



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي
السريع قطاعات غرب النيل فى المسافة من ٨٠٠ + ٥٨ كم
الى ٦٠٠ + ٤٦ كم بطول ١,٨ كم

تنفيذ: شركة انشاء للمقاولات العامة

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٣٤) اتجاه الطريق الساحلي بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٦/١ اجتمع كل من:-

1- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام المشروعات

2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري

3- السيد المهندس / محمود شعبان احمد مدير المشروع

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ (٢٠٢٣/٦/١) هو تاريخ استلام الموقع وبداية الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- كورسجايد

٢- [Signature]

١- [Signature]

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى
مطروح

عقيد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٣/٦/١٥



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والمحطات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للمحطات والكباري
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة) المقايسة الختامية لبيود الاعمال تنفيذ شركة انشاء اتجاه الطرق الساحلي القطاع من المحطة ٤٥٨+٨٠٠ الى ٤٦٠+٦٠٠				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة
٣	أعمال الردم			
١٠٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة علاوة مسافة النقل ١٩٥ كم	م³	٦,٤١٤,٠٢٧٧.٢٣	٨٥
		م³	٦,٤١٤,٠٢٧٧.٢٣	٢٧٠,٢٠
		م³	٦,٤١٤,٠٢٧٧.٢٣	١٣
٤	طبقات الأساس			
١٠٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٢٥% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والقيمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان علاوة مسافة النقل ١٩٠ كم	م³	٨٠٠,٠٠	٢٧٨,٠٠
			٨٠٠,٠٠	٢٠٤,٠٠
			٨٠٠,٠٠	٢٥,٠٠
٢٠٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة العمار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفائق بجهاز لوس الجولوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والقيمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان علاوة مسافة النقل ١٩٠ كم	م³	٥,٥٦٥,٠٠	٢٩٨,٠٠
			٥,٥٦٥,٠٠	٢٠٤,٠٠
			٥,٥٦٥,٠٠	٢٥,٠٠
الإجمالي				
(خمس مليون وسبع مائة ألف جنيه فقط لا غير)				

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني قياض
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندسين /
هاني محمد محمود طه

مدير المشروع المالک

م/ ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشارى

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ محمود شعبان

م/ محمد انشاء والمقاولات العامة
شركة
٢٥٥٧٢١١
٢٥٥٧٢١١

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة انشاء للمقاولات العامة - من المحطة 458+800 الى المحطة 460+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الثلاثاء الموافق :- 2022/5/17

- بناء على طلب المقاول شركة انشاء للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى محمود نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب |
| 4- السيد المهندس / محمود شعبان | ممثل شركة انشاء للمقاولات |

وتبين ان المحجر علي مسافة 195 كم من منتصف قطاع شركة انشاء للمقاولات العام


N 30 ° 33 ' 19 . 7 " E 29 ° 45 ' 06 . 7

احد اثي المحجر

N 92 ° 70 ' 06 . 28 " E 36 ° 37 ' 09 . 61 "


احداثي منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،،



4- محرم شعبان أحمد

3- محمد خليل



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة انشاء للمقاولات العامة من المحطة ٨٠٠+٥٨ الى المحطة ٦٠٠+٦٠

محضر تحديد مسافة نقل

(SUB BALLAST)

انه في يوم الاثنين الموافق :- ٢٠٢٣/١/٣٠

- بناء على طلب المقاول شركة انشاء للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل SUB BALLAST من كسارة (الامارتية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-





- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى محمود نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب |
| ٤- السيد المهندس / كمال نجيب | استشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| ٥- السيد المهندس / محمود شعبان | ممثل شركة انشاء للمقاولات العامة |

وتبين ان الكسارة على مسافة ١٩٠ كم من منتصف قطاع شركة انشاء للمقاولات العام

احداثي الكسارة $N30^{\circ} 38' 59.0''$ $E 29^{\circ} 42' 23.8$

احداثي منتصف القطاع $N 92^{\circ} 70' 06.28''$ $E 36^{\circ} 37' 09.61''$

وعلي ذلك تم توقيع،،

٥- محمود شعبان أحمد
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة انشاء للمقاولات العامة من المحطة ٨٠٠+٥٨ الى المحطة ٦٠٠+٦٠

محضر تحديد مسافة نقل

(prepared sub grade)

انه في يوم الاثنين الموافق :- ٢٠٢٣/١/٣٠

- بناء على طلب المقاول شركة انشاء للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل prepared subgrade من كسارة (الامارتية)

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى محمود نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب |
| ٤- السيد المهندس / كمال نجيب | استشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٥- السيد المهندس / محمود شعبان | ممثل شركة انشاء للمقاولات العامة |

وتبين ان الكسارة علي مسافة ١٩٠ كم من منتصف قطاع شركة انشاء للمقاولات العام

احداثي الكسارة $N30^{\circ} 38' 59.0''$ $E 29^{\circ} 42' 23.8''$

احداثي منتصف القطاع $N 92^{\circ} 70' 06.28''$ $E 36^{\circ} 37' 09.61''$

وعلي ذلك تم توقيع،،

٥- محمود شعبان احمد
٤- محمد
٣- محمد
٢- محمد
١- محمد

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_ قطاع العلمين / فوكة)

لتنفيذ المسافة من الكم (458+800) إلى الكم (460+600) بطول 1.8 كم اتجاه الطريق الساحلي

تنفيذ شركة :- إنشاء للمقاولات العامة

إشراف: المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د . سعد الجيوشي)

انه في يوم الإثنين الموافق 2023/10/2 وبناءً علي قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية

لمنطقة غرب الدلتا رقم (121) بتاريخ 2022/09/14 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي لأعمال عليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------|--|----------|
| (1) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات بالمنطقة | (رئيساً) |
| (2) المهندس/إبراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (3) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (4) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (5) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (6) المهندس/ محمود شعبان | مدير مشروع الشركة المنفذة | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الأتربة و الأساس لتشكيل مسار الجسر الترابي

-أولاً :- أعمال الردم

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

ثانياً:- أعمال الأساس (Prepared Subgrade) :-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

ثالثاً:- أعمال الأساس (Sub Ballast) :-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (1) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - (2) علي السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
 - (3) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - (4) علي استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وابلغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(6) محمد نجيب - اد
(5) شفيق
(4) شفيق
(3) شفيق
(2) شفيق
(1) شفيق

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

إفادة

بالإشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) .

العقد رقم: 2134/2022/2023

في المسافة من 458+800 إلي 460+600

مقاوله شركة : انشاء للمقاولات العامة

اشراف استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC)
ا.د سعد الجبوشي

كمية الأتربة المستخدمة في المشروع : 6414.02 م³

كمية الأساس (Prepared subgrade) المستخدمة في المشروع : 800 م³

كمية الأساس (Sub ballast) المستخدمة في المشروع : 5565 م³

يرجي العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيانات والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت إشراف المنطقة .

مدير مشروع الشركة : م/ محمود شعبان
مدير مشروع الاستشاري : م/ مصطفى نجم
مدير مشروع الهيئة : م/ إبراهيم العنلوي
مدير عام المشروعات : م/ محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية : م/ مهندس

عميد مهندس

"هاني محمد محمود طه"



التقييم الفني

مشروع :- اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من كم ٤٥٨+٨٠٠ الي كم ٦٠٠ + ٤٦٠ بطول ١,٨ كم اتجاه الطريق
الساحلي.

٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٣٤
شركة انشاء للمقاولات العامة

رقم العقد:-
تنفيذ:-

المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا.

اشراف :-

الحسابات المالية و مفصل التقييم و قيمة الخصومات

انه في يوم ٢٠٢٣/١٠/٩ و بناء على القرار الاداري (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤

الصادر من السيد عميد مهندس/ رئيس الادارة المركزية - منطقة غرب الدلتا و محضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ
في ٢٠٢٣/١٠/٢ تم عمل التقييم الفني للعملية عالية و قد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| ١. السيد المهندس / محمد حسني فياض | (مدير عام المشروعات) | (رئيس اللجنة) |
| ٢. السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | (ممثل الهيئة) | (عضو لجنة) |
| ٣. السيد المهندس / عبدالله عبد المحسن | (معمل المنطقة المشرفة) | (عضو لجنة) |
| ٤. السيد المهندس / مصطفى نجم | (مكتب دكتور سعد الجبوشي استشاري الهيئة) | (عضو لجنة) |
| ٥. السيد المهندس / محمد خليل | (مكتب استشاري المساحة) | (عضو لجنة) |
| ٦. السيد المهندس / محمود شعبان احمد | (الشركة المنفذة) | (عضو لجنة) |

و بعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية و ملفات التجارب العملية تمت حساب الخصومات المالية
و جاءت كالاتي:-

- خصم ٢٢٨٢.٠٠ جنيه (الفان ومانتان واثنين وثمانون جنيها لاغير) قيمة تجارب المعمل.

- لا يوجد خصم على خروج العينات.

- لا يوجد خصم علي خروج العينات.



- يتم خصم مبلغ وقدره (٣٤.٢٠٠) اربعة وثلاثون الفا ومائتي جنيه لا غير بنسبة ٠.٦ % من اجمالي قيمة المشروع نتيجة الفحص البصري.

التوقيعات:

١-
٢-
٣-
٤-
٥-
٦- كورسيه اند

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا





الإسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

٢٠٢٣ / ١١ / ١٣
"هاني محمد محمود طه"

Contractor Company	انشاء للمقاولات العامة			Designer Company							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Eng/ Mahmoud Shaban		24/1/2023	1:00							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				459	EW	CS	24	1	2023	1	00

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Sub ballast material results					
Location to be Used	459+840 to 459+900 (0.7)			459+140 to 459+300 (0.7)		
	459+900 to 460+100 (0.7)			460+000 to 460+100 (0.9)		
	460+100 to 460+300 (0.7)			460+100 to 460+300 (0.9)		
	460+300 to 460+500 (0.7)			460+300 to 460+500 (0.9)		
	458+800 to 458+900 (0.7)					
	458+900 to 459+040 (0.7)					
	459+040 to 459+140 (0.7)					
MAR Approval No				Date		
Supplier Name						
Test Requirement		Specification		Clause		
Reference Photos		Yes attached / No		Other		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note	
1	Sieve analysis	M ³	5000			
2	Material finer than sieve no ,200					
3	L.L and P.L and Proctor test					
4	Absorption test and Los angles abrasion and CBR					
Comments by:			Comments by:			
Asample has been taken form Sub allast material by SEGAC Office to cairo university Lab and the results founded meet the specificonctions and accepted						
APPROVAL STATUS						
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R		
Contractor						
QA/QC *	Ramel					
GARB**	M Negr					
Comment by ER						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

تقرير رقم 2023/M/2001-03

اسم العميل : شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
الطين - فوكة - قطاع ٦
التاريخ : ٢٠٢٣/١/٢٤
مكان العينة : تشوينات (Sub ballast)

البيانات بعاليه حسب إلقاء العميل.

رقم المنخل	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	97.3	82.9	72.6	58.7	40.3	24.7	17.6	10.9	4.3

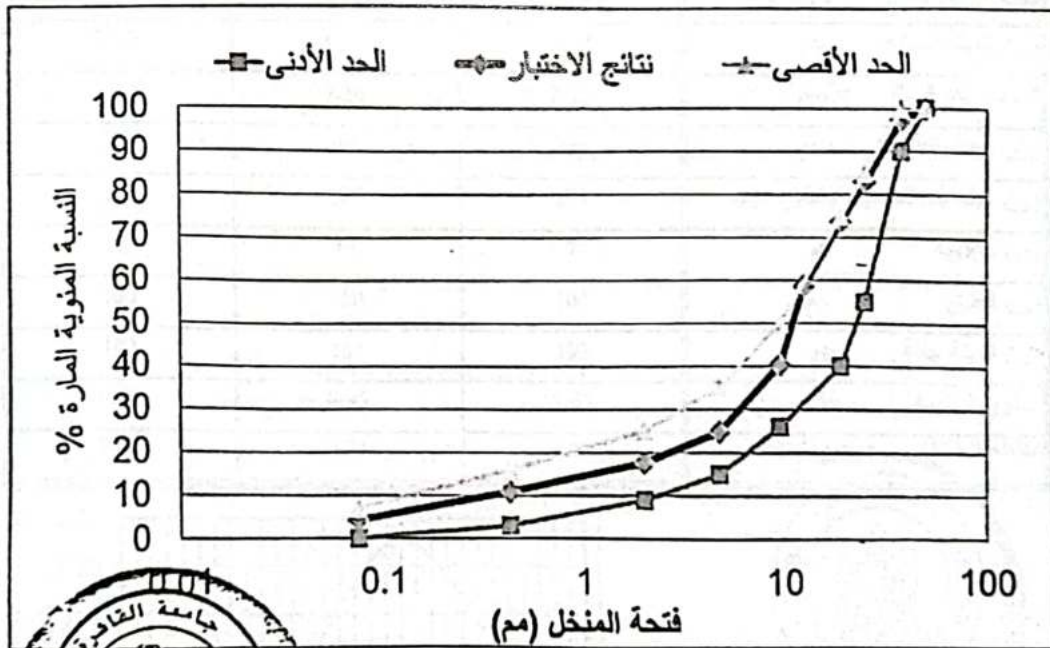

حد السيولة (%)	لا يوجد
حد اللدونة (%)	لا يوجد
العينة مقبولة طبقاً لمواصفات المشروع المرسله من العميل	

اختبار

اختبار تعيين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة


تقرير رقم 2023/81/2001-03

اسم العميل: شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية: القطار الكهربائي السريع
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٤
نوع التربة: تشوينات
حجم القالب: ٢١١٢ سم^٣
العلمين - فوكه - قطاع ٦

تشوينات (Sub ballast)

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

9	6	3	نسبة الماء المضاف %
11417	11386	11039	وزن القالب و العينة جم
6395	6395	6395	وزن القالب جم
5022	4991	4644	وزن العينة المبتلة جم
2.38	2.36	2.20	الكثافة بعد الدمك جم/سم ^٣
300	300	300	وزن عينة بالطبق جم
282	287	293	وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم
18	13	7	وزن الرطوبة جم
100	100	100	وزن الطبق جم
182	187	193	وزن العينة جافة جم
9.89	6.95	3.63	محتوى الرطوبة %
2.16	2.21	2.12	الكثافة الجافة جم/سم ^٣

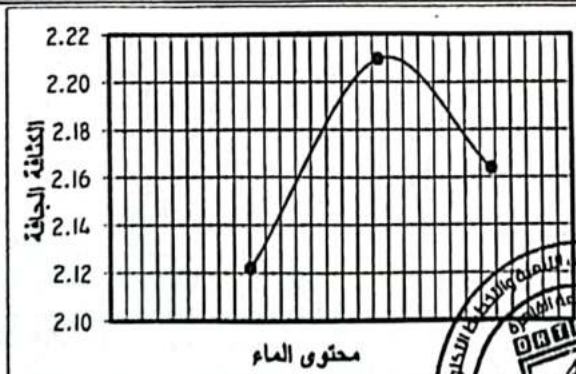

اعتماد

أقصى كثافة جافة = ٢.٢١ جم/سم^٣
عند محتوى رطوبة = ٦.٩٥ %

اختبار

California Bearing Ratio
الترتيب رقم 2023/M/2001-03

Client Name: شركة إنشاءات للمقاولات العامة

Test Date: 24/01/2023

Project Name: الطريق الكهرمانى السريع
العلمين - لوكية - قطاع ١


Specimen Type: تشوييلات
(Sub ballast)

البيانات بعينه حسب إداة العمل والنتائج التى تم الحصول عليها تمثل العيلة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسئولية على المركز.

(A) Molding Moisture Contest							
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm^3	2208		
A. Mass. Wet Soil + can. g	450			Mass of sample, Mold g	13317		
B. Mass. Dry Soil + can. g	428			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	22			Mass of sample g	4859		
D. Mass Can g	100			Unit Wet Mass g/cm^3	2.20		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	328			Percent Moisture %	6.71		
F. %Moisture ((C/E*100)	6.71			Unit Dry Mass g/cm^3	2.06		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR
0	9	0.00										
0.5	112	5.79										
1.2	321	16.59										
1.5	440	22.74										
2.5	722	37.31		54.07								
3.81	1197	61.85										
5.08	1558	85.67		83.18								
7.62	2247	116.11										

Swell			
Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Height mm	5.01		
Initial Height mm	5.0		
Difference mm	0.01		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.01		
Test No.	1		
Blows Per Layer	10		

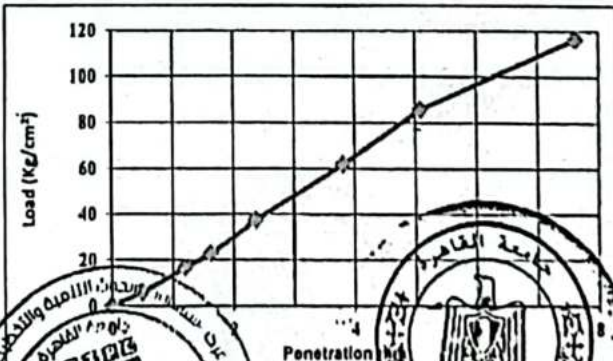

Tested By

Approved

Los Angeles Abrasion (AASHTO T96)
تقرير رقم 2023/M/2001-03

Client Name: شركة إنشاء للمباني العامة
Project Name: لطار الكهربائي السريع
الطريق - لوكية - قطاع 1

Test Date: 24/01/2023
Specimen type: ثوريلك
(Sub ballast)

البيانات بعليه حسب المادة المعمل والناتج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون انشاء مسؤولية على المركز.

Test Class		A	B	C	D
Abrasive Charge (No. of Spheres)		12	11	8	6
Sieves		Sample Mass g			
Passing	Retained				
mm (alt.)	mm (alt.)				
37.5 (1 1/2 in.)	25.0 (1 in.)	1250			
25.0 (1 in.)	19.0 (3/4 in.)	1250			
19.0 (3/4 in.)	12.5 (1/2 in.)	1250	2500		
12.5 (1/2 in.)	9.50 (3/8 in.)	1250	2500		
9.50 (3/8 in.)	6.35 (1/4 in.)			2500	
6.35 (1/4 in.)	4.75 (No.4)			2500	
4.75 (No.4)	2.36 (No.8)				5000
Total		5000	5000	5000	5000

Total Class (A)
Mass of Sample before Test g = 5000
Mass of Sample retained on 1.70mm(No.12) g = 3654
Los Angeles Wear = ((5000-Mass Ret.) / 5000) X 100 % = 26.92

Tested By



Approved

(Signature)



MATERIAL INSPECTION REQUEST



مركز الاستشارات الهندسية
تشييد وتشغيل الطرق
(جودة) (GARB)

المهنة العامة
للمسحور والكباري
(GARB)



Contractor Company	انشاء للمقاولات العامة		Designer Company	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time
	Eng/ Mahmoud Shaban	كوبري	25/1/2023	1:20
Received by ER			MIR	

C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
459	EW	CS	25	1	2023	1	20

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Sub ballast material results				
Location to be Used	459+300 to 459+500 (0.7) 459+500 to 459+700 (0.7) 459+700 to 459+840 (0.7) 458+800 to 459+00 (0.9) 459+000 to 459+200 (0.9) 459+200 to 459+320 (0.9) 459+320 to 459+500 (0.9)		459+500 to 459+600 (0.9) 459+600 to 459+740 (0.9) 459+740 to 459+840 (0.9) 459+840 to 460+00 (0.9)		
MAR Approval No			Date		
Supplier Name					
Test Requirement	Specification		Clause		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Sieve analysis	M ³	5000		
2	Material finer than sieve no ,200				
3	L.L and P.L and Proctor test				
4	Absorption test and Los angles abrasion and CBR				
Comments by:		Comments by:			
Asample has been taken form sub ballast material by SEGAC Office to cairo university Lab and the results founded meet the specificonctions and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	كوبري	كوبري			
QA/QC *	Ramzi				
GARB**	m. Hegm				
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

تقرير رقم 2023/M/2001-04

اسم العميل : شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية : القطر الكهربائي السريع
العلمين - فقرة - قطاع ٦
التاريخ : ٢٠٢٣/١/٢٥
مكان العينة : شويكات (Sub ballast)
عينة رقم ١

*البيانات بمقتضى حساب إلقاء السيل.

No.200	No.40	No.10	No.4	3/8 in.	1/2 in.	3/4 in.	1.0 in.	1.5 in.	2.0 in.	رقم المنخل
0.075	0.425	2.00	4.75	9.50	12.50	19.00	25.00	38.00	50.00	فتحة المنخل (مم)
3.6	8.1	14.2	22.0	38.6	55.3	72.3	84.1	96.2	100.0	النسبة المئوية المارة %

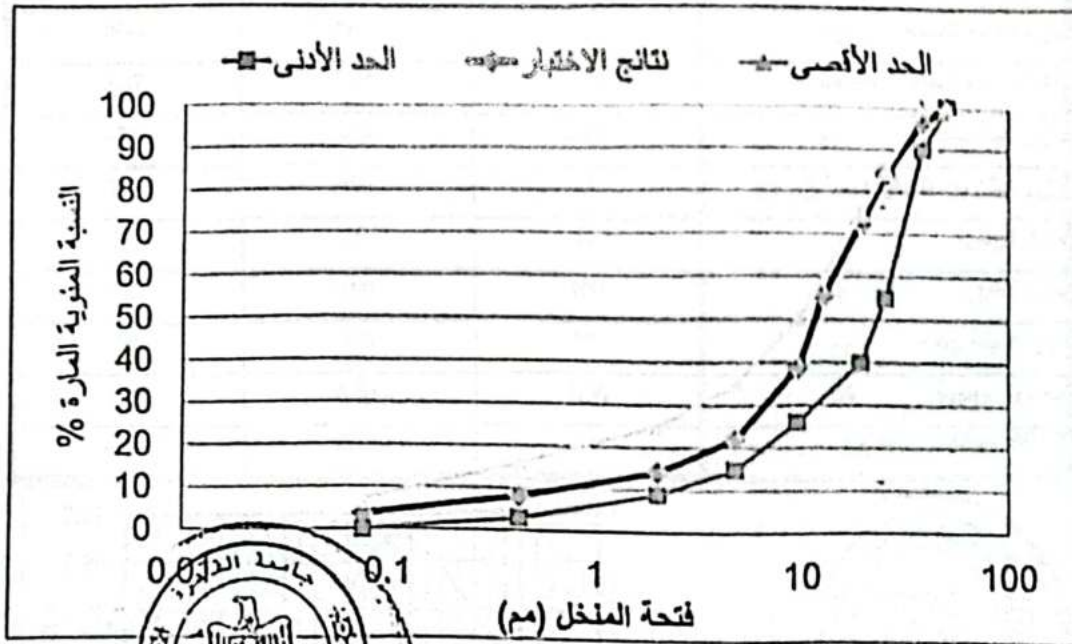

حد السيولة (%)	لا يوجد
حد اللدولة (%)	لا يوجد
العينة متقبولة طبقاً لمواصفات المشروع المرسل من المختبر	

الختبار

California Bearing Ratio
تقرير رقم 2023/M/2001-04

Client Name: شركة إنشاء للمقاولات العامة

Test Date: 25/01/2023

Project Name: الخط الكهرالي السريع
الطين - لوك - قطاع 1


Specimen Type : تشوينات
عينة رقم (Sub ballast)

البيانات بعليه حسب إلقاء العميل والتنتج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسؤولية على المركز.

(A) Molding Moisture Contest							
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm^3	2208		
A. Mass. Wet Soil + can. g	400			Mass of sample, Mold g	13319		
B. Mass. Dry Soil + can. g	380			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	20			Mass of sample g	4861		
D. Mass Can g	100			Unit Wet Mass g/cm^3	2.20		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	280			Percent Moisture %	7.14		
F. %Moisture ((C/E*100)	7.14			Unit Dry Mass g/cm^3	2.05		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total Load kg	Unit Load (K/cm^2)	Corr. Load (K/cm^2)	% CBR	Total Load kg	Unit Load (K/cm^2)	Corr. Load (K/cm^2)	% CBR	Total Load kg	Unit Load (K/cm^2)	Corr. Load (K/cm^2)	% CBR
0	0	0.00										
0.5	144	7.44										
1.2	374	19.33										
1.63	499	25.78										
2.37	794	41.03		59.46								
3.81	1327	68.57										
5.08	1789	92.44		89.75								
7.62	2397	123.86										

Swell			
Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Height mm	4.02		
Initial Height mm	4.02		
Difference mm	0		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.00		
Test No.	1		
Blows Per Layer	10		

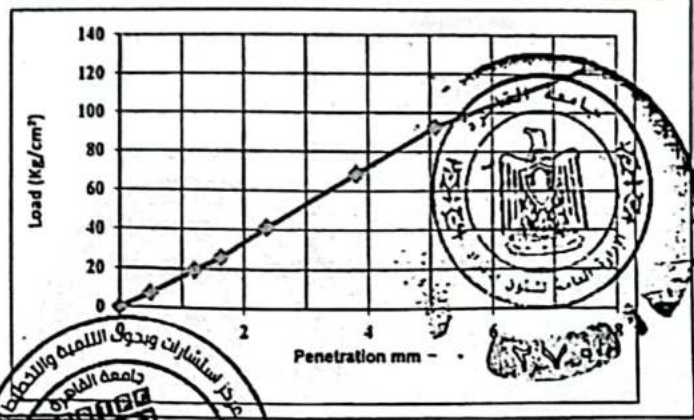

Tested By

Approved

Los Angeles Abrasion (AASHTO T90)
2023/M/2001-04 تقرير رقم

Client Name: شركة إنشاء للملازمات العامة

Test Date: 25/01/2023

Project Name: المطار الكهربائي السريع
الطمين - لوكة - قطاع 1

Specimen type: لشويك
صلة رلم (Sub ballast)

البيانات بعاليه حسب المادة السيل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العيلة الموردة من قبل السيل دون اننى مسئولية على المركز.

Test Class		A	B	C	D
Abrasive Charge (No. of Spheres)		12	11	8	6
Sieves		Sample Mass g			
Passing mm (alt.)	Retained mm (alt.)				
37.5 (1 1/2 in.)	25.0 (1 in.)	1250		-	
25.0 (1 in.)	19.0 (3/4 in.)	1250			
19.0 (3/4 in.)	12.5 (1/2 in.)	1250	2500		
12.5 (1/2 in.)	9.50 (3/8 in.)	1250	2500		
9.50 (3/8 in.)	6.35 (1/4 in.)			2500	
6.35 (1/4 in.)	4.75 (No.4)			2500	
4.75 (No.4)	2.36 (No.8)				5000
Total		5000	5000	5000	5000

Total Class (A)
Mass of Sample before Test g = 5000
Mass of Sample retained on 1.70mm(No.12) g = 3608
Los Angles Wear = ((5000-Mass Ret.) / 5000) X 100 % = 27.84

Tested By

Approved



MATERIAL INSPECTION REQUEST



مركز الإسفلت والخرق
شركة الخرقة والخرق
(مركز الخرقة)

الهيئة العامة
لنقل و الطرق
(GARB)



Contractor Company	انشاء للمقاولات العامة			Designer Company							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	Eng/ Mahmoud Shaban	محمد شهاب	25/1/2023	1:20							
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				458	EW	CS	25	1	2023	1	20

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials		Sub ballast material results			
Location to be Used	459+300 to 459+500 (0.7)	459+500 to 459+600 (0.9)			
	459+500 to 459+700 (0.7)	459+600 to 459+740 (0.9)			
	459+700 to 459+840 (0.7)	459+740 to 459+840 (0.9)			
	458+800 to 459+00 (0.9)	459+840 to 460+00 (0.9)			
	459+000 to 459+200 (0.9)	458+800 to 458+900 (0.7)			
	459+200 to 459+320(0.9)	458+900 to 459+040 (0.7)			
	459+320 to 459+500 (0.9)	459+040 to 459+140 (0.7)			
	459+900 to 460+100 (0.7)	459+140 to 459+300 (0.7)			
	460+100 to 460+300 (0.7)	459+840 to 459+900 (0.7)			
	460+300 to 460+500 (0.7)	460+000 to 460+100 (0.9)			
460+100 to 460+300 (0.9)	460+300 to 460+500 (0.9)				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement		Specification		Clause	
Reference Photos		Yes attached / No		Other	
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Sieve analysis	M ³	10000		
2	Material finer than sieve no ,200				
3	L.L and P.L and Proctor test				
4	Absorption test and Los angles abrasion and CBR				
Comments by:			Comments by:		
Asample has been taken form sub ballast material by SEGAC Office to calro university Lab and the results founded meet the specifcontions and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	محمد شهاب	محمد شهاب			
QA/QC *	Kamel				
GARB**	m. Negrin				
Comment by ER					
Employers Representative					


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

الرقم 2023/8/2001-04

اسم العميل : شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية : القطر الكهربائي السريع
العميل - فوك - قطاع ٦
التاريخ : ٢٠٢٣/١/٢٥
مكان العينة : ثوبينات (Sub ballast)
عينة رقم ١

*البيانات مأخوذة حسب إلقاء العميل.

رقم المنخل	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	96.2	84.1	72.3	55.3	38.6	22.0	14.2	8.1	3.6

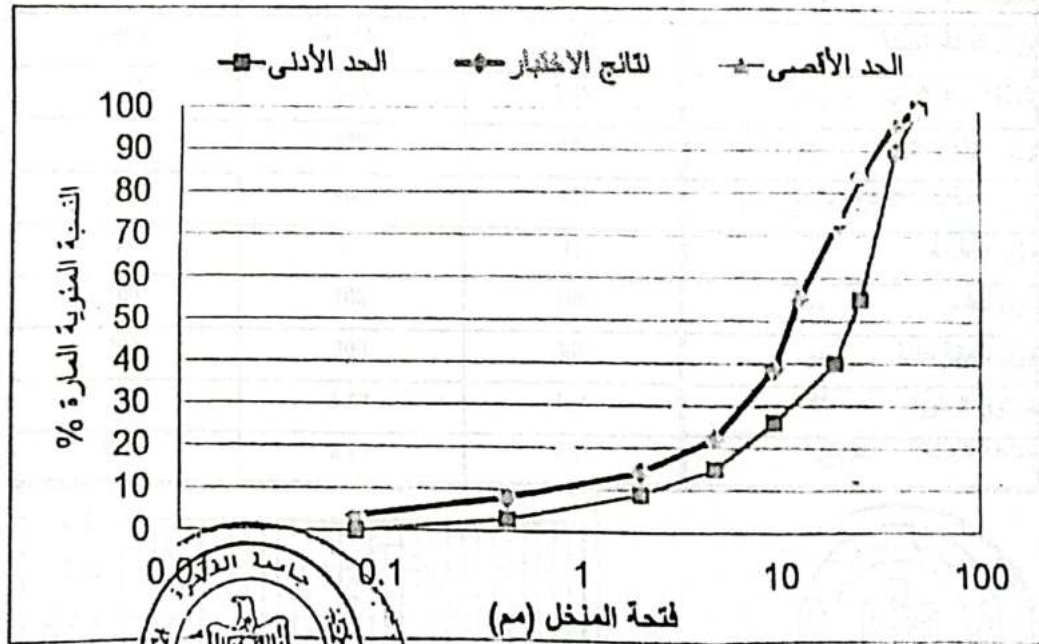

حد السيولة (%)	لا يوجد
حد اللدونة (%)	لا يوجد
العينة مقبولة طبقاً لمواصفات المشروع المرسل من العميل	

الختبار



اختبار تعيين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة


المرور رقم 2023/21/2001-04

اسم العميل: شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية: القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٥
لوع التربة: تشوينات
حجم القالب: ٢١١٢ سم^٣

تشوينات (Sub ballast) - عينة ١

البيانات بحاليه حسب المادة العميل

9	6	3	نسبة الماء المضاف %
11394	11372	11004	وزن القالب و العينة جم
6395	6395	6395	وزن القالب جم
4999	4977	4689	وزن العينة المبتلة جم
2.37	2.36	2.18	الكثافة بعد الدمك جم/سم ^٣
420	420	420	وزن عينة بالطبق جم
391	400	409	وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم
29	20	11	وزن الرطوبة جم
100	100	100	وزن الطبق جم
291	300	309	وزن العينة جافة جم
9.97	6.67	3.56	محتوى الرطوبة %
2.15	2.21	2.11	الكثافة الجافة جم/سم ^٣

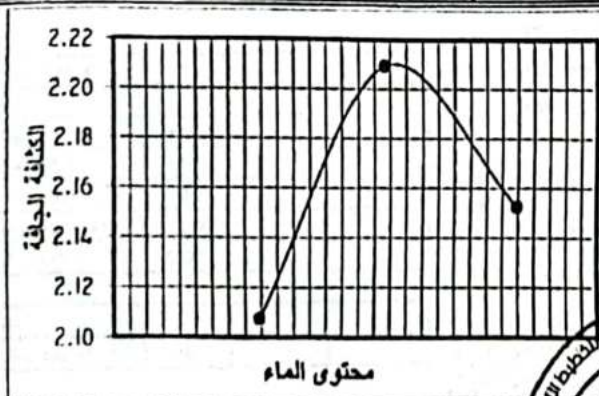

اعتماد

اسم: _____

أقصى كثافة جافة = ٢.٢١ جم/سم^٣
عند محتوى ماء = ٦.٦٧ %

اختبار



Los Angeles Abrasion (AASHTO T90)

القرار رقم 2023/M/2001-04

Client Name: لدراسة إنشاء لادقارات العامة

Test Date: 25/01/2023

Project Name: القطار الكهربائي السريع
العلمين - لوكة - قطاع ١

Spoolman type: لدريلك
(Sub ballast) صبة راما

البيانات بعالية حسب اداة العمل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون ائلى مسئولية على المركز.

Test Class		A	B	C	D
Abrasive Charge (No. of Spheres)		12	11	8	6
Sieves		Sample Mass g			
Passing	Retained				
mm (alt.)	mm (alt.)				
37.5 (1 1/2in.)	25.0 (1 in.)	1250		-	
25.0 (1 in.)	19.0 (3/4in.)	1250			
19.0 (3/4in.)	12.5 (1/2in.)	1250	2500		
12.5 (1/2in.)	9.50 (3/8in.)	1250	2500		
9.50 (3/8in.)	6.35 (1/4in.)			2500	
6.35 (1/4in.)	4.75 (No.4)			2500	
4.75 (No.4)	2.36 (No.8)				5000
Total		5000	5000	5000	5000

Total Class (A)
Mass of Sample before Test g = 5000
Mass of Sample retained on 1.70mm(No.12) g = 3608
Los Angeles Wear = ((5000-Mass Ret.) / 5000) X 100 % = 27.84

Tested By

Approved



نتائج اختبار الامتصاص

نمبر رقم 2023/M/2001-04

اسم العميل : شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكه - قطاع ٦
تاريخ الورود : ٢٠٢٣/١/٢٥
عدد العينات : ١

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

نوع العينة	النسبة المئوية للامتصاص
تشوينات (Sub ballast) عينة رقم ١	٢.٦٥

اعتماد

اختبار



MATERIAL INSPECTION REQUEST



مركز الاستشارات الهندسية
تشييد الطرق والجسور
(مركز الاستشارات الهندسية)

الهيئة العامة
للمطارات والكباري
(GARB)



Contractor Company	انشاء للمقاولات العامة		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name Eng/ Mahmoud Shaban	Sign كود شهاب	Date 4/1/2023	Time 2:00																
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <th>C1</th> <th>C2</th> <th>C3</th> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>YY</th> <th>HH</th> <th>MM</th> </tr> <tr> <td>459</td> <td>EW</td> <td>CS</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2023</td> <td>2</td> <td>00</td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	459	EW	CS	4	1	2023	2	00	
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
459	EW	CS	4	1	2023	2	00													

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Sub grade material results				
Location to be Used	459+500 to 459+640 (0.25) 459+640 to 459+840 (0.25) 459+140 to 459+300 (0.5) 459+300 to 459+500 (0.5) 459+500 to 459+700 (0.5) 459+700 to 459+840 (0.5)				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement				Specification	Clause
Reference Photos	Yes attached / No			Other	
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Sieve analysis	M ³	10000		
2	Material finer than sieve no ,200				
3	L.L and P.L and Proctor test				
4	Absorption test and Los angles abrasion and CBR				
Comments by:			Comments by:		
A sample has been taken from Sub grade material by SEGAC Office to Cairo University Lab and the results founded meet the specifications and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	كود شهاب	كود شهاب			
QA/QC *	Ramess				
GARB**	m. Negm				
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

لترتيب رقم 2023/M/2001-01

اسم العميل : شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦
التاريخ : ٢٠٢٣/١/١
مكان العينة : تشوينات (Subgrade)

ملاحظات يعليه حسب إرادة العميل.

رقم المنخل	3	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	75.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	85.9	78.2	71.4	55.3	40.2	28.6	18.1	10.5	7.0

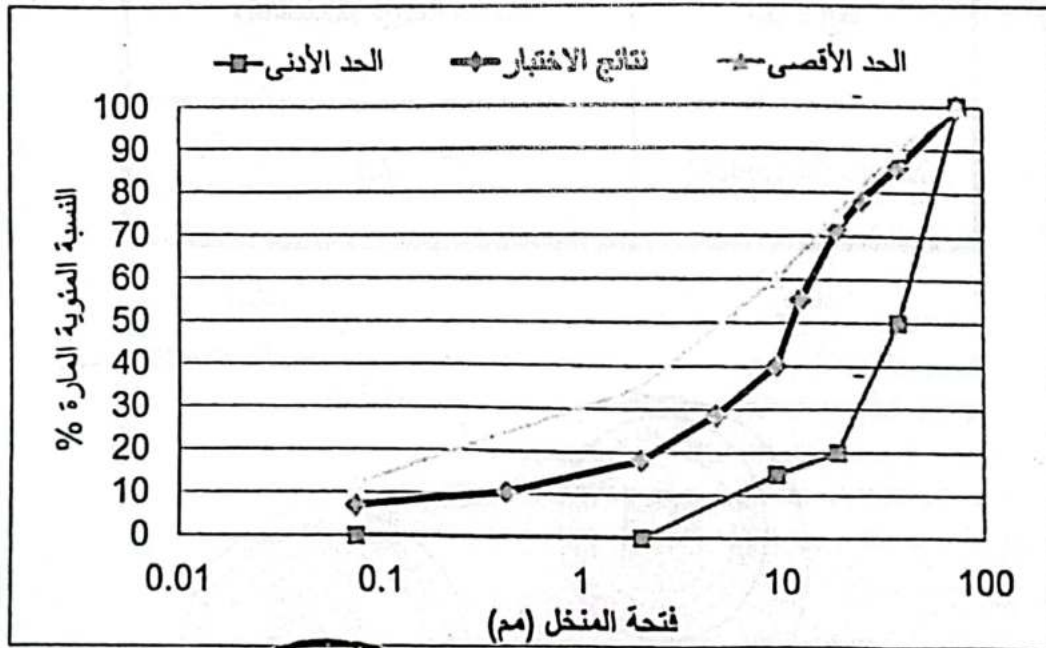

حد السيولة (%)	لا يوجد
حد اللدونة (%)	لا يوجد
العينة مقبولة طبقاً لمواصفات المشروع المرحلية من العميل.	

اختبار

نتائج اختبار الامتصاص
نمبر رقم 2023/M/2001-01

اسم العميل : شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكه - قطاع ٦
تاريخ الورود : ٢٠٢٣/١/٤
عدد العينات : ١

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

نوع العينة	التمهيد المئوية للامتصاص
تشوينات (Subgrade)	٢.٨٠

اعتماد

اختبار

أ. ه. ه. ه.



اختبار تعيين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة


نمبر رمل 2023/01/2001-01

اسم العميل: شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية: القطر الكهربائي السريع
العلمين - فوكه - قطاع ٦
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٤
نوع التربة: تشوينات
حجم القالب: ٢١١٢ سم^٣

تشوينات (Subgrade)

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

نسبة الماء المضاف %	3	6	9
وزن القالب و العينة جم	11021	11342	11392
وزن القالب جم	6395	6395	6395
وزن العينة المبتلة جم	4526	4947	4997
الكثافة بعد الدمك جم/سم ^٣	2.19	2.34	2.37
وزن عينة بالطبق جم	500	500	500
وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم	488	474	465
وزن الرطوبة جم	12	26	35
وزن الطبق جم	100	100	100
وزن العينة جافة جم	388	374	365
محتوى الرطوبة %	3.09	6.95	9.59
الكثافة الجافة جم/سم ^٣	2.12	2.19	2.16

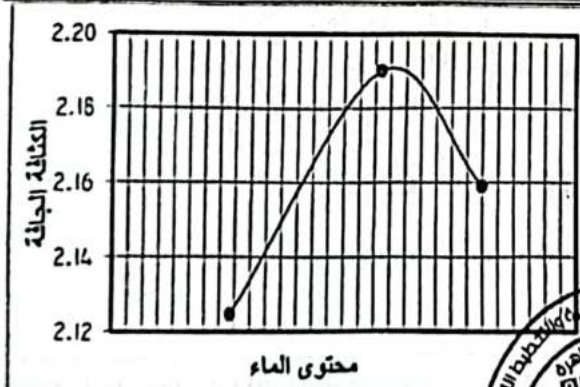

اعتماد

اسم العميل



اختبار

Los Angeles Abrasion (AASHTO T96)
نظير رقم 2023/M/2001-01

Client Name: شركة إنشاء للمطارات العامة
Project Name: المطار الكهرملي السريع
الطمين - لوكه - لطاق 1

Test Date: 04/01/2023
Specimen Type: ثوبك
(Subgrade)

البيانات بعليه حسب الفلة العسل والنفع التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العسل دون انشئ مسئولية على المركز.

Test Class		A	B	C	D
Abrasive Charge (No. of Spheres)		12	11	8	6
Sieves		Sample Mass g			
Passing	Retained				
mm (all.)	mm (all.)				
37.5 (1 1/2 in.)	25.0 (1 in.)	1250			
25.0 (1 in.)	19.0 (3/4 in.)	1250			
19.0 (3/4 in.)	12.5 (1/2 in.)	1250	2500		
12.5 (1/2 in.)	9.50 (3/8 in.)	1250	2500		
9.50 (3/8 in.)	6.35 (1/4 in.)			2500	
6.35 (1/4 in.)	4.75 (No.4)			2500	
4.75 (No.4)	2.36 (No.8)				5000
Total		5000	5000	5000	5000

Total Class (A)
Mass of Sample before Test g = 5000
Mass of Sample retained on 1.70mm(No.12) g = 3578
Los Angeles Wear = ((5000-Mass Ret.) / 5000) X 100 % = 28.44


Tested By

Approved



رقم بریدی : ١٢٢١١ جیزة - مصر ص.ب : ٣٨ فاكس : ٣٥٧٣٦٦٠١ : ٣٥٧٠٧٧١٣ : ٣٥٦٨٧٦٩٦ - ٣٥٧٢٨٥٣٢ - ٣٥٧٢٨٦٢٣
E-mail: info@drtpc.org Mail: 12211Giza - Egypt P.O.Box: 38 Fax: 35736601 Tel.: 35707713 - 35687696 - 35728532 - 35728623

رقم بریدی : ١٢٢١١ جیزة - مصر ص.ب : ٣٨ فاكس : ٣٥٧٣٦٦٠١ : ٣٥٧٠٧٧١٣ : ٣٥٦٨٧٦٩٦ - ٣٥٧٢٨٥٣٢ - ٣٥٧٢٨٦٢٣
E-mail: info@drtpc.org Mail: 12211Giza - Egypt P.O.Box: 38 Fax: 35736601 Tel.: 35707713 - 35687696 - 35728532 - 35728623



California Bearing Ratio

نمبر رقم 2023/M/2001-01

Client Name:

شركة إنشاء للمطارات العامة

Test Date:

04/01/2023

Project Name:

الطيار الكهربائي السريع
الطين - لوكه - لطاع ١

Specimen Type :


تشيونيك
(Subgrade)

تمت بحسب تعليمات اختبار السيل والتنتج التي تم الحصول عليها من قبل السيل دون اثنى مسئولية على المركز.

(A) Molding Moisture Contest							
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm^3	2208		
A. Mass, Wet Soil + can. g	400			Mass of sample, Mold g	13300		
B. Mass, Dry Soil + can. g	378			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	22			Mass of sample g	4842		
D. Mass Can g	100			Unit Wet Mass g/cm^3	2.19		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	278			Percent Moisture %	7.91		
F. %Moisture ((C/E)*100)	7.91			Unit Dry Mass g/cm^3	2.03		


Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
Penetration	Molded /	TESTED /		Molded /	TESTED /			Molded /	TESTED /		
mm	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.
	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²
0	0	0.00									
0.5	112	5.79									
1.2	223	11.52									
1.63	319	16.48									
2.37	455	23.51		34.07							
3.51	782	40.41									
5.08	1147	59.27		57.54							
7.62	1784	92.18									

Swell			
Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Height mm	2.05		
Initial Height mm	2.04		
Difference mm	0.01		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.01		
Test No.	1		
Blows Per Layer	10		

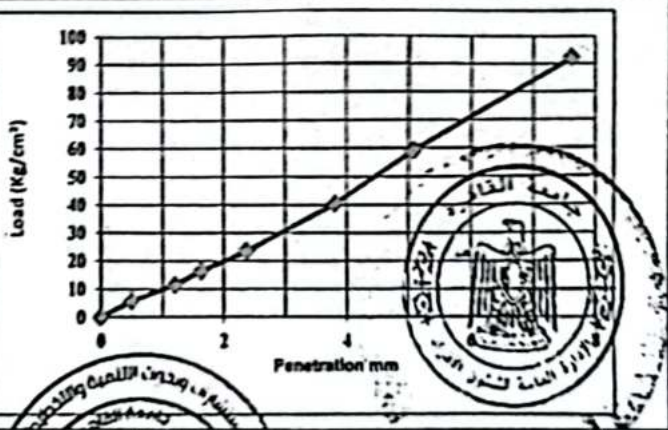

Tested By

Approved



Contractor Company		البناء للمقاولات العامة		Designer Company			
Issued by Contractor		Name	Eng/ Mahmoud Shaban	Sign		Date	25/12/2022
Received by ER				MIR		Time	2:00
				CI	CZ	C3	DD
				458	EW	CS	25
						MM	12
						YY	2022
						HH	2
						MM	00

CODE - 1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used	
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials		Sub grade material results			
Location to be Used	459 +140 to 459+260 (0.25)	459+840 to 459+900 (0.5)			
	459+260 to 459+380 (0.25)	459+900 to 460+100 (0.5)			
	459+380 to 459+500 (0.25)	460+100 to 460+300 (0.5)			
	458+800 to 458+900 (0.5)	458+800 to 458+900 (.25)			
	458+900 to 458+980 (0.5)	458+900 to 459+040 (0.25)			
	458+980 to 459+140 (0.5)	459+040 to 459+140 (0.25)			
	460+300 to 460+500 (0.25)	459+840 to 459+900 (0.25)			
	460+300 to 460+500 (.5)	459+900 to 460+100 (0.25)			
		460+100 to 460+300 (0.25)			
MAR Approval No		Date			
Supplier Name		Specification	Clause		
Test Requirement		Other			
Reference Photos	Yes attached / No				
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Sieve analysis	M ³	10000		
2	Material finer than sieve no. 200				
3	L.L. and P.L. and Proctor test				
4	Absorption test and Los angles abrasion and CBR				
Comments by:		Comments by:			
Asample has been taken form sub grade material by SEGAC Office to Cairo University Lab and the results founded meet the specifcontions and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor					
QA/QC *					
GARB**					
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer
** Allignment / Bridges: Culvert Only


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

نمبر رقم 2022+MW2001-04

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٥
مكان العينة : تشوينات (Subgrade)
اسم العميل : شركة إنشاءات للمقاولات العامة
اسم العملية : القطر الكهربائي السريع
العميل - فوكه - قطاع ٦


رقم المنخل	3	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	75.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	87.0	77.6	72.3	32.6	41.6	30.3	22.4	13.7	7.9

حبيبات بطيه حسب إلكة السيل.

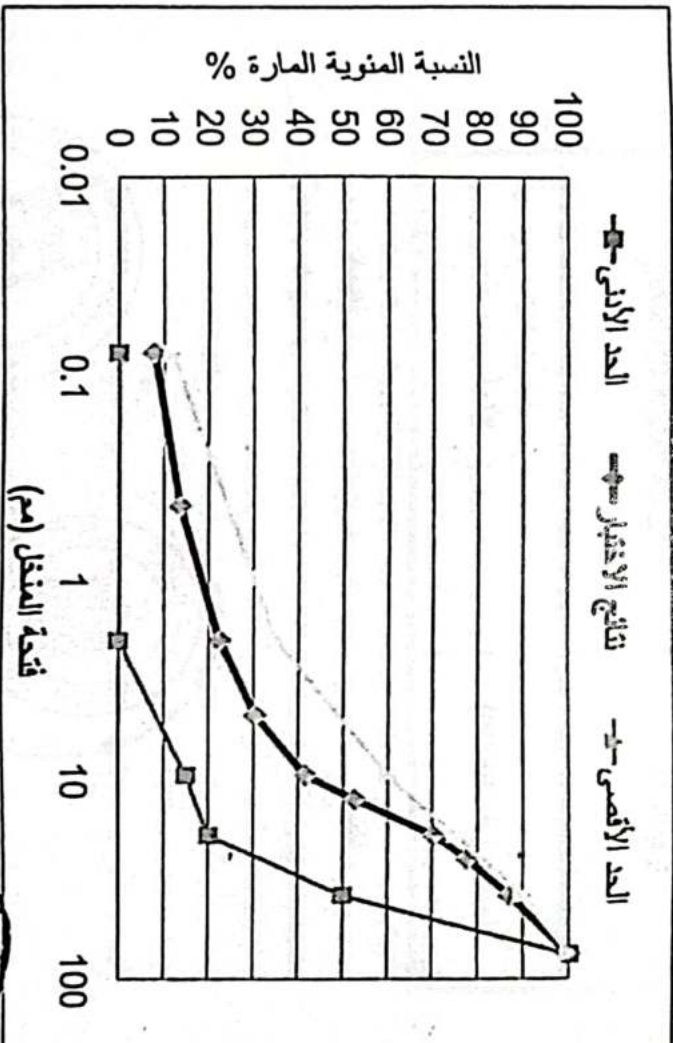

اعتماد


أ. س. ب. ب. ب.



2022/1/11/2001-01 01

تسويغات (Subgrado)

نسبة الماء المضاف %	وزن التراب و الرغوة جـ	وزن التراب جـ	وزن الرغوة المربطة جـ	النتيجة بعد الدمك جـ/سم	وزن عينة بالطنى جـ	وزن عينة بعد التجفيف بالطنى جـ
0	11357	11062			400	389
2.36	6395	6395	4667	2.21		
4.079	4962					
11.374						
6.395						
2.15	2.20	2.13				
9.49	6.76	3.81				
274	281	289				
100	100	100				
26	19	11				
374	381	389				

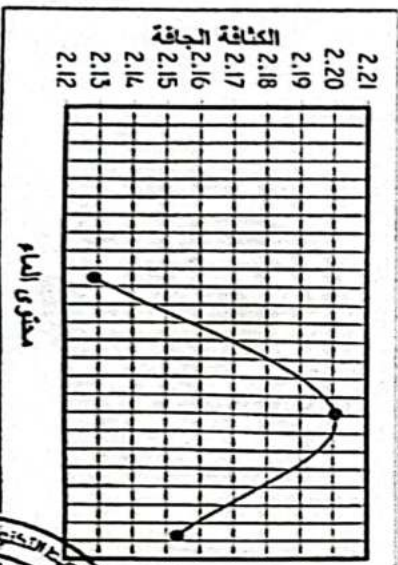

انفـ ٢٠٢١ م / ٢٠٢١ هـ / ٢٠٢١ م

7.4%

اعتماد

٢٥٧٢٨٦٩٣ - ٢٥٧٢٨٥٣٢ - ٢٥٦٨٧٩٩٦ - ٢٥٧.٧٧١٣ : ٢٥٧٢٨٦٩٣
 رقم برقي : ١٢٧١١ - ص ٤٠٠ : ٢٥٧٢٨٦٩٣
 E-mail: info@drpc.org Mail: 1221Giza - Egypt P.O.Box: 38 Fax: 35736601 Tel.: 35707713 - 35687996 - 35728532 - 35728623



Los Angeles Abrasion (AASHTO T96)

نمر رقم 2022/AN/2001-04

Client Name:

لجنة إنشاء الطرق لجامعة

Test Date:

26/12/2022

Project Name:

طابق التبريد السريع
لطبقات لينة. طابق 1

Specimen type:

للبريك
(Subgrade)

البيانات يملأها حسب إداة السيل والتفتيح التي تم الحصول عليها لتقل الحيلة الواردة من قبل السيل دون التي مسجلة على البركة.

Test Class		A	B	C	D
Abrasive Charge (No. of Spheres)		12	11	8	6
Sieves		Sample Mass			
Passing	Retained	g			
mm (all.)	mm (all.)				
37.5 (1 1/2 in.)	25.0 (1 in.)	1250			
25.0 (1 in.)	19.0 (3/4 in.)	1250			
19.0 (3/4 in.)	12.5 (1/2 in.)	1250	2500		
12.5 (1/2 in.)	9.50 (3/8 in.)	1250	2500		
9.50 (3/8 in.)	6.35 (1/4 in.)			2500	
6.35 (1/4 in.)	4.75 (No. 4)			2500	
4.75 (No. 4)	2.36 (No. 8)				5000
Total		5000	5000	5000	5000

Total Class

Mass of Sample before Test

(A) 5000
g =

Mass of Sample retained on 1.70mm(No.12)

g = 3674

Los Angeles Wear = ((5000-Mass Ret.) / 5000) X 100 % =

26.52

Tested By

Approved



رقم بريدي: ١٢٢١١ - جولة - مصر ص.ب: ٢٨ فاكس: ٣٨٨٧١٢١ - ٢٥٧٨٧١٢١ - ٢٥٧٨٧١٢٢ - ٢٥٧٨٧١٢٣
E-mail: info@drtpc.org Mail: 12211Giza - Egypt P.O.Box: 38 Fax: 35736601 Tel.: 35707713 - 35687696 - 35728532 - 35728623

DEVELOPMENT RESEARCH
AND TECHNOLOGICAL
PLANNING CENTER
CAIRO UNIVERSITY



مركز استشارات وبحوث التنمية
والتخطيط التكنولوجي
جامعة القاهرة


California Bearing Ratio
تقرير رقم 2022/AM/2001-04

Client Name: شركة بغداد للمباني العالية
Project Name: الطريق القوياني السريع
الطريق - نيرة - قطاع 1
Test Date: 25/12/2022
Specimen Type: كتريات
(Subgrade)

البيانات بملليمتر حسب إبرة السيل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل القيمة المتوسطة من قبل السيل دون انسي مسجلة على الطريق

(A) Molding Moisture Content									
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3		
Can No.	1			Mold Vol.	Cm ³	2208			
1. Mass. Wet Soil + can. g	420			Mass of sample, Mold g	13304				
2. Mass. Dry Soil + can. g	400			Mass of Mold g	8458				
3. Mass Moisture (A-B)	20			Mass of sample g	4846				
4. Mass Can g	100			Moisture Content %	2.19				
5. Mass of Dry Soil (B-D)	300			Percent Moisture %	6.67				
6. Moisture (C-E/100)	6.67			Unit Dry Mass g/cm ³	2.06				

Test No. 1									
Penetration	Molded /	TESTED /	%	Molded /	TESTED /	%	Molded /	TESTED /	%
mm	Total Unit	Cor.	CBR	Total Unit	Cor.	CBR	Total Unit	Cor.	CBR
0	0	0.00		Load kg	Load (Kcm ²)	CBR	Load kg	Load (Kcm ²)	CBR
0.5	102	5.27							
1.2	245	12.66							
1.63	335	17.31							
2.37	472	24.39	35.35						
3.81	782	40.41							
5.08	1099	56.79	55.13						
7.62	1756	92.60							

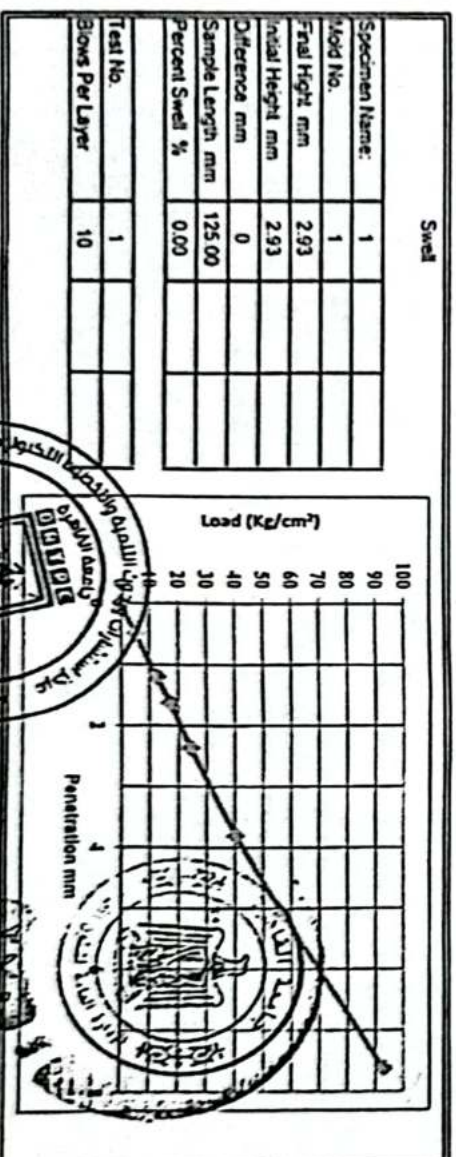

تلفون: ٢٥٧٢٨٦٢٣ - ٢٥٧٢٨٦٢٢ - ٢٥٦٨٧٩٩٩ - ٢٥٧٠٧٧٧٧
E-mail: info@drpc.org Mail: 12211Giza - Egypt P.O.Box: 38 Fax: 35736601 Tel.: 35707713 - 35687696 - 35728532 - 35728623

MATERIAL INSPECTION REQUEST



مركز البحوث والدراسات
الهندسية
(SGAC)

الهيئة العامة
للحرق والكهرباء
(GARB)



Contractor Company	الشباب للمقاولات العامة		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name Eng/ Mahmoud Shaban	Sign <i>[Signature]</i>	Date 15/12/2022	Time 1:00																
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>458</td> <td>EW</td> <td>C5</td> <td>15</td> <td>12</td> <td>2022</td> <td>1</td> <td>00</td> </tr> </table>		C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	458	EW	C5	15	12	2022	1	00
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
458	EW	C5	15	12	2022	1	00													

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE - 2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Sub grade material results	
Location to be Used	458+800 to 458+900 (0.25) 458+900 to 459+040 (0.25) 459+040 to 459+140 (0.25) 459+840 to 459+900 (0.25)	459+900 to 460+100 (0.25) 460+100 to 460+300 (0.25) 460+300 to 460+500 (0.25) 460+300 to 460+500 (0.5)

MAR Approval No		Date			
Supplier Name		Specification	Clause		
Test Requirement		Other			
Reference Photos	Yes attached / No				
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Sieve analysis	M ³	5000		
2	Material finer than sieve no ,200				
3	L.L and P.L and Proctor test				
4	Absorption test and Los angles abrasion and CBR				

Comments by: _____

Asample has been taken form Sub grade material by SEGAC Office to calro university Lab and the results founded meet the specifcontions and accepted

APPROVAL STATUS			
Organisation	Name	Sign	Date
Contractor	<i>Silwag</i>	<i>[Signature]</i>	
QA/QC *	<i>Rmish</i>	<i>[Signature]</i>	
GARB**	<i>m-Negm</i>	<i>[Signature]</i>	
Comment by ER			
Employers Representative			

* Designer
** Alignment / Bridges: Culvert Only


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقا لـ AASHTO

المرور رقم 101-2001/2022


التاريخ : ٢٠١١/١٢/١٥
مكان البينة : تدرجيات (Subgrade)
اسم العميل : شركة إنشاء المقارلات العامة
اسم العملية : المقار الكورباني السريع
العاملين : لوردة - فلاح ١

*بيانات طبقا حسب البلاد العميل.

رقم المنخل	3	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)		38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	86.6	78.5	72.4	59.0	51.0	38.4	22.3	12.3	8.3

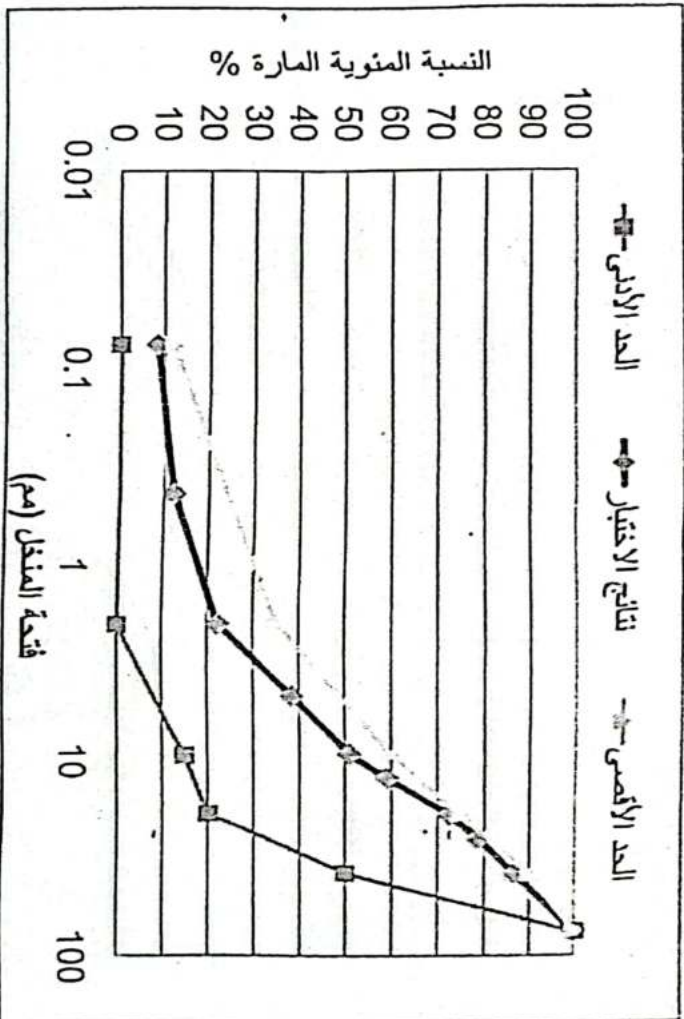

اعتماد
أ. م. ج. شمس





نتائج اختبار الامتصاص

البر رقم M/2001-01 2022

اسم العميل : شركة إنشاءات للمقاولات العامة
اسم العملية: الخطار الكهربائي السريع
تاريخ الورق : ٢٠٢٢/١٢/١٥
عدد العينات : ١
المعلمين - لوحة - قطاع ١

البيانات بمثابة حسب إرادة العميل

النسبة المئوية للامتصاص	نوع العينة
٢.٥٥	تشويبات (Subgrade)

اعتماد

اختبار

أب ج د





اختبار تعيين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة


تقرير رقم 2022/٨/١2001-01

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١٥
نوع التربة : تشوينات
حجم القالب : ٢١١٢ سم^٣
شركة إنشاء المقاولات العامة
القطار الكهربائي السريع
العلمين - فركة - قطاع ٦
اسم العميل:
اسم العملية:

تشوينات (Subgrade)

نسبة الماء المضاف %	وزن القالب و العينة جم	وزن القالب جم	وزن العينة المبتلة جم	الكثافة بعد الماء جم/سم ^٣	وزن عينة بالطبق جم	وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم	وزن الرطوية جم	وزن الطبق جم	وزن العينة جافة جم	محتوى الرطوية %	الكثافة الجافة جم/سم ^٣
9	11362	11340	11033								
6	6395	6395	6395								
3	4967	4945	4638								
2.35	2.34	2.20									
300	300	300									
282	287	293									
18	13	7									
100	100	100									
182	187	193									
9.89	6.95	3.63									
2.14	2.19	2.12									

البيانات بحاليه حسب أداة العميل

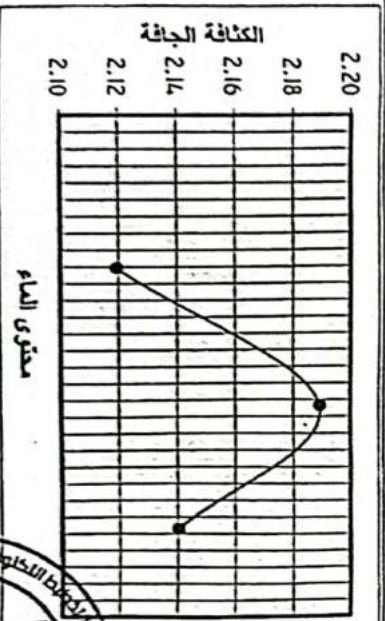

أقصى كثافة جافة = ٢.١٩ كجم/سم^٣

% ١.٩٥





Los Angeles Abrasion (AASHTO T96)
نمر رقم 01-M/2001-2022

Client Name: شركة إنشاءات للملازم خاصة
Project Name: الملازم للتجديف السريع
الملازم - ليرة - لواقع 1
Test Date: 16/12/2022
Specimen Type: تجريك
(Subgrade)

البيانات المطلوبة حسب المادة السيل والتآكل الترميم الحصول عليها لتفصيل العملية المبررة من قبل السيل دون التمرين.

Test Class	A	B	C	D
Abrasive Charge (No. of Spheres)	12	11	8	6
Sieves	Sample Mass g			
Passing				
mm (all.)	mm (all.)			
37.5 (1 1/2 in.)	25.0 (1 in.)	1250		
25.0 (1 in.)	19.0 (3/4 in.)	1250		
19.0 (3/4 in.)	12.5 (1/2 in.)	1250		
12.5 (1/2 in.)	9.50 (3/8 in.)	2500		
9.50 (3/8 in.)	6.35 (1/4 in.)		2500	
6.35 (1/4 in.)	4.75 (No. 4)		2500	
4.75 (No. 4)	2.36 (No. 8)			5000
Total	5000	5000	5000	5000

Total Class
Mass of Sample before Test g = 5000
Mass of Sample retained on 1.70mm(No.12) g = 3741
Los Angeles Wear = ((5000-Mass Ret.) / 5000) X 100 % = 25.18

Tested By

Approved



Signature




California Bearing Ratio
نشر رقم 2022/M/2001-01

Client Name: شركة إنشاءات المطارات العامة
Project Name: المطار الكويتي السريع
Test Date: 15/12/2022
Specimen Type: تربة رملية - قاع
(Subgrade)

البيانات بقطر حسب المادة السيل والتنتج التي تم الحصول عليها نقل القيمة الواردة من قبل السيل دون ائني مسئولية على المركز.

(A) Molding Moisture Conltest									
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3		
Can No.	1			Mold Vol.	Cm ³				
A. Mass, Wet Soil + can, g	400			Mass of sample, Mold g	13340				
B. Mass, Dry Soil + can, g	378			Mass of Mold g	8458				
C. Mass Moisture (A-B)	24			Mass of sample g	4882				
D. Mass Can g	100			Unit Wet Mass g/cm ³	2.21				
E. Mass of Dry Soil (B-D)	276			Percent Moisture %	8.70				
F. % Moisture ((C/E*100)	8.70			Unit Dry Mass g/cm ³	2.03				

Test No. 1									
Penetration	Molded	/	TESTED	/	Molded	/	TESTED	/	
mm	Test	Unit	Cor.	%	Total	Unit	Cor.	%	
	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	
0	0	0.00							
0.5	68	4.55							
1.2	270	13.95							
1.63	374	19.33							
2.37	524	30.18		43.73					
3.61	842	43.51							
5.05	1056	54.56		52.98					
7.62	1398	72.24							

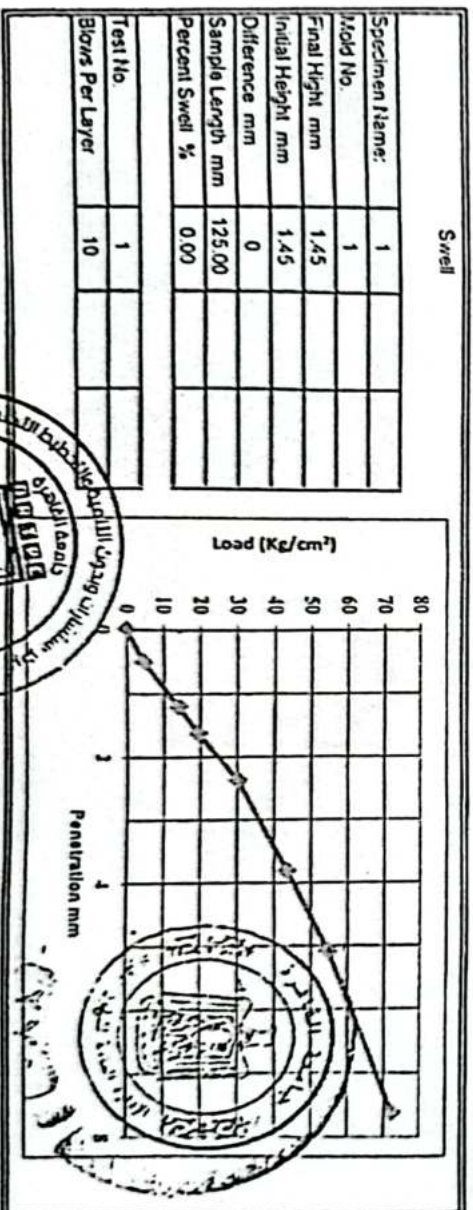

Tested By

Approved

MATERIAL INSPECTION REQUEST



مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والجسور
(مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والجسور)

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

Contractor Company	انشاء للمقاولات العامة		Designer Company							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
	Eng/ Mahmoud Shaban	ك. ش. ش. ش.	25/12/2022	2:00						
Received by ER		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			458	EW	CS	25	12	2022	2	00

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Sub grade material results				
Location to be Used	459 +140 to 459+260 (0.25)		459+840 to 459+900 (0.5)		
	459+260 to 459+380 (0.25)		459+900 to 460+100 (0.5)		
	459+380 to 459+500 (0.25)		460+100 to 460+300 (0.5)		
	458+800 to 458+900 (0.5)				
	458+900 to 458+980 (0.5)				
	458+980 to 459+140 (0.5)				
MAR Approval No			Date		
Supplier Name					
Test Requirement	Specification		Clause		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	Sieve analysis	M ³	5000		
2	Material finer than sieve no ,200				
3	L.L and P.L and Proctor test				
4	Absorption test and Los angles abrasion and CBR				
Comments by:		Comments by:			
Asample has been taken form Sub grade material by SEGAC Office to Cairo University Lab and the results founded meet the specificonctions and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	ك. ش. ش. ش.	ك. ش. ش. ش.			
QA/QC *	Kam	ك. ش. ش. ش.			
GARB**	m. Negr	ك. ش. ش. ش.			
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only


نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

نمبر رقم 2022+M/2001-04


اسم العميل : شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية : القطر الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦
التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٥
مكان العينة : تشوينات (Subgrade)

البيانات بعينه حسب إلقاء العميل.

رقم المنخل	3	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	75.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	87.0	77.6	70.3	52.6	41.6	30.3	22.4	13.7	7.9

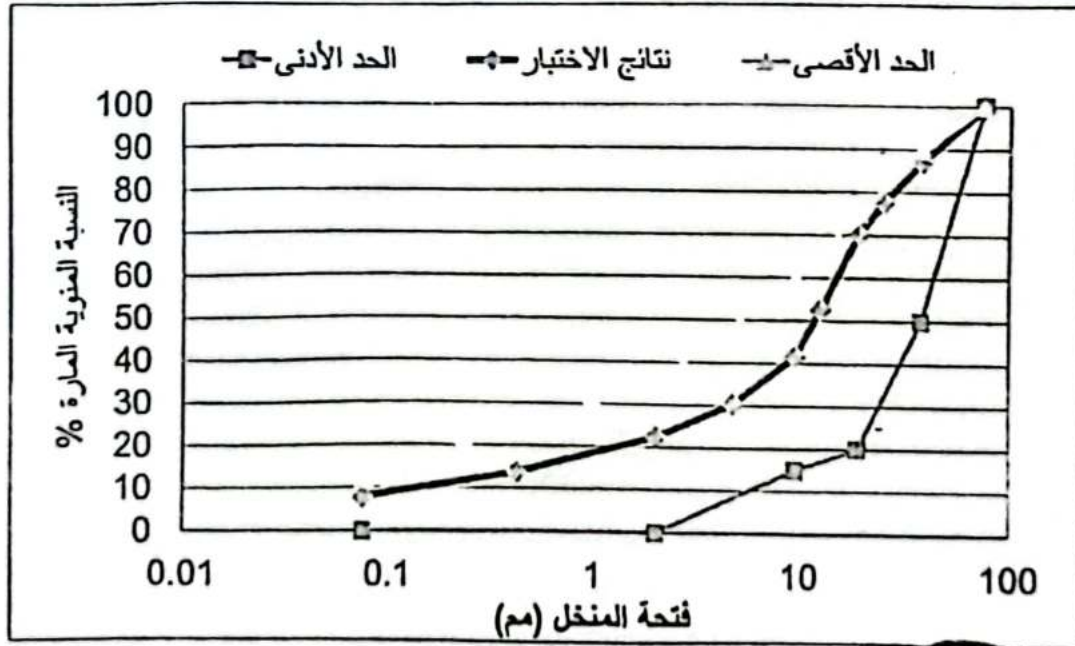

اعتماد
أ. م. م. م.

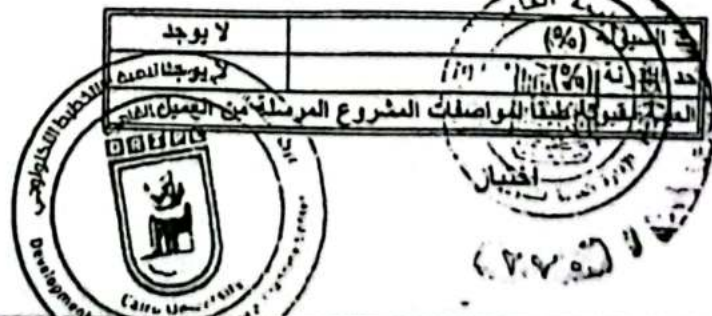

نتائج اختبار الامتصاص

تقرير رقم 2022/RT/2001-04

تاريخ الورود : ٢٠٢٢/١٢/٢٥

عدد العينات : ١

اسم العميل : شركة إنشاء للمقاولات العامة

اسم العملية : القطار الكهربائي السريع

العلمين - فوكه - قطاع ٦

البيانات بماله حسب المادة العميل

النسبة المئوية للامتصاص	نوع العينة
٢.٧٥	تشوينات (Subgrade)

اعتماد

اختبار





الختبار تعبرن أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة


المرجع رقم 01-001/AM/2022

التاريخ : ٢٠٢١/١١/٢٥
نوع التربة : تشوبلات
حجم القالب : ٢١١٢ سم^٣

اسم العمل : شركة إنشاء للمقاولات العامة
اسم العملية : القطر الكهربائي السريع
العلمون - أوعية - أبعاد ٦

تشوبلات (Subgrado)

البيانات وحقول حسب المادة العمل			
0	0	3	نسبة الماء المضاف %
11374	11357	11062	وزن القالب و العينة جم
6395	6395	6395	وزن القالب جم
4979	4962	4667	وزن العينة المبللة جم
2.36	2.35	2.21	نسبة الماء بعد الدمك جم/سم ^٣
400	400	400	وزن عينة بالتطبيق جم
374	381	389	وزن عينة بعد التجفيف بالتطبيق جم
26	19	11	وزن الرطوبة جم
100	100	100	وزن التطبيق جم
274	281	289	وزن العينة جافة جم
9.49	6.76	3.81	محتوى الرطوبة %
2.15	2.20	2.13	نسبة الجافة جم/سم ^٣

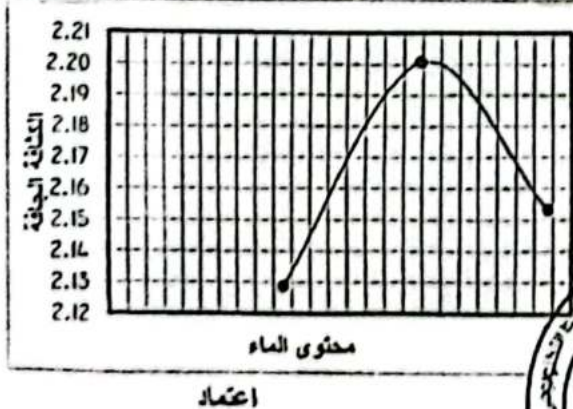

أقصى كثافة جافة : ٢.٢٠ كجم / سم^٣

% ٦.٧٦



Los Angeles Abrasion (AASHTO T96)

نار بر رقم 2022/8/2001-04

Client Name: شركة الشاء للمطالقات العامة

Test Date: 25/12/2022

Project Name: المطار الجديد السريع
العلمين - ليرة - قطاع 1

Specimen type: تلمينك
(Subgrade)

البيانات بعينه حسب آلة العمل والتناجح التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون انتمى مسئولية على المركز.

Test Class		A	B	C	D
Abrasive Charge (No. of Spheres)		12	11	8	6
Sieves		Sample Mass g			
Passing	Retained				
mm (alt.)	mm (alt.)				
37.5 (1 1/2in.)	25.0 (1 in.)	1250			
25.0 (1 in.)	19.0 (3/4in.)	1250			
19.0 (3/4in.)	12.5 (1/2in.)	1250	2500		
12.5 (1/2in.)	9.50 (3/8in.)	1250	2500		
9.50 (3/8in.)	6.35 (1/4in.)			2500	
6.35 (1/4in.)	4.75 (No.4)			2500	
4.75 (No.4)	2.36 (No.8)				5000
Total		5000	5000	5000	5000

Total Class (A)
Mass of Sample before Test g = 5000
Mass of Sample retained on 1.70mm(No.12) g = 3674
Los Angeles Wear = ((5000-Mass Ret.) / 5000) X 100 % = 26.52

Tested By

Approved



California Bearing Ratio

نمبر رقم 2022+M/2001-04

Client Name: شركة إنشاء للمقاولات العامة

Test Date: 25/12/2022

Project Name: المطار الكهربائي السريع
العلمين - نويّة - قطاع ٦


Specimen Type : تشوينات
(Subgrade)

البيانات بعاليه حسب إلهة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسؤولية على المركز.

(A) Molding Moisture Contest							
Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. cm^3	2208		
A. Mass, Wet Soil + can. g	420			Mass of sample, Mold g	13304		
B. Mass, Dry Soil + can. g	400			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	20			Mass of sample g	4846		
D. Mass Can g	100			Unit Wet Mass g/cm^3	2.19		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	300			Percent Moisture %	6.67		
F. % Moisture ((C/E)*100)	6.67			Unit Dry Mass g/cm^3	2.06		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR	Load kg	Load (K/cm^2)	Load K/cm^2	CBR
0	0	0.00										
0.5	102	5.27										
1.2	245	12.66										
1.53	335	17.31										
2.37	472	24.39		35.35								
3.81	782	40.41										
5.08	1099	56.79		55.13								
7.62	1796	92.80										

Swell			
Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Height mm	2.93		
Initial Height mm	2.93		
Difference mm	0		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.00		
Test No.	1		
Blows Per Layer	10		

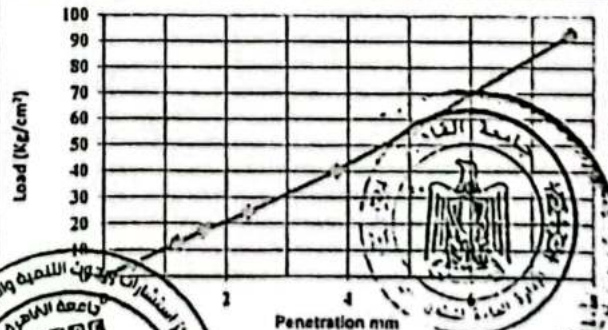

Tested By

Approved
