

محضر أستلام موقع

العملية: أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) بطول ٣,٥ كم

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة القليوبية

أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ و في حضور كلا من :-

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / محمد صديق | الهيئة العامة للطرق و الكبارى |
| ٢- السيد المهندس / إبراهيم الصابر | استشارى الهيئة العامة للطرق و الكبارى (مكتب حياة) |
| ٣- السيد المهندس / أمير أحمد أنور | استشارى الهيئة العامة للطرق و الكبارى (مكتب حياة) |
| ٤- السيد المهندس / مصطفى السيد هاشم | شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق |

المكان : طريق شبين القناطر / الشاملة

الأجراءات:




اجتمع الحاضرون فى المكان و الزمان المحددين بعاليه لاجل تسليم موقع المشروع المطلوب تنفيذه طبقا للعقد رقم

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١ الى أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق للبدء فى تنفيذ اعمال العقد المشار اليه بعاليه.

القرار: تم تسليم الموقع خالى من العوائق الى شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق بتاريخ

٢٠٢٣/٥/١٤ على ان يعتبر اليوم هو تاريخ استلام الموقع.

التوقيع

٤- 
٣- 
٢- 
١- 



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

على تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم (القطاع الاول)

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٣١ طبقاً للموافقة المرفقة على المذكرة المعروضة على سيادته بخصوص تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم (القطاع الاول) لشركة اولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق .
وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في ٢٠٢٣ / / على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / مثال السيد عمر	مدير عام صيانة الطرق
المهندس / محمد عامر	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
المهندس / السيد المحاسب	الإدارة المركزية للبحوث
السيد المحاسب / السيد المحاسب	المنطقة المشرفة
السيد الأستاذ /	إدارة العقود والمشتريات
	إدارة المراجعة
	الإدارة القانونية
	رئيساً
	عضواً
	عضواً
	عضواً
	عضواً
	عضواً

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق ٢٠٢٣ / / بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتي :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م١٠٠	٦٩	٦٩٠٠
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م١٠	٦	٦٠
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة خرسانة عادية أو مسلحة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه .	٣م١٠٠	٨١	٨١٠٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة اساس مثبت وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٢٥ سم والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف على ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقاً لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطرق وفقاً للقطاع الإنشائي المطلوب .	٢م٣٨٠٠٠	٦٣	٢٣٩٤٠٠٠
٥	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٩٠٠ بالطن	٢٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
٦	بالمتر المسطح أعمال الكشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة الكشط الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهر العمل . - يتم احتساب ٣,٢ جنيه للسلم الواحد كشط في حالة الزيادة أو النقصان	٢م١٠٠	١٨	١٨٠٠
٧	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ كم من محور الطريق ويتم التنفيل طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠٥٠	٢٣	١١٥٠٠

صورة طبق الأصل

محضر اجتماع اللجنة

لجنة تقييم وتنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم (القطاع الأول)

علي تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم (القطاع الأول)

(المنطقة الاولى - المركزية)

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاختلاف (بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة والقصى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر	٣٥٠٠	١١٥,٢	٥٧٦٠٠
٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٣١٠٠٠	٤٠,٦	٤٠٦٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٢ د) او (٣ د) في الاماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وطبقا لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسياً بعد الدمك والفئة شملة وضع طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000) او المستحلبات الاسفلتية المطابقة	٣٢٤٥,٩٥٦	٢٢٥٠	٥٥٣٤٠١
١١	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من أي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل .	٢٣٨٠٠٠	٣١,٥	١١٩٧٠٠٠
١٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام اعمالها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣٠٠٠	١٠,٧٥	٢٢٢٥٠

محضر اجتماع اللجنة
الخاصة بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطريق
على تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم (القطاع الاول)

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١٣	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م٣٠٠٠	١٦٦,٢٥	٤٩٨٧٥٠
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣٩٠٠٠	١٦١,٢٥	٦٢٨٨٧٥٠
١٥	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) من الخرسانة المسلحة بالفيبر جلاس وجه واحد بارتفاع ٨٠ طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / ٣م وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ يتم التنفيذ على فرش من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم ويعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦ O ٦) م ط ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطريق .	٢٠ م ط	٥٥٠	١١٠٠٠
١٦	بالمتر المكعب اعمال رفع وازالة المخلفات مع نقل المخلفات الغير صالحة للرم خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بماجيعة بمسافة لا تقل عن ١٤ كم	٣م٥٠٠٠	٢٦	١٣٠٠٠٠
١٧	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنت (وسط) بابعاد ١١,٥ / ٣,٠ * ٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣م٠,٨ سم دولوميت لا يزيد اكير بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣م ٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردوره على فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم و التي تملأ بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٢ : ١ والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣م٥٠٠	١٣٥	٦٧٥٠٠
١٨	بالعدد اعمال تلية او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياه - صرف) طبقاً لمنسوب الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٥٠ بالعدد	٥٢٥	٢٦٢٥٠
١٩	بالعدد انشاء بلاعات كاملة مقاس ٠,٦ x ٠,٦ والارتفاع حسب ميول الصرف في الشارع من الخرسانة العادية المكونة من ٠,٨ م زلط + ٠,٤ م رمل + ٣م ٠,٨ كجم اسمنت بورتلاندي ويكون سمك الارضية والحوائط ١٥ سم والفئة تشمل أعمال المحارة بالغرفة وعزلها بمادة غير قابلة لتسريب المياه مع التوريد وتركيب الشنبر وغطاء الغرفة والمواسير بين صرف الامطار والمطابق والشعر يشمل الفرد والردم بالرمال والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات	١٦ بالعدد	٥٠٠٠	٨٠٠٠٠

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطارق

على تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم (القطاع الاول)

(المنطقة الاولى - المركزية)

رقم	البند	التسمية	المساحة بعد المفاوضة	القيمة
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للعيينة المعتمدة باجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم بالتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة	١٠٠ م ٢	١٩٥	١٩٥٠٠
	مقاس ٨٠ × ٢٠٠ × ١٠٠			
	الاجمالي (فقط وقدره ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وتسعون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيها لا غير)			١٣٥٩٠٣٦١

- الاسعار المتفق عليها طبقا للقائمة الموحدة يناير ٢٠٢٣ واسعار السوق اما بنود الاسفلت طبقا للمذكرة المعتمدة المبين بها زيادة اسعار البيتومين والسولار
- مسافة النقل مسئولية المنطقة طبقا لاقرب محجر معتمد
- يتم خصم نسبة ٠,٥ % من اجمالي قيمة التعاقد
- يتم صرف فروق الاسعار طبقا للمعاملات (بيتومين - اسمنت - سولار - حديد)
- مدة التنفيذ (٦ أشهر)
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير ٢٠٢٣ في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها
- وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه

ممثل الشركة	التوقيع	التوقيع	التوقيع
السيد المهندس	التوقيع	اللجنة	التوقيع
السيد المحاسب	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد المحاسب	التوقيع	السيد المهندس /	التوقيع
السيد الأستاذ	التوقيع	السيدة المهندس /	التوقيع
		السيدة المهندس /	التوقيع

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب



كشف باسماء السادة المؤمن عليهم

19198 / 4

كشف متمم للوثيقة

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الرفاء	حالة المعجز الكلى او الجزئى المستديم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعار	جنىة
مهندسين	2	75000	75000	3.63	544.50
التمويل الموضحة لكل شخص					
مساعد مهندس او ملاحظ فنى	1	30000	30000	3.62	108.60
سائق معدة او سيارة و من فى حكمهم	1	15000	15000	3.63	54.45
عمل على	1	10000	10000	3.63	36.30

جنىة مصرى

205000

اجمالى مبلغ التأمين

خصومات و اضافات

186.00

25.00

عدم ذكر اسم

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية على الحوادث التى تقع اثناء وبسبب العمل فقط وفى مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم غير مذكورى الاسماء اثناء تنفيذ عملية
اسناد أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الاول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن ()
" المبادرة الرئاسية " حياة كريمة
رقم العقد : وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين
رقم العقد : 12023/2022/1331
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن 220 فولت

929.85

صافى القسط

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة 1/11

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
PO BOX: 62 ORMAN - EGYPT
Tel: 33368101 - 7
Fax: 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

البريد الإلكتروني : 3 ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
الهاتف : ٣٣٣٦٨١٠٧ / ٣٣٣٦٨١٠١
فاكس : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٥٢٦٩٧
بريد : ١٢ ااورمان - الدقى - مصر

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

و يقوم الشركة بحماية مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والوعية



جدول وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية العامة

رقم الوثيقة 19196 و 4

اسم المؤمن له شركة اولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق
لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

طبيعة النشاط أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الاول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن المبادرة
الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر
العنوان شقة 2 عقار 5 ش على ضيف من 16 أكتوبر - السلام - القاهرة

مدة التأمين تبدأ من يوم 2023/06/13 الساعة الثانية عشر ظهرا
وتنتهى فى يوم 2024/06/13 الساعة الثانية عشر ظهرا

من المعلوم والمتفق عليه صراحة :

إن التأمين بموجب هذه الوثيقة يغطى عواقب المسؤولية المدنية القانونية التي قد يتعرض لها المؤمن له طبقا للتشريع الحالي من المواد 163 إلى 178 من القانون المدني المصري والتي تثبت في حقه بموجب حكم قضائي نهائي وذلك عن أي أضرار جسيماتية سوء من قبل (المهندس والمقاول والجهة الادارية والاستشاري) قد تلحق بالغير اثناء قيام المؤمن له بمزاولة عمله (أسناد أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الاول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر .
رقم العقد : 1331/2022/2023

الحدود الجغرافية / ع.م.ج

الحد الأقصى لمسئولية الشركة

1000000 جم (مائة ألف جنيه مصري) الحد الأقصى للالتزام بالشركة للشخص الواحد عن الأضرار الجسيماتية
100000 جم (مائة ألف جنيه مصري) الحد الأقصى للالتزام بالشركة للحدث الواحد عن الأضرار الجسيماتية
100000 جم (مائة ألف جنيه مصري) الحد الأقصى للالتزام بالشركة خلال مدة التأمين مهما بلغ عدد الحوادث عن الأضرار الجسيماتية
** لا يجوز إلغاء أو إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من شركة مالهية العامة للطرق والكبارى
وتشمل حدود المسؤولية المبينة غالية كافة الأتعاب والمصروفات القضائية وجميع مصروفات الدفاع أيا كان نوعها المترتبة عن الحادث والتي توافق عليها الشركة.

حساب القسط والدمغات

القسط الصافي	435.00	نصف دمغة الاتساع	3.00
نصف الدمغة النسبية	2.20	مصاريف الاصدار	55.85
رسم الاشراف والرقابة	2.65	رسوم خدمات مراجعة و اعتماد	0.43
القسط الاجمالي	500.00	فقط خمسمائة جنيه مصري لا غير	0.87

ومن المعلوم والمتفق عليه صراحة أن المؤمن له تسلم الشروط العامة للوثيقة وعدد صفحاتها (4).

انتاج / شاهدة حسام الدين راتب



كشف بأسماء فريق العمل بالشركة

الأسم / العدد	التخصص	سنوات الخبرة
أ / محمود سيف	رئيس مجلس الإدارة	
م / مصطفى هاشم	مدير التنفيذ للطريق	١٠ سنوات
م / أحمد اسماعيل	حاسب كميات	٥ سنوات
م / محمد طه	مهندس كهرباء	٥ سنوات
٢	فنى سلامة مرورية	٥ سنوات
محمد أمين	مساح توتال	٧ سنوات
حسام حسن	مساح ميزان	٧ سنوات
٢	مساعد مساح	٥ سنوات
٢	فنى سلامة مرورية	٥ سنوات
٢	مراقب تنفيذ / فنى مواد	٥ سنوات
٢٠	سائق معدة	
٣	سائق سيارة	
٢٠	عامل	
٣	فنيين الصيانة	
١	فنى مخازن	

المعدات الموجودة بالموقع

عدد	بيان	الأستخدام / نوع البند
١	مقشطة أسفلت ورتيجن	قشط وازالة الأسفلت
٣	ماكينة انارة ٥٠ ك وات	أعمال التحويلات
١	ونش انقاذ	أعمال التحويلات
١	كلارك	أعمال التحويلات
٢	لودر	أعمال التحويلات ، أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
٢	هراس بوماج هزاز تربة	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
١	جريد	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس ، طبقات FDR الأساس المثبت
٤	قلاب	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
٢	جرار زراعى مزود بمكنسة	أعمال الأساس
١	تانك مياه نصر	أعمال الأساس ، طبقات الأساس المثبت FDR
١	ماكينة إعادة تدوير الأسفلت ورتيجن FDR	طبقات الأساس المثبت FDR
١	هراس حوافر غنم	طبقات الأساس المثبت FDR

شركة أولاد نصر الدين
لإنشاء و رصف الطرق

ت. ص: ٢٨٢ ب. ص: ١٩٥ - ١٥٤ - ١٣٠
Tel: 01060325895
01225255373

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

عدد	بيان	الأستخدام / نوع البند
١	معمل أسفلت مواد	مجمع الخلطات ، طبقات الأساس المثبت FDR
١	فنشر أسفلت ديماج	طبقات الأسفلت
١	هراس حديد خفيف ١٢ طن	طبقات الأسفلت
١	هراس حديد ثقيل في حدود ٢٤ طن	طبقات الأساس المثبت FDR ، طبقات الأسفلت
١	منشار قطاعية أسفلت	طبقات الأسفلت
١	عربة مكنسة ميكانيكية	طبقات الأسفلت
١	سيارة رش جامبو	أعمال رش الطبقات بالمياه
١	محطة خلط مركزية	مجمع الخلطات
بطاقة ١٠٠ طن	خزان بيتومين ٧٠/٦٠	
بطاقة ٣٠ طن	خزان R.C	
٢ بطاقة ٤٠ طن	خزان المستحلبات البيتومينية	
١	ميزان بسكول	
٢	ميزان قامة كاملة	الأعمال المساحية
١	جهاز محطة الأرصاد الكاملة Total station	الأعمال المساحية

شركة أولاد نصر الدين

لإنشاء و رصف الطرق
Tel: 01060325895
01225255373
س.ت: ٢٨٤٣ ب.ض: ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٦

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

العملية أو المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم

بالطن أعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخططة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف

NOTES	QUANTITY	rate	Area	End Station	Start Station	SERIAL
	279.30	26.6 kg/m ²	10500.00	1+180	0+000	١
	279.30			الاجملى		

مهندس الاستشاري

م / ابراهيم الصاير

م / امير احمد النور

التوقيع /

التوقيع /

مهندس المقاول

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع /

العملية أو المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق شبين القاطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القاطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم

أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الإسفلت وطبقة الأساس القائمة (FDR) معاً (الفئة شاملة نظافة سطح الإسفلت الحالي والخط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المسطح

NOTES	QUANTITY	Area	End Station	Start Station	SERIAL
	10500.00	8.90	1+180	0+000	١
	10500.00	الاجمالي			

مهندس الاستشاري

م / ابراهيم الصابر

م / امير احمد انور

التوقيع /

التوقيع /

مهندس المقاول

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع /

العملية أو المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (النطاق الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير mc30 بمعدل (٢, ١-٥, ١كجم/م^٢) ترش فوق طبقة الأساس بط تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

NOTES	QUANTITY	Area	End Station	Start Station	SERIAL
	10500.00	8.90	1+180	0+000	١
	10500.00	الاجمالى			

مهندس الاستشاري

م / ابراهيم الصاير

م / امير احمد انور

التوقيع /

التوقيع /

مهندس المقاول

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع /

المعملية أو المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشفلة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم

بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام اجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة

NOTES	QUANTITY	Area	End Station	Start Station	SERIAL
	10500.00	8.90	1+180	0+000	١
	10500.00	الاجمالي			

مهندس الاستشاري

م / ابراهيم الصاير

م / امير احمد انور

التوقيع /

التوقيع /

مهندس المقاول

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع /



طلب امتلاك

اسم المشروع	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	١	التاريخ	٢٠٢٣-٦-١٠

الموضوع أعمال إنشاء طبقة اساس مثبت بسمك ٢٥ بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٠+٤٠٠ حتى المحطة ٠+٤٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

ملاحظة على باعده و شالاج
ملاحظة على اسفلت او مواد الاسفلت
ملاحظة على العزل

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

0+400


0+500

0+600

0+700

0+800



					
طلب استلام					
اسم المشروع		أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم			
المالك		الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى			
مدير المشروع		م / مصطفى هاشم			
رقم الطلب		٢			
الموضوع		أعمال إنشاء طبقة اساس مئيت بسمك ٢٥ بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف			
رقم اللوحة		مراجعة			
وصف الأعمال المنفذة:		وصف			
حفر		أعمال تسوية و دمك			
أعمال أساس		أسفلت			
أعمال مساحية		أخرى			
تفاصيل الفحص:					
تاريخ الفحص:		مكان الفحص		من المحطة ٠+٤٠٠ حتى المحطة ٠+٧٤٠	
ملاحظات الاستشاري:					
يتم عمل العمل بموجب مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى					
مهندس الطرق		مهندس المساحة			
					
النتيجة:					
المقاول:		الاستشاري:			
الاسم:		الاسم:			
التوقيع:		التوقيع:			
التاريخ:		التاريخ:			

طلب استلام

اسم المشروع	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٣	التاريخ	٢٠٢٣-٠٦-١٤

الموضوع أعمال إنشاء طبقة اساس مئيت بسمك ٢٥ بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٠+٧٤٠ حتى المحطة ١+٠٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

يتم اتمام العمل على الطريق
على خطه القديم
الذي كان عليه من قبل

مهندس الطرق

مهندس المساحة

النتيجة:

المقاول:	الاسم:	التوقيع:	التاريخ:
المقاول:	الاسم:	التوقيع:	التاريخ:
المقاول:	الاسم:	التوقيع:	التاريخ:
المقاول:	الاسم:	التوقيع:	التاريخ:



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٤	التاريخ	٢٠٢٣-٠٦-١٥
الموضوع	أعمال إنشاء طبقة اساس مئيت بسمك ٢٥ بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف		

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	اخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ١٠٠٠ حتى المحطة ١٠١٨٠
--------------	------------	---------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

٤- يتم احداث مساحات الكمرات المرسية
٥- يتم عمل الممر
٥- يلزم عمل بياض كمرات الممر

مهندس الطرق مهندس المساحة

[Signature]

النتيجة:

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

[Signature]

الاستشارى:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

[Signature]

طلب استلام

اسم المشروع	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٥	التاريخ	٢٠٢٢-٦-٢٢

أعمال رش طبقات الأساس بطبقة تشريب من البيتزيمين السائل متوسط التطاير (MC)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٠+٠٠٠ حتى المحطة ٠+٤٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

م.م. عليكم التبريح كد ٤٨٠
هو المرفق على الطريق و انما هذا العمل
سيتم رصفه حتى محطة ١,٥

مهندس الطرق مهندس المساحة

النتيجة:

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

طلب استلام

طلب استلام			
اسم المشروع	اعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	الاعمال	اعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٦	التاريخ	٢٠٢٣-٦-٢٢
الموضوع	اعمال فرش طبقة الأسفلت السطحية بسمك ٥ سم	الوصف	مراجعة
رقم اللوحة			

وصف الأعمال المنفذة:

وصف الأعمال المنفذة:			
حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية	
أعمال أساس	أسفلت	أخرى	
تفاصيل الفحص:			

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٠+٠٠٠ حتى المحطة ٠+٤٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

مهندس الطرق مهندس المساحة

النتیجه:

النتيجة:					
د	ج	ب	ا		
الأستشاري:			المقاول:		
الاسم:			الاسم:		
التوقيع:			التوقيع:		
التاريخ:			التاريخ:		



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٧	التاريخ	٢٠٢٣-٦-٢٣

الموضوع أعمال رش طبقات الأساس بطبقة تشريب من البيتزمين السائل متوسط التطاير (MC)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنقذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٠+٤٠٠ حتى المحطة ٠+٧٤٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

بارك الله اليوم
فالمزم انه امسح في الحفرة البرية
مزم المزم مزم ١,٢ ١,٥

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

ا	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

طلب استلام

اسم المشروع	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٨	التاريخ	٢٠٢٣-٦-٢٣

الموضوع	رقم اللوحة	الوصف	مراجعة
أعمال فرش طبقة الأسفلت السطحية بسمك ٥ سم			

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أسس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٠+٤٠٠ حتى المحطة ٠+٧٤٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

يتم عمل العمل على
تدعيم الأساسات تحت
الطريق استناداً إلى
ملاحظات المهندس المساح

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ:

طلب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	اسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشارى المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	المالك
شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٦-٢٤	التاريخ	١٠	رقم الطلب

أعمال فرش طبقة الأسفلت السطحية بسمك ٥ سم

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مسلحة
أعمال أسفلت	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٧٤٠+٠٠ حتى المحطة ١٠٠٠+
--------------	------------	-----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

أ. المهندس علم الجبر
ب. المهندس أحمد إمام
ج. المهندس محمد
د. المهندس محمد
هـ. المهندس محمد

مهندس الطرق مهندس المساحة

النتيجة:

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	١١	التاريخ	٢٠٢٣-٦-٢٥

الموضوع أعمال رش طبقات الأساس بطبقة تشريب من البيتزمين السائل متوسط التطاير (MC)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية	
أعمال أساس	أسفلت	أخرى	

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ١٠٠٠ + ٠ حتى المحطة ١٨٠ + ١
--------------	------------	---------------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

بالحمد لله على العمل به استنادا الى
المرجع ١٠٠٠ + ٠ الى ١٨٠ + ١
بالحمد لله على العمل به استنادا الى
المرجع ١٠٠٠ + ٠ الى ١٨٠ + ١

مهندس الطرق مهندس المساحة

[Signature]

النتيجة:

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الاستشارى:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

طلب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم	أسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشارى المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	المالك
شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٦-٢٥	التاريخ	١٢	رقم الطلب

الموضوع أعمال فرش طبقة الأسفلت السطحية بسمك ٥ سم

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية	
أعمال أسس	أسفلت	أخرى	

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ١٠٠٠+ حتى المحطة ١٨٠+
--------------	------------	---------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

بالرم غده العاربه
نلزم ان اياهه
نلزم ضبطها
نلزم ان يه باله


مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

مقولة شركة : أولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة
استشارى المالك : مكتب حياة للاستشارات الهندسية


اسم المشروع : رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول)
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة المركزية الاولى

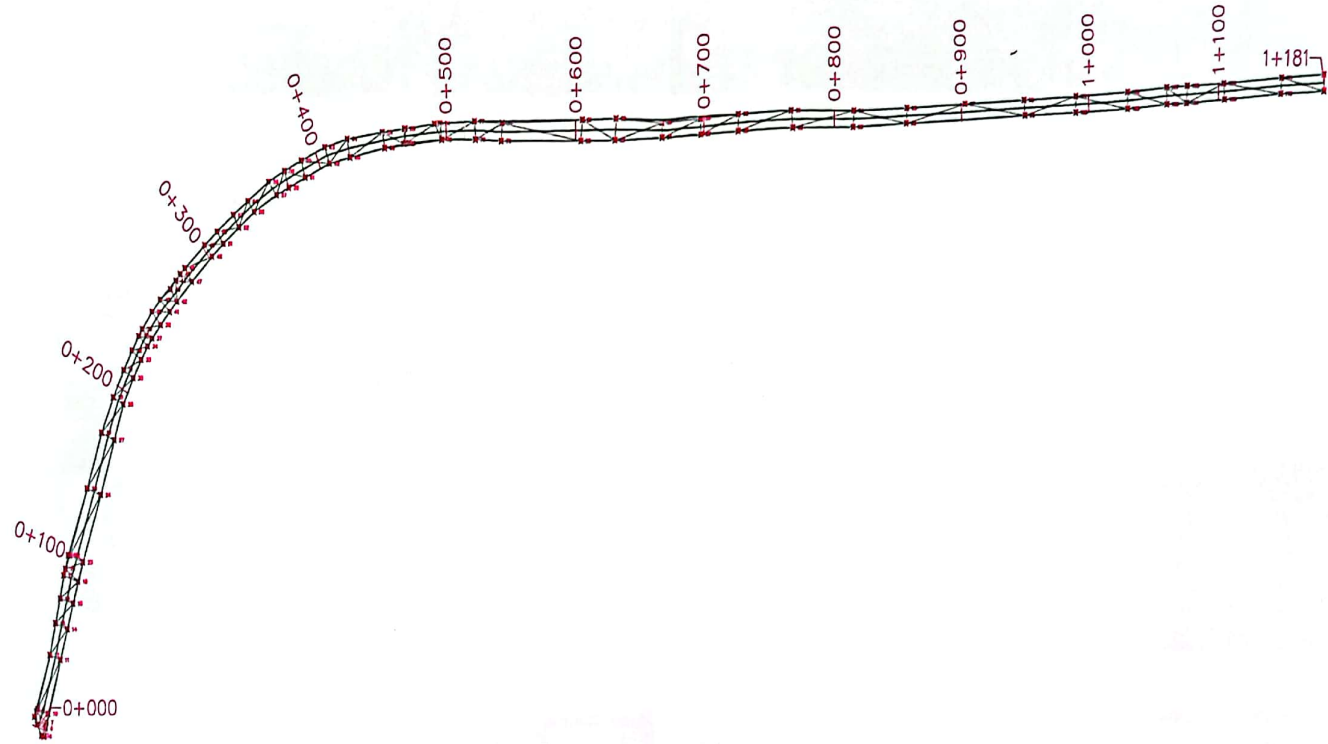

طبقة الاساس المثبت بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف من محطة 0+000 الى محطة 1+180

م	الاعمال	البرنامج الزمني لمشروع أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) بطول 3.5 كم											
		شهر مايو			شهر يونيو			شهر يوليو			شهر أغسطس		
		الاسبوع الأول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الأول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الأول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث	الاسبوع الأول	الاسبوع الثاني	الاسبوع الثالث
1	استلام الموقع وتظهره من العوائق	من محطة 0+000 إلى محطة 3+700											
2	عمل الروبركات والرفع المساحي للأرض الطبيعيه	من محطة 0+000 إلى محطة 3+700											
3	أعمال تطهير ودمج قطاعات حفر المرافق	من محطة 0+000 إلى محطة 3+700											
4	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك 25 بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف	من محطة 0+000 إلى محطة 3+700											
5	تسوية الأرض بعد إنشاء طبقة الأساس المثبت بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف	من محطة 0+000 إلى محطة 3+700											
6	اجراء الاختبارات												
7	رش Mco												
8	تنفيذ طبقة الإسفلت السطحيه												
9	أعمال تغطية لوخفض غرف التفتيش												
10	توريد وتركيب البردورات												
11	توريد وتركيب وحلات الاتركوك												
12	إنشاء بلاعات المطر												

عبد الرحمن الصبارك



يعتمد ،،،
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع / م / نصر محمد طبع

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع / م / محمد عبدالرؤف راجح

مهندس الهيئة
التوقيع / م / محمد صديق

استشارى المشروع (مكتب حياة للإستشارات الهندسية)
التوقيع / م / امير احمد أنور
التوقيع / م / ابراهيم الصبار



المقاول
الشركة المنفذة (اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة)
التوقيع / م / مصطفى السيد هاشم

المدة
الد
التر
