

محضر استلام موقع

العملية:- أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة القليوبية.

تنفيذ شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة حياة كريمة (بالأمر المباشر)

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ وفي حضور كلا من:-

- | | |
|------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / محمد صديق | الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- مهندس / ابراهيم الصابر | استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري (مكتب حياة) |
| ٣- مهندس / أمير أحمد أنور | استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري (مكتب حياة) |
| ٤- مهندس / مصطفى هاشم | مندوب شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق |

المكان: طريق قليوب / شبين القناطر





الإجراءات:-

اجتمع الحاضرون في المكان والزمان المحددين بعالیه لأجل تسليم موقع المشروع تنفيذه طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣ إلى شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة في تنفيذ أعمال العقد المشار إليه بعالیه.

القرار:-

تم تسليم الموقع خالي من العوائق بطول ٣,٥ كم إلى شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤ على أن يعتبر اليوم هو تاريخ استلام الموقع لمسافة ٣,٥ كم.

التوقيع:-

٤- 
٣- 
٢- 
١- 


رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
نصر محمد طيخ

أصل



١٣٠٠ شهر ١٢
١٢/٩/٢٠٢٣

١٢/٩/٢٠٢٣



٢- محمد سامح
١- لصفود

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية
تحية طيبة وبعد ...

مرفق طيه أصل موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة علي محضر الاجتماع الخاص بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق علي تنفيذ اعمال استكمال طريق قليوب / القشيش / كفر طلحا / طحانوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بالامر لمباشر - اشراف المنطقة الاولى (المركزية) .
يرجي التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحريرا في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

مهندس /

" محسن محمد زهران "

الهيئة العامة للنقل والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المخططات العامة
رقم الوارد / ٥٧٩٦
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ١٢/٩/٢٠٢٣
التوقيع /

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
تحية طيبة وبعد ..

يرجي التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

" محسن محمد زهران "

١٢/٩/٢٠٢٣
١٩٦٨
٩/٩١

شركة النصر للدين

الخاصة بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق

على تنفيذ أعمال استكمال طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر

(المنطقة الاولى - المركزية)

إيماء إلى موافقة السيد الفريق // وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ على المذكرة المعروضة على سيادته بخصوص تنفيذ مشروع أعمال استكمال طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣ لشركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الدارق .

والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في / / ٢٠٢٣ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذه على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منال السيد عمر	مدير عام صيانة الطرق	رئيسا
المهندس / محمد فتحي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / محمد عامر	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٣ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتى :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٤٣٠٠٠	١٠,٧٥	٤٦٢٢٥٠
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ١٠ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م ٤٣٠٠٠	١٦١,٢٥	٦٩٣٣٧٥٠
	الإجمالي (فقط وقدره سبعة مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيها لا غير)			٧٣٩٦٠٠٠

23/٢/٢٠٢٣

طريق قليب



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمطروضة شركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق
على تنفيذ أعمال استكمال طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع
الثاني) بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر
(المنطقة الاولى - المركزية)

- الاسعار المتفق عليها طبقاً لآخر اطال القائمة الموحدة بتاريخ ٢٠٢٣ ، طبقاً لاسعار الدولة ، وقت المقارنة ، واسعار نفود
- الاسفلت طبقاً للمذكرة المعتمدة مراعي فيها زيادة اسعار الببتومين والموالار .
- يتم خصم نسبة ٠,٥ % من اجمالي قيمة التعاقد حيث ان اسعار القائمة هي الحد الاعلى للاسعار .
- يتم صرف فروق الاسعار طبقاً للمعاملات (ببتومين - سولار) .
- مدة التنفيذ (٦ أشهر) .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه .

ممثل الشركة كرسى	التوقيع	التوقيع
السيد المهندس	التوقيع	اللجنة
السيد المحاسب / هاشم بيرت	التوقيع	السيد المهندس /
السيد المحاسب / محمد نصر	التوقيع	السيد المهندس /
السيد الأستاذ /		السيد المهندس /
		السيدة المهندسة /


رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



طرق ج ب

جدول وثيقة

التأمين من المسؤولية المدنية العامة

رقم الوثيقة 19324 و 4

اسم المؤمن له شركة اولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

طبيعة النشاط (أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول 7 كم بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ")

العنوان شقة 2 عقار 5 ش على ضيف من 16 أكتوبر - السلام - القاهرة

مدة التأمين تبدأ من يوم 2023/07/11 الساعة الثانية عشر ظهرا

وتنتهى فى يوم 2024/07/11 الساعة الثانية عشر ظهرا

من المعلوم والمتفق عليه صراحة :

إن التأمين بموجب هذه الوثيقة يغطى عواقب المسؤولية المدنية القانونية التي قد يتعرض لها المؤمن له طبقا للتشريع الحالي من المواد 163 إلى 178 من القانون المدني المصري والتي تثبت في حقه بموجب حكم قضائي نهائي وذلك عن أي أضرار جسمية سوء من قبل (المهندس والمقاول والجهة الادارية والاستشاري) قد تلحق بالغير اثناء قيام المؤمن له بمزاولة عمله (أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول 7 كم بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ").
رقم العقد : 2197/2022/2023

الحدود الجغرافية / ٤.٥.٢

الحد الأقصى لمسئولية الشركة

100000 جم (مائة ألف جنيه مصرى لا غير) الحد الأقصى لالتزام الشركة للشخص الواحد عن الأضرار الجسمية .
100000 جم (مائة ألف جنيه مصرى) الحد الأقصى لالتزام الشركة للحادث الواحد عن الأضرار الجسمية
100000 جم (مائة ألف جنيه مصرى) الحد الأقصى لالتزام الشركة خلال مدة التأمين مهما بلغ عدد الحوادث عن الأضرار الجسمية
** لا يجوز إلغاء أو إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من شركة مالهية العامة للطرق والكبارى التحمل / ال 10 % الاولى من قيمة كل حادث عن الأضرار الجسمية بحد ادنى 10000.00 جم .
وتشمل حدود المسؤولية المبينة عاليه كافة الأتعاب والمصروفات القضائية وجميع مصروفات الدفاع أيا كان نوعها المترتبة عن الحادث والتى توافق عليها الشركة.

حساب القسط والدفعات

القسط الصافي	435.00	نصف دفعة الاتساع	3.00
نصف الدفعة النسبية	2.20	مصاريف الاصدار	55.85
رسم الاشراف والرقابة	2.65	رسوم خدمات مراجعة و اعتماد	0.43
القسط الاجمالى	500.00	صندوق حملة وثائق	0.87
		فقط خمسمائة جنية مصرى لا غير	

ومن المعلوم والمتفق عليه صراحة أن المؤمن له تسلم الشروط العامة للوثيقة وعدد صفحاتها (4).

انتاج / شاهنده حسام الدين راتب

تاريخ الطباعة 2023/07/11



للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 13 El Mercha Sq, Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣٠ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٧ / ٣٣٣٦٨١٠

بريد : ٦٢ القورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة السنوية والبنوعيه

هذه الوثيقة مؤهلة ومحفوظة



كشف باسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة 19323 د/ 4

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط				
الاسم	الوظيفة	العدد	حالة العجز الكلى او الجزلى المستديم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جنازة		
(تأميناً على عدد مهندسين بدون ذكر(2) أسماء	مهندسين	2	75000	75000	0	.00	.00	3.63	544.50
المبالغ الموضحة لكل شخص									
تأميناً على عدد(1)مساعد مهندس او ملاحظ فنى بدون ذكر أسماء	مساعد مهندس او ملاحظ فنى	1	30000	30000	0	.00	.00	3.62	108.60
تأميناً على عدد(1)سائق معدة او سيارة و من فى حكمهم بدون ذكر أسماء	سائق معدة او سيارة و من فى حكمهم	1	15000	15000	0	.00	.00	3.63	54.45
تأميناً على عدد(1)عامل عادى بدون ذكر أسماء	عامل عادى	1	10000	10000	0	.00	.00	3.63	36.30
اجمالى مبلغ التأمين			205000	جنية مصرى					

خصومات و اضافات	عدم ذكر اسم
186.00	25.00

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية على الحوادث التى تقع اثناء وبسبب وداخل موقع العمل فقط وفى مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم غير مذكورى الاسماء اثناء تنفيذ عمليه (اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين/ شبين القناطر (القطاع الثانى) بطول (سبعة كم) بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين
رقم العقد : ١٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢١٩٧
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ فولت

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	الرقم الوثيقة	19323	و /	4	تاريخ طلب التأمين	2023/07/12	العملة	جنية مصرى	مدة التأمين من	2023/07/11	ظهورا الى	2024/07/11	ظهورا
اسم المتعاقد	اسم المؤمن عليه	شركة اولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق	كما بالكشف المرفق	تاريخ الميلاد	اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة	كما بالكشف المرفق	العنوان	شقة ٢ عقار ٥ ش على ضيف من ١٦ اكتوبر - السلام - القاهرة	لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى			

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية على الحوادث التى تقع اثناء وبسبب وداخل موقع العمل فقط وفى مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم غير مذكورى
الاسماء اثناء تنفيذ عملية (اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كلر طحا / طحا نوب / كلر شبين/ شبين القناطر (القطاع الثانى) بطول
(سبعة كم) بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبشرط الا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن الحد المؤمن عليه والا سقط حقه
فى الانتفاع بمزايا التأمين
رقم العقد : ٢٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩٧
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ فولت

القسط الصافى	نصف الدفعة النسبية	نصف دفعة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الانشاءات	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالى
929.85	4.65	3.00	54.10	5.60	0.93	1.87	1000.00

فقط الف و جنية مصرى لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

- اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء
بالبند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما
جاء بالبند الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء
بالبند الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع
(خمس فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢
اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- خامسا : تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى اقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

24382

شاهنדה حسام الدين راتب

كشف بأسماء فريق العمل بالشركة

الأسم / العدد	التخصص	سنوات الخبرة
أ / محمود سيف	رئيس مجلس الإدارة	
م / مصطفى هاشم	مدير التنفيذ للطريق	١٠ سنوات
م / أحمد اسماعيل	حاسب كميات	٥ سنوات
م / محمد طه	مهندس كهرباء	٥ سنوات
٢	فنى سلامة مرورية	٥ سنوات
محمد أمين	مساح توتال	٧ سنوات
حسام حسن	مساح ميزان	٧ سنوات
٢	مساعد مساح	٥ سنوات
٢	فنى سلامة مرورية	٥ سنوات
٢	مراقب تنفيذ / فنى مواد	٥ سنوات
٢٠	سائق معدة	
٣	سائق سيارة	
٢٠	عامل	
٣	فنيين الصيانة	
١	فنى مخازن	

شركة أولاد نصر الدين

لإنشاء و رصف الطرق
ت. ٢٨٢٢ ب. ض. ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٨

Tel: 01060325895
01225255373

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

المعدات الموجودة بالموقع

عدد	بيان	الأستخدام / نوع البند
١	مقشطة أسفلت ورتيجن	قشط وازالة الأسفلت
٣	ماكينة انارة ٥٠ ك وات	أعمال التحويلات
١	ونش انقاذ	أعمال التحويلات
١	كلارك	أعمال التحويلات
٢	لودر	أعمال التحويلات ، أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
٢	هراس بوماج هزاز تربة	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
١	جريد	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس ، طبقات FDR الأساس المثبت
٤	قلاّب	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
٢	جرار زراعى مزود بمكنسة	أعمال الأساس
١	تانك مياه نصر	أعمال الأساس ، طبقات الأساس المثبت FDR
١	ماكينة إعادة تدوير الأسفلت ورتيجن FDR	طبقات الأساس المثبت FDR
١	هراس حوافر غنم	طبقات الأساس المثبت FDR

شركة أولاد نصر الدين
لإنشاء و رصف الطرق
س.ت: ٢٨٤٣٣ ب.ض: ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٨

Tel: 01060325895
01225255373

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

عدد	بيان	الأستخدام / نوع البند
١	معمل أسفلت مواد	مجمع الخلطات ، طبقات الأساس المثبت FDR
١	فنشر أسفلت ديماج	طبقات الأسفلت
١	هراس حديد خفيف ١٢ طن	طبقات الأسفلت
١	هراس حديد ثقيل في حدود ٢٤ طن	طبقات الأساس المثبت FDR ، طبقات الأسفلت
١	منشار قطاعية أسفلت	طبقات الأسفلت
١	عربة مكنسة ميكانيكية	طبقات الأسفلت
١	سيارة رش جامبو	أعمال رش الطبقات بالمياه
١	محطة خلط مركزية	مجمع الخلطات
بطاقة ١٠٠ طن	خزان بيتومين ٧٠/٦٠	
بطاقة ٣٠ طن	خزان R.C	
٢ بطاقة ٤٠ طن	خزان المستحلبات البيتومينية	
١	ميزان بسكول	
٢	ميزان قامة كاملة	الأعمال المساحية
١	جهاز محطة الأرصاد الكاملة Total station	الأعمال المساحية

شركة أولاد نصر الدين

٣
T: 01060325895
01225255373

لإنشاء و رصف الطرق
ب. ت. ٢٨٤٣٢
ض. ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٨

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

العملية أو المشروع : تنفيذ أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القفطيش / كثر طحاتوب / كثر شبين / شبين القناطر (القطاع التاتى) بطول ٧ كم

بالمرز المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصق من البىيومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل لا يزيد عن ٠,٤ كم/م^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام بمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

NOTES	QUANTITY	Average width	Length	End Station	Start Station	SERIAL
	8910.490	12.73	700	4+250	3+550	١
	6998.656	11.11	630	6+330	5+700	٢
	7898.329	11.79	670	7+000	6+330	٣
	23807.48	/		الاجمالى		


م / ابراهيم الصاير

التوقيع / 

م / امير احمد انور

التوقيع / 

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع / 

المعملية أو المشروع : تنفيذ أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيب / كفر ططوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع التاني) بطول ٧ كم						
٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/١٠ وارادة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة					
	NOTES	QUANTITY	Average width	Length	End Station	Start Station
		8910.490	12.73	700	4+250	3+550
		6998.656	11.11	630	6+330	5+700
		7898.329	11.79	670	7+000	6+330
		23807.48	الاجمالى			

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع / *Mustafa*

م / امير احمد النور

التوقيع / *Amir*

م / ابراهيم الصاير

التوقيع / *Ahmed*

طلب استلام

اسم المشروع	اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الاعمال	اعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	١	التاريخ	٢٠٢٣-٧-٢

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٣+٥٥٠ حتى المحطة ٣+٨٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

يلزم غلة التمديد
يلزم أخذ قاطعات
يلزم اخذ مصادق كارت
يلزم اخذ قاطعات

مهندس الطرق	مهندس المساحة
لر	

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:	الاسم:	التوقيع:
الاسم:	التوقيع:	التاريخ:	

طلب أستلام

اسم المشروع	اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الأعمال	اعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٢	التاريخ	٢٠٢٣-٧-٢
الموضوع	أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم		

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٣+٥٥٠ حتى المحطة ٣+٨٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الأستشارى:

يطلب من اذ ملاحظه ان العمل به بالسرعة
بلزم على الطريق
يطلب من اذ ملاحظه ان العمل به بالسرعة
بلزم ان العمل به بالسرعة

مهندس الطرق	مهندس المساحة
لر	

النتيجة:

ا	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

طلب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	اسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشارى المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى	المالك
شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٦	التاريخ	٣	رقم الطلب

أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٣+٨٠٠ حتى المحطة ٤+٢٥٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

يبلغ عدد اعماله ٨٤٠٠ م^٢
يبلغ المبلغ المزمع له ١٠٠٠٠٠٠ ل.س

مهندس الطرق مهندس المساحة

لم

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	المقاول:	الاستشارى:	الاستشارى:
الاسم:	الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:



طلب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني)	أسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشارى المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	المالك
شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٦	التاريخ	٤	رقم الطلب

الموضوع أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٣+٨٠٠ حتى المحطة ٤+٢٥٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

يطلب عليه العمل وفقاً لاصطلاحات المرفقة
يطلب من المالك أن يسلط
يطلب من المقاول أن يسلط

مهندس الطرق مهندس المساحة

لر

النتيجة:

أ	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثاني)	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	استشاري المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٥	التاريخ	٢٠٢٣-٧-١٥

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٥+٧٠٠ حتى المحطة ٦+٠٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

يطلب منه العمل به
يطلب منه أخذ مساحات العمل
يطلب منه العمل به

مهندس الطرق	مهندس المساحة
لمر	

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	المقاول:	الاستشاري:	الاستشاري:
الاسم:	الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:

طلب استلام

اسم المشروع	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	6	التاريخ	٢٠٢٣-٧-١٥
الموضوع	أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم		

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٥+٧٠٠ حتى المحطة ٦+٠٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

لزم اخذ كميات الدمك و
لزم عمل الفحص
لزم اخذ كميات عماد حقل

مهندس الطرق	مهندس المساحة
لر	

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني)	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	استشاري المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٧	التاريخ	٢٠٢٣-٧-٢٢

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية	
أعمال أساس	أسفلت	أخرى	

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٦+٠٠٠ حتى المحطة ٦+٣٣٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

بإمضاء
بإمضاء
بإمضاء

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	الاستشاري:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

طلب استلام

أعمال طرق

الأعمال

أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قايوب / القديش
/ كفر طحا / طحا نوب / كفر شين / شبين القناطر (القطاع الثاني)

اسم المشروع

مكتب حياة للاستشارات الهندسية

استشاري المالك

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المالك

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق

المقاول

م / مصطفى هاشم

مدير المشروع

٢٠٢٣-٧-٢٢

التاريخ

8

رقم الطلب

أعمال فرش طبقة الإسفلت السطحية بسمك ٥ سم

الموضوع

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية ودمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

من المحطة ٦+٠٠٠ حتى المحطة ٦+٣٣٠

مكان الفحص

تاريخ الفحص:

ملاحظات الاستشاري:

يلزم على المالك
يلزم انشاء اسفلت
يلزم تسوية ودمك
يلزم انشاء أساس

مهندس المساحة

مهندس الطرق

لم

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	الاستشاري:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

طلب أستلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني)	اسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشاري المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري	المالك
شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٢٣	التاريخ	9	رقم الطلب

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٦+٣٣٠ حتى المحطة ٦+٧٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

يلزم عدم العودة
تدريجاً من املاح الجبس والسليم
يلزم ان يتم عمل ١,٥ سم

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشاري:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

(RC3000) أعمال رش طبقة لاصق من البتومين أسفل سريع التطاير)

مطب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قتيوب // التفتيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شين / شين القناطر (القطاع الثاني)	أسم المشروع
مكتب حبة للاستشارات الهندسية	استشاري المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البحري	المالك
شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٢٣	التاريخ	10	رقم الطلب

أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم

رقم التوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية ودمك	أعمال مساحية
أعمال لاس	أسفلت	أخرى

تفصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٦+٣٣٠ حتى المحطة ٦+٧٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

للمرور على الموقع
للمرور على الموقع
للمرور على الموقع
للمرور على الموقع

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	الاستشاري:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	11	التاريخ	٢٠٢٣-٧-٢٤

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٦+٧٠٠ حتى المحطة ٧+٠٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

نلاحظ خلع العزل مع
تلميح آخر اما صاحب العمل
تلميح الاستشارى لم يجد لانه لم يجرى ١.٥

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

طلب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثاني)	اسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشاري المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	المالك
شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٢٤	التاريخ	12	رقم الطلب
الموضوع: أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم			

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أسس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٧٠٠٠+٦ حتى المحطة ٧٠٠٠+
--------------	------------	-----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

يلزم تكليف الطرحة
بدرج أو إمامة كسر الماربات
يلزم إفحص بالانكسار
يلزم فحص الكنا سيد اعطاه


مهندس الطرق	مهندس المساحة
	

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشاري:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		


مؤسسة شركة : أولاد نصر الدين الأندلس ووصف الطرق و المقادير العامة
 استثماري المالك : مكتب جبهة الاستثمارات الجهوية

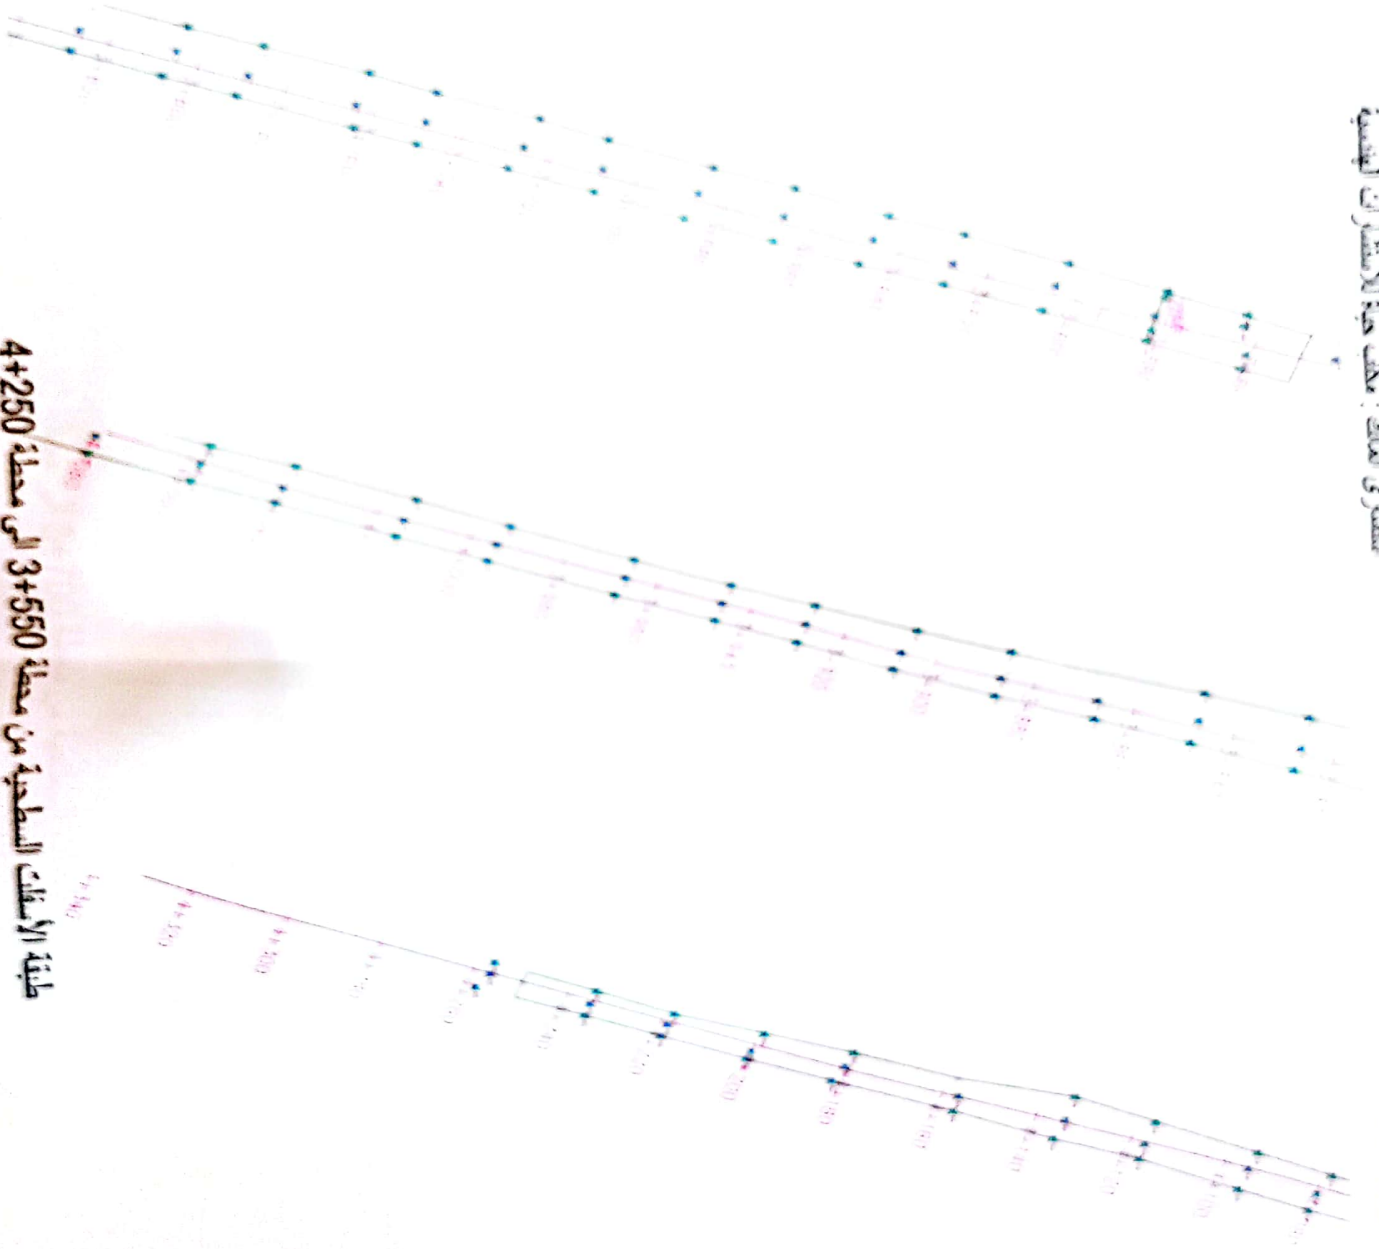اسم المشروع : رفع كفاءة طريق قليب - شيف القنطرة القطاع الثاني
 المالك : اللجنة العامة للطرق والكباري المنطقة المركزية الأولى



طريق الأسفلت السطحية من محطة 3+550 إلى محطة 4+250

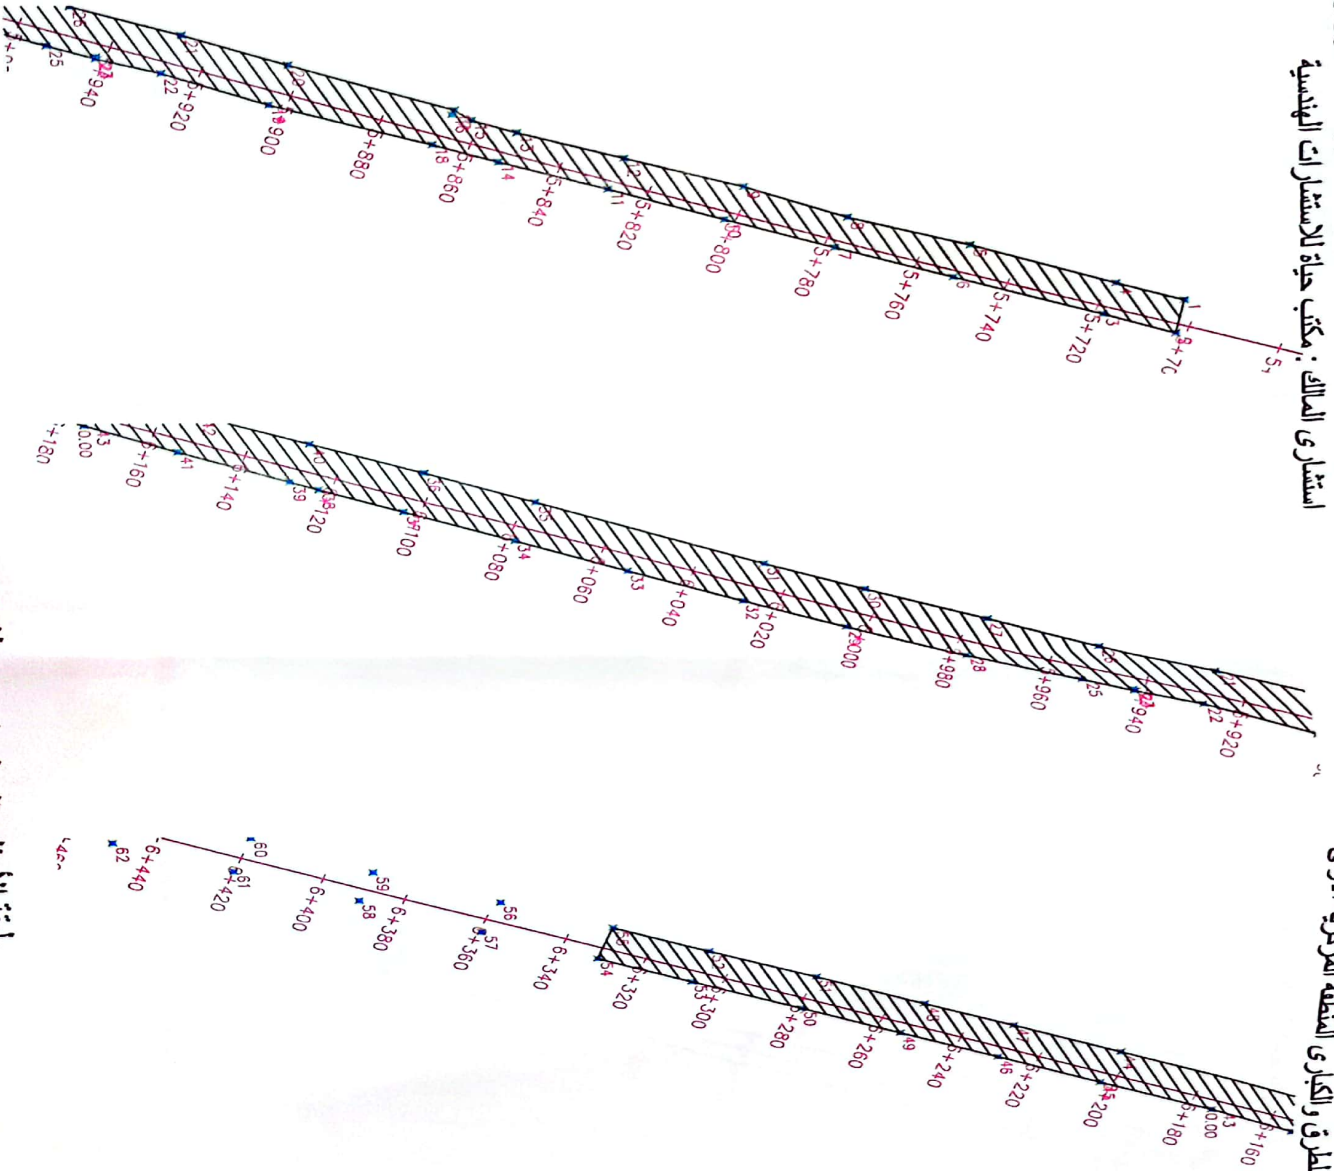مقارنة شركة : أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقارلات العامة
استشاري المالك : مكتب حياة للاستشارات الهندسية



اسم المشروع : رفع كفاءة طريق قليوب - شبين القناطر القطاع الثاني
الملك : الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة المركزية الاولى

طبقة الاسفلت السطحية من محطة 5+700 الى محطة 6+330

المالك / وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الاولى المركزية

100

[illegible]

م / مصطفى السيد هاشم



مدير عام التفتيش والصيانة
التوقيع /
م/محمد عبدالرؤوف راجح

التوقيع:  م / نعيم محمد طه
