

كل ما يلزم لنهوا  
منافسة اسمنت مطابق

من القناطر

0+700

كشف متعمد ٠.١١

كشف باسم  
4 191

### محضر استلام موقع

**العملية:** أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية ( القطاع الأول ) بطول ٣,٥ كم ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة محافظة القليوبية أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق "حياة كريمة" ( بالأمر المباشر ) انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ و في حضور كلا من :-

- |                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١- السيد المهندس / محمد صديق        | الهيئة العامة للطرق و الكبارى                      |
| ٢- السيد المهندس / إبراهيم الصابر   | استشارى الهيئة العامة للطرق و الكبارى (مكتب حياة ) |
| ٣- السيد المهندس / أمير أحمد أنور   | استشارى الهيئة العامة للطرق و الكبارى (مكتب حياة ) |
| ٤- السيد المهندس / مصطفى السيد هاشم | شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق            |



**المكان :** طريق شبين القناطر / الشاملة

### الأجراءات:

اجتمع الحاضرون فى المكان و الزمان المحددين بعاليه لاجل تسليم موقع المشروع المطلوب تنفيذه طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٣١) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١ الى أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق للبدء فى تنفيذ اعمال العقد المشار اليه بعاليه.

**القرار:** تم تسليم الموقع خالى من العوائق الى شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ على ان يعتبر اليوم هو تاريخ استلام الموقع.

التوقيع

٤-   
٣-   
٢-   
١- 



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

## على تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم ( القطاع الأول )

إيماء إلى موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٣١ طبقاً للموافقة المرفقة على المذكرة المعروضة على سيادته بخصوص تنفيذ مشروع أعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم ( القطاع الأول ) لشركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق .  
وإلى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة الموزعة في ٢٠٢٣ / / على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الأعمال - أعضاء اللجنة :-

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| المهندسة / منال السيد عمر     | مدير عام صيانة الطرق                 |
| المهندس / محمد عامر           | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق |
| المهندس / السيد المحاسب       | الإدارة المركزية للبحوث              |
| السيد المحاسب / السيد المحاسب | المنطقة المشرفة                      |
| السيد الأستاذ /               | إدارة العقود والمشتريات              |
|                               | إدارة المراجعة                       |
|                               | الإدارة القانونية                    |
|                               | رئيساً                               |
|                               | عضواً                                |
|                               | عضواً                                |
|                               | عضواً                                |
|                               | عضواً                                |
|                               | عضواً                                |

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق ٢٠٢٣ / / بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتفاق :-

| م | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكمية    | السعر بعد المفاوضة | القيمة  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| ١ | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣م١٠٠     | ٦٩                 | ٦٩٠٠    |
| ٢ | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢م١٠      | ٦                  | ٦٠      |
| ٣ | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة خرسانة عادية أو مسلحة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جمعه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣م١٠٠     | ٨١                 | ٨١٠٠    |
| ٤ | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة أساس مثبت وذلك بإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائم بمتوسط سمك ٢٥ سم والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف على ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقاً لتصميم الخلطة وسمكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطرق وفقاً للقطاع الإنشائي المطلوب .                                                                                                                                       | ٢م٣٨٠٠٠   | ٦٣                 | ٢٣٩٤٠٠٠ |
| ٥ | بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٩٠٠ بالطن | ٢٠٠٠               | ١٨٠٠٠٠٠ |
| ٦ | بالمتر المسطح أعمال الكشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة الكشط الأوتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهر العمل .<br>- يتم احتساب ٣,٢ جنيه للسم الواحد كشط في حالة الزيادة أو النقصان                                                                                                                                                                                      | ٢م١٠٠     | ١٨                 | ١٨٠٠    |
| ٧ | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ كم من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . | ٣٠٥٠      | ٢٣                 | ١١٥٠٠   |

صورة طبق الأصل



## محضر اجتماع اللجنة

التي تنفذ أعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم (القطاع الأول)

( المنطقة الأولى - المركزية )

| م  | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكمية     | السعر بعد<br>المفاوضة | القيمة  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------|
| ٨  | بالمتر المكعب أعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتفاف (بنسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ % ) ورشها بالمياه الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة والقصى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣م ٥٠٠     | ١١٥,٢                 | ٥٧٦٠٠   |
| ٩  | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % والا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل ٢٠ كم<br>- يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وذلك حتي مسافة نقل ١٠٠ كم و١ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر | ٣م ١٠٠٠    | ٤٠,٦                  | ٤٠٦٠٠٠  |
| ١٠ | بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج ( ٢ د ) او ( ٣ د ) في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسياً بعد الدمك والفئة شملة وضع طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000) او المستحلبات الاسفلتية المطابقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣م ٢٤٥,٩٥٦ | ٢٢٥٠                  | ٥٥٣٤٠١  |
| ١١ | بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب ( برايم ) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١.٢ كجم/م <sup>٢</sup> طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من أي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢م ٣٨٠٠٠   | ٣١,٥                  | ١١٩٧٠٠٠ |
| ١٢ | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومن السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م <sup>٢</sup> ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام اعمالها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٢م ٣٠٠٠    | ١٠,٧٥                 | ٣٢٢٥٠   |



**محضر اجتماع اللجنة**  
**الخاصة بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق**  
**على تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم ( القطاع الاول )**

| م  | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الكمية    | السعر بعد المفاوضة | القيمة  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| ١٣ | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثّلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                               | ٢م٣٠٠٠    | ١٦٦,٢٥             | ٤٩٨٧٥٠  |
| ١٤ | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يمثّلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                               | ٣٩٠٠٠     | ١٦١,٢٥             | ٦٢٨٨٧٥٠ |
| ١٥ | بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز خرساني ( نيوجيرسي ) من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس وجه واحد بارتفاع ٨٠ طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة ( FAIR FACE ) يحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / ٣م وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ يتم التنفيذ على فرش من الخرسانة العادية سمك ٢٠ سم ويعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ( ١٦ ٠ ٦ ) م ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطريق                                                                | ٢٠ م ط    | ٥٥٠                | ١١٠٠٠   |
| ١٦ | بالمتر المكعب اعمال رفع وازالة المخلفات مع نقل المخلفات الغير صالحة للرم خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بماجيعة بمسافة لا تقل عن ١٤ كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣م٥٠٠٠    | ٢٦                 | ١٣٠٠٠٠  |
| ١٧ | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنت (وسط) بابعاد ١١,٥ / ٣,٠ * ٥٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣م٠,٨ سم دولوميت لا يزيد اكير بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٣م٠,٤ رمل + ٢٥٠٠ كجم اسمنت ويتم تركيب البردوره على فرش من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم و التي تملأ بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٢ : ١ والسعر يشمل التسوية اسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف | ٣م٥٠٠     | ١٣٥                | ٦٧٥٠٠   |
| ١٨ | بالعدد اعمال تغطية او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق ( مياه - صرف ) طبقاً لمنسوب الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لتعليمات المهندس المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٠ بالعدد | ٥٢٥                | ٢٦٢٥٠   |
| ١٩ | بالعدد انشاء بلاعات كاملة مقاس ٠,٦ x ٠,٦ والارتفاع حسب ميول الصرف في الشارع من الخرسانة العادية المكونة من ٠,٨ م زلط + ٠,٤ م رمل + ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي ويكون سمك الارضية والحوائط ١٥ سم والفئة تشمل أعمال المحارة بالغرفة وعزلها بمادة غير قابلة لتسريب المياه مع التوريد وتركيب الشنبر وغطاء الغرفة والمواسير بين صرف الامطار والمطابق الشنبر يشمل الفرد والردم بالرمال والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات                                                                                                                                  | ١٦ بالعدد | ٥٠٠٠               | ٨٠٠٠٠   |

### محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الحارث

على تنفيذ اعمال رفع كفاءة طريق شبين - الشاملة حتى حدود الشرقية بطول ٣.٥ كم ( القطاع الاول )

( المنطقة الاولى - المركزية )

| ٢  | البند                                                                                                                                                                                                                                                                              | التسمية | المساحة بحد<br>المفاوضة | القيمة   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| ٢٠ | بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقا للعيينة المعتمدة باجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤٠ مم في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميمية ومحمل على البند جميع ما يلزم بالتركيب والتشطيب ونهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة | ١٠٠ م ٢ | ١٩٥                     | ١٩٥٠٠    |
|    | مقاس ٨٠ × ٢٠٠ × ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                         |          |
|    | الاجمالي ( فقط وقدره ثلاثة عشر مليون وخمسمائة وتسعون الف وثلاثمائة واحد وستون جنيها لا غير )                                                                                                                                                                                       |         |                         | ١٣٥٩٠٣٦١ |

- الاسعار المتفق عليها طبقا للقائمة الموحدة يناير ٢٠٢٣ واسعار السوق اما بنود الاسفلت طبقا للمذكرة المعتمدة المبين بها زيادة اسعار البيتومين والسولار
- مسافة النقل مسئولية المنطقة طبقا لاقرب محجر معتمد
- يتم خصم نسبة ٠,٥ % من اجمالي قيمة التعاقد
- يتم صرف فروق الاسعار طبقا للمعاملات ( بيتومين - اسمنت - سولار - حديد )
- مدة التنفيذ ( ٦ أشهر )
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية وطبقاً للقائمة الموحدة يناير ٢٠٢٣ في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها
- وعليه أقفل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه

| ممثل الشركة   | التوقيع       | التوقيع       | التوقيع       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس | السيد المهندس |
| السيد المحاسب | السيد المحاسب | السيد المحاسب | السيد المحاسب |
| السيد المحاسب | السيد المحاسب | السيد المحاسب | السيد المحاسب |
| السيد الأستاذ | السيد الأستاذ | السيد الأستاذ | السيد الأستاذ |

رئيسي قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

( التوقيع )

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

طرق ج ب





كشف باسماء السادة المؤمن عليهم

19198 / 4

كشف متمم للوثيقة

| الاسم                                                               | الوظيفة                          | العدد | مبلغ التأمين | السعر | القسط  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------|-------|--------|
| (تأميناً على عدد مهندسين بدون ذكر أسماء)                            | مهندسين                          | 2     | 75000        | 75000 | 544.50 |
| تأميناً على عدد (1) مساعد مهندس او ملاحظ فنى بدون ذكر أسماء         | مساعد مهندس او ملاحظ فنى         | 1     | 30000        | 30000 | 108.60 |
| تأميناً على عدد (1) سائق معدة او سيارة و من فى حكمهم بدون ذكر أسماء | سائق معدة او سيارة و من فى حكمهم | 1     | 15000        | 15000 | 54.45  |
| تأميناً على عدد (1) عامل عادى بدون ذكر أسماء                        | عامل عادى                        | 1     | 10000        | 10000 | 36.30  |

اجمالى مبلغ التأمين

205000

جنية مصرى

خصومات و اضافات

186.00

25.00

عدم ذكر اسم

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون  
تقتصر التغطية على الحوادث التى تقع اثناء وبسبب العمل فقط وفى مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم غير مذكورى الاسماء اثناء تنفيذ عملية اسناد اعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الاول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن ( )  
"المبادرة الرئيسية " حياة كريمة  
رقم العقد : وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين  
رقم العقد : 12023/2022/1331  
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن 220 فولت

929.85

صافى القسط

**MIC**  
MOHANDS INSURANCE CO.  
شركة المهندسين للتأمين  
إدارة الحوادث المتنوعة 1/11

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني [www.mohins.com](http://www.mohins.com)

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza  
P.O.BOX: 62 ORMAN - EGYPT  
Tel: 33368101 - 7  
Fax: 33352697 - 33361365

[www.mohins.com](http://www.mohins.com)

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة  
الهاتف : ٣٣٣٦٨١٠٠ - ٣٣٣٦٨١٠٧  
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥  
بريد : ١٢ الاورمان - الدقى - مصر

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

يقيم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

## جداول وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية العامة

رقم الوثيقة 19196 و / 4

اسم المؤمن له شركة اولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق  
لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

طبيعة النشاط أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الاول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن المبادرة  
الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر  
العنوان شقة 2 عقار 5 ش على ضيف من 16 أكتوبر - السلام - القاهرة

مدة التأمين تبدأ من يوم 2023/06/13 الساعة الثانية عشر ظهرا  
وتنتهى فى يوم 2024/06/13 الساعة الثانية عشر ظهرا

من المعلوم والمتفق عليه صراحة :

إن التأمين بموجب هذه الوثيقة يغطى عواقب المسؤولية المدنية القانونية التي قد يتعرض لها المؤمن له طبقا للتشريع الحالي من المواد 163 إلى 178 من القانون المدني المصري والتي تثبت في حقه بموجب حكم قضائي نهائي وذلك عن أي أضرار جسيماتية سوء من قبل ( المهندس والمقاول والجهة الادارية والاستشاري) قد تلحق بالغير اثناء قيام المؤمن له بمزاولة عمله (أسناد أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الاول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر .  
رقم العقد : 1331/2022/2023

الحدود الجغرافية / ع.م.ج

### الحد الأقصى لمسئولية الشركة

1000000 جم (مائة ألف جنيه مصري لا غير) الحد الأقصى للالتزام بالشركة للشخص الواحد عن الأضرار الجسيماتية  
100000 جم ( مائة ألف جنيه مصري ) الحد الأقصى للالتزام بالشركة للحادث الواحد عن الأضرار الجسيماتية  
1000000 جم ( مائة ألف جنيه مصري ) الحد الأقصى للالتزام بالشركة خلال مدة التأمين مهما بلغ عدد الحوادث عن الأضرار الجسيماتية  
\*\* لا يجوز إلغاء أو إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من شركة مالهية العامة للطرق والكبارى  
وتشمل حدود المسؤولية المبينة غالية كافة الأتعاب والمصروفات القضائية وجميع مصروفات الدفاع أيا كان نوعها المترتبة عن الحادث والتي توافق عليها الشركة.

### حساب القسط والدمغات

|                      |        |                              |       |
|----------------------|--------|------------------------------|-------|
| القسط الصافي         | 435.00 | نصف دمغة الاتساع             | 3.00  |
| نصف الدمغة النسبية   | 2.20   | مصاريف الاصدار               | 55.85 |
| رسم الاشراف والرقابة | 2.65   | رسوم خدمات مراجعة و اعتماد   | 0.43  |
| القسط الاجمالي       | 500.00 | فقط خمسمائة جنيه مصري لا غير | 0.87  |

ومن المعلوم والمتفق عليه صراحة أن المؤمن له تسلم الشروط العامة للوثيقة وعدد صفحاتها (4).

انتاج / شاهدة حسام الدين راتب





## كشف بأسماء فريق العمل بالشركة

| الأسم / العدد    | التخصص                 | سنوات الخبرة |
|------------------|------------------------|--------------|
| أ / محمود سيف    | رئيس مجلس الإدارة      |              |
| م / مصطفى هاشم   | مدير التنفيذ للطريق    | ١٠ سنوات     |
| م / أحمد اسماعيل | حاسب كميات             | ٥ سنوات      |
| م / محمد طه      | مهندس كهرباء           | ٥ سنوات      |
| ٢                | فنى سلامة مرورية       | ٥ سنوات      |
| محمد أمين        | مساح توتال             | ٧ سنوات      |
| حسام حسن         | مساح ميزان             | ٧ سنوات      |
| ٢                | مساعد مساح             | ٥ سنوات      |
| ٢                | فنى سلامة مرورية       | ٥ سنوات      |
| ٢                | مراقب تنفيذ / فنى مواد | ٥ سنوات      |
| ٢٠               | سائق معدة              |              |
| ٣                | سائق سيارة             |              |
| ٢٠               | عامل                   |              |
| ٣                | فنيين الصيانة          |              |
| ١                | فنى مخازن              |              |



### المعدات الموجودة بالموقع

| عدد | بيان                                  | الأستخدام / نوع البند                                  |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ١   | مقشطة أسفلت ورتيجن                    | قشط وازالة الأسفلت                                     |
| ٣   | ماكينة انارة ٥٠ ك وات                 | أعمال التحويلات                                        |
| ١   | ونش انقاذ                             | أعمال التحويلات                                        |
| ١   | كلارك                                 | أعمال التحويلات                                        |
| ٢   | لودر                                  | أعمال التحويلات ، أعمال الأتربة ، أعمال الأساس         |
| ٢   | هراس بوماج هزاز تربة                  | أعمال الأتربة ، أعمال الأساس                           |
| ١   | جريد                                  | أعمال الأتربة ، أعمال الأساس ، طبقات FDR الأساس المثبت |
| ٤   | قلاّب                                 | أعمال الأتربة ، أعمال الأساس                           |
| ٢   | جرار زراعى مزود بمكنسة                | أعمال الأساس                                           |
| ١   | تانك مياه نصر                         | أعمال الأساس ، طبقات الأساس المثبت FDR                 |
| ١   | ماكينة إعادة تدوير الأسفلت ورتيجن FDR | طبقات الأساس المثبت FDR                                |
| ١   | هراس حوافر غنم                        | طبقات الأساس المثبت FDR                                |

شركة أولاد نصر الدين  
لإنشاء و رصف الطرق

٢٨٢٢٢ ب.ص: ١٦٥ - ١٥٤ - ١٣٠  
Tel: 01060325895  
01225255373

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق  
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

| عدد           | بيان                                    | الأستخدام / نوع البند                   |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| ١             | معمل أسفلت مواد                         | مجمع الخلطات ، طبقات الأساس المثبت FDR  |
| ١             | فنشر أسفلت ديماج                        | طبقات الأسفلت                           |
| ١             | هراس حديد خفيف ١٢ طن                    | طبقات الأسفلت                           |
| ١             | هراس حديد ثقيل في حدود ٢٤ طن            | طبقات الأساس المثبت FDR ، طبقات الأسفلت |
| ١             | منشار قطاعية أسفلت                      | طبقات الأسفلت                           |
| ١             | عربة مكنسة ميكانيكية                    | طبقات الأسفلت                           |
| ١             | سيارة رش جامبو                          | أعمال رش الطبقات بالمياه                |
| ١             | محطة خلط مركزية                         | مجمع الخلطات                            |
| بطاقة ١٠٠ طن  | خزان بيتومين ٧٠/٦٠                      |                                         |
| بطاقة ٣٠ طن   | خزان R.C                                |                                         |
| ٢ بطاقة ٤٠ طن | خزان المستحلبات البيتومينية             |                                         |
| ١             | ميزان بسكول                             |                                         |
| ٢             | ميزان قامة كاملة                        | الأعمال المساحية                        |
| ١             | جهاز محطة الأرصاد الكاملة Total station | الأعمال المساحية                        |

شركة أولاد نصر الدين

لإنشاء و رصف الطرق  
Tel: 01060325895  
01225255373  
س.ت: ٢٨٤٣ ب.ض: ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٦

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق  
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة



العملية أو المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق شنين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شنين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم

بالطن أعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسب المقررة بالخطة التصميمية  
والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف

| NOTES | QUANTITY | rate                   | Area     | End Station | Start Station | SERIAL |
|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------------|--------|
|       | 279.30   | 26.6 kg/m <sup>2</sup> | 10500.00 | 1+180       | 0+000         | ١      |
|       | 279.30   |                        |          | الاجملى     |               |        |

مهندس الاستشاري

م / ابراهيم الصاير

م / امير احمد النور

التوقيع /

التوقيع /

مهندس المقاول

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع /

العملية أو المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق شبين القاطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القاطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم

أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بنظام إعادة تدوير طبقات الإسفلت وطبقة الأساس القائمة  
معا (FDR) والفئة شاملة نظافة سطح الإسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط  
والمواصفات ..... والفئة شاملة بالمتر المسطح

| NOTES | QUANTITY | Area     | End Station | Start Station | SERIAL |
|-------|----------|----------|-------------|---------------|--------|
|       | 10500.00 | 8.90     | 1+180       | 0+000         | ١      |
|       | 10500.00 | الاجمالي |             |               |        |

مهندس الاستشاري

م / ابراهيم الصابر

التوقيع /

م / امير احمد انور

التوقيع /

مهندس المقاول

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع /

٥١



العملية أو المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم

بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير mc30 بمعدل (٢, ١-٥, ١كجم/م<sup>٢</sup>) ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

| NOTES | QUANTITY | Area    | End Station | Start Station | SERIAL |
|-------|----------|---------|-------------|---------------|--------|
|       | 10500.00 | 8.90    | 1+180       | 0+000         | ١      |
|       | 10500.00 | الاجملى |             |               |        |

مهندس الاستشاري

م / ابراهيم الصابر

م / امير احمد انور

التوقيع /

التوقيع /

مهندس المقاول

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع /

المعملية أو المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم

بالمر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام اجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسيو او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة

| NOTES | QUANTITY | Area     | End Station | Start Station | SERIAL |
|-------|----------|----------|-------------|---------------|--------|
|       | 10500.00 | 8.90     | 1+180       | 0+000         | ١      |
|       | 10500.00 | الاجمالي |             |               |        |

مهندس الاستشاري

م / ابراهيم الصلبي

م / امير احمد انور

التوقيع / 

التوقيع / 

مهندس المقاول

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع / 






0+400

0+500

0+600

0+700

0+800

|                                                                                       |  |                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |  |                                           |  |  |  |
| <b>طلب استلام</b>                                                                     |  |                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |
| اسم المشروع                                                                           |  | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم |  |                                                                                     |  |
| المالك                                                                                |  | الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى                                                                                 |  |                                                                                     |  |
| مدير المشروع                                                                          |  | م / مصطفى هاشم                                                                                                             |  |                                                                                     |  |
| رقم الطلب                                                                             |  | ٢                                                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| الموضوع                                                                               |  | أعمال إنشاء طبقة اساس مئيت بسمك ٢٥ بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف                                                           |  |                                                                                     |  |
| رقم اللوحة                                                                            |  | مراجعة                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| وصف الأعمال المنفذة:                                                                  |  | وصف                                                                                                                        |  |                                                                                     |  |
| حفر                                                                                   |  | أعمال تسوية و دمك                                                                                                          |  |                                                                                     |  |
| أعمال أساس                                                                            |  | أسفلت                                                                                                                      |  |                                                                                     |  |
| أعمال مساحية                                                                          |  | أخرى                                                                                                                       |  |                                                                                     |  |
| <b>تفاصيل الفحص:</b>                                                                  |  |                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |
| تاريخ الفحص:                                                                          |  | مكان الفحص                                                                                                                 |  | من المحطة ٠+٤٠٠ حتى المحطة ٠+٧٤٠                                                    |  |
| <b>ملاحظات الاستشاري:</b>                                                             |  |                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |
| <p>يتم عمل العمل<br/>بموجب مواصفات<br/>الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى</p> |  |                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |
| مهندس الطرق                                                                           |  | مهندس المساحة                                                                                                              |  |                                                                                     |  |
|    |  |                                         |  |                                                                                     |  |
| <b>النتيجة:</b>                                                                       |  |                                                                                                                            |  |                                                                                     |  |
| المقاول:                                                                              |  | الاستشاري:                                                                                                                 |  |                                                                                     |  |
| الاسم:                                                                                |  | الاسم:                                                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| التوقيع:                                                                              |  | التوقيع:                                                                                                                   |  |                                                                                     |  |
| التاريخ:                                                                              |  | التاريخ:                                                                                                                   |  |                                                                                     |  |



طلب استلام

|              |                                                                                                                            |                |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| اسم المشروع  | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | الأعمال        | أعمال طرق                               |
| المالك       | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى                                                                                  | استشارى المالك | مكتب حياة للاستشارات الهندسية           |
| مدير المشروع | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | المقاول        | شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق |
| رقم الطلب    | ٣                                                                                                                          | التاريخ        | ٢٠٢٣-٠٦-١٤                              |

الموضوع أعمال إنشاء طبقة اساس مئيت بسمك ٢٥ بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف

| رقم اللوحة | الوصف | مراجعة |
|------------|-------|--------|
|            |       |        |

وصف الأعمال المنفذة:

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| حفر        | أعمال تسوية و دمك | أعمال مساحية |
| أعمال أساس | أسفلت             | أخرى         |

تفاصيل الفحص:

|              |            |                                  |
|--------------|------------|----------------------------------|
| تاريخ الفحص: | مكان الفحص | من المحطة ٠+٧٤٠ حتى المحطة ١+٠٠٠ |
|--------------|------------|----------------------------------|

ملاحظات الاستشارى:

يتم اتمام العمل على الطريق  
من محطة ٠+٧٤٠ الى محطة ١+٠٠٠

مهندس الطرق

مهندس المساحة

النتيجة:

| أ        | ب          | ج | د |
|----------|------------|---|---|
| المقاول: | الاستشارى: |   |   |
| الاسم:   | الاسم:     |   |   |
| التوقيع: | التوقيع:   |   |   |
| التاريخ: | التاريخ:   |   |   |



طلب استلام

|              |                                                                                                                            |                |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| اسم المشروع  | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | الأعمال        | أعمال طرق                               |
| المالك       | الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى                                                                                 | استشارى المالك | مكتب حياة للاستشارات الهندسية           |
| مدير المشروع | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | المقاول        | شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق |
| رقم الطلب    | ٤                                                                                                                          | التاريخ        | ٢٠٢٣-٠٦-١٥                              |
| الموضوع      | أعمال إنشاء طبقة اساس مئيت بسمك ٢٥ بنظام اعادة تدوير طبقات الرصف                                                           |                |                                         |

| رقم اللوحة | الوصف | مراجعة |
|------------|-------|--------|
|            |       |        |

وصف الأعمال المنفذة:

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| حفر        | أعمال تسوية و دمك | أعمال مساحية |
| أعمال أساس | أسفلت             | اخرى         |

تفاصيل الفحص:

|              |            |                                  |
|--------------|------------|----------------------------------|
| تاريخ الفحص: | مكان الفحص | من المحطة ١+٠٠٠ حتى المحطة ١+١٨٠ |
|--------------|------------|----------------------------------|

ملاحظات الاستشارى:

٤- يتم احداث مساحات الكمرات المرسية  
٥- يتم عمل الممر  
٥- يلزم عمل بياض كمرات الممر

|             |               |
|-------------|---------------|
| مهندس الطرق | مهندس المساحة |
|             |               |

النتيجة:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | د |
|---|---|---|---|

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

I. Bawar

فحص





طلب استلام

|              |                                                                                                                            |                |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| اسم المشروع  | اعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | الأعمال        | اعمال طرق                               |
| المالك       | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى                                                                                  | استشارى المالك | مكتب حياة للاستشارات الهندسية           |
| مدير المشروع | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | المقاول        | شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق |
| رقم الطلب    | ٦                                                                                                                          | التاريخ        | ٢٠٢٣-٦-٢٢                               |
| الموضوع      | اعمال فرش طبقة الأسفلت السطحية بسمك ٥ سم                                                                                   | رقم اللوحة     |                                         |
|              |                                                                                                                            | الوصف          | مراجعة                                  |

وصف الأعمال المنفذة:

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| حفر        | اعمال تسوية و دمك | اعمال مساحية |
| اعمال اساس | اسفلت             | اخرى         |

تفاصيل الفحص:

|              |            |                                  |
|--------------|------------|----------------------------------|
| تاريخ الفحص: | مكان الفحص | من المحطة ٠+٠٠٠ حتى المحطة ٠+٤٠٠ |
|--------------|------------|----------------------------------|

ملاحظات الاستشارى:

هو رقم عالم العنصر  
بملاحظة ان  
بالمزج اذ

|             |               |
|-------------|---------------|
| مهندس الطرق | مهندس المساحة |
|-------------|---------------|

النتيجة:

|          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| أ        | ب          | ج        | د        |
| المقاول: | الاستشارى: | الاسم:   | التوقيع: |
| الاسم:   | الاسم:     | التوقيع: | التاريخ: |
| التاريخ: | التاريخ:   | التاريخ: | التاريخ: |





طلب استلام

|              |                                                                                                                            |                |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| اسم المشروع  | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | الأعمال        | أعمال طرق                               |
| المالك       | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى                                                                                  | استشارى المالك | مكتب حياة للاستشارات الهندسية           |
| مدير المشروع | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | المقاول        | شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق |
| رقم الطلب    | ٧                                                                                                                          | التاريخ        | ٢٠٢٣-٦-٢٣                               |

الموضوع أعمال رش طبقات الأساس بطبقة تشريب من البيتزمين المائل متوسط التطاير (MC)

| رقم اللوحة | الوصف | مراجعة |
|------------|-------|--------|
|            |       |        |

وصف الأعمال المتقدمة:

|            |                   |              |
|------------|-------------------|--------------|
| حفر        | أعمال تسوية و دمك | أعمال مساحية |
| أعمال أساس | أسفلت             | أخرى         |

تفاصيل الفحص:

|              |            |                                  |
|--------------|------------|----------------------------------|
| تاريخ الفحص: | مكان الفحص | من المحطة ٠+٤٠٠ حتى المحطة ٠+٧٤٠ |
|--------------|------------|----------------------------------|

ملاحظات الاستشارى:

يكرم حاكم العالم  
فالم اسماء  
مكرم المرام مكرم  
١٠٢٠٢٠٢٠

|             |               |
|-------------|---------------|
| مهندس الطرق | مهندس المساحة |
|             |               |

النتيجة:

| المقاول: | المقاول: | ب | ج | د |
|----------|----------|---|---|---|
| الاسم:   | الاسم:   |   |   |   |
| التوقيع: | التوقيع: |   |   |   |
| التاريخ: | التاريخ: |   |   |   |

طلب استلام

|              |                                                                                                                            |                |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| اسم المشروع  | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | الأعمال        | أعمال طرق                               |
| المالك       | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى                                                                                  | استشارى المالك | مكتب حياة للاستشارات الهندسية           |
| مدير المشروع | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | المقاول        | شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق |
| رقم الطلب    | ٨                                                                                                                          | التاريخ        | ٢٠٢٣-٦-٢٣                               |

| الموضوع                                  | رقم اللوحة | الوصف | مراجعة |
|------------------------------------------|------------|-------|--------|
| أعمال فرش طبقة الأسفلت السطحية بسمك ٥ سم |            |       |        |

وصف الأعمال المنفذة:

|           |                   |              |
|-----------|-------------------|--------------|
| حفر       | أعمال تسوية و دمك | أعمال مساحية |
| أعمال أسس | أسفلت             | أخرى         |

تفاصيل الفحص:

|              |            |                                  |
|--------------|------------|----------------------------------|
| تاريخ الفحص: | مكان الفحص | من المحطة ٠+٤٠٠ حتى المحطة ٠+٧٤٠ |
|--------------|------------|----------------------------------|

ملاحظات الاستشارى:

يتم عمل العمل على  
تدريجى واما ما فات العمل  
في العمل استخدام الاسس كما وشرحت

|             |               |
|-------------|---------------|
| مهندس الطرق | مهندس المساحة |
|             |               |

النتيجة:

| ا        | ب          | ج        | د        |
|----------|------------|----------|----------|
| المقاول: | الاستشارى: | الاسم:   | التوقيع: |
| الاسم:   | التوقيع:   | التاريخ: |          |



طلب استلام

|              |                                                                                                                            |                      |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| اسم المشروع  | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | الاعمال              | أعمال طرق                               |
| المالك       | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى                                                                                  | استشارى المالك       | مكتب حياة للاستشارات الهندسية           |
| مدير المشروع | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | المقاول              | شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق |
| رقم الطلب    | ٩                                                                                                                          | التاريخ              | ٢٠٢٣-٦-٢٤                               |
| الموضوع      | أعمال رش طبقات الأسفلت بطبقة تشريب من البيترومين السائل متوسط التطاير (MC)                                                 | رقم اللوحة           |                                         |
|              |                                                                                                                            | الوصف                | مراجعة                                  |
|              |                                                                                                                            | وصف الأعمال المنفذة: |                                         |
| حفر          |                                                                                                                            | أعمال تسوية و دمك    | أعمال مساحية                            |
| أعمال أساس   |                                                                                                                            | أسفلت                | أخرى                                    |
|              |                                                                                                                            | تفاصيل الفحص:        |                                         |
| تاريخ الفحص: |                                                                                                                            | مكان الفحص           | من المحطة ٠٠+٧٤٠ حتى المحطة ١+٠٠٠       |
|              |                                                                                                                            | ملاحظات الاستشاري:   |                                         |
|              |                                                                                                                            | مهندس الطرق          | مهندس المساحة                           |
|              |                                                                                                                            | النتيجة:             |                                         |
| المقاول:     | الاسم:                                                                                                                     | الاسم:               | الاسم:                                  |
| التوقيع:     | التوقيع:                                                                                                                   | التوقيع:             | التوقيع:                                |
| التاريخ:     | التاريخ:                                                                                                                   | التاريخ:             | التاريخ:                                |

م. ب. م. علي العلي  
م. ب. م. احمد العلي  
م. ب. م. احمد العلي  
م. ب. م. احمد العلي

طلب استلام

|                                        |                |                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| أعمال طرق                              | الأعمال        | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | اسم المشروع  |
| مكتب حياة للاستشارات الهندسية          | استشارى المالك | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى                                                                                  | المالك       |
| شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق | المقاول        | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | مدير المشروع |
| ٢٠٢٣-٦-٢٤                              | التاريخ        | ١٠                                                                                                                         | رقم الطلب    |

أعمال فرش طبقة الأسفلت السطحية بسمك ٥ سم

| رقم اللوحة | الوصف | مراجعة |
|------------|-------|--------|
|            |       |        |

وصف الأعمال المنفذة:

|             |                  |             |
|-------------|------------------|-------------|
| أعمال مسلحة | أعمال تسوية ودمك | حفر         |
| أخرى        | أسفلت            | أعمال أسفلت |

تفاصيل الفحص:

|                                  |            |              |
|----------------------------------|------------|--------------|
| من المحطة ٠+٧٤٠ حتى المحطة ١+٠٠٠ | مكان الفحص | تاريخ الفحص: |
|----------------------------------|------------|--------------|

ملاحظات الاستشارى:

بالتوقيع علم الجبر  
بالتوقيع علم الجبر  
بالتوقيع علم الجبر  
بالتوقيع علم الجبر

مهندس الطرق مهندس المساحة

النتيجة:

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| أ | ب | ج | د |
|---|---|---|---|

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:





طلب استلام

|              |                                                                                                                            |                |                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| اسم المشروع  | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | الأعمال        | أعمال طرق                               |
| المالك       | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى                                                                                  | استشارى المالك | مكتب حياة للاستشارات الهندسية           |
| مدير المشروع | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | المقاول        | شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق |
| رقم الطلب    | ١١                                                                                                                         | التاريخ        | ٢٠٢٣-٦-٢٥                               |

الموضوع أعمال رش طبقات الأساس بطبقة تشريب من البيتزمين السائل متوسط التطاير (MC)

| رقم اللوحة | الوصف | مراجعة |
|------------|-------|--------|
|            |       |        |

وصف الأعمال المنفذة:

|            |                   |              |  |
|------------|-------------------|--------------|--|
| حفر        | أعمال تسوية و دمك | أعمال مساحية |  |
| أعمال أساس | أسفلت             | أخرى         |  |

تفاصيل الفحص:

|              |            |                                   |
|--------------|------------|-----------------------------------|
| تاريخ الفحص: | مكان الفحص | من المحطة ١٠٠٠ + حتى المحطة ١٨٠ + |
|--------------|------------|-----------------------------------|

ملاحظات الاستشارى:

بإسم عمدة الطريق رقم ١٨٠  
بإسم ١٨٠ + ١٠٠٠  
بإسم ١٠٠٠ + ١٨٠

مهندس الطرق مهندس المساحة

النتيجة:

| أ        | ب          | ج | د |
|----------|------------|---|---|
| المقاول: | الاستشارى: |   |   |
| الاسم:   | الاسم:     |   |   |
| التوقيع: | التوقيع:   |   |   |
| التاريخ: | التاريخ:   |   |   |

طلب استلام

|                                         |                |                                                                                                                            |              |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| أعمال طرق                               | الأعمال        | أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول ٣,٥ كم | أسم المشروع  |
| مكتب حياة للاستشارات الهندسية           | استشارى المالك | الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى                                                                                  | المالك       |
| شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق | المقاول        | م / مصطفى هاشم                                                                                                             | مدير المشروع |
| ٢٠٢٣-٦-٢٥                               | التاريخ        | ١٢                                                                                                                         | رقم الطلب    |

الموضوع أعمال فرش طبقة الأسفلت السطحية بسمك ٥ سم

| رقم اللوحة | الوصف | مراجعة |
|------------|-------|--------|
|            |       |        |

وصف الأعمال المنفذة:

|           |                   |              |
|-----------|-------------------|--------------|
| حفر       | أعمال تسوية و دمك | أعمال مساحية |
| أعمال أسس | أسفلت             | أخرى         |

تفاصيل الفحص:

|              |            |                                 |
|--------------|------------|---------------------------------|
| تاريخ الفحص: | مكان الفحص | من المحطة ١٠٠٠+ حتى المحطة ١٨٠+ |
|--------------|------------|---------------------------------|

ملاحظات الاستشارى:

بالرغم من عدم الفحص  
تقدم اذامنا الى الهيئة العامة  
للطرق والكبارى والنقل البرى  
بالتوقيع والتاريخ  
٢٠٢٣-٦-٢٥

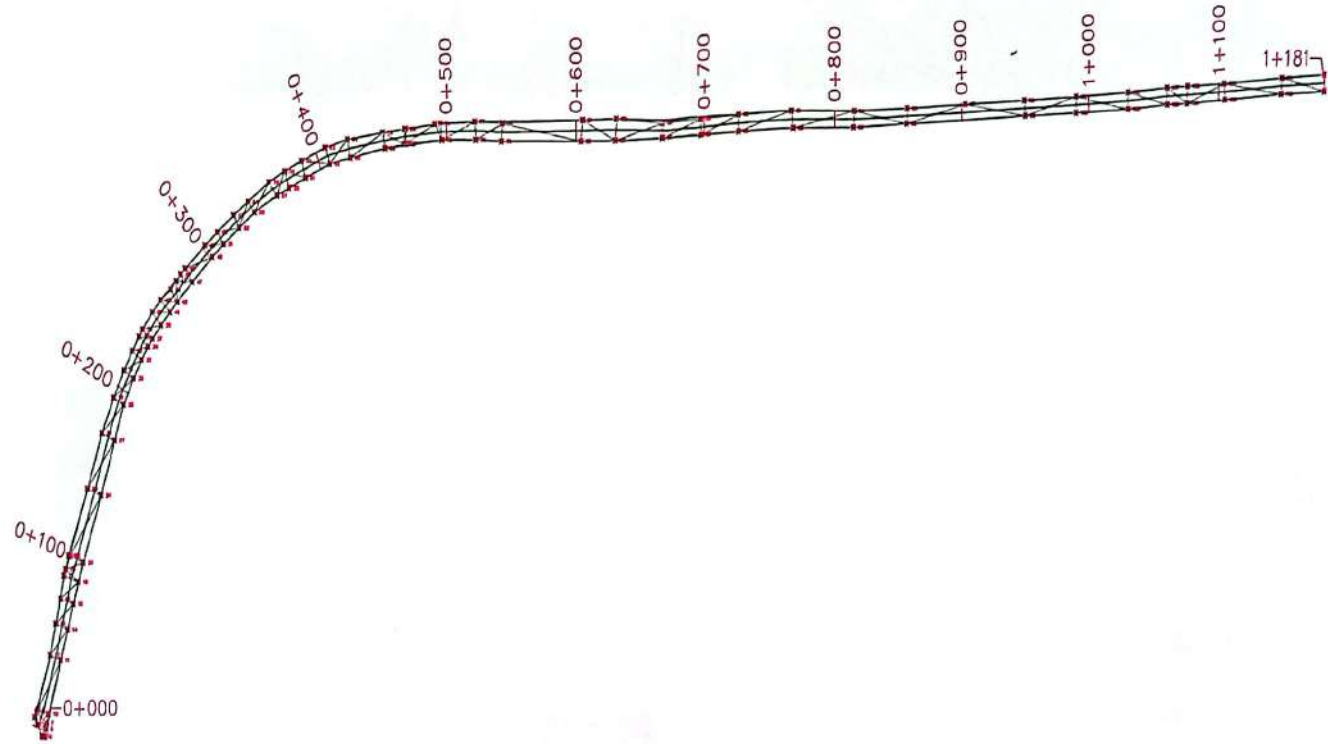
|             |               |
|-------------|---------------|
| مهندس الطرق | مهندس المساحة |
|             |               |

النتيجة:

| ا        | ب          | ج        | د        |
|----------|------------|----------|----------|
| المقاول: | الاستشارى: | الاسم:   | التوقيع: |
| الاسم:   | التوقيع:   | التاريخ: |          |

مقاوله شركة : أولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة  
استشارى المالك : مكتب حياة للاستشارات الهندسية

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (القطاع الأول)  
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة المركزية الاولى



طبقة الاساس المثبت بنظام اعاده تدوير طبقات الرصف من محطة 0+000 الى محطة 1+180



| م  | الاعمال                                                                  | البرنامج الزمني لمشروع أعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر / الشاملة حتى حدود الشرقية (قطاع الأول) بطول 3.5 كم |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|    |                                                                          | شهر مايو                                                                                                     |              |              | شهر يونيو                     |              |              | شهر يوليو                     |              |              | شهر أغسطس                     |              |              |
|    |                                                                          | الاسبوع<br>1                                                                                                 | الاسبوع<br>2 | الاسبوع<br>3 | الاسبوع<br>1                  | الاسبوع<br>2 | الاسبوع<br>3 | الاسبوع<br>1                  | الاسبوع<br>2 | الاسبوع<br>3 | الاسبوع<br>1                  | الاسبوع<br>2 | الاسبوع<br>3 |
| 1  | استلام الموقع وتطهيره من العوائق                                         | من محطة<br>0+000 إلى<br>0+700                                                                                |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
| 2  | عمل الروبوت والرفع المساحي للأرض الطبيعية                                | من محطة<br>0+000 إلى<br>0+700                                                                                |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
| 3  | أعمال تطهير ودم قنات حفر المرافق                                         | من محطة<br>0+000 إلى<br>0+700                                                                                |              |              | من محطة<br>0+000 إلى<br>0+500 |              |              | من محطة<br>1+000 إلى<br>1+500 |              |              | من محطة<br>2+000 إلى<br>2+500 |              |              |
| 4  | أعمال إنشاء طبقة أساس ممتد 25 بنظام إعادة<br>تدوير طبقات الرصف           |                                                                                                              |              |              | من محطة<br>0+500 إلى<br>1+000 |              |              | من محطة<br>1+000 إلى<br>1+500 |              |              | من محطة<br>2+000 إلى<br>2+500 |              |              |
| 5  | تسوية الأرض بعد إنشاء طبقة الأساس المثبت<br>نظام إعادة تدوير طبقات الرصف |                                                                                                              |              |              | من محطة<br>0+500 إلى<br>1+000 |              |              | من محطة<br>1+000 إلى<br>1+500 |              |              | من محطة<br>2+000 إلى<br>2+500 |              |              |
| 6  | اجراء الاختبارات                                                         |                                                                                                              |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
| 7  | رش Mco                                                                   |                                                                                                              |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
| 8  | تنفيذ طبقة الإسفلت السطحية                                               |                                                                                                              |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
| 9  | أعمال تلمية وخفض فرق التفتيش                                             |                                                                                                              |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
| 10 | توريد وتركيب البردورات                                                   |                                                                                                              |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
| 11 | توريد وتركيب وحدات الاتراك                                               |                                                                                                              |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |
| 12 | إنشاء بلاعات المطر                                                       |                                                                                                              |              |              |                               |              |              |                               |              |              |                               |              |              |

عبد الرحمن الصبارك



يعتمد ،،،  
رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى  
التوقيع / م / نصر محمد طبع

مدير عام التنفيذ والصيانة  
التوقيع / م / محمد عبدالرؤوف راجح

مهندس الهيئة  
التوقيع / م / محمد صديق

استشارى المشروع ( مكتب حياة للإستشارات الهندسية )  
التوقيع / م / امير أحمد أنور  
التوقيع / م / ابراهيم الصبار



المقاول  
الشركة المنفذة ( اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة )  
التوقيع / م / مصطفى السيد هاشم

المدة  
الد  
التر
