



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد المفاوضة لبنود الاعمال
للقطاعات الآتية:

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	المرحلة
١	سيد عبد المالك سيد يونس	٤٩٣+٠٠٠	٤٩٤+٠٠٠	مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

✱



مركز الإستشارات الهندسية
للتنقل والمحطات والطرقات
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجبوشي



الهيئة العامة
للطرق والكبارى
(GARB)



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات المقاسمة المعدلة بعد المفاوضات لبنود الاعمال تنفيذ شركة سيد عبدالمالك سيد يونس القطاع من المحطة ٤٩٣٠٠٠ الى ٤٩٤٠٠٠				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة
١	اعمال الحفر			
٢-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيهه لكلومتر زيادة	م ^٣	١,٥٧٠,٠٠٠	٣٠,٥٠
٣	اعمال الردم			
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منصوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيهه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المواد المحجزة طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	م ^٣	٣,٩٠٨	١٠١,٤٠
	علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم	م ^٣	٣,٩٠٨	٣١٢,٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	م ^٣	٣,٩٠٨	١٣,٠٠
٥	البلاطات الخرسانية			
١-٥	بالمتر المصطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م ^٢ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ^٢ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - يتم اضافة علاوة قدرة ٥ جنيهه بعد اول ١٠ متر راسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسى)	م ^٢	٧,٨٥٠,٠٣	٤٥٧
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عالية لقمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٣٠,٨ م ^٢ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ^٢ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشارى (فبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمال خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشارى) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٢٦٢,٠	٢,٦٦٥,٢
	الإجمالي			
	(ستة مليون جنيه فقط لا غير)			

مدير عام المشروعات (الهيئة)

محمد حسنى فياض



يعتمد

مفيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

مدير المشروع (الهيئة)

م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشارى

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / محمود محمد فتحى



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات المسافة من الكم ٤٩٣+٠٠٠ الى الكم ٤٩٤+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : (٢-١) اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة
عدا التربة الصخرية

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٥٧٠,٠٠	٧,٨٥٠	٢٠٠	٤٩٣+٩٠٠	٤٩٣+٧٠٠	القطاع الأول
١٥٧٠,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٢)				
١٥٧٠,٠٠	الاجمالي الكلي (م٢)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات المسافة من الكم ٤٩٣+٠٠٠ الى الكم ٤٩٤+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : (١-٣) أعمال توريد وتشغيل اتربه صالحه للردم

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٩٠٨,٠٠	٦٥,١٣٣	٦٠	٤٩٤+٠٠٠	٤٩٣+٩٤٠	القطاع الأول
٣٩٠٨,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٣٩٠٨,٠٠	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات المسافة من الكم ٤٩٣+٠٠٠ الى الكم ٤٩٤+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢١٠ كم

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٩٠٨,٠٠	٦٥,١٣٣	٦٠	٤٩٤+٠٠٠	٤٩٣+٩٤٠	القطاع الأول
٣٩٠٨,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
٣٩٠٨,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات المسافة من الكم ٤٩٣+٠٠٠ الى الكم ٤٩٤+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٩٠٨,٠٠	٦٥,١٣٣	٦٠	٤٩٤+٠٠٠	٤٩٣+٩٤٠	القطاع الأول
٣٩٠٨,٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
٣٩٠٨,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الخنولي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود محمد فتحي
محمد فتحي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر
الترابي والحمايات المسافة من الكم ٤٩٣+٠٠٠ الى الكم ٤٩٤+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : (١-٥) اعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم
تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م

الكمية (م²)	الاتجاه	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايسة
		متوسط العرض	طول	الى	من	
٤٣٥٤,٦٤	اليسار	٤,٦٧	٩٣٢	٤٩٣+٩٣٢	٤٩٣+...	القطاع الأول
١١٨,٥٠		٢,٩٦	٤٠	٤٩٤+...	٤٩٣+٩٦٠	القطاع الثاني
٣٠٥٠,٤٨	اليمين	٣,٢٥	٩٤٠	٤٩٣+٩٤٠	٤٩٣+...	القطاع الثالث
١٢٦,٩٨		٢,٨٩	٤٤	٤٩٤+...	٤٩٣+٩٥٦	القطاع الرابع
٧٦٥٠,٦٠		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م²)				
٧٦٥٠,٦٠		الاجمالي الكلي (م²)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحى

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١)

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات المسافة من الكم ٤٩٣+٠٠٠ الى الكم ٤٩٤+٠٠٠ بطول ١ كم

رقم البند و بيانه : (٢-٥) اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدامات حمايات الميول الجانبية
تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية (م³)	الاتجاه	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
		السمك	العرض	طول	الى	من	
٨٤,٠٠	اليسار	٠,٥٠	٠,٣٠	٥٦٠	٤٩٣+٥٦٠	٤٩٣+٠٠٠	القطاع الأول
٤,٢٠		٠,٥٠	٠,٣٠	٢٨	٤٩٣+٩٣٢	٤٩٣+٩٠٤	القطاع الثانى
١٢,٠٠		١,٠٠	٠,٣٠	٤٠	٤٩٤+٠٠٠	٤٩٣+٩٦٠	القطاع الثالث
١٤١,٠٠	اليمن	٠,٥٠	٠,٣٠	٩٤٠	٤٩٣+٩٤٠	٤٩٣+٠٠٠	القطاع الرابع
٦,٦٠		٠,٥٠	٠,٣٠	٤٤	٤٩٤+٠٠٠	٤٩٣+٩٥٦	القطاع الرابع
٢٤٧,٨٠		اجمالى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)					
٢٤٧,٨٠		الاجمالى الكلى (م³)					

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود محمد فتحي

محضر استلام موقع

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات المسافة من الكم ٠٠٠+٩٣ الى الكم ٠٠٠+٩٤ بطول ١ كم

تنفيذ: شركة سيد عبد المالك سيد يونس

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٧

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٧ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات- الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / محمود محمد فتحى مدير مشروع - شركة سيد عبد المالك سيد يونس

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٧ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- محمود محمد فتحى

٢- [Signature]

١- [Signature]



رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

نتائج اختبار التدرج الحبيبي وتصنيف التربة طبقاً لـ AASHTO

تقرير رقم 2022+/M/2000-102

التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٤

اسم العميل : السيد / سيد عبد المالك سيد يونس

مكان العينة : أتربة توريد (مشاؤون)


اسم العملية : القطار الكهربائي السريع

St. 493+000 : St. 494+000

العلمين - فوكة - قطاع ٦

*البيانات بعاليه حسب إفادة العميل.

رقم المنخل	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
فتحة المنخل (مم)	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425	0.075
النسبة المئوية المارة %	100.0	93.7	84.7	77.6	69.5	64.1	51.3	40.5	28.2	14.3

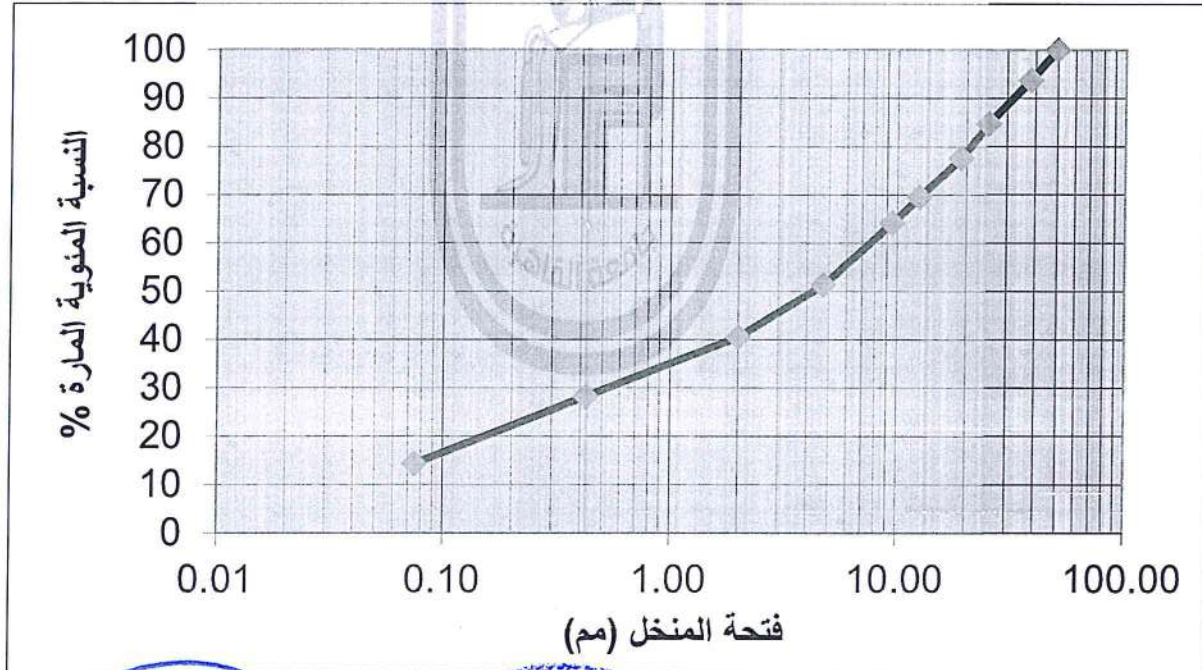

حد السيولة (%)	لا يوجد
حد اللدونة (%)	لا يوجد
تصنيف العينة طبقاً لنظام AASHTO	A-1-a

اختبار



اختبار تعيين أقصى كثافة جافة بتجربة بروكتور المعدلة

تقرير رقم 2022+/M/2000-102


التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٤
نوع التربة : أتربة توريد (مشاون)
حجم القالب : ٢١١٢ سم^٣

اسم العميل : السيد / سيد عبد المالك سيد يونس
اسم العملية : القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٦

St. 493+000 : St. 494+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل

نسبة الماء المضاف %	3	6	9	12
وزن القالب و العينة جم	10639	10869	11057	11094
وزن القالب جم	6395	6395	6395	6395
وزن العينة المبتلة جم	4244	4474	4662	4699
الكثافة بعد الدمك جم/سم ^٣	2.01	2.12	2.21	2.22
وزن عينة بالطبق جم	390	390	390	390
وزن عينة بعد التجفيف بالطبق جم	381	372	365	357
وزن الرطوبة جم	9	18	25	33
وزن الطبق جم	95	95	95	95
وزن العينة جافة جم	286	277	270	262
محتوى الرطوبة %	3.15	6.50	9.26	12.60
الكثافة الجافة جم/سم ^٣	1.95	1.99	2.02	1.98

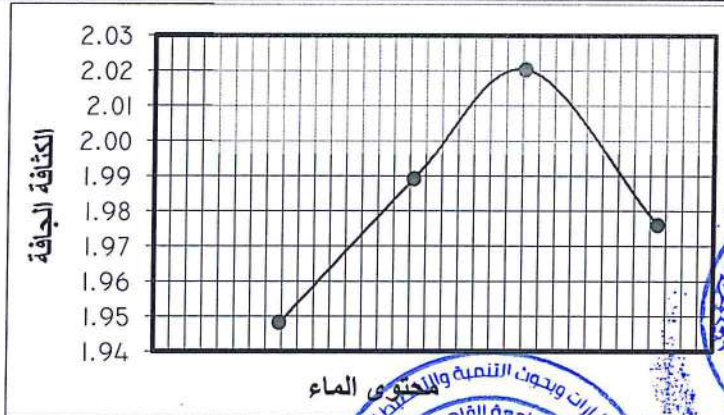

أقصى كثافة جافة = ٢.٠٢ كجم/سم^٣
عند محتوى ماء = ٩.٢٦ %



اختبار



California Bearing Ratio

تقرير رقم 2022+/M/2000-102

Client Name: السيد / سيد عبد المالك سيد يونس

Test Date: 04/12/2022

Project Name: القطار الكهربائي السريع
العلمين - فوكة - قطاع ٢

Specimen Type : أتربة توريد (مشاون)
St. 493+000 : St. 494+000

البيانات بعاليه حسب إفادة العميل والنتائج التي تم الحصول عليها تمثل العينة الموردة من قبل العميل دون أدنى مسئولية على المركز.

(A) Molding Moisture Contest


Specimen Name:	1	1	1	Specimen Name:	1	2	3
Can No.	1			Mold Vol. Cm^3	2208		
A. Mass, Wet Soil + can, g	470			Mass of sample, Mold g	13307		
B. Mass, Dry Soil + can, g	440			Mass of Mold g	8458		
C. Mass Moisture (A-B)	30			Mass of sample g	4849		
D. Mass Can g	100			Unite Wet Mass g/cm^3	2.20		
E. Mass of Dry Soil (B-D)	340			Percent Moisture %	8.82		
F. %Moisture ((C/E*100)	8.82			Unite Dry Mass g/cm^3	2.02		

Penetration mm	Test No. 1				Test No. 2				Test No. 3			
	Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /		Molded /		TESTED /	
	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%	Total	Unit	Corr.	%
	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR	Load kg	Load (K/cm ²)	Load K/cm ²	CBR
0	0	0.00										
0.64	44	2.27										
1.27	86	4.44										
1.90	143	7.39										
2.54	211	10.90		15.80								
3.81	370	19.12										
5.08	511	26.40		25.63								
7.62	683	35.29										

Swell

Specimen Name:	1		
Mold No.	1		
Final Hight mm	4.65		
Initial Height mm	4.65		
Difference mm	0		
Sample Length mm	125.00		
Percent Swell %	0.00		

Test No.	1		
Blows Per Layer	65		

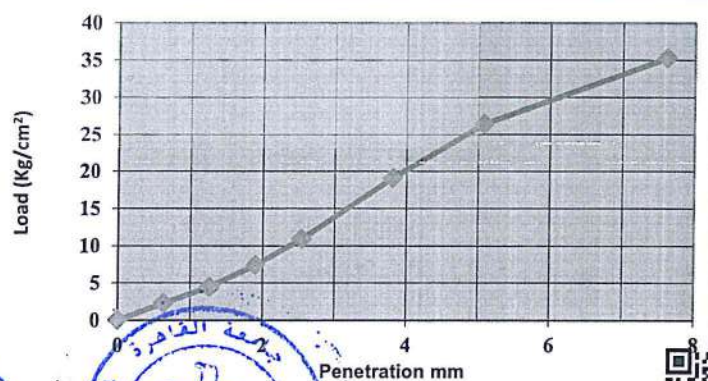

Tested By

Approved



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب محامل الاستشارات الهندسية

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 18-06-2023
Report No : 73
Location : slope protection right side st (493+000) : st (493+300)

Cx = 75 m³

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days								
11-6-2023	18-6-2023	7	slope protection right side st (493+000) : st (493+300)	7968	7972	2.36	753	341	321	128
				7984			678	307		
				7964			695	315		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ و معالجة العينات

CEL
مكتب محامل الاستشارات الهندسية
بمصلحة الهندسة 557-558-559
مركز تقيس : شارع النور 73-74-75
Signature

3-El-Matek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 18-06-2023
Report No : 74
Location : slope protection right side st (493+000) : st (493+300)

$Q = 75$

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
11-6-2023		18-6-2023	7	slope protection right side st (493+000) : st (493+300)	7928	7953	2.36	646	293	278	111
					7973			654	296		
					7957			539	244		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ و معالجة العينات

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المعامل الشهري
بمبنى المحلة الجديدة - شارع ١٠٠٠ - القاهرة
التوقيع: السيد عبد الملك

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 19-06-2023
Report No : 85
Location : slope protection right side St. (493+000) : (493+300)

Qs 70 M COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
12-6-2023	19-6-2023	7	slope protection right side St. (493+000) : (493+300)	8290	8247	2.44		601	272	267	107
				8321				537	243		
				8130				633	287		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن أي عيوب في معالجة العينات



Signature /.../ 3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 19-06-2023
Report No : 86
Location : slope protection right side St. (493+000) : (493+300)

Q = 7.5 COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days								
12-6-2023	19-6-2023	7	slope protection right side St. (493+000) : (493+300)	8248	8222	2.44	603	273	272	109
				8230			538	244		
				8189			659	299		

Note: تم توريد الكميات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 09-07-2023
Report No : 123
Location : slope protection right side St. (493+000) : (493+300)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350

Casting	Date of	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
11-6-2023		9-7-2023	28	slope protection right side St. (493+000) : (493+300)	8157	8272	2.45	699	317	352	141
					8263			839	380		
					8395			793	359		
					8357	8350	2.47	758	343	348	139
					8343			811	367		
					8351			738	334		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ العينات

Signature: 

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 10-07-2023
Report No : 132
Location : slope protection right side St. (493+000) : (493+300)

Q: 70 COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density		Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³) ³					
12-6-2023	10-7-2023	28	slope protection right side St. (493+000) : (493+300)	8172	8204	2.43		725	328	315	126
				8242				641	290		
				8198				720	326		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذ ومعالجة العينات.

CEL
مكتب محامل الاستشارات الهندسية
رقم التسجيل ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١
العنوان ٣ شارع الملك ابدال - القاهرة

Signature /

٣ شارع الملك ابدال
القاهرة - الزمالة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 10-07-2023
Report No : 133
Location : slope protection right side St. (493+000) : (493+300)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350

Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing										
12-6-2023	10-7-2023	28	slope protection right side St. (493+000) : (493+300)	8156	8154	2.42	600	272	309	124	
				8103				342			
				8202				312			

Note: تم توريد الكميات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة اختبار ومعالجة العينات

Signature / ...

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 13-06-2023
Report No : 61
Location : slope protection right side st (493+300) : st (493+600)

CS 45

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
6-6-2023	13-6-2023	7	slope protection right side st (493+300) : st (493+600)	8132	8172	2.42	676	306	281	112
				8122			571	259		
				8262			611	277		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اخذها معالجتها العيانات

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الهندسة المدنية
2019-2024 - ECT - 2019-2024
البريد الإلكتروني : info@cel-egypt.com - الهاتف : 27367231

Signature / *[Signature]*

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب محامل الاستشارات الهندسية

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 15-06-2023
Report No : 63
Location : slope protection right side st (493+300) : st (493+600)

Qs 135

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³) ³	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing									
8-6-2023	15-6-2023	7	slope protection right side st (493+300) : st (493+600)	8037	7986	2.37	583	264	251	101
				7953			511	231		
				7968			571	259		
				8328	8315	2.46	653	296	272	109
				8310			595	270		
				8308			552	250		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية اختبار ومعالجة العينات

مكتب محامل الاستشارات الهندسية
القسم المختبري
249 - 257 - 258
الموقع: شارع القاهرة - النيل - القاهرة - 11511

Signature / ...

Signature / ... El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد الملك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 04-07-2023
Report No : 128
Location : slope protection right side st (493+300) : st (493+600)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
6-6-2023	4-7-2023	28	slope protection right side st (493+300) : st (493+600)	8164	8129	2.41	775	351	350	140
				8093			796	361		
				8131			747	338		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

Signature /
مكتب محامل الاستشارات الهندسية
243-894-537
243-894-537
243-894-537
243-894-537

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : سيد عبد المالك
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 06-07-2023
Report No : 126
Location : slope protection right side st (493+300) : st (493+600)

Q 135 COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C 250/350 OPC

Casting	Date of Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
8-6-2023	6-7-2023	28	slope protection right side st (493+300) : st (493+600)	7986	8123	2.41	807	366	343	137
				8136			683	309		
				8247			782	354		
				8143	8212	2.43	804	364	333	133
				8263			720	326		
				8231			679	308		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذها معاملة العينات

Signature /
المستند رقم 135
تم الصنع في 06-07-2023
الموقع: القاهرة

S El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. المالك الأفضل
القاهرة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة سيد عبد المالك سيد يونس مقاولات عمومية واستيراد وتصدير

من المحطة 493+000 الى المحطة 494+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/07/06

- بناء على طلب المقاول شركة سيد عبد المالك سيد يونس مقاولات عمومية واستيراد وتصدير لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية) على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه .

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي
ممثل استشاري المساحة مكتب XYZ
مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي
مندوب شركة سيد عبد المالك سيد يونس

- 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي
- 2- السيد المهندس / مصطفى نجم
- 3 السيد المهندس / محمد خليل
- 4- السيد المهندس / كمال نجيب
- 5- السيد المهندس / احمد سيد عبد المالك

وتبين ان المحجر على مسافة 210 كم من منتصف قطاع شركة سيد عبد المالك سيد يونس


N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7 "

احداثي المحجر

N 31 ° 02 ' 39.85 " E 28 ° 01 ' 18.78 "

احداثي منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،،



5- احمد سيد عبد المالك
4-
3-
2-
1-

رقم الوثيقة 1 539 هـ / 2
رقم الملحق
نوع التأمين جميع اخطار مقاولين



مطالبة سداد

الفرع
نوع التأمين
القطاع
عماد الدين
هندسى
خاص

منشأة / سيد عبدالمالك سيد يونس

مطلوب من

الهيئة العامة للطرق والكبارى

لصالح

القيمة البالغة قدرها فقط خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنية مصرى لا غير
وذلك سداد للقسط الوارد بهذا الايصال وذلك عن مبلغ التأمين قدره 6 000 000.00 جنية مصرى

جنية مصرى

5 520.00	القسط الصافى
304.00	نصف دمغة النسيجه
34.00	رسم الاشراف والرقابه
5.00	نصف دمغة الاتساع
50.00	مصاريف الاصدار
5.00	رسم تنميه موارد
17.00	مصاريف الهيئه
5 935.00	القسط الاجمالى
جنية مصرى	

بها	الوثيقه المبينه
المستحقه عن	بهذا الايصال وذلك وفقا للتفصيل الوارد
بها	الملحق المبين
عن المدة من	2023/11/07
الى	2024/11/07
تاريخ السداد	

تحريرا فى 2023/11/20

إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢

2022/11/28

32581

حافظ

شروق فريد فايز

اسم المنتج

276.00 %

5.00

العموله الاصليه قبل الاستقطاعات



وثيقه تأمين جميع اخطار المقاولين

الفرع عماد الدين

رقم الوثيقه 1539 هـ / 2

اسم المؤمن له منشأة / سيد عبدالملك سيد يونس

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المقاوله عقد مقاول رقم (2024 / 2023 / 655) والخاص بأعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
موقع العمل (قطاع العلمين - فوكه) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابى والحمايات المسافة من الكم 493.000 الى الكم 494.000 بطول 1 كم

وصف المشروع

مدة التأمين

أ - بالنسبة للاعمال يبدأ التأمين فى ٢٠٢٣/١١/٠٧ الساعة الثانيه عشره ظهرا وينتهى فى ٢٠٢٤/١١/٠٧ الساعة الثانيه عشره ظهرا

ب - بالنسبة لاعمال الصيانه وتبدأ فى وتنتهى فى
الساعة الثانيه عشره ظهرا
الساعة الثانيه عشره ظهرا

مبلغ التأمين

القسم الاول الاضرار الماديه ٦.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

القسم الثانى المسئوليه المدينه قبل الغير ١.٠٠٠.٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار الماديه

البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- اعمال المقاوله الاعمال الدائم والمؤقته متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد 1/1 - قيمه العقد	60000000 جم	ال 20% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 50000 جم
2/1 الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع 2 - ادوات ومهمات التشييد	لا يوجد	
3 - الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق	لا يوجد	
4 - ازاله الانقاض	لا يوجد	
5 - المنشآت المؤقته	لا يوجد	

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
ادارة التأمينات الهندسيه

فرع عماد الدين ٢/٢٤٢

محمد ذكى احمد على

التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد : ٦٢ اorman - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥



التحملات	حدود التعويض	الآخطار الطبيعية
	غير مغطى	1 - الزلازل / البراكين / الأعاصير
	غير مغطى	2 - العواصف / الزوايع / الفيضانات / غمر المياه / انزلاق وانهيار التربة
	غير مغطى	

(1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد القسم الثاني
المسئوليه المدنيه قبل الغير

التحملات	حدود التعويض	البنود المؤمن عليها
	100000 جم (مائة الف جنيهها لا غير)	1 - الاصابات الجسمانيه
	200000 جم (مائتان الف جنيهها لا غير)	1/1 للشخص الواحد
	500000 جم (خمسائة الف جنيهها لا غير)	2/1 مهما كان عدد الاشخاص
ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 5000		2 - الاضرار الماديه للممتلكات

(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحده 1000000.00

يعتبر متمما لهذه الوثيقة طلب التامين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التاليه والمرفقه جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة

ملحق وسائل مكافحه الحريق

مرفق شرط سقوط الحق

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية
قرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمد زكى أحمد على

التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٦٨١٠
بريد : ٦٢ اorman - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية



من المعلوم والمتفق عليه مايلى :-

- ان الوثيقة لا تغطى اى خسائر او اضرار او تلفيات ناتجة عن عمليات الارهاب او التخريب
- انه من ضمن تغطيات الوثيقة تغطية خطرى الحريق والسطو المسلح
- بشرط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه وان شركة المهندسين للتأمين غير مسنولة عن اية حوادث تكون قد وقعت خلال الفترة السابقة
- الحد الاقصى للتعويض الواحد 500 الف جنيه مصرى
من المعلوم والمتفق عليه ايضا"

- انه فى حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات التى تستحق
بموجبها الى الهيئة العامة للطرق والكبارى
- لايجوز اجراء اى تعديلات الا بعد اخذ موافقة كتابية من
الهيئة العامة للطرق والكبارى

5 520.00	القسط الصافى
304.00	نصف الدفعة النسبية
34.00	رسم الاشراف والرقابة
5.00	نصف الدفعة النوعية
50.00	مصاريف الاصدار
5.00	رسم تنمية موارد
17.00	مصاريف الهيئة
5 935.00	القسط الاجمالى

فقط خمسة الاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنية مصرى لاغير

تحريرا فى 2023/11/20

صفحة 3 من 3

2022/11/28

32581

شروق فريد فايز حافظ

اسم المنتج

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
قرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمد ذكى احمد على
التوقيع

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352097 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٣٣٣٦٨١٠٧

بريد : ٦٢ الاورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠٦

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدخل والنسبة والنوعية

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد

نوع التأمين : ج. أ. مقاولين

وثيقة رقم : ١٥٣٩ ٢/هـ

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة أو الملحقه بها وفيما عدا ذلك. فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-
١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الأوقات مع تقدم العمل.

ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقتة
٢- يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .
٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة فى الانشاء .
أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات .
٤- أن يتم إزالة النفايات بانتظام - إزالة النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أى نوع مثل:-

- عمليات الجلف، التقطيع، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
- استعمال النتومين الساخن - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
يتم تنفيذ (العمل الحرارى) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحرارى) بعد انتهاء هذا العمل بساعة .
٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحوائط غير قابله للحريق.

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية
قسم عماد الدين ٢/٢٤٢
محل ذكى أحمد على

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٧

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

info@mohins.com

يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي عمل حراري.

- ٧- تعيين منسق أمان بالموقع.
- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك.
- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام .-
- ان يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية أسبوعيا .
- ان يكون اقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فورية مجهزة له في جميع الأوقات .
- ٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين : ٥٠٠٠٠٠ جم (خمسائة الف جنيها لاغير)


MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمد ذكي أحمد علي

التوقيع

شروط سقوط الحق

- تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-
(أ) إذا أدلي المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة علي قبول التأمين ، أو إذا أخفي عمدا عن الشركة بيانات كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.
(ب) مخالفة القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط التأميني إذا انطوت علي جناية أو جنحة عمديه.
ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في التعويض عن الحادث المؤمن منها إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطويعلي غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا .

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
قرع عماد الدين ٢/٢٤٢
محمّد زكي أحمد علي
التوقيع



مطالبة سداد

ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦
سجل تجارى رقم ٨٤٦٣٤ - الجيزة
الفرع

رقم الوثيقة / ١٦٠٠٠/
رقم الايصال / ٧١٣٢
تحريرا فى / ٢٠٢٣/١١/٢٠

نوع التأمين / حوادث شخصية
القطاع / خاص
مطلوب من / منشأة / سيد عبدالمالك سيد يونس
العنوان /
مبلغ التأمين / ١٣٠٠٠٠ جنية مصرى
الصلاحيه / الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان حساب الرسوم

المدة من	الى	القسط الصافى
٢٠٢٣/١١/٠٧	٢٠٢٤/١١/٠٧	١٩٧,٠٠
التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يغطى الحوادث الناتجة عن خطر الارهاب و التخريب و الشغب و الاضطرابات الاهلية.		دمغة نسييه ٣,٠٠
		مصاريف الاصدار ٥٢,٠٠
		مصاريف الاشراف ٢,٠٠
		دمغة الاتساع ٤,٠٠
		رسوم خدمات مراجعة و اعتماد ٠,٦٧
		صندوق حملة وثائق ١,٣٣
فقط مائتي و ستون جنية مصرى لا غير		القسط الاجمالى ٢٦٠,٠٠ جنية مصرى

شروق فريد فايز حافظ

٣٢٥٨١

العمولة الاصلية قبل الاستقطاعات

١٠,٠٠ %

١٩,٧٠

شركة المهندسين للتأمين
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محسن أحمد مختار



وثيقة تأمين حوادث شخصيه

الفرع المصدر	عماد الدين	رقم الوثيقة	١٦٠٠٠ / ٢	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/١١/٢٠
العملة	جنية مصرى	مدة التأمين من	٢٠٢٣/١١/٠٧	ظهري الى	ظهري
اسم المتعاقد	منشأة / سيد عبدالملك سيد يونس				
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق				
العنوان	الهيئة العامة للطرق والكبارى				
لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى				
العملة	جنية مصرى	مدة التأمين من	٢٠٢٣/١١/٠٧	ظهري الى	ظهري
اسم المتعاقد	منشأة / سيد عبدالملك سيد يونس				
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق				
العنوان	الهيئة العامة للطرق والكبارى				
لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى				

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
من المعلوم والمتفق عليه
- أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عالية تقتصر على عدد (١) مهندس وعدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ فنى و (١) سائق معدة او سيارة ومن فى حكمهم و (١) عامل بدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل داخل نطاق العمل بعملية اسناد اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشار القطر الكهربائى السريع الخط الاول (العين السفينة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابى والحمايات المسافة من كم ٩٣,٠٠٠ الى كم ٩٤,٠٠٠ بطول ١ كم وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة ولا سقط حقه فى التعويض - لايجوز إجراء أية تعديلات فى بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من لهيئة العامة للطرق والكبارى / المستفيد عقد رقم ٢٠٢٣/٦٥٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١ / ٠٧ بتاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٠٧ -

القسط الصافى	نصف الدفعة النسبية	نصف الدفعة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالى
١٩٧,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤,٠٠٠	٥٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٦٧	١,٣٣	٢٦٠,٠٠٠

فقط مائتي و ستون جنية مصرى لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

- اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / اول من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثانيا : اذا اصاب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثالثا : اذا اصاب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- رابعا : اذا اصاب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمس فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبنود ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد اقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

وثيقة تأمين حوادث شخصية



الفرع المصدر	عماد الدين	رقم الوثيقة	١٦٠٠٠ / ٢	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/١١/٢٠
العملة	جنية مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٣/١١/٠٧	ظهر الى	٢٠٢٤/١١/٠٧
				ظهرا	

٣٢٥٨١

شروق فريد فايز حافظ

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها

٢٠٢٣/١١/٢٠

تحريرا في

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع

(Signature)



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٦٠٠٠ ر/ ٢

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
عدد (١) مهندس بدون ذكر اسم	مهندس	١	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٥٢,٥٠
عدد (١) مساعد مهندس بدون ذكر اسم	مساعد مهندس	١	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٥,٥٠
عدد (١) سائق معدة أو سيارة بدون ذكر اسم	سائق معدة أو سيارة	١	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٣,٠٠٠
عدد (١) عامل بدون ذكر اسم	عامل	١	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٣,٠٠٠
اجمالي مبلغ التأمين			١٣٠٠٠٠	جنية مصرى	

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥,٠٠٠

٣٩,٥٠

أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون

من المعلوم والمتفق عليه

أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب الوثيقة عالية تقتصر على عدد (١) مهندس وعدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ فني و (١) سائق معدة او سيارة ومن في حكمهم و (١) عامل بدون ذكر اسم اثناء وبسبب العمل داخل نطاق العمل بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (العلمين - فوكة) مراحل استكمال تشكيل الجسر الترابي والحمايات المسافة من كم ٩٣,٠٠٠ الى كم ٩٤,٠٠٠ بطول ١ كم وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب الوثيقة وإلا سقط حقه في التعويض - لايحوز اجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من لهيئة العامة للطرق والكبارى / المستفيد عند رقم ٢٠٢٣/١١/٠٧ بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠٢٣/١١/٠٧ -

صافي القسط

١٩٧,٠٠

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.

شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحوادث المتنوعة

فرع عماد الدين ٢/١٨٦

صلاح محمد أحمد مختار

التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٣٣٣٦٨١٠

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقي - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة السنوية واللوحة
