

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبنس) قطاع الخطة ... الروبيكي تنفيذ شركة ... الريادة...

بيان بالجمالي الاعمال التي تمت صرفها من بداية العمل حتي تاريخه

م	البند	عقد عملية ٤٨٣/٢٠٢٣/٢٠٢٤						عقد استكمال ١ (٤٣٠/٢٠٢٤/٢٠٢٥)			اجمالي الكمية المنصرفة للقطاع
		جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	ختامي	اجمالي	جاري ١	جاري ٢	ختامي ٣	اجمالي	
1	plat load test										
5_1	عمل اختبار plat load test بالمعد	7	0	63	23	93	0	43		43	136
2	بند الحفر										
1_2	حفر ترابه عدا الصخريه	8800	0	3000	600	12400	0	0	0	0	12400
-	علاوة النقل {١,٠٥ * كم 9.5}	8800	0	3000	600	12400	0	0	0	0	12400
2_2	حفر في جميع انواع التربه عدا الصخريه	26300	0	2000	449,382	28749.38	0	0	0	0	28749.3817
	علاوة النقل {١,٠٥ * كم 9.5}	26300	0	2000	449,382	28749.38	0	0	0	0	28749.3817
3	بند الاتربة										
2--3	تحميل ونقل الاتربة										
	للقرمة	0	4653	0	0	4653	12600	0	0	12600	17253
	للجزء العلوي	2449.1	22884.9	0	0	25334	0	0	0	0	25334
	للجزء السفلي	12836	1524.67	0	0	14361	0	0	0	14000	28361
	علاوة النقل {1.65 * 48} جنيهه	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000
	مقالت بطول ٣,٦ كم = ٠,٢٥*٣,٦ = ٠,٩ جنيهه	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	14000
	علاوة النقل {١,٤٥ * 33} جنيهه	6170.4	29062.6	0	0	35233	12600	0	0	12600	47833
	علاوة النقل {1.6} كم 1.٤٥ * ١,٤٥ جنيهه	9115.6	0	0	0	9115.55	0	0	0	0	9115.55
5	بند طبقة الاساس										
1_5	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس	0	1259	0	0	1259	8000	0	0	8000	9259
	مسافة النقل {80 * كم ١,٢٥} جنيهه	0	1259	0	0	1259	8000	0	0	8000	9259
	مسافة النقل {22 * كم ١,٠٥} جنيهه	0	1259	0	0	1259	8000	0	0	8000	9259


مختص البيئة

مختص المسئول بي البيئة

مختص الشركة

٢٤/١٢/٢٠٢٤

١٢/١٢/٢٠٢٤



محضر اعتماد حصر كميات للقطاع

التاريخ	04/03/2025	الموافق يوم	الثلاثاء
اسم المشروع		اصمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العائش من رمضان / بليس)	
قطاع	01+000/02+000	اتجاه	الروبيكي
		اسم الشركة المنفذة :	الريادة

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمر اجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (الريادة)و اعتمادها من الاستشاري العام للهيئة القومية للسكة حديد مصر (خط الروبيكي) .
 عقد رقم {٢٠٢٤/٤٣٠/٢٠٢٥}

ملاحظات	الكمية الاجمالية المنفذة	البند	بند ٣- الاتربة	بند ٥- طبقات الاساس	توريد وفرش طبقات اساس م٣	1_5
	43	plat load test				
		تحميل ونقل الاتربة				2_3
	12600.00	للفرمة				
	0.00	للجزء العلوي				
	14000.00	للجزء السفلي				
	26600.00	اجمالي كميات التربة				
	8000					

مهندس المشرف

مهندس المشرف

مهندس استشاري الجبنة

مهندس استشاري الجبنة



	١	٢
البيانات		
المنفذ	الفئة	الوحدة
٤٣	٢٧٥,٠٠٠	العدد
		حصر عمال تربية لقطاع شركة الريادة المحطة من ٦٨٠+٢ الى ٣٠٠+
		بالمر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتر به مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمة (علي الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء الطوري (علي الا نقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي مسافة النقل = ٥٠ كم - ٣ كم = ٤٨ كم * ٦٥ جنية معدات بطول ٣,٦ كم = ٦,٣٥ * ٩ = ٥٩ جنية
		٢_٣

الحق كذا

رقم العقد 430/2025/2024
بيان الاعمال التي تمت في العقد الي تاريخه ٢٠٢٥/٣/٤

بيان الأعمال التي تمت في العقد الي تاريخه ٢٠٢٥/٣/٤

م	النبد	مقد رقم {٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٣٠}			
		مقابلة المقعد	جاري ٢	مقابلة مقابلة ١	اجمالي
5-1	عمل اختبار plat load test بالحد	50	43	43	43
3	بند الاتربة بالمتر المكعب نقل وثريد التربه				
2-3	جزء القرصه	15000	0	12600	12600.00
	للجزء العلوي	500	0	0	0.00
	للجزء السفلي	500	14000	15000.00	14000.00
	علاوة النقل {33} * 1,7٥ جنيهه		0	12600	12600.00
	علاوة النقل {48} * 1.65 جنيهه		14000	0	14000
5	مققات بفرول ٣,٦ كم * ٢,٥٣ * ٩,٠ جنيهه		14000	0	14000
	بند طبقات الاساس				
1-5	بالمتر المكعب ثوريد وفرش طبقة اساس	9000	0	8000	8000
	مسافة النقل ١٢٢ كم				
	مسافة النقل 80 * ٥,٥ جنيهه		0	8000	8000
	مسافة النقل {22} * ١,٢ جنيهه		0	8000	8000

مهندس استشاري الهيئة

معتمد
الشركاء



ضبط جودة لمشروع اصلاح الجسر الترابي لمشروع خط سكه حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)

شركة الريادة للمقاولات العموميه و التوريدات

المسافة من ١٠١ + ٦١٠ الي ٣ + ٥٠٠

م	التاريخ	المعمل	نوع الصلاحية	نوع الطبقة	نوع STA.	تصنيف التربة	اكبر قطر للحبيبات	نسبة المواد الناعمة > ٢٠٠	معامل اللدونة	حد السيولة	امتصاص المياه	انتفاش حر	نسبة التآكل طبقا لاختبار لوس انجلوس	اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	النتيجة	ملاحظات
1	10.02.2025	توشت	تربة ردم	ردم سفلي	02+900	A-1-b	-	8.0%	2.4%	21.1%	-	0.0%	-	31.9%	مقبول	
2	10.02.2025	توشت	تربة ردم	ردم سفلي	03+400	A-1-b	-	7.0%	4.3%	19.8%	-	0.1%	-	31.7%	مقبول	
3	15.02.2025	جامعة الزقازيق	تربة ردم	ردم سفلي	03+200	A-1-b	-	5.0%	N.P	N.P	-	0.0%	-	32.0%	مقبول	

مهندس الهيئة
يعتمد.....

الاستشاري الدائم (مكتب محرم باخوم)
مهندس الاشراف
يعتمد.....

مهندس الشركة

جميع الاختبارات والنتائج تمت طبقا لكراسة الشروط والمواصفات اصدار ج

مورس

٢١٠١



مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

التاريخ :-	6/1/2025	الإتجاه :-	الوصلة الرئيسية
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العمومية و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - C 1

رفع ميزانية شبكية لقطاع شركة الوطنية

:- برجاء التكرم بطلب استلام الآتي

نوع العمل :-	اعمال مساحية	وصف العمل :-	رفع ميزانية شبكية لقطاع شركة الوطنية
مكان العمل :-	02+000	توقيع مهندس الشركة :-	03+900
ترقيم السكة الحديد :-	01+610		03+510
رقم تكرار تقديم الطلب :-	الاول ☒	الباقي ☐	الباقي ☐

المستول

موقف الأعمال السابقة :-

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل	مستوفى ☐	غير مستوفى ☐	

ملاحظات :-

موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبغاد تقديمه ☐

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يعتمد ،،

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /

محمد

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

التاريخ :-	2/1/2025	الإتجاه :-	الوصلة الرئيسية
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العمومية و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 3

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km
_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification

استكمال عرض مسار السكة علي الجانب الايمن علي
منسوب (3.5) طبقا لتصميم :-

:- برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسي

نوع العمل :-	اعمال مساحية	وصف العمل :-	طبعة ردم علي منسوب (3.5 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركة :-	
ترقيم السكة الحديد :-	03+280	03+200	
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسئول	موقف الأعمال السابقه :-
	1- الاعمال المساحية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	2- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	3- الاعمال المدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	4- العرض الكامل ☐ مستوفى ☐ غير مستوفى

ملاحظات :-

موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بحالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يتمتع

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

التاريخ :-	2/1/2025	الإتجاه :-	الوصله الرئيسي
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 4

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km
_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification

استكمال عرض مسار السكة علي الجانب الايمن علي
منسوب (-4 م) طبقا لتصميم :-

:- يرجى التكرم بطلب إستلام الأتي

نوع العمل :-	اعمال مساحية	وصف العمل :-	طريقة ردم علي منسوب (-4 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركة :-	
ترقيم السكة الحديد :-	03+280	03+500	
رقم تكرار تقديم الطلب :-	☒ الاول	☐ الثاني	☐ الثالث

المستول

موقف الأعمال السابقة :-

مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	1- الاعمال المساحية :
مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	2- اعمال الجوده :
مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	3- الاعمال المدنية :
مستوفى	غير مستوفى		4- العرض الكامل

ملاحظات :-

☐ مرفوض ويعاد تقديمه

☐ موافق مع عمل الملاحظات بحالية

☐ موافق

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

بمقتد

مهندس البيئة

الاسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر التزايي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس)

التاريخ :-	3/2/2025	الإنتاج :-	الوصلة الرئيسية
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العمومية و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 5

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km
_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification

تصميم طبقة ردم علي منسوب (-2.5 م) طبقا لتصميم :-

:- يرجى التكرم بطلب إستلام الآتي

نوع العمل :-	اعمال مساحية+ مواد	وصف العمل :-	تصميم طبقة ردم علي منسوب (-2.5 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركة	
ترقيم السكة الحديد	02+780	02+880	
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☒	البالي ☐

المسئول	موقف الأعمال السابقه :-
١- الاعمال المساحية :	مقبول ☒
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐
٣- الاعمال المدنية :	مقبول ☐
٤- العرض الكامل	مستوفى ☐

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بحالية ☐	مرفوض وبعاد تقديمه ☐
----------------------	--------------------------------	--	---

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يقعد ،،

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)

التاريخ :-	3/2/2025	الإتجاه :-	الوصلة الرئيسية
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العمومية و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 6

تصميم طبقه ردم على منسوب (-3.0 م) طبقا لتصميم :-			
تصميم طبقه ردم على منسوب (-3.0 م) طبقا لتصميم :-			
نوع العمل :-	اعمال مساحية + مواد	وصف العمل :-	تصميم طبقه ردم على منسوب (-3.0 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركة :-	
ترقيم السكة الحديد :-	02+880	03+020	
رقم تكرار تقديم الطلب :-	☒ الاول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسئول	موقف الأعمال السابقة :-
١- الاعمال المساحية :	مقبول
٢- أعمال الجودة :	مقبول
٣- الاعمال المدنية :	مقبول
٤- العرض الكامل	غير مستوفى

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بحالية	مرفوض وبعاد تقديمه
----------------------	-------	-------------------------------	--------------------

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يقدم ،،

مهندس الهندسة

الاسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)

التاريخ :-	5/2/2025	الإتجاه :-	الوصلة الرئيسية
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العمومية و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 7

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km
_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification

طبقة ردم على منسوب (3.0 م) طبقا لتصميم :-

نوع العمل :-	أعمال مساحية + مواد	وصف العمل :-	طبقة ردم على منسوب (3.0 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركة	
ترقيم السكة الحديد :-	03+160	03+020	
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

موقف الأعمال السابقة :-

المستوفى	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
١- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	

ملاحظات :-

مرفوض ويعاد تقديمه ☐ موافق مع عمل الملاحظات بحالة ☐ موافق ☐

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يعقده

مهندس الهينة

الاسم /

التوقيع /

أ. م. م. م.

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس)

التاريخ :-	6/2/2025	الإتجاه :-	الوصله الرئيسي
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 8

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km
_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification

طبقة ردم على منسوب (3.0 م) طبقا لتصميم :-

:- يرجىاء التكرم بطلب إستلام الأتى

نوع العمل :-	اعمال مساحية + مواد	وصف العمل :-	طبقة ردم على منسوب (3.0 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركة :-	
ترقيم السكة الحديد :-	03+280	03+160	
رقم تكرار تقديم الطلب :-	☒ الاول	☐ الثانى	☐ الثالث

موقف الأعمال السابقة :-

١ - الاعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢ - أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣ - الاعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤ - العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	

ملاحظات :-

مرفوض وبعد تقديمه ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بحالية ☐ موافق ☐

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يعتمد ،،

مهندس الهيئة

الاسم /

التوقيع /

يعتمد ،،

مهندس استشارى الهيئة

الاسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر الترابي لحظ سكه حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

التاريخ :-	9/2/2025	الإتجاه :-	الوصله الرئيسي
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 9

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km
_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification

طبقة ردم علي منسوب (2.0 م) طبقا لتصميم :-

:- برجاء التكرم بطلب إستلام الأتسى

نوع العمل :-	اعمال مساحية + مواد	وصف العمل :-	طبقة ردم علي منسوب (2.0 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركة :-	
ترقيم السكه الحديد :-	02+780	02+880	
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

موقف الأعمال السابقة :-	المسئول
١- الاعمال المساحية :	مقبول ☒ مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☒ مرفوض ☐
٣- الاعمال المدنية :	مقبول ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل	مستوفى ☐ غير مستوفى ☐

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
----------------------	--

* تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يعقّد

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /

١٨٢١

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية
TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

2

Test

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: from st. 2+780 to 2+830
soil name: -2

date: 12/2/2025

plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement

stress mn/m2	bar	1	2	Average
0.01	5.3	25.87	22.41	0.00
0.08	42.3	25.50	22.16	0.31
0.16	84.7	25.23	21.89	0.58
0.25	132.4	24.86	21.48	0.97
0.33	174.8	24.47	21.15	1.33
0.42	222.5	24.19	20.88	1.61
0.5	264.8	23.90	20.53	1.93
0.25	132.4	24.22	20.77	1.65
0.125	66.2	24.58	20.96	1.37
0.01	5.3	24.83	21.24	1.11
0.08	42.3	24.47	21.12	1.35
0.16	84.7	24.10	20.87	1.66
0.25	132.4	23.86	20.73	1.85
0.33	174.8	23.75	20.67	1.93
0.42	222	23.52	20.45	2.16



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - يازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979


2

Test

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: from st. 2 +780 to 2 +830
soil name: -2
date: 12/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

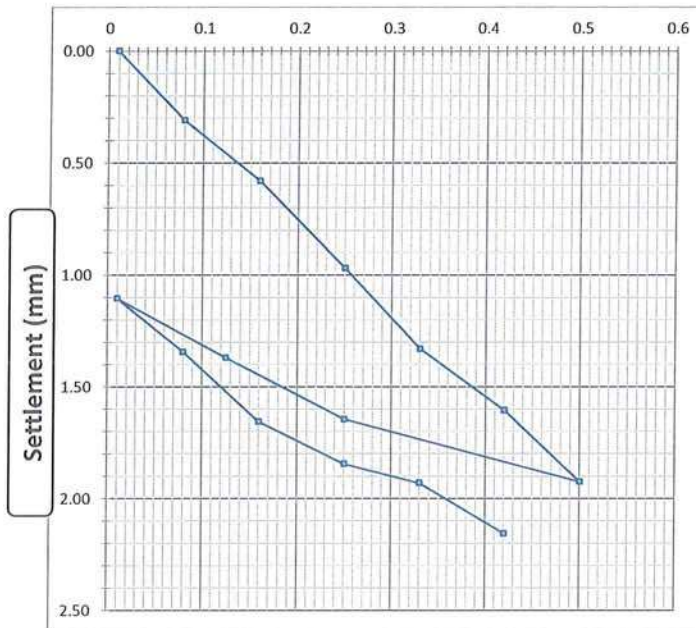

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.39
0.3 σ =	0.15	0.55
0.7 σ_2 =	0.35	1.98
0.3 σ_2 =	0.15	1.62

Ev1=	53.3	Mn/m2
Ev2=	123.7	Mn/m2

Ev2/Ev1=	2.3
----------	-----



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - تقاذية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979



توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: from st. 2 + 830 to 2 + 880
soil name: -2
date: 12/2/2025

plate diameter :600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement

<u>stress mn/m2</u>	<u>bar</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>Average</u>
0.01	5.3	24.35	26.44	0.00
0.08	42.3	24.15	26.25	0.20
0.16	84.7	23.85	26.10	0.42
0.25	132.4	23.57	25.88	0.67
0.33	174.8	23.24	25.55	1.00
0.42	222.5	22.98	25.26	1.28
0.5	264.8	22.76	24.97	1.53
0.25	132.4	22.84	25.12	1.42
0.125	66.2	23.15	25.35	1.15
0.01	5.3	23.57	25.65	0.79
0.08	42.3	23.24	25.42	1.07
0.16	84.7	23.05	24.67	1.54
0.25	132.4	22.92	24.58	1.65
0.33	174.8	22.75	24.47	1.79
0.42	222	22.58	24.34	1.94




أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - تفاذية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: from st. 2 +830 to 2 + 880
soil name: -2
date: 12/2/2025
plate diameter : 600 mm

stress (mn/m2)

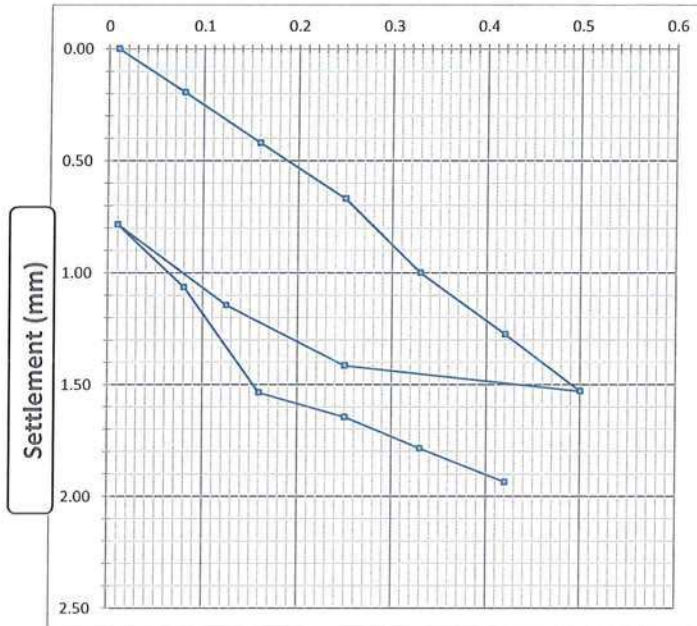

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 sigma=	0.35	1.06
0.3 sigma=	0.15	0.39
0.7 sigma2=	0.35	1.82
0.3 sigma2=	0.15	1.48

Ev1=	67.2	Mn/m2
Ev2=	131.5	Mn/m2

Ev2/Ev1=	2.0
----------	-----





مشروع أعمال الجسر الترابي لخط سكه حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس

التاريخ :-	9/2/2025	:- الإتجاه	الوصله الرئيسي
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	:- نطاق العمل	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 10

:- برضاء التكرم بطلب إستلام الآتى				طبقة ردم علي منسوب (-3.5 م) طبقا لتصميم :-		Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification	
:- نوع العمل		اعمال مساحية+ مواد		:- وصف العمل		طبقة ردم علي منسوب (-3.5 م)	
:- مكان العمل				:- توقيع مهندس الشركة			
:- ترقيم السكه الحديد		03+510	03+280				
رقم تكرار تقديم الطلب :-				الاول ☒	الباني ☐	البالت ☐	

موقف الأعمال السابقه :-				المسئول
١- الاعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
٢- أعمال الجوده :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
٣- الاعمال المدنيه :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
٤- العرض الكامل	مستوفى ☐	غير مستوفى ☐		

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐	مرفوض وبعاد تقديمه ☐
* تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .			
مهندس الهيئه			
الاسم /			
التوقيع /			
يقعد ،،			

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

التاريخ :-	10/2/2025	:- الإتجاه	الوصله الرئيسيه
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	:- نطاق العمل	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 11

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km
_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification

طبقة ردم علي منسوب (-2.5 م) طبقا لتصميم :-

:- برجاء التكرم بطلب إستلام الأتشي

:- نوع العمل	اعمال مساحية+ مواد	:- وصف العمل	طبقة ردم علي منسوب (-2.5 م)
:- مكان العمل		:- توقيع مهندس الشركة	
:- ترقيم السكة الحديد	02+880	03+040	
رقم تكرار تقديم الطلب :-	☒ الاول	☐ الثاني	☐ الثالث

المستوفى	موقف الأعمال السابقة :-
مقبول	١- الاعمال المساحية :
مقبول	٢- أعمال الجوده :
مقبول	٣- الاعمال المدنيه :
مستوفى	٤- العرض الكامل

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض وبعاد تقديمه
----------------------	-------	-------------------------------	--------------------

* تلزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

يعقده ،،

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /

يعقده ،،

مهندس استشاري الهيئه

الاسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس)

التاريخ :-	11/2/2025	:- الإتجاه	الوصله الرئيسي
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	:- نطاق العمل	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 12

:- برجاء التكرم بطلب إستلام الأتي		طبقة ردم علي منسوب (2.5 م) طبقا لتصميم :-		Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km _Alt.2_km2+500_shift+km25_modification	
:- نوع العمل		اعمال مساحية+ مواد		:- وصف العمل	
:- مكان العمل				:- توقيع مهندس الشركه	
:- ترقيم السكه الحديد		03+180		03+040	
رقم تكرار تقديم الطلب :-		☒ الاول		☐ الثاني	
		☐ الثالث			

موقف الأعمال السابقه :-		المستعمل	
١- الاعمال المساحيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- أعمال الجوده :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- الاعمال المدنيه :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل	مستوفى	غير مستوفى	

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض وبعاد تقديمه
* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .			
مهندس استشاري الهيئه	يعقبد ،،	مهندس الهيئه	يعقبد ،،
الاسم /	الاسم /	الاسم /	الاسم /
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بليس)

التاريخ :-	12/2/2025	الإتجاه :-	الوصله الرئيسيه
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 13

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified4_21-3-2024_km
_Alt.2_km2+500_shift+km25_modification

طبقة ردم علي منسوب (-2.5 م) طبقا لتصميم :-

:- برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى

نوع العمل :-	اعمال مساحية + مواد	وصف العمل :-	طبقة ردم علي منسوب (-2.5 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركة	
ترقيم السكة الحديد	03+280	03+180	
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

موقف الأعمال السابقه :-

المستول	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	١- الاعمال المساحية :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٢- أعمال الجوده :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٣- الاعمال المدنيه :
	مستوفى	غير مستوفى		٤- العرض الكامل

ملاحظات :-

مرفوض وبعاد تقديمه ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ موافق ☐

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يعقده ،،

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /

يعقده ،،

مهندس استشارى الهيئه

الاسم /


التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

التاريخ :-	17/2/2025	الإتجاه :-	الوصله الرئيسي
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 15

برجاء التكرم بطلب إستلام الأتي طبقه ردم علي منسوب (-2.0 م) طبقا لتصميم :- Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified5_21-3-2024_A0_24-4-2023_2			
نوع العمل :-	اعمال مساحية+ مواد	وصف العمل :-	طبقه ردم علي منسوب (-2.0 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركه	
ترقيم السكه الحديد	02+880	03+040	
رقم تكرار تقديم الطلب :-		☒ الاول ☐ الثاني ☐ الثالث	

المسئول	موقف الأعمال السابقة :-			
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	١- الأعمال المساحية :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٢- أعمال الجوده :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٣- الأعمال المدنيه :
	مستوفى	غير مستوفى		٤- العرض الكامل

ملاحظات :-	

نتيجة هذه الأعمال :-	☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه
----------------------	---

* تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

يعقده ،،

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /

يعقده ،،

مهندس استشاري الهيئه

الاسم /

التوقيع /

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية
TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

2

Test

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+020
soil name : -2.0
date: 17/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement


<u>stress mn/m2</u>	<u>bar</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>Average</u>
0.01	5.3	25.10	22.15	0.00
0.08	42.3	24.87	21.73	0.32
0.16	84.7	24.61	21.50	0.57
0.25	132.4	24.39	20.80	1.03
0.33	174.8	23.98	20.32	1.48
0.42	222.5	23.64	20.25	1.68
0.5	264.8	23.47	20.15	1.82
0.25	132.4	23.66	20.33	1.63
0.125	66.2	23.97	20.50	1.39
0.01	5.3	24.23	20.70	1.16
0.08	42.3	24.00	20.34	1.46
0.16	84.7	23.87	20.14	1.62
0.25	132.4	23.70	19.93	1.81
0.33	174.8	23.55	19.77	1.97
0.42	222	23.42	19.40	2.22



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+020
soil name : -2.0
date: 17/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

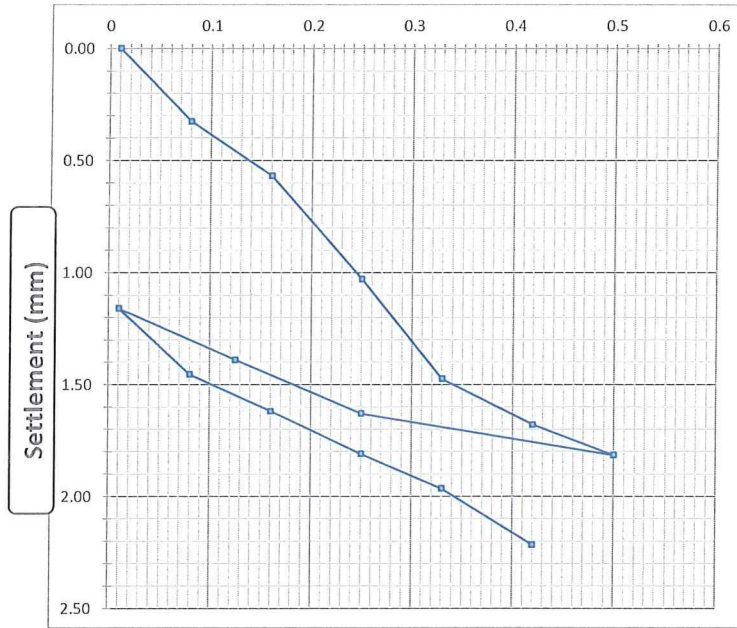

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.52
0.3 σ =	0.15	0.54
0.7 σ_2 =	0.35	2.02
0.3 σ_2 =	0.15	1.60

Ev1=	91.7	Mn/m2
Ev2=	213.7	Mn/m2

Ev2/Ev1=	2.3
----------	-----



توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله باسوس - محافظة القليوبية

project : (إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 2+960
Level : -2.0
date: 17/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement

stress mn/m2	bar	1	2	Average
0.01	5.3	22.70	19.00	0.00
0.08	42.3	22.55	18.75	0.20
0.16	84.7	22.30	18.54	0.43
0.25	132.4	22.10	18.27	0.66
0.33	174.8	21.89	17.90	0.96
0.42	222.5	21.67	17.73	1.15
0.5	264.8	21.45	17.52	1.37
0.25	132.4	21.85	17.90	0.98
0.125	66.2	22.15	18.16	0.70
0.01	5.3	22.60	18.35	0.38
0.08	42.3	22.35	18.12	0.62
0.16	84.7	22.13	18.05	0.76
0.25	132.4	21.95	17.90	0.93
0.33	174.8	21.81	17.81	1.04
0.42	222	21.67	17.65	1.19




أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - تفاذية بالموقع - بازوميتير - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله باسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 2+960
Level : -2.0
date: 17/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

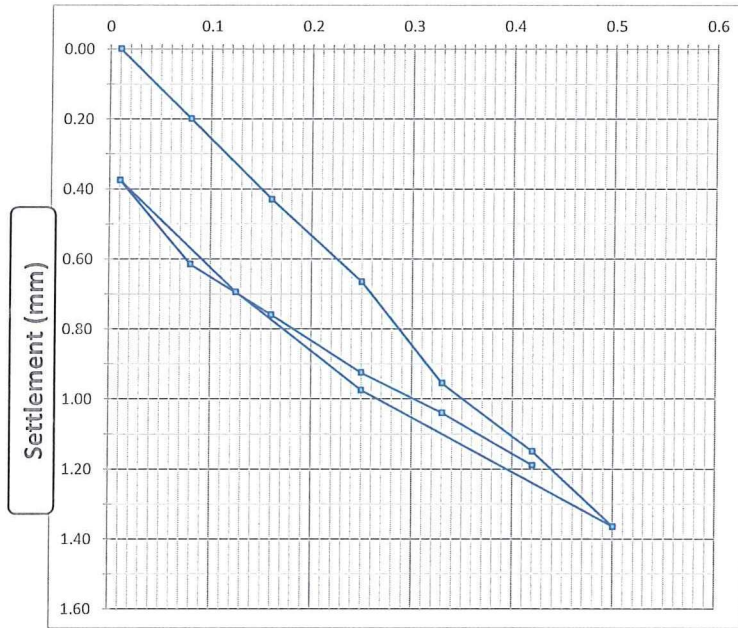

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.00
0.3 σ =	0.15	0.40
0.7 σ_2 =	0.35	1.07
0.3 σ_2 =	0.15	0.74

Ev1=	150.7	Mn/m2
Ev2=	271.5	Mn/m2

Ev2/Ev1=	1.8
----------	-----



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزل ياسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 2+900
Level : -2.0
date: 17/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement


stress mn/m2	bar	1	2	Average
0.01	5.3	17.34	23.25	0.00
0.08	42.3	17.00	22.90	0.35
0.16	84.7	16.80	22.70	0.55
0.25	132.4	16.26	22.45	0.94
0.33	174.8	15.88	21.60	1.56
0.42	222.5	15.70	21.35	1.77
0.5	264.8	15.43	21.26	1.95
0.25	132.4	15.55	21.45	1.80
0.125	66.2	15.70	21.67	1.61
0.01	5.3	15.95	21.80	1.42
0.08	42.3	15.70	21.55	1.67
0.16	84.7	15.57	21.41	1.81
0.25	132.4	15.30	21.25	2.02
0.33	174.8	14.99	20.98	2.31
0.42	222	14.85	20.77	2.49



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 2+900
Level : -2.0
date: 17/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

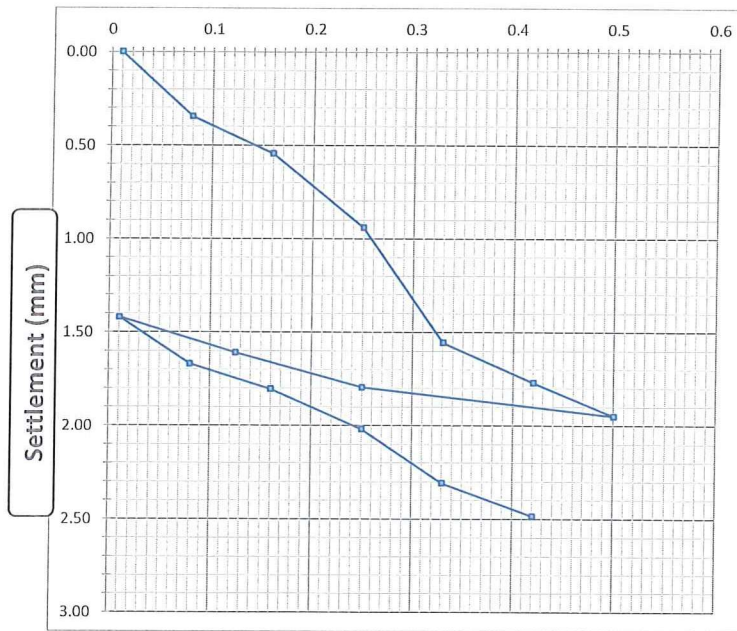

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.60
0.3 σ =	0.15	0.52
0.7 σ_2 =	0.35	2.35
0.3 σ_2 =	0.15	1.79
Ev1=	83.1	Mn/m2
Ev2=	160.9	Mn/m2
Ev2/Ev1=	1.9	



مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)

التاريخ :-	18/2/2025	الإتجاه :-	الوصله الرئيسي
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 16

:- برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى		طبقه ردم علي منسوب (-2.0 م) طبقا لتصميم :-		Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified5_21-3-2024_A0_24-4-2023_2	
نوع العمل	اعمال مساحيه مواد	وصف العمل	طبقه ردم علي منسوب (-2.0 م)		
مكان العمل		توقيع مهندس الشركه			
ترقيم السكه الحديد	03+160	03+040			
رقم تكرار تقديم الطلب :-		الاول ☒	الثاني ☐	الثالث ☐	

موقف الأعمال السابقة :-				المستعمل
١- الاعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
٢- أعمال الجوده :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
٣- الاعمال المدنيّة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐	
٤- العرض الكامل	مستوفى ☐	غير مستوفى ☐		

ملاحظات :-					

نتيجة هذه الأعمال :-	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاله ☐	مرفوض وبعاد تقديمه ☐
----------------------	--------------------------------	---	---

* تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يعتمد ،،

مهندس الهيئه

الاسم /
التوقيع /

يعتمد ،،

مهندس استشارى الهيئه

الاسم /
التوقيع /

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزل باسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+050
level: -2.0
date: 18/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement


stress mn/m2	bar	1	2	Average
0.01	5.3	25.10	22.13	0.00
0.08	42.3	24.78	21.86	0.30
0.16	84.7	24.56	21.53	0.57
0.25	132.4	24.00	21.24	1.00
0.33	174.8	23.80	20.85	1.29
0.42	222.5	23.61	20.58	1.52
0.5	264.8	23.43	20.22	1.79
0.25	132.4	23.66	20.54	1.52
0.125	66.2	23.78	20.76	1.35
0.01	5.3	23.98	20.90	1.18
0.08	42.3	23.61	20.70	1.46
0.16	84.7	23.40	20.54	1.65
0.25	132.4	23.18	20.43	1.81
0.33	174.8	22.90	20.27	2.03
0.42	222	22.76	19.97	2.25



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقاً للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+050
level: -2.0
date: 18/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

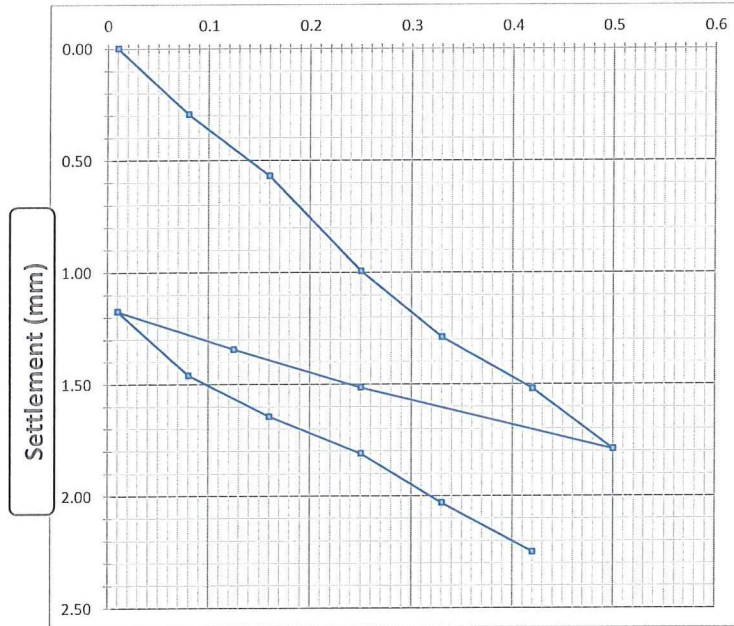

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.34
0.3 σ =	0.15	0.54
0.7 σ_2 =	0.35	2.08
0.3 σ_2 =	0.15	1.62

Ev1=	111.7	Mn/m2
Ev2=	196.9	Mn/m2

Ev2/Ev1=	1.8
----------	-----





توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية
TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+100
level: -2.0
date: 18/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement

<i>stress mn/m2</i>	<i>bar</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>Average</i>
0.01	5.3	18.15	24.10	0.00
0.08	42.3	17.92	23.90	0.22
0.16	84.7	17.65	23.75	0.43
0.25	132.4	17.29	23.43	0.77
0.33	174.8	17.05	23.17	1.02
0.42	222.5	16.80	22.84	1.31
0.5	264.8	16.55	22.65	1.53
0.25	132.4	16.76	22.94	1.28
0.125	66.2	16.98	23.10	1.09
0.01	5.3	17.13	23.31	0.91
0.08	42.3	16.98	23.19	1.04
0.16	84.7	16.87	22.89	1.25
0.25	132.4	16.75	22.77	1.37
0.33	174.8	16.55	22.64	1.53
0.42	222	16.30	22.51	1.72




أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتير - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+100
level: -2.0
date: 18/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

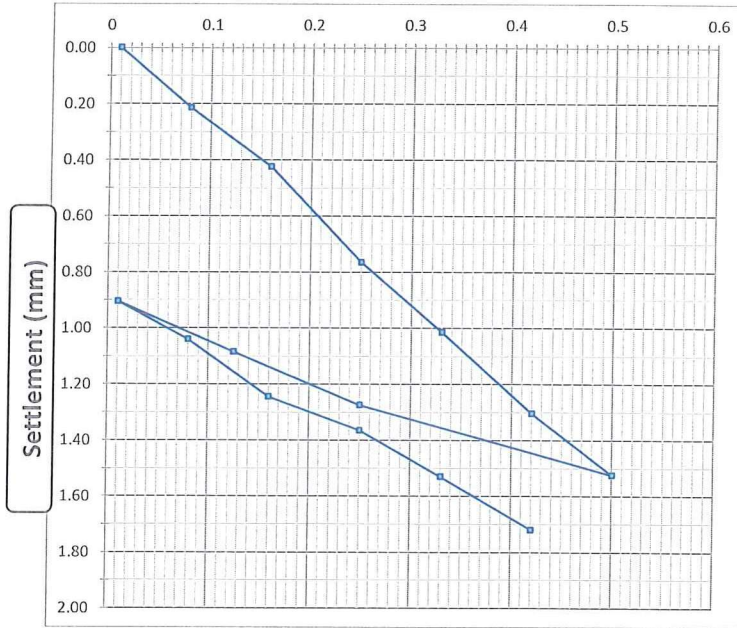

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.08
0.3 σ =	0.15	0.40
0.7 σ_2 =	0.35	1.57
0.3 σ_2 =	0.15	1.22

Ev1=	132.2	Mn/m2
Ev2=	255.1	Mn/m2

Ev2/Ev1=	1.9
----------	-----



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتير - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقاً للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+150
soil name: -2.0
date: 18/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement


stress mn/m2	bar	1	2	Average
0.01	5.3	22.76	23.40	0.00
0.08	42.3	22.45	22.90	0.41
0.16	84.7	22.12	22.67	0.68
0.25	132.4	21.87	22.32	0.98
0.33	174.8	21.55	21.97	1.32
0.42	222.5	21.30	21.75	1.56
0.5	264.8	20.97	21.26	1.97
0.25	132.4	21.25	21.47	1.72
0.125	66.2	21.54	21.66	1.48
0.01	5.3	21.75	21.80	1.31
0.08	42.3	21.40	21.90	1.43
0.16	84.7	21.26	21.75	1.58
0.25	132.4	20.98	21.62	1.78
0.33	174.8	20.87	21.52	1.89
0.42	222	20.74	21.30	2.06



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+150
soil name: -2.0
date: 18/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

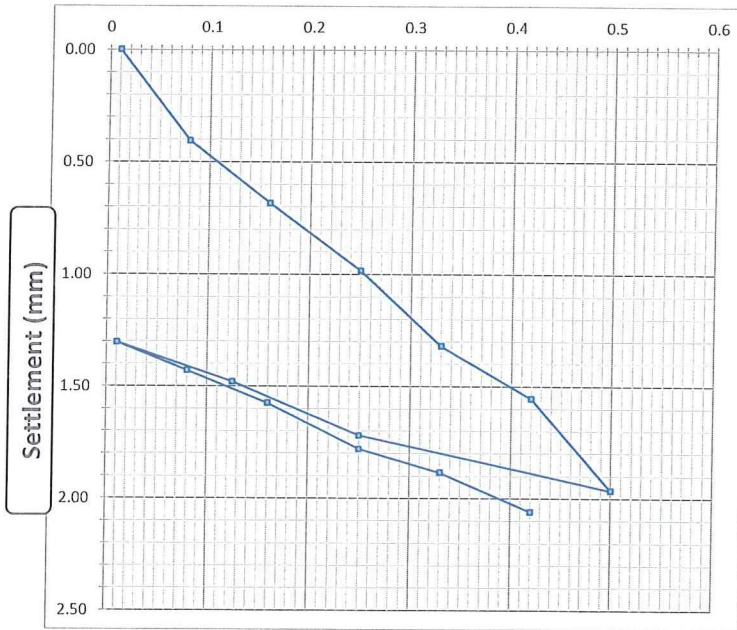

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.37
0.3 σ =	0.15	0.65
0.7 σ_2 =	0.35	1.92
0.3 σ_2 =	0.15	1.56

Ev1=	124.6	Mn/m2
Ev2=	245.2	Mn/m2

Ev2/Ev1=	2.0
----------	-----



مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

التاريخ :-	19/2/2025	الإتجاه :-	الوصله الرئيسيه
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العموميه و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 17

Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified5_21-3-2024_A0_24-4-2023_2

طبقة ردم علي منسوب (-1.75 م) طبقا لتصميم :-

:- برجاء التكرم بطلب إستلام الأتي

نوع العمل :-	اعمال مساحية+ مواد	وصف العمل :-	طبقة ردم علي منسوب (-1.75 م)
مكان العمل :-		توقيع مهندس الشركه	
ترقيم السكه الحديد :-	02+780	02+880	
رقم تكرار تقديم الطلب :-	☒ الاول	☐ الثاني	☐ الثالث

موقف الأعمال السابقه :-

المستول	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	١- الاعمال المساحية :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٢- أعمال الجوده :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٣- الاعمال المدنيه :
	مستوفى	غير مستوفى		٤- العرض الكامل

ملاحظات :-

موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاله ☐ مرفوض وبعاد تقديمه ☐

نتيجة هذه الأعمال :-

* تلزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يعقده ،،

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /

يعقده ،،

مهندس استشارى الهيئه

الاسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر الترابي لخط سكه حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

التاريخ :-	20/2/2025	الإتجاه :-	الوصلة الرئيسية
الشركة المنفذة :-	الريادة للمقاولات العمومية و للتوريدات	نطاق العمل :-	(02+000 : 03+900)

RB - RSCCE - GARBLT - IR - Emb - 18

:- برجاء التكرم بطلب إستلام الأتى		طبقة ردم علي منسوب (-2.0 م) طبقا لتصميم :-		Robiky_Main Line_Sc 2000_V7_Modified5_21-3-2024_A0_24-4-2023_2	
:- نوع العمل		اعمال مساحية+ مواد		:- وصف العمل	
:- مكان العمل				:- توقيع مهندس الشركه	
:- ترقيم السكه الحديد		03+280		03+160	
رقم تكرار تقديم الطلب :-				☐ الاول	
				☐ الثاني	
				☐ الثالث	

المسئول	موقف الأعمال السابقة :-			
سكك	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	١- الاعمال المساحية :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٢- أعمال الجوده :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٣- الاعمال المدنية :
	مستوفى	غير مستوفى		٤- العرض الكامل

ملاحظات :-

نتيجة هذه الأعمال :- ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالية ☐ مرفوض وبعاد تقديمه

* تلزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية او ضوئية من طلب الاستلام .

يعقده ،،

مهندس الهيئه

الاسم /

التوقيع /

يعقده ،،

مهندس استشارى الهيئه

الاسم /

التوقيع /

2

Test

توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING


طريق الدائري - نزله باسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+280
soil name: -2.0
date: 22/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement


stress mn/m2	bar	1	2	Average
0.01	5.3	17.45	23.60	0.00
0.08	42.3	17.12	23.45	0.24
0.16	84.7	16.95	23.27	0.41
0.25	132.4	16.74	22.90	0.70
0.33	174.8	16.55	22.65	0.92
0.42	222.5	16.24	22.32	1.25
0.5	264.8	15.95	22.12	1.49
0.25	132.4	16.35	22.44	1.13
0.125	66.2	16.65	22.70	0.85
0.01	5.3	16.90	22.95	0.60
0.08	42.3	16.55	22.66	0.92
0.16	84.7	16.40	22.50	1.08
0.25	132.4	16.31	22.34	1.20
0.33	174.8	16.20	22.18	1.34
0.42	222	15.95	21.90	1.60




أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتير - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+280
soil name: -2.0
date: 22/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

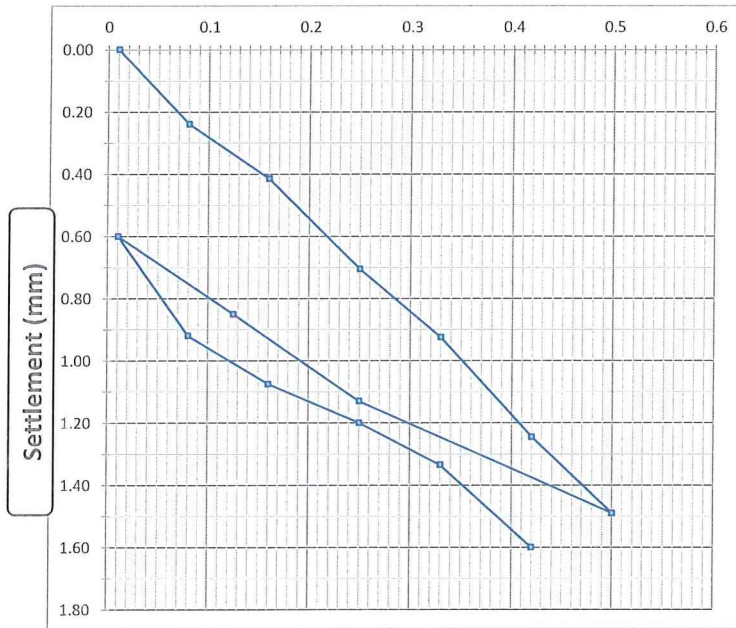

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.00
0.3 σ =	0.15	0.39
0.7 σ_2 =	0.35	1.39
0.3 σ_2 =	0.15	1.06

E_{v1} =	149.3	Mn/m2
E_{v2} =	266.1	Mn/m2

E_{v2}/E_{v1} =	1.8
-------------------	-----

[Handwritten signature]



توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+230
soil name: -2.0
date: 22/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement

stress mn/m2	bar	1	2	Average
0.01	5.3	24.40	19.00	0.00
0.08	42.3	24.15	18.78	0.23
0.16	84.7	23.87	18.50	0.51
0.25	132.4	23.65	18.27	0.74
0.33	174.8	23.35	17.90	1.08
0.42	222.5	23.10	17.65	1.33
0.5	264.8	22.87	17.40	1.57
0.25	132.4	23.15	17.85	1.20
0.125	66.2	23.60	18.12	0.84
0.01	5.3	23.95	18.50	0.47
0.08	42.3	23.55	18.17	0.84
0.16	84.7	23.36	17.90	1.07
0.25	132.4	22.98	17.83	1.30
0.33	174.8	22.87	17.78	1.38
0.42	222	22.74	17.67	1.50




أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+230
soil name: -2.0

date: 22/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

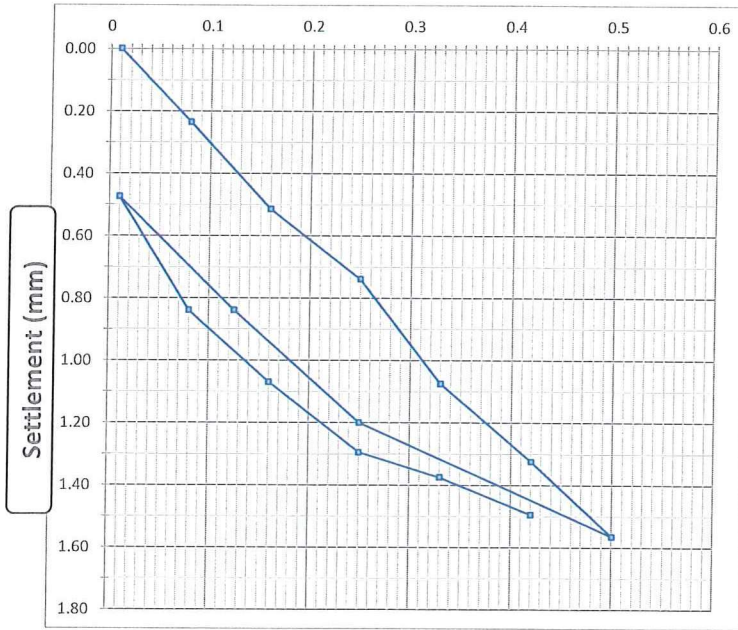

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 σ =	0.35	1.13
0.3 σ =	0.15	0.48
0.7 σ_2 =	0.35	1.40
0.3 σ_2 =	0.15	1.04

Ev1=	138.3	Mn/m2
Ev2=	249.7	Mn/m2

Ev2/Ev1=	1.8
----------	-----



توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزله ياسوس - محافظة القليوبية

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+180
soil name: -2.0
date: 22/2/2025
plate diameter: 600 mm

plate load test DIN 18134:2001-09

settlement


stress mn/m2	bar	1	2	Average
0.01	5.3	21.16	22.40	0.00
0.08	42.3	20.85	22.18	0.27
0.16	84.7	20.67	21.87	0.51
0.25	132.4	20.45	21.57	0.77
0.33	174.8	20.15	21.32	1.05
0.42	222.5	19.87	21.10	1.30
0.5	264.8	19.60	20.85	1.56
0.25	132.4	19.95	21.20	1.21
0.125	66.2	20.23	21.47	0.93
0.01	5.3	20.65	21.68	0.62
0.08	42.3	20.35	21.50	0.86
0.16	84.7	19.90	21.36	1.15
0.25	132.4	19.81	21.15	1.30
0.33	174.8	19.75	20.96	1.43
0.42	222	19.54	20.83	1.60



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - باروميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

project : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
contractor: شركة الريادة
location: st. 3+180
soil name: -2.0
date: 22/2/2025
plate diameter: 600 mm
stress (mn/m2)

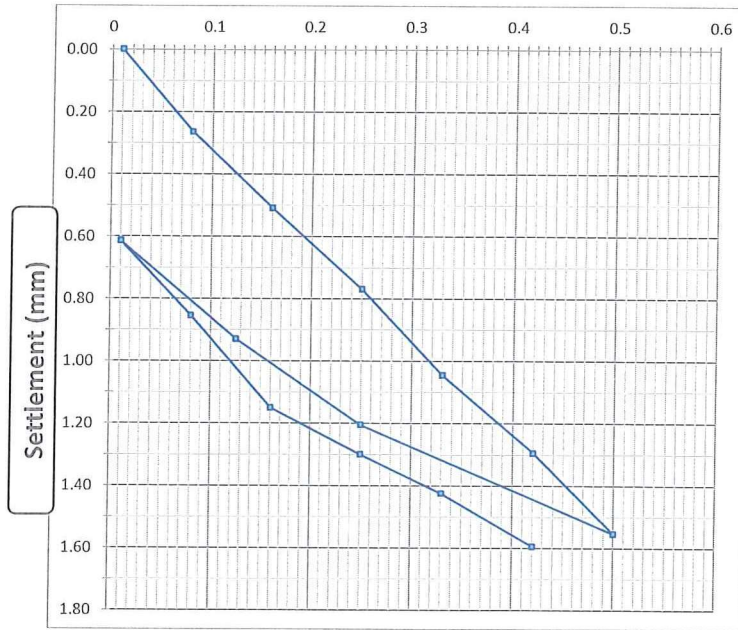

$$E_v = 0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma / \Delta s$$

		s
0.7 sigma=	0.35	1.10
0.3 sigma=	0.15	0.48
0.7 sigma2=	0.35	1.46
0.3 sigma2=	0.15	1.11
Ev1=	144.9	Mn/m2
Ev2=	257.4	Mn/m2
Ev2/Ev1=	1.8	

[Handwritten signature]



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)

التاريخ	15 / 02 / 2025	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات	نطاق العمل	من المحطة 2+000 حتي المحطة 3+900

Submetal Material

RB - RSCCE - GARBLT- IR - MAT- 3

برجاء التكرم بإستلام الأتي :
عينات اترربة من قطاع شركة الريادة المحطة " 03+200 " ردم سفلي "

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكباري .
- 2- صورة من محضر العينات .
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

دناخ العجيت حصوات حبيقة للسفاري المردمى وحبيقة

المواصفات المنفذة الخاصة للمشروع

نتيجة هذه الأعمال :

مرفوض ويعاد تقديمه

موافق مع عمل الملاحظات بعاليه

موافق

✓

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة

مهندس استشاري الهيئة

مهندس الشركة المنفذة:

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /
ALRIYADAH
GENERAL CONTRACTING & SUPPLIES

محضر عينات

السيد المهندس/ مدير معمل ضبط الجودة واختبارات المواد جامعة الزقازيق – كلية الهندسة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى صدور أمر إسناد بتكليف شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات بتنفيذ أعمال إنشاء جس خط سكة حديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول 1.89 كم، في المسافة من 1.61 كم إلى 3.5 كم بالوصلة الرئيسية،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عينات اترية من طبقات (الردم السفلي) لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

احداثيات العينة		نوع العينة	مكان العمل
N	E		
829129.008	690374.511	تربة	03+200

القائم بإحضار العينات مهندس الشركة المنفذة م/أدهم محمود

التاريخ: 2025 / 02 / 15

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل اللازم وتفضلوا بقبول وافر التحية..

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

مهندس استشاري
الهيئة

كورد



إختبار صلاحية عينة تربة

أعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
المأخذ (3+200)

الشركة المنفذة
شركة الريادة للمقاولات العمومية

فني المعمل

أ/ حسام علاء الدين

مهندس المعمل

م/ أحمد علاء مراد

عضو هيئة التدريس المشرف علي المعمل

م/ محمد عبدالفتاح

مدير المعمل

أ.م.د/ عادل الطقاش

وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ محمد عناني



فبراير 2025

ملخص النتائج

أ- إختبار الفحص البصري : العينة تربة حمراء مخلطة بزلط.

ب- نتائج تجربة التدرج الحبيبي :

رقم المنخل	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	4	10	40	200
نسبة المار%	100%	100%	100%	100%	100%	95.0%	85.0%	51.3%	20.0%	5.0%

ج- إختبارات حدود إتربرج :

لا يوجد	حد السيولة %
لا يوجد	حد اللدونة %

د - نتائج إختبار بروكتور المعدل :


أقصى كثافة جافة (جرام/سم ³)	2.14
محتوي المياه المثالي %	8.10%

هـ - تصنيف التربة :

(A1-b)

و- نسبة تحمل كاليفورنيا = 32 %

ي- الإنتفاش الحر : (لا يوجد إنتفاش بالعينة)

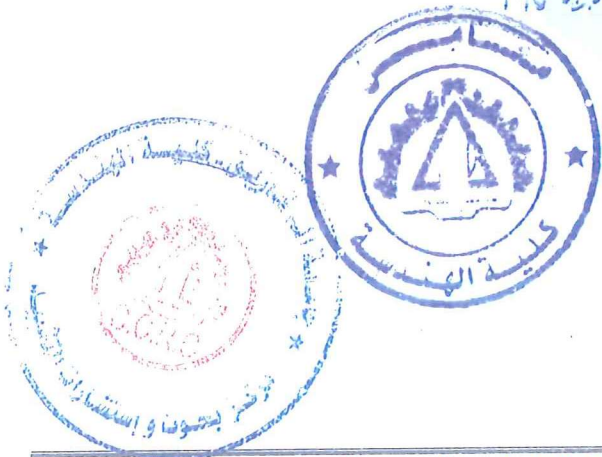


ب- نتائج إختبار التدرج الحبيبي:

تم إجراء الإختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية AASHTO T 27-14

وزن العينة = 4000 جرام


نسبة المار %	المار بالجرام	المحجوز التراكمي	المحجوز بالجرام	فتحات المنخل بالمم	رقم المنخل
100.0	4000	0	0	50	2
100.0	4000	0	0	37.5	1.5
100.0	4000	0	0	25	1
100.0	4000	0	0	19	1/4
100.0	4000	0	0	12.5	1/2
95.0	3800	200	200	9.5	3/8
85.0	3400	600	400	4.75	4
51.3	2050	1950	1350	2	10
20.0	800	3200	1250	0.425	40
5.0	200	3800	600	0.075	200
0.0	0	4000	200	0.001	pan

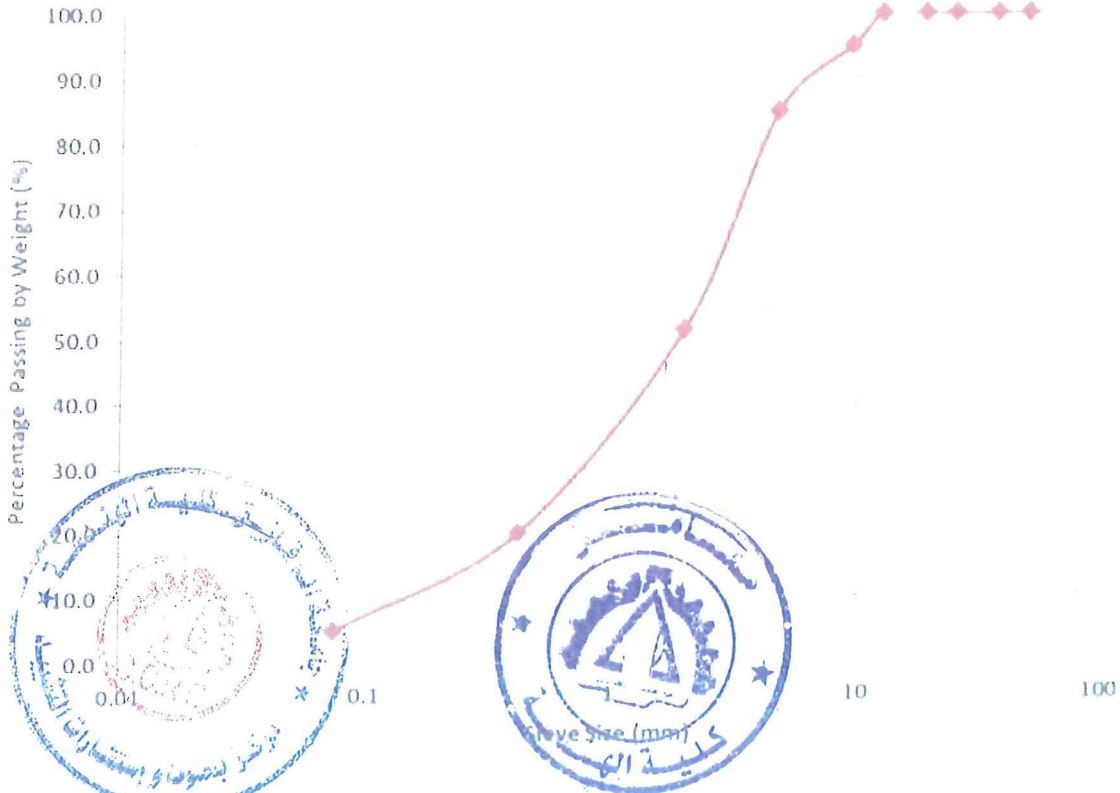

د- إختبار بروكتور المعدل:

تم إجراء الإختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D598-00

CONTAINER NUMBER				G1	G2	G3	G4
A	MASS WET SOIL & TARE	gm		160.0	160.0	160.0	160.0
B	MASS DRY SOIL & TARE	gm		156.0	153.0	152.0	149.0
C	TARE MASS	gm		27.0	27.0	27.0	27.0
D	MASS OF WATER	gm	A-B	4.0	7.0	8.0	11.0
E	MASS OF DRY SOIL	gm	B-C	129.0	126.0	125.0	122.0
F	MOISTURE CONTENT	%	$\frac{D}{E} \times 100$	3.1	5.6	6.4	9.0
DRY DENSITY							
TRIAL NUMBER				1	2	3	4
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL	gm		15400	15900	16030	15800
H	MASS OF MOLD	gm		8500	8500	8500	8500
I	MASS OF WET SOIL	gm	G-H	6900	7400	7530	7300
J	VOLUME OF MOLD	cm ³		3309	3309	3309	3309
K	WET DENSITY	g/cm ³	$\frac{I}{J}$	2.085	2.236	2.276	2.206
L	DRY DENSITY	g/cm ³	$\frac{k}{100 + f} \times 100$	2.023	2.119	2.139	2.024

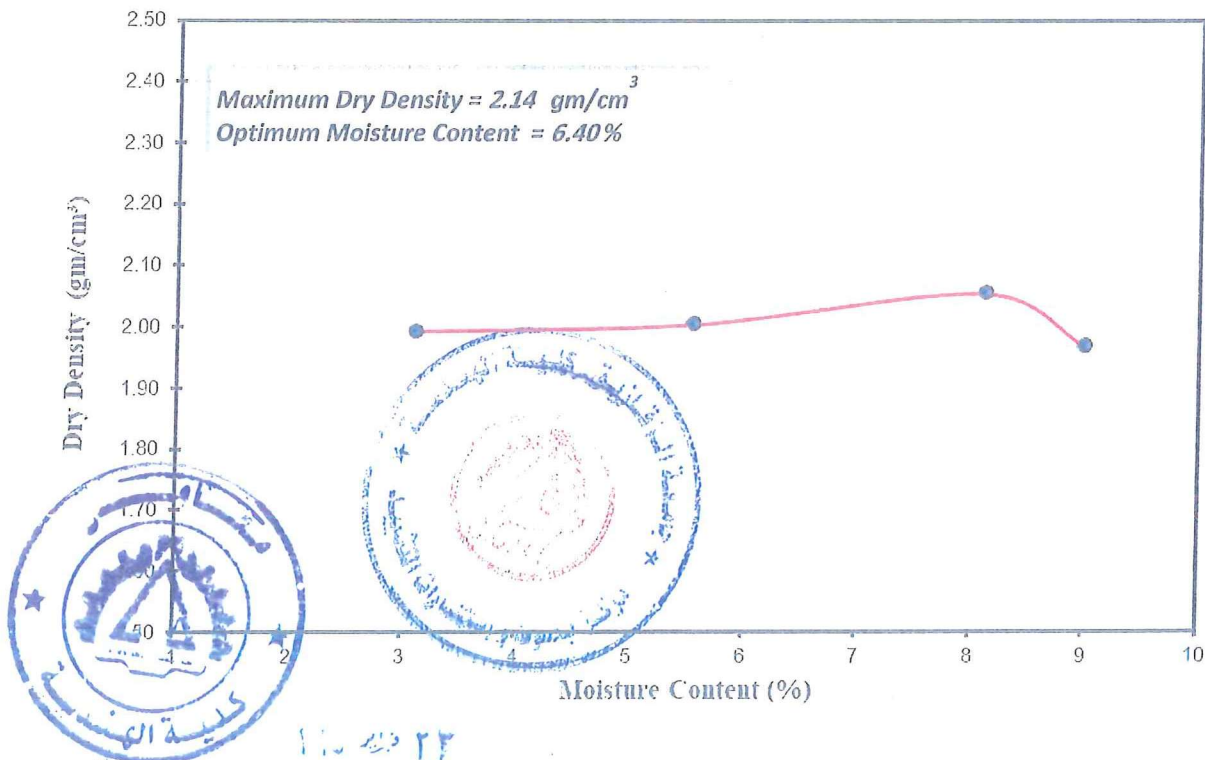

هـ- تصنيف التربة:

تم إجراء الاختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية (M-145)

The Classification Of Soil AASHTO (M-145)

General Classification	Granular Materials 35% Or Less Passing 0.075 mm							Silt-Clay Materials More Than 35% Passing 0.075 mm				
Sieve Analysis Passing%	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	
Group Classification	a	b		4	5	6	7				5	6
Sieve No . 10 Aperture 2.00 mm	50 MAX											
Sieve No . 40 Aperture .425 mm	30 MAX	50 MAX	51 MIN									
Sieve No . 200 Aperture .075 mm	15 MAX	25 MAX	10 MAX	35 MAX	35 MAX	35 MAX	35 MAX	36 MIN	36 MIN	36 MIN	36 MIN	
Liquid Limit %				40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	
Plasticity Index %	6 MAX		NP	10 MAX	10 MAX	11 MIN	11 MIN	10 MAX	10 MAX	11 MIN	11 MIN	
General Rating	Excellent To Good							Fair To Poor				
THE GROUP CLASSIFICATION IS			A-1b									

و- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا:

تم إجراء الاختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية AASHTO T193

أقصى كثافة جافة معملية = 2.14 طن/م³

نسبة الرطوبة = 6.40%


نسبة تحمل كاليفورنيا = 32%

ي- اختبار الإنتفاش الحر:

(لا يوجد إنتفاش بالعينة)

ملاحظات:

- تم توريد العينة للاختبار بمعرفة الشركة وعلي مسئوليتها.



110 22

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكى - بلبيس)

التاريخ	10 / 02 / 2025	الإتجاه	الخط الرئيسي
الشركة المنفذة	شركة الريادة للمقاولات العموميه والتوريدات	نطاق العمل	من المحطة 2+000 حتي المحطة 3+900

Submetal Material

RB - RSCCE - GARBLT- IR - MAT-

برجاء التكرم بإستلام الأتي :
عينات اترربة من قطاع شركة الريادة المحطة 03+400 "ردم سفلي"

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
- 2- صورة من محضر العينات .
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

العملات منبذ لرامات الخاضع لى ط 1.1

نتيجة هذه الأعمال :

مرفوض ويعاد تقديمه

موافق مع عمل الملاحظات بعاليه

موافق

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس استشاري الهيئة

الإسم /
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة :

الإسم /
التوقيع /



محضر عينات

السيد المهندس/ مدير معمل ضبط الجودة واختبارات المواد توتست لاختبار المواد الخرسانية
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى صدور أمر إسناد بتكليف شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات بتنفيذ
أعمال إنشاء جس خط سكة حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول 1.9
كم، في المسافة من 1.6 كم إلى 3.5 كم بالوصلة الرئيسية،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عينات اتربة من طبقات (الردم السفلي) لإجراء الاختبارات
اللازمة عليها.

احداثيات العينة		نوع العينة	مكان العمل
N	E		
829148.301	690175.532	تربة	03+400

القائم بإحضار العينات مهندس الشركة المنفذة م/أدهم محمود

التاريخ: 2025 / 02 / 10

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل اللازم وتفضلوا بقبول وافر التحية...

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

مهندس استشاري
الهيئة

أدهم

مهندس الشركة
المنفذة

AL RIYADAH
GENERAL CONTRACTING & SUPPLIES

توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزلة باسوس - محافظة القليوبية

2

Test

GRAIN SIZE DISTRIBUTION

Laboratory NO :22

Date : feb.10..2025


المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بليس)

شركة الريادة

st.3+400

المحجر : الصاعقة

II. GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE :

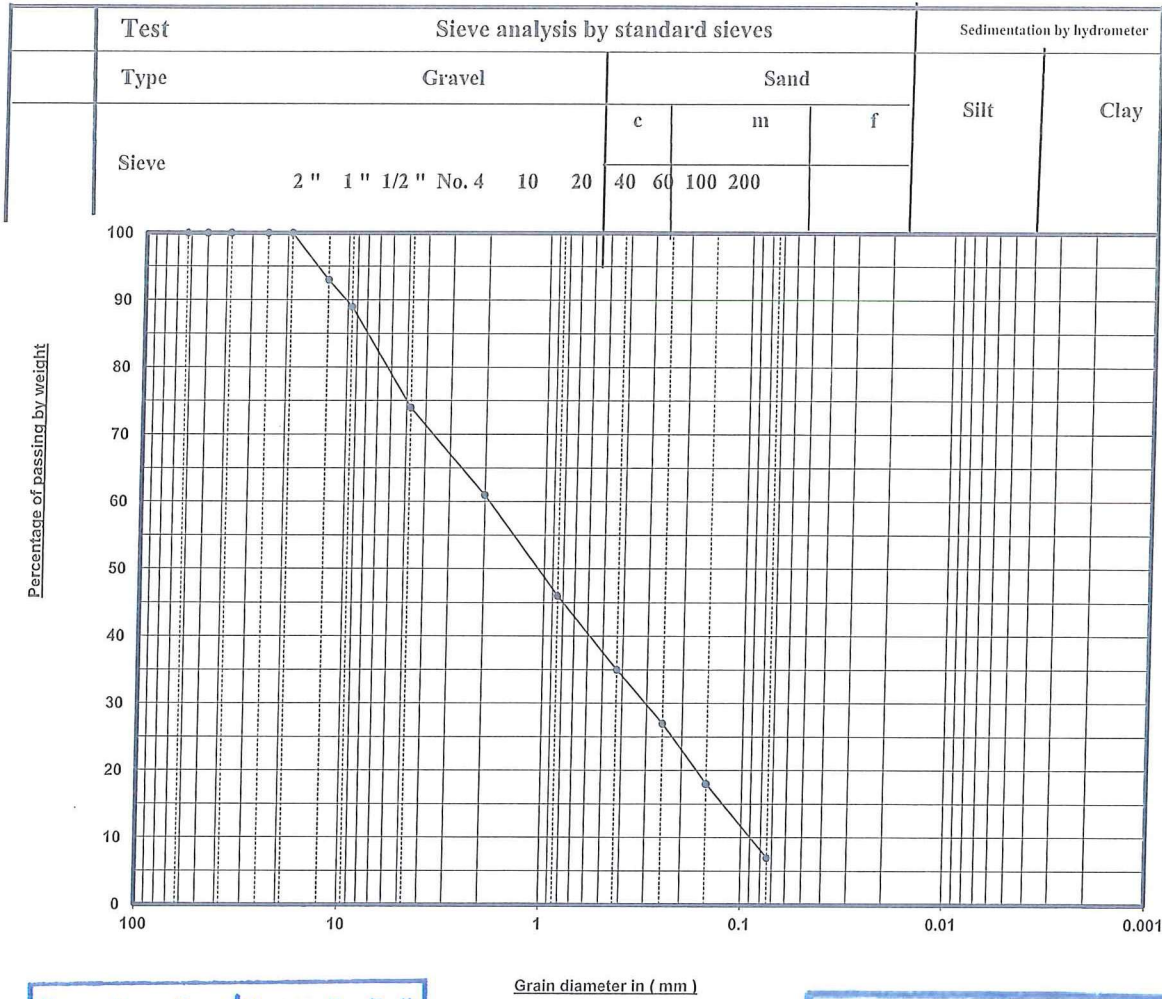

III. GENERAL NOTES :

Description	Grain size parameter of soil	
Colour : Light brown	AASHTO Classification :	A-I-b
Structure : cohesionless	Uniformity coefficient C_u :	NA
Name : calcareous gravelly sand contains some of silt	Effective diameter in mm :	NA
	Uniformity curvature C_z :	NA

أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - نفاذية بالموقع - يلزوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

GRAIN SIZE DISTRIBUTION

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
شركة الريادة


المحجر : الصاعقة

st.3+400

Date : feb.10..2025

Sieve	Diameter	Pass. %
2.5	62.5	100
2.0	50	100
1 1/2 "	38.1	100
1 "	25	100
3/4"	19	100
1/2"	12.5	93
3/8 "	9.5	89
No 4	4.75	74
No 10	2	61
No 20	0.85	46
No 40	0.425	35
No 60	0.25	27
No 100	0.15	18
No200	0.074	7





توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزه ياسوس - محافظة القنيطرة


COMPACTION PROCTOR TEST

Laboratory NO :22
Date,feb.,10.,2025

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
شركة الريادة
st.3+400

المحجر : الصاعقة

II. MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP CURVE :

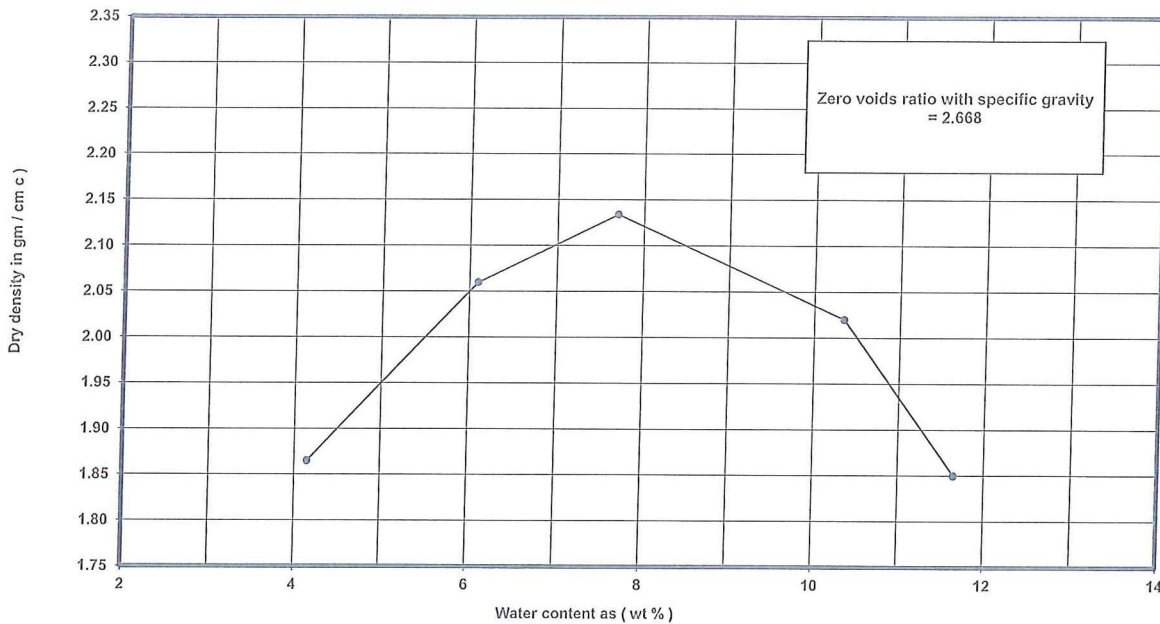


III. GENERAL NOTES :

1. Compaction method type = Modified
2. Procedures are as ASTM Specifications (D - 1557 method D)
3. The maximum dry density in (gm/cm 3) = 2.134
4. The optimum water content as percent = 7.70



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - تفاذية بالموقع - يازوميتز - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01147583979 / 01022565054



توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزلة ياسين - محافظة القليوبية

COMPACTION PROCTOR TEST


المشروع : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
شركة الريادة
st.3+400

Date : feb..10..2025

المحجر : الصاعقة

water	Dry	Zero voids ratio
content	density	
%	gm/cm3	
		0.5
4.15	1.865	1
6.1	2.06	1.5
7.7	2.134	2
10.35	2.02	2.5
11.65	1.85	3





توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزل ياسوس - محافظة القليوبية

THE CLASSIFICATION OF SOIL AND SOIL AGGREGATE MIXTURES FOR CONSTRUCTION PURPOSES

المشروع : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
شركة الريادة

Date: feb..10..2025

المحجر : الصاعقة

st.3+400

General classification	Granular materials 35 % or less passing 0.075 mm							Silt - clay materials more than 35 % passing 0.075 mm			
Sieve / group classification analysis / passing %	A - 1		A-3	A - 2				A-4	A-5	A-6	A-7
	a	b		4	5	6	7				
Sieve No. 10 aperture 2.00 mm	50 max										
Sieve No. 40 aperture 0.425mm	30 max	50 max	51 min								
Sieve No. 200 aperture 0.075mm	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min
Characteristics of fraction passing liquid sieve limit %				40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min
No. plasticity index %	6 max		NP	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	11 min
General rating	excellent to good							Fair to poor			

GENERAL NOTES:


1. max = maximum & min = minimum
2. The above - mentioned table was quoted from AASHTO (M - 145)
3. The group classification is (A - I - b)

test	result	classification
No.10 (2 mm)	61%	(A - I - b)
No.40 (0.425 mm)	35%	
No.200 (0.075 mm)	7%	
L.L	19.75%	
P.L	15.50%	
P.I	4.25%	



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - تفادية بالموقع - بازوميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979



BEARING RATIO OF LABORATORY UNSOAKED COMPACTED SOILS

Date : feb..10..2025


المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - جاليس)

شركة الريادة

المحجر : الصاغة

st.3+400

II. PENETRATION AGAINST LOAD RELATIONSHIP CURVE :

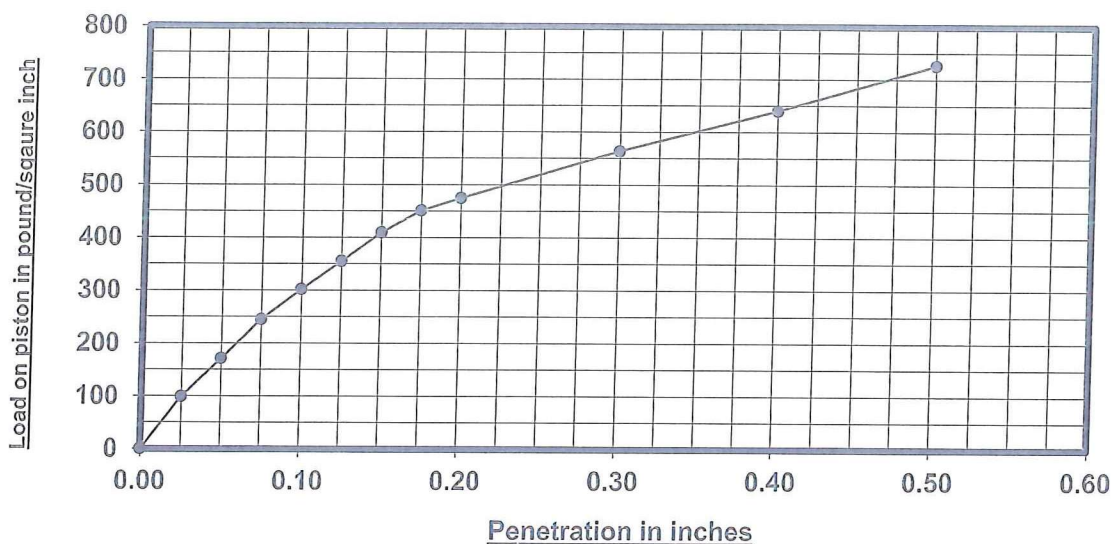

III. TEST DATA :

SNO	Description	Result	SNO	Description	Result
1	Sample condition	Soaked	4	Dry density in gm/cm ³ a)initial	1.865
2	Compaction type	modified		b) final	2.134
3	Surcharge load	20 lb	5	Water content in (%) a)initial	4.15
				b) final	7.70

IV. GENERAL NOTES :

1 . C. B. R. Value = 31.67 at 0.20 inch penetration



توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية
TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزل بهاسوس - محافظة القليوبية

2

Test

BEARING RATIO OF LABORATORY
SOAKED COMPACTED SOILS - CBR

Date : feb..10..2025

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - هلبيس)

شركة الريادة

المحجر : الصاعقة

st.3+400

CBR= 31.67
at 0.1" 30.2
at 0.2" 31.7

in inch	in pound/in 2
0	0
0.025	99
0.05	171
0.075	245
0.1	302
0.125	355
0.15	409
0.175	451
0.2	475
0.3	564
0.4	641
0.5	727



توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزل باسوس - محافظة القليوبية

2

Test

إختبار تحديد حد السيولة واللدونة ومجال اللدونة - حدود أتربرج

ASTM D4318


Date : feb..10..2025

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبس)
شركة الريادة
المحجر : الصاعقة

st.3+400

نتائج الإختبار

حد اللدونة		حد السيولة				الإختبار
		١٧	٢٠	٢٣	٢٨	عدد الدقات
١٢	٤	٦	٥٥	٨	٢	رقم الجفنة
١٦.٥٥	١٥.٧٥	٢٦.٠٠	٢٤.٠٠	٢٣.٥٠	٢٥.٠٠	وزن الجفنة (جم)
٢٨.٠٠	٣٢.٥٠	١٤٦.٠٠	١٤٥.٥٠	١٣٨.٥٠	١٤٤.٥٠	وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
٢٦.٠٠	٣١.٠٠	١٢١.٠٠	١٢٣.٥٠	١٢٠.٦٥	١٣١.٥٠	وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
٢.٠٠	١.٥٠	٢٥.٠٠	٢٢.٠٠	١٧.٨٥	١٣.٠٠	وزن الماء (جم)
٩.٤٥	١٥.٢٥	٩٥.٠٠	٩٩.٥٠	٩٧.١٥	١٠٦.٥٠	وزن العينة الجافة (جم)
٢١.١٦	٩.٨٤	٢٦.٣٢	٢٢.١١	١٨.٣٧	١٢.٢١	نسبة الرطوبة (%)
١٥.٥٠		١٩.٧٥				المتوسط (%)

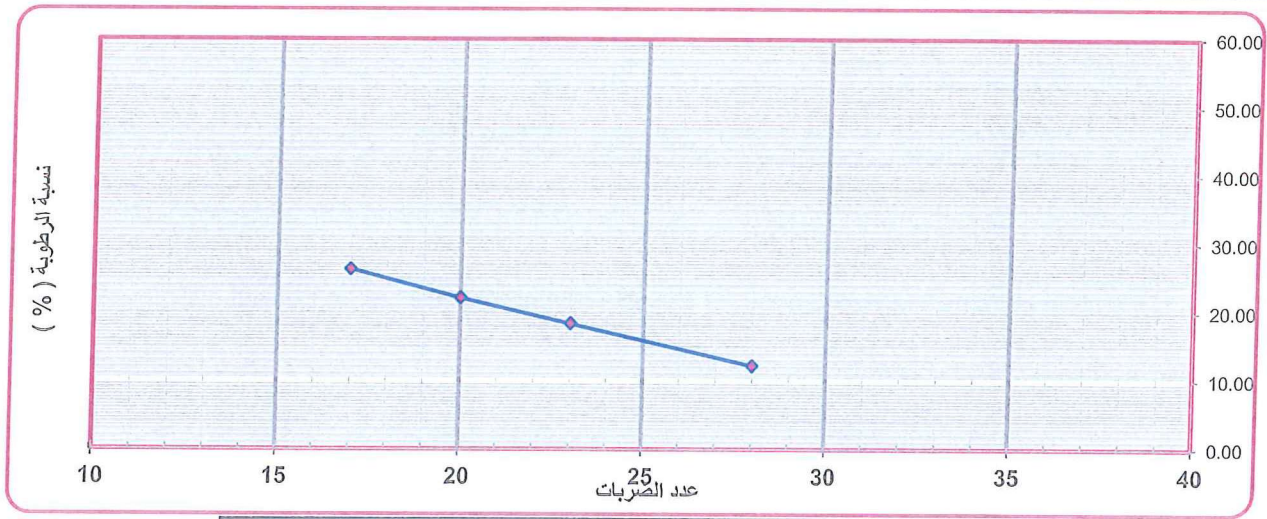

مجال اللدونة	حد اللدونة	حد السيولة
٤.٢٥	١٥.٥٠	١٩.٧٥



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - تقاذية بالموقع - يازوميتير - اختبارات الدمك
اختبارات الحنيد - أعمالنا طبقا للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979

FREE SWELLING TEST OF SOIL

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
شركة الريادة

Date :feb..10..2025
st.3+400

I. SAMPLE IDENTIFICATION :

المحجر : الصاعقة

SNO	Description	Free swelling in (%)
1	Light brown cohesionless calcareous gravelly sand contains some gravel and silt	0.10

II. GENERAL NOTES :

- 1 . Oven dry sample was used in the test
- 2 . The dry soil passing the sieve No. 40 (aperture = 0.425 mm) was used in the test
- 3 . The test was carried out in conformity with Soil Laboratory testing



GENERAL CONTRACTING & SUPPLIES

Handwritten signature: *[Signature]*

محضر عينات

السيد المهندس/ مدير معمل ضبط الجودة واختبارات المواد توتست لاختبار المواد الخرسانية
تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى صدور أمر إسناد بتكليف شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات بتنفيذ
أعمال إنشاء جس خط سكة حديد (الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس) بطول 1.9
كم، في المسافة من 1.6 كم إلى 3.5 كم بالوصلة الرئيسية،
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم عينات اتربة من طبقات (الردم السفلي) لإجراء الاختبارات
اللازمة عليها.

احداثيات العينة		نوع العينة	مكان العمل
N	E		
829106.8591	690673.6951	تربة	02+900

القائم بإحضار العينات مهندس الشركة المنفذة م/أدهم محمود

التاريخ: 2025 / 02 / 10

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل اللازم وتفضلوا بقبول وافر التحية...

الاستشاري العام

مهندس الهيئة

مهندس استشاري
الهيئة

أ. م. م.




Date.feb..10..2025

شركة الريادة

st. 2+900

المحجر : الصاعقة

II. GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE :

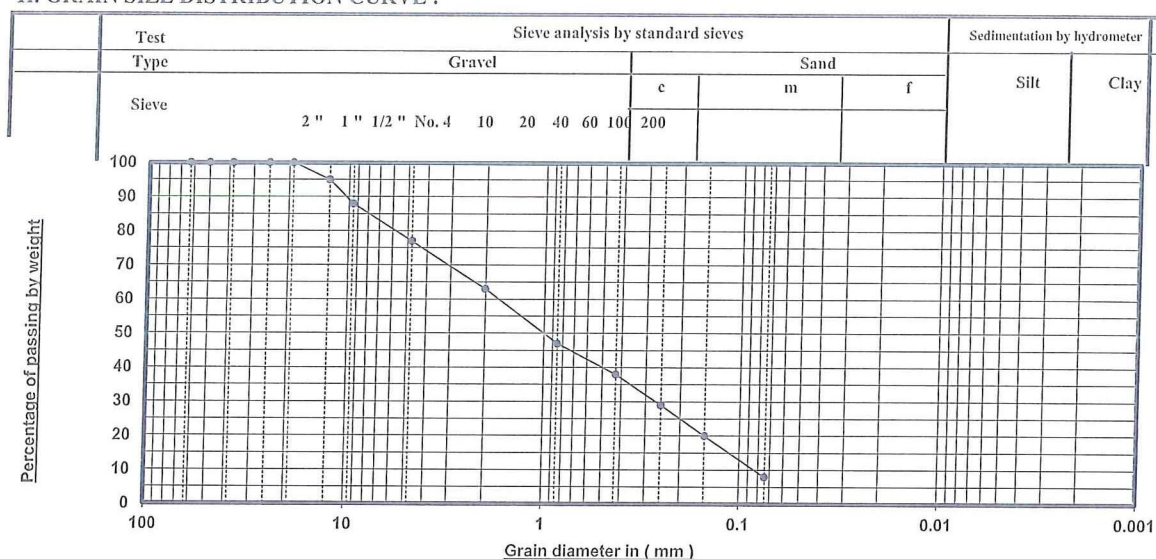

III. GENERAL NOTES :

Description		Grain size parameter of soil	
Colour :	Light brown	AASHTO Classification :	A-1-b
Structure :	cohesionless	Uniformity coefficient C_u :	NA
Name :	calcareous gravelly sand contains some of silt	Effective diameter in mm :	NA
		Uniformity curvature C_z :	NA



GRAIN SIZE DISTRIBUTION

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
شركة الريادة


st. 2+900

المحجر : الصاعقة

Date : feb..10...2025

Sieve	Diameter	Pass. %
2.5	62.5	100
2.0	50	100
1 1/2 "	38.1	100
1 "	25	100
3/4"	19	100
1 1/2"	12.5	95
3/8 "	9.5	88
No 4	4.75	77
No 10	2	63
No 20	0.85	47
No 40	0.425	38
No 60	0.25	29
No 100	0.15	20
No200	0.074	8





BEARING RATIO OF LABORATORY UNSOAKED COMPACTED SOILS


Date : feb..10..2025

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - جليبيس)
شركة الريادة

المحجر : الصاعقة

st. 2 + 900

II. PENETRATION AGAINST LOAD RELATIONSHIP CURVE :

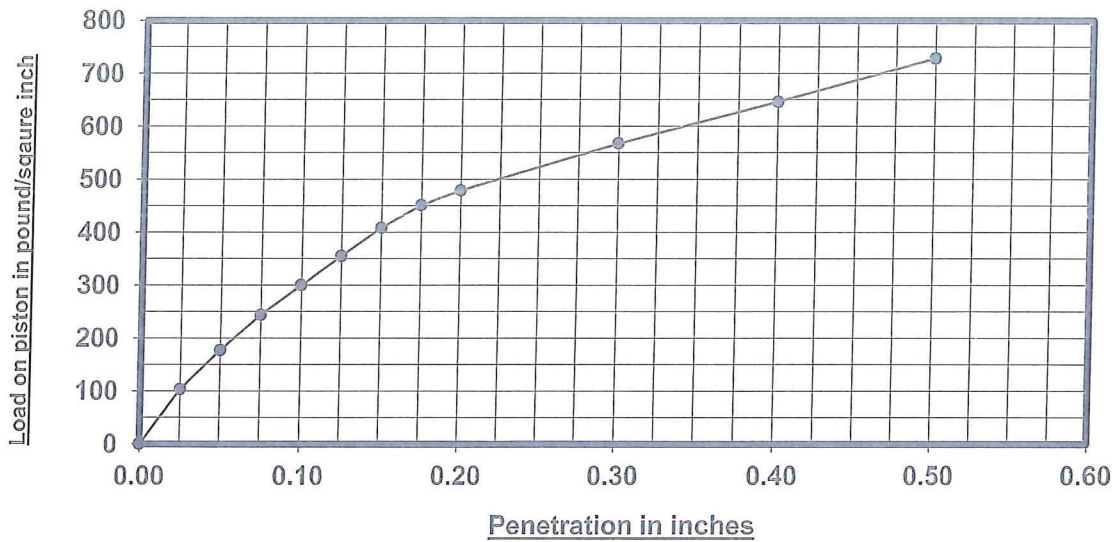


III. TEST DATA :

SNO	Description	Result	SNO	Description	Result
1	Sample condition	Soaked	4	Dry density in gm/cm ³ a) initial	2.110
2	Compaction type	modified		b) final	2.229
3	Surcharge load	20 Ib	5	Water content in (%) a) initial	3.50
				b) final	6.55

IV. GENERAL NOTES :

1 . C. B. R. Value = 31.93 at 0.20 inch penetration





توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية
TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزهة ياسوس - محافظة القليوبية

BEARING RATIO OF LABORATORY
SOAKED COMPACTED SOILS - CBR

Date : feb. 10..2025

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)

شركة الريادة


المحجر : الصاعقة

st. 2+900

CBR= 31.93
at 0.1" 30.0
at 0.2" 31.9

in inch	in pound/in 2
0	0
0.025	103
0.05	177
0.075	244
0.1	300
0.125	355
0.15	408
0.175	451
0.2	479
0.3	568
0.4	647
0.5	729





توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدانري - نزله ياسوس - محافظة القنيطرة

COMPACTION PROCTOR TEST

Laboratory NO :24


Date:feb..10..202.

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بابيس)
شركة الريادة

st. 2 + 900

المحجر : الصاعقة

II. MOISTURE - DENSITY RELATIONSHIP CURVE :

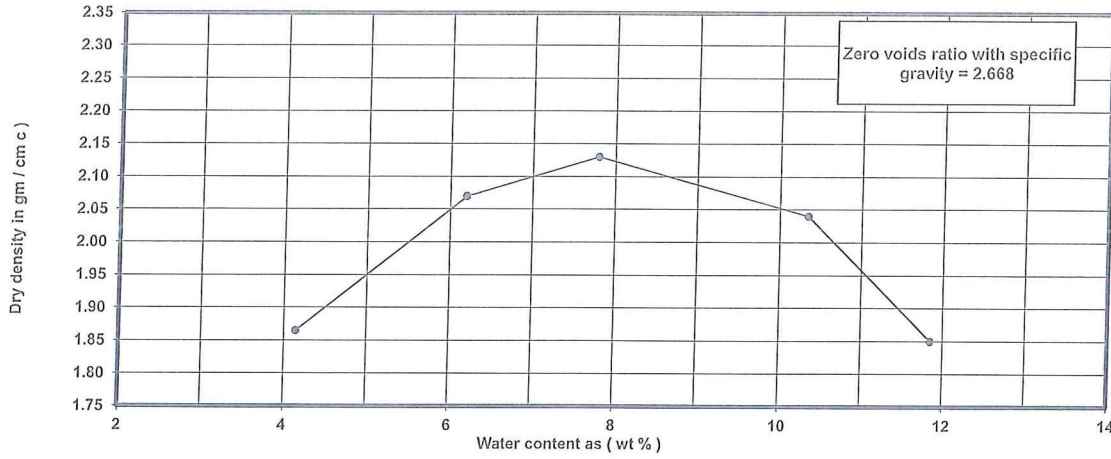

III. GENERAL NOTES :


1. Compaction method type =
2. Procedures are as ASTM Specifications (D - 1557 method D)
3. The maximum dry density in (gm/cm 3) =
4. The optimum water content as percent =

Modified

2.130

7.80





توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - قزله باسوس - محافظة القليوبية

COMPACTION PROCTOR TEST

المشروع : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بابيس)
شركة الريادة

Date : feb..10..2025

الحجر : الصاعدة

st. 2 + 900

water	Dry	Zero voids ratio
content	density	
%	gm/cm3	
		0.5
4.15	1.865	1
6.2	2.07	1.5
7.8	2.130	2
10.35	2.04	2.5
11.85	1.85	3





توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزلة ياسوس - محافظة القنيطرة

THE CLASSIFICATION OF SOIL AND SOIL AGGREGATE MIXTURES FOR CONSTRUCTION PURPOSES

المشروع : إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
شركة الريادة

المحجر : الصاعقة

st. 2 ÷ 900

General classification	Granular materials 35 % or less passing 0.075 mm							Silt - clay materials more than 35 % passing 0.075 mm			
Sieve / group classification analysis passing %	A - 1		A-3	A - 2				A-4	A-5	A-6	A-7
	a	b		4	5	6	7				
Sieve No. 10 aperture 2.00 mm	50 max										
Sieve No. 40 aperture 0.425mm	30 max	50 max	51 min								
Sieve No. 200 aperture 0.075mm	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min
Characteristics of fraction passing liquid sieve limit %				40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min
No. / plasticity index %	6 max		NP	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	11 min
General rating	excellent to good							Fair to poor			

GENERAL NOTES :

1. max = maximum & min = minimum
2. The above - mentioned table was quoted from AASHTO (M - 145)
3. The group classification is (A -1-b)

test	result	classification
No.10 (2 mm)	63%	(A -1-b)
No.40 (0.425 mm)	38%	
No.200 (0.075 mm)	8%	
L.L	21.10%	
P.L	18.68%	
P.I	2.42%	



توتست لاختبارات التربة والمواد الخرسانية TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - نزلة ياسوس - محافظة القنيطرة

2

Test

إختبار تحديد حد السيولة واللدونة ومجال اللدونة - حدود أتربرج

ASTM D4318


Date : feb..10..2025

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)
شركة الريادة
المحجر : الصاعقة

st. 2+900

نتائج الإختبار

حد اللدونة		حد السيولة				الإختبار
		١٧	٢٠	٢٤	٢٨	عدد الدقات
٥٥	٩	١٢	٣٢	٧	٢	رقم الجفنة
١٦.٤٥	١٥.٥٥	٢٥.٦٠	٢٤.٥٠	٢٣.٥٠	٢٧.٠٠	وزن الجفنة (جم)
٣٣.٥٠	٣١.٥٠	١٤٥.٥٠	١٤٣.٥٠	١٣٨.٥٠	١٤٨.٥٠	وزن الجفنة + وزن العينة الرطبة (جم)
٣٠.٠٠	٢٩.٨٥	١٢١.٥٠	١٢١.٠٠	١١٩.٥٠	١٣١.٥٠	وزن الجفنة + وزن العينة الجافة (جم)
٣.٥٠	١.٦٥	٢٤.٠٠	٢٢.٥٠	١٩.٠٠	١٧.٠٠	وزن الماء (جم)
١٣.٥٥	١٤.٣٠	٩٥.٩٠	٩٦.٥٠	٩٦.٠٠	١٠٤.٥٠	وزن العينة الجافة (جم)
٢٥.٨٣	١١.٥٤	٢٥.٠٣	٢٣.٣٢	١٩.٧٩	١٦.٢٧	نسبة الرطوبة (%)
١٨.٦٨		٢١.١٠				المتوسط (%)

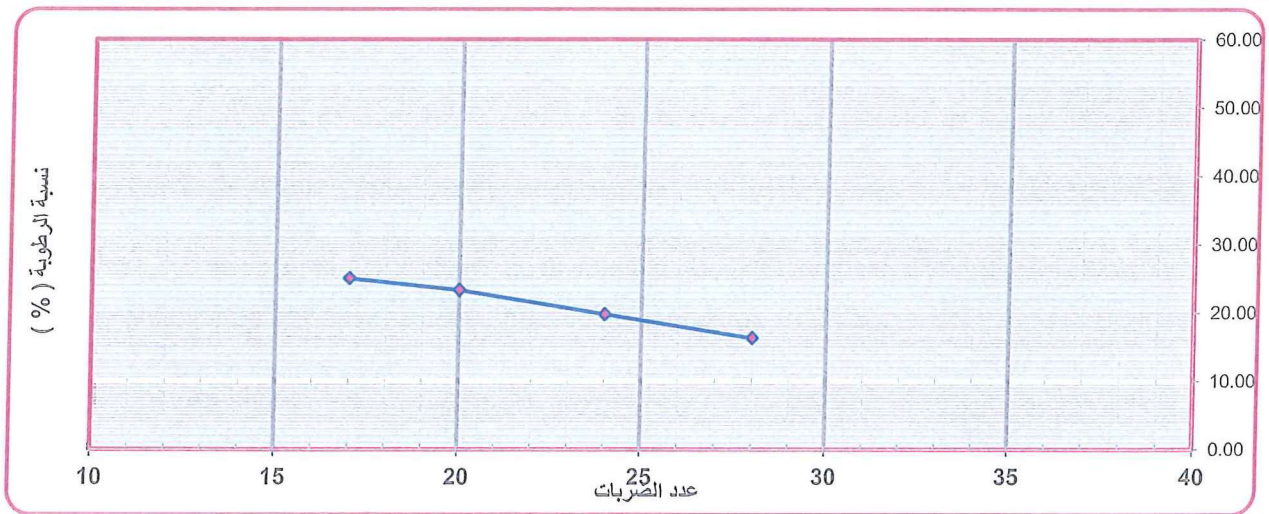


مجال اللدونة	حد اللدونة	حد السيولة
٢.٤٢	١٨.٦٨	٢١.١٠



أعمال الجسات - اختبارات التربة - اختبارات المواد - فتحات الكور - تغذية بالموقع - باروميتر - اختبارات الدمك
اختبارات الحديد - أعمالنا طبقاً للمواصفات القياسية والكود

تليفون : 01022565054 / 01147583979



توتست للاختبارات التربة والمواد الخرسانية
TO TEST FOR SOIL AND CONCRETE TESTING

طريق الدائري - فزله ياسوس - محافظة القليوبية

FREE SWELLING TEST OF SOIL

المشروع : انشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد (الروبيكي - بلبيس)

شركة الريادة

Date : feb.10..2025

I. SAMPLE IDENTIFICATION :

المحجر : الصاعقة

st.2+900

SNO	Description	Free swelling in (%)
1	Light brown cohesionless calcareous gravelly sand contains some gravel and silt	0.01

II. GENERAL NOTES :

- 1 . Oven dry sample was used in the test
- 2 . The dry soil passing the sieve No. 40 (aperture = 0.425 mm) was used in the test
- 3 . The test was carried out in conformity with Soil Laboratory testing

