

محضر استلام موقع

العملية:- أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" محافظة القليوبية.

تنفيذ شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة حياة كريمة (بالأمر المباشر)

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٦/١٤ وفي حضور كلا من:-

- | | |
|------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / محمد صديق | الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- مهندس / ابراهيم الصابر | استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري (مكتب حياة) |
| ٣- مهندس / أمير أحمد أنور | استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري (مكتب حياة) |
| ٤- مهندس / مصطفى هاشم | مندوب شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق |

المكان: طريق قليوب / شبين القناطر




الإجراءات:-

اجتمع الحاضرون في المكان والزمان المحددين بعالیه لأجل تسليم موقع المشروع تنفيذه طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣ إلى شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة في تنفيذ أعمال العقد المشار إليه بعالیه.

القرار:-

تم تسليم الموقع خالي من العوائق بطول ٣,٥ كم إلى شركة أولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٤ على أن يعتبر اليوم هو تاريخ استلام الموقع لمسافة ٣,٥ كم.

التوقيع:-

٤- 
٣- 
٢- 
١- 


رئيس الإدارة المركزية
المهندس /
نصر محمد طيخ

أصل



١٣٠٠ محمد زهران
١٣٠٠
١٣٠٠

صورة طبق الاصل
١٣٠٠
١٣٠٠

٢- محمد سامح
١- لصفوة

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية
تحية طيبة وبعد ...

مرفق طيه أصل موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة علي محضر الاجتماع الخاص بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق علي تنفيذ اعمال استكمال طريق قليوب / القشيش / كفر طلحا / طحانوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بالامر لمباشر - اشراف المنطقة الاولى (المركزية) .
يرجي التكرم بالإحاطة والتنبية باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحريرا في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣

مهندس /

" محسن محمد زهران "

الهيئة العامة للنقل والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المخططات العامة
رقم الوارد / ٥٧٤٦
عدد المرفقات / ٢
التاريخ / ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣
التوقيع /

صورة مرسلة للسيد المهندس / رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية
تحية طيبة وبعد ..

يرجي التكرم بالإحاطة والتنبية باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

" محسن محمد زهران "

تحريرا في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣
قسم المخططات العامة
رقم الوارد / ١٩٦٨
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣
التوقيع /

مجلس الإدارة العامة

الخاصة بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق
على تنفيذ اعمال استكمال طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالاصر المباشر

(المنطقة الاولى - المركزية)

إيماء إلى موافقة السيد الفريق // وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٣ على المذكرة المعروضة على سيادته بخصوص تنفيذ مشروع اعمال استكمال طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحانوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٩٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣ لشركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الدارق .

والى موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في / / ٢٠٢٣ على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندسة / منال السيد عمر	مدير عام صيانة الطرق	رئيسا
المهندس / محمد فتحي	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندس / محمد عامر	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس /	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الاستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الموافق / / ٢٠٢٣ بمقر الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقاً للاتى :-

م	البند	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتيومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٤٣٠٠٠	١٠,٧٥	٤٦٢٢٥٠
٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٤٣٠٠٠	١٦١,٢٥	٦٩٣٣٧٥٠
	الإجمالي (فقط وقدره سبعة مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيها لا غير)			٧٣٩٦٠٠٠

23/ 2023

طريق قليوب
مجلس الإدارة العامة
شركة اولاد نصر الدين



محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق

على تنفيذ اعمال استكمال طريق قليب / القشيش / كفر طحا / ملحانوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر (المنطقة الاولى - المركزية)

- الاسعار المتفق عليها طبقا لاسعار املاك القائمة الموحدة بقرار ٢٠٢٣ و طبقا لاسعار السوق وقت المفاضلة و اسعار عقود الاسفلت طبقا للمذكرة المعتمدة مراعى فيها زيادة اسعار البتومين والمولار .
- يتم خصم نسبة ٥,٥ % من اجمالي قيمة التعاقد حيث ان اسعار القائمة هي الحد الاعلى للاسعار .
- يتم صرف فروق الاسعار طبقا للمعاملات (بيتومين - مولار) .
- مدة التنفيذ (٦ أشهر) .
- وفي حال المرور على محطات تحصيل للشركة الوطنية لإنشاء وتعمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية وطبقا للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ في حال تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .
- تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .
- وعليه أقبل المحضر بما تم الاتفاق عليه بعاليه .

ممثل الشركة كرسى	التوقيع	التوقيع
السيد المهندس	التوقيع	اللجنة
السيد المحاسب / حاتم بيرت	التوقيع	السيد المهندس /
السيد المحاسب / محمد نصر	التوقيع	السيد المهندس /
السيد الاستاذ /		السيد المهندس /
		السيدة المهندسة /

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /


محسن محمد زهران

أوافق ويعتمد

التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



طرق ج ب

جدول وثيقة

التأمين من المسؤولية المدنية العامة

رقم الوثيقة 19324 و 4

اسم المؤمن له شركة اولاد نصر الدين لانشاء ورصف الطرق

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

طبيعة النشاط (أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين/ شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول 7 كم بمحافظة القليوبية
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

العنوان شقة 2 عقار 5 ش على ضيف من 16 أكتوبر - السلام - القاهرة

مدة التأمين تبدأ من يوم 2023/07/11 الساعة الثانية عشر ظهرا

وتنتهى فى يوم 2024/07/11 الساعة الثانية عشر ظهرا

من المعلوم والمتفق عليه صراحة :

إن التأمين بموجب هذه الوثيقة يغطى عواقب المسؤولية المدنية القانونية التي قد يتعرض لها المؤمن له طبقا للتشريع الحالى من المواد 163 إلى 178 من القانون المدنى المصرى والتي تثبت في حقه بموجب حكم قضائي نهائي وذلك عن أي أضرار جسمية سوء من قبل (المهندس والمقاول والجهة الادارية والاستشارى) قد تلحق بالغير اثناء قيام المؤمن له بمزاولة عمله (أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين/ شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول 7 كم بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ").
رقم العقد : 2197/2022/2023

الحدود الجغرافية / ع.م.ح

الحد الأقصى لمسئولية الشركة

100000 جـم (مائة ألف جنيه مصرى لا غير) الحد الأقصى لالتزام الشركة للشخص الواحد عن الأضرار الجسمية .
100000 جـم (مائة ألف جنيه مصرى) الحد الأقصى لالتزام الشركة للحادث الواحد عن الأضرار الجسمية
100000 جـم (مائة ألف جنيه مصرى) الحد الأقصى لالتزام الشركة خلال مدة التأمين مهما بلغ عدد الحوادث عن الأضرار الجسمية
** لا يجوز إلغاء أو إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من شركة مالهية العامة للطرق والكبارى
التحمل / ال 10 % الأولى من قيمة كل حادث عن الأضرار الجسمية بحد ادنى 10000.00 جـم .
وتشمل حدود المسؤولية المبينة عليه كافة الأتعاب والمصروفات القضائية وجميع مصروفات الدفاع أيا كان نوعها المترتبة عن الحادث والتى توافق عليها الشركة.

حساب القسط والدفعات

القسط الصافي	435.00	نصف دفعة الاتساع	3.00
نصف الدفعة النسبية	2.20	مصاريف الاصدار	55.85
رسم الاشراف والرقابة	2.65	رسوم خدمات مراجعة و اعتماد	0.43
القسط الاجمالى	500.00	صندوق حملة وثائق	0.87
		فقط خمسمائة جنية مصرى لا غير	

ومن المعلوم والمتفق عليه صراحة أن المؤمن له تسلم الشروط العامة للوثيقة وعدد صفحاتها (4).

انتاج / شاهدة حسام الدين راتب

تاريخ الطباعة 2023/07/11



للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office : 13 El Marouta Sq, Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EG 1977

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان الماروتة - الدقي - الجيزة

تلفون : ٣٣٣٦٨١٠ - ٧

بريد : ٧٢ القورمان - الدقي - مصر

فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩ - ٣٣٣٦١٣٦

نقوم بشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على صيرورة الخدمة المسبقة والعمومية

هذه الوثيقة مؤهلة ومحفوظة



كشف باسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة 19323 و 4

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الولاية	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جناية
مهندسين	2	75000	75000	0	3.63
(تأميناً على عدد مهندسين بدون ذكر(2) اسماء					544.50
المبالغ التوضيحية لكل شخص					
مساعد مهندس او ملاحظ فنى	1	30000	30000	0	3.62
تأميناً على عدد(1) مساعد مهندس او ملاحظ فنى بدون ذكر اسماء					108.60
سائق (1) سائق	1	15000	15000	0	3.63
تأميناً على عدد(1) سائق سيرة و من فى حكمهم بدون ذكر اسماء					54.45
عامل على	1	10000	10000	0	3.63
تأميناً على عدد(1) عامل عادى بدون ذكر اسماء					36.30
اجمالى مبلغ التأمين		205000	جنية مصرى		

خصومات و اضافات
عدم ذكر اسم 25.00
186.00

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية على الحوادث التى تقع اثناء وبسبب وداخل موقع العمل فقط وفى مواعيد العمل الرسمية على السادة المؤمن عليهم غير
مذكورى الاسماء اثناء تنفيذ عملية (اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين/ شبين
القطاطر (القطاع الثانى) بطول (سبعة كم) بمحافظة القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبشرط الا يزيد العدد وقت وقوع
الحادث عن الحد المؤمن عليه والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين
رقم العقد : ١٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢١٩٧
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ فولت

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

كشف بأسماء فريق العمل بالشركة

الأسم / العدد	التخصص	سنوات الخبرة
أ / محمود سيف	رئيس مجلس الإدارة	
م / مصطفى هاشم	مدير التنفيذ للطريق	١٠ سنوات
م / أحمد اسماعيل	حاسب كميات	٥ سنوات
م / محمد طه	مهندس كهرباء	٥ سنوات
٢	فنى سلامة مرورية	٥ سنوات
محمد أمين	مساح توتال	٧ سنوات
حسام حسن	مساح ميزان	٧ سنوات
٢	مساعد مساح	٥ سنوات
٢	فنى سلامة مرورية	٥ سنوات
٢	مراقب تنفيذ / فنى مواد	٥ سنوات
٢٠	سائق معدة	
٣	سائق سيارة	
٢٠	عامل	
٣	فنيين الصيانة	
١	فنى مخازن	

شركة أولاد نصر الدين

لإنشاء و رصف الطرق
ت. ٢٨٢٢ ب. ض. ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٨

Tel: 01060325895
01225255373

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

المعدات الموجودة بالموقع

عدد	بيان	الأستخدام / نوع البند
١	مقشطة أسفلت ورتيجن	قشط وازالة الأسفلت
٣	ماكينة انارة ٥٠ ك وات	أعمال التحويلات
١	ونش انقاذ	أعمال التحويلات
١	كلارك	أعمال التحويلات
٢	لودر	أعمال التحويلات ، أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
٢	هراس بوماج هزاز تربة	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
١	جريد	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس ، طبقات FDR الأساس المثبت
٤	قلاّب	أعمال الأتربة ، أعمال الأساس
٢	جرار زراعى مزود بمكنسة	أعمال الأساس
١	تانك مياه نصر	أعمال الأساس ، طبقات الأساس المثبت FDR
١	ماكينة إعادة تدوير الأسفلت ورتيجن FDR	طبقات الأساس المثبت FDR
١	هراس حوافر غنم	طبقات الأساس المثبت FDR

شركة أولاد نصر الدين
لإنشاء و رصف الطرق
ت. ٢٨٤٣٣ ب. ٢٨٤٣٣ - ١٥٤ - ٢٢٨

Tel: 01060325895
01225255373

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

عدد	بيان	الأستخدام / نوع البند
١	معمل أسفلت مواد	مجمع الخلطات ، طبقات الأساس المثبت FDR
١	فنشر أسفلت ديماج	طبقات الأسفلت
١	هراس حديد خفيف ١٢ طن	طبقات الأسفلت
١	هراس حديد ثقيل في حدود ٢٤ طن	طبقات الأساس المثبت FDR ، طبقات الأسفلت
١	منشار قطاعية أسفلت	طبقات الأسفلت
١	عربة مكنسة ميكانيكية	طبقات الأسفلت
١	سيارة رش جامبو	أعمال رش الطبقات بالمياه
١	محطة خلط مركزية	مجمع الخلطات
بطاقة ١٠٠ طن	خزان بيتومين ٧٠/٦٠	
بطاقة ٣٠ طن	خزان R.C	
٢ بطاقة ٤٠ طن	خزان المستحلبات البيتومينية	
١	ميزان بسكول	
٢	ميزان قامة كاملة	الأعمال المساحية
١	جهاز محطة الأرصاد الكاملة Total station	الأعمال المساحية

شركة أولاد نصر الدين

٣
تلفون: ٠١٠٦٠٣٢٥٨٩٥
٠١٢٢٥٢٥٥٣٧٣
ب. ص: ٢٨٤٣
ض: ٦٩٥ - ١٥٤ - ٢٢٨

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
٥٩ عين شمس - الشركة العربية - عين شمس القاهرة

العملية أو المشروع : تنفيذ أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / كفر طحالبوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى) بطول ٧ كم

١ بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصق من البىيومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل لا يزيد عن ٠,٤ كجم/م^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام بمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعقدة والبد بجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

NOTES	QUANTITY	Average width	Length	End Station	Start Station	SERIAL
	8910.490	12.73	700	4+250	3+550	١
	6998.656	11.11	630	6+330	5+700	٢
	7898.329	11.79	670	7+000	6+330	٣
	23807.48	/				الاجمالى

م / ابراهيم الصابر

التوقيع / 

م / امير احمد انور

التوقيع / 

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع / 

المعملية أو المشروع : تنفيذ أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طهوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني) بطول ٧ كم						
٢ بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/١٠ وارادة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة						
NOTES	QUANTITY	Average width	Length	End Station	Start Station	SERIAL
	8910.490	12.73	700	4+250	3+550	١
	6998.656	11.11	630	6+330	5+700	٢
	7898.329	11.79	670	7+000	6+330	٣
	23807.48			الاجملى		

م / مصطفى السيد هاشم

التوقيع /

م / امير احمد النور

التوقيع /

م / ابراهيم الصابر

التوقيع /



طلب استلام

اسم المشروع	اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الاعمال	اعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	١	التاريخ	٢٠٢٣-٧-٢
الموضوع	أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)		

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية	
أعمال أساس	أسفلت	أخرى	

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص:	من المحطة ٣+٥٥٠ حتى المحطة ٣+٨٠٠
--------------	-------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

يلزم غلة الفهرس
يلزم أخذ ملاحظات
يلزم اخذ ملاحظات كارت
يلزم اخذ ملاحظات دة كدمل

مهندس الطرق	مهندس المساحة
لر	

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاسم:	التوقيع:	التاريخ:

طلب أستلام

اسم المشروع	اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الأعمال	اعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٢	التاريخ	٢٠٢٣-٧-٢
الموضوع	أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم		

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٢+٥٥٠ حتى المحطة ٢+٨٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الأستشارى:

يطلب من المقاول ان يمدد العمل الى المحطة ٢+٨٠٠
بلزم على المقاول ان يمدد العمل الى المحطة ٢+٨٠٠
بلزم من المقاول ان يمدد العمل الى المحطة ٢+٨٠٠
بلزم من المقاول ان يمدد العمل الى المحطة ٢+٨٠٠

مهندس الطرق	مهندس المساحة
ل.ل.	

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	المقاول:	المقاول:	المقاول:
الاسم:	الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:

طلب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثانى)	اسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشارى المالك	الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى	المالك
شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٦	التاريخ	٣	رقم الطلب

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	اخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٣+٨٠٠ حتى المحطة ٤+٢٥٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

« يلزم عمل الفحص كى ٤٨ ساعة »
« يلزم الكمية المخطط لها »

مهندس الطرق مهندس المساحة

لم

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		



طلب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثاني)	أسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشاري المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	المالك
شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٢-٧-٦	التاريخ	٤	رقم الطلب

الموضوع أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٢+٨٠٠ حتى المحطة ٤+٢٥٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

يطلب على العميل اذ اصلاحه ان يمدد لمرافقه
يطلب انذريات من ان يمدد
يطلب استلام مراسل اكادوس

مهندس الطرق مهندس المساحة

لرله

النتيجة:

ا	ب	ج	د
---	---	---	---

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الاستشاري:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قلوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شيبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٥	التاريخ	٢٠٢٣-٧-١٥

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٥٧٠٠ حتى المحطة ٦٠٠٠
--------------	------------	--------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

يطلب حله العليم
يطلب اخذ اصناف الاسفلت
يطلب الاسفلت بعد الفحص

مهندس الطرق	مهندس المساحة
لمر	

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:

طلب استلام

اسم المشروع	اعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	6	التاريخ	٢٠٢٣-٧-١٥
الموضوع	أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم		

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٥+٧٠٠ حتى المحطة ٦+٠٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

لم يتم اخذ كميات الدمك و الحفر
بموازنة عمل الطريق
بموازنة كميات عمل الفحص

مهندس الطرق	مهندس المساحة
لم	

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	٧	التاريخ	٢٠٢٣-٧-٢٢

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية	
أعمال أساس	أسفلت	أخرى	

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٦+٠٠٠ حتى المحطة ٦+٣٣٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

بإم عظمه الطريق
بإم اخذ ملاحظات
بإم ٧ بزام بعد الرأى

مهندس الطرق	مهندس المساحة
لر	

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

طلب استلام

أعمال طرق

الأعمال

أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قايوب / الفديش
/ كفر طحا / طحا نوب / كفر شين / شين القناطر
(القطاع الثاني)

اسم المشروع

مكتب حياة للاستشارات الهندسية

استشاري المالك

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

المالك

شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق

المقاول

م / مصطفى هاشم

مدير المشروع

٢٠٢٣-٧-٢٢

التاريخ

8

رقم الطلب

أعمال فرش طبقة الإسفلت السطحية بسماك ٥ سم

الموضوع

مراجعة

الوصف

رقم اللوحة

وصف الأعمال المنفذة:

أعمال مساحية

أعمال تسوية و دمك

حفر

أخرى

أسفلت

أعمال أساس

تفاصيل الفحص:

من المحطة ٦+٠٠٠ حتى المحطة ٦+٣٣٠

مكان الفحص

تاريخ الفحص:

ملاحظات الاستشاري:

مهندس المساحة

مهندس الطرق

م. م. م.

يلزم على المالك
يلزم انشاء الجدران
يلزم اسفلت
يلزم انشاء كبات مع صلاحيات

النتيجة:

د

ج

ب

ا

الاستشاري:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

المقاول:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



طلب أستلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	اسم المشروع
مكتب حياة للاستشارات الهندسية	استشارى المالك	الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى	المالك
شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٢٣	التاريخ	9	رقم الطلب

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين المائل مربع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أساس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٦+٣٣٠ حتى المحطة ٦+٧٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

يلزم عدم العمل
تدريجى على الماكينات
يلزم العمل على
١.٥٤١

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

(RC3000) أعمال رش طبقة لاصق من البتومين استل سريع التصاير)

مطب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قتيوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شنين / شنين القناطر (القطاع الثاني)	أسم المشروع
مكتب حبة للاستشارات الهندسية	استشاري المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البحري	المالك
شركة اولاد نصر الدين لإنشاء و وصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٢٣	التاريخ	10	رقم الطلب

أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم

رقم التوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية ودمك	أعمال مساحية
أعمال لاس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٦+٣٣٠ حتى المحطة ٦+٧٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

للمرور على الموقع
بمجرد اكتمال العمل
بموجب سبب المطالب

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	الاستشاري:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		



طلب استلام

اسم المشروع	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليوب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شبين / شبين القناطر (القطاع الثانى)	الأعمال	أعمال طرق
المالك	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى	استشارى المالك	مكتب حياة للاستشارات الهندسية
مدير المشروع	م / مصطفى هاشم	المقاول	شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق
رقم الطلب	11	التاريخ	٢٠٢٣-٧-٢٤

الموضوع أعمال رش طبقة لاصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000)

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية	
أعمال أساس	أسفلت	أخرى	

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٦+٧٠٠ حتى المحطة ٧+٠٠٠
--------------	------------	----------------------------------

ملاحظات الاستشارى:

نلاحظ خلل العزل مع
تلمس الحصى مع الأسفلت
تلمس الأسفلت مع الحصى
١٠٠ سم

مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

أ	ب	ج	د
المقاول:	الاستشارى:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		

طلب استلام

أعمال طرق	الأعمال	أعمال استكمال رفع كفاءة طريق قليب / القشيش / كفر طحا / طحا نوب / كفر شيبين / شيبين القناطر (القطاع الثاني)	اسم المشروع
مكتب حيلة للاستشارات الهندسية	استشاري المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	المالك
شركة أولاد نصر الدين لإنشاء و رصف الطرق	المقاول	م / مصطفى هاشم	مدير المشروع
٢٠٢٣-٧-٢٤	التاريخ	12	رقم الطلب
أعمال فرش طبقة الاسفلت السطحية بسمك ٥ سم			الموضوع

رقم اللوحة	الوصف	مراجعة

وصف الأعمال المنفذة:

حفر	أعمال تسوية و دمك	أعمال مساحية
أعمال أسس	أسفلت	أخرى

تفاصيل الفحص:

تاريخ الفحص:	مكان الفحص	من المحطة ٧٠٠٠ حتى المحطة ٧٠٠٠
--------------	------------	--------------------------------

ملاحظات الاستشاري:

يتم فحص الطريق
بمجموعه اماكن كسر و ترميم
بمجموعه اماكن كسر و ترميم
بمجموعه اماكن كسر و ترميم


مهندس الطرق	مهندس المساحة

النتيجة:

ا	ب	ج	د
المقاول:	الاستشاري:		
الاسم:	الاسم:		
التوقيع:	التوقيع:		
التاريخ:	التاريخ:		


مقومة شركة : لو لا نصور العين الانشاء ووصف الطريق و المقوم آلات العمدة
استشاري المالك : مكتب جياة الاستشارات الهندسية

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق قليوب - شبين القناطر القطاع الثاني
المالك : اللجنة العامة للطرق والكباري المنطقة المركزية الاولى

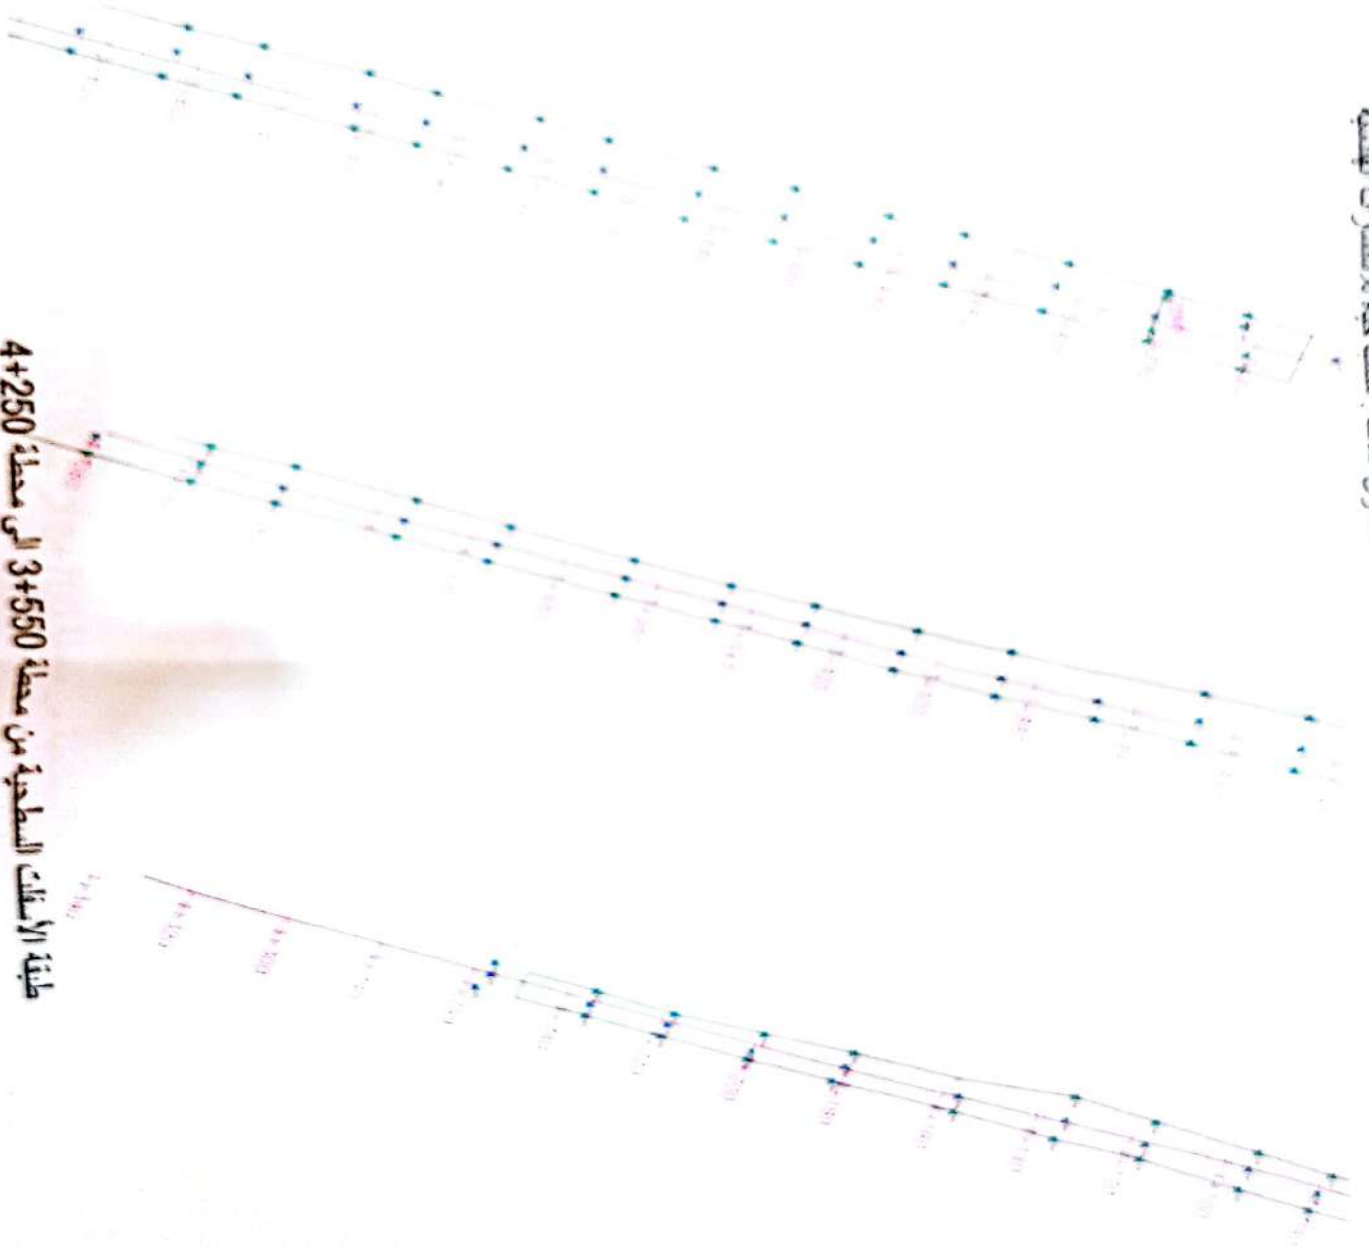

طبقة الأسفلت السطحية من محطة 3+550 الى محطة 4+250

مقارنة شركة : اولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقارلات العامة
استشاري المالك : مكتب حياة للاستشارات الهندسية

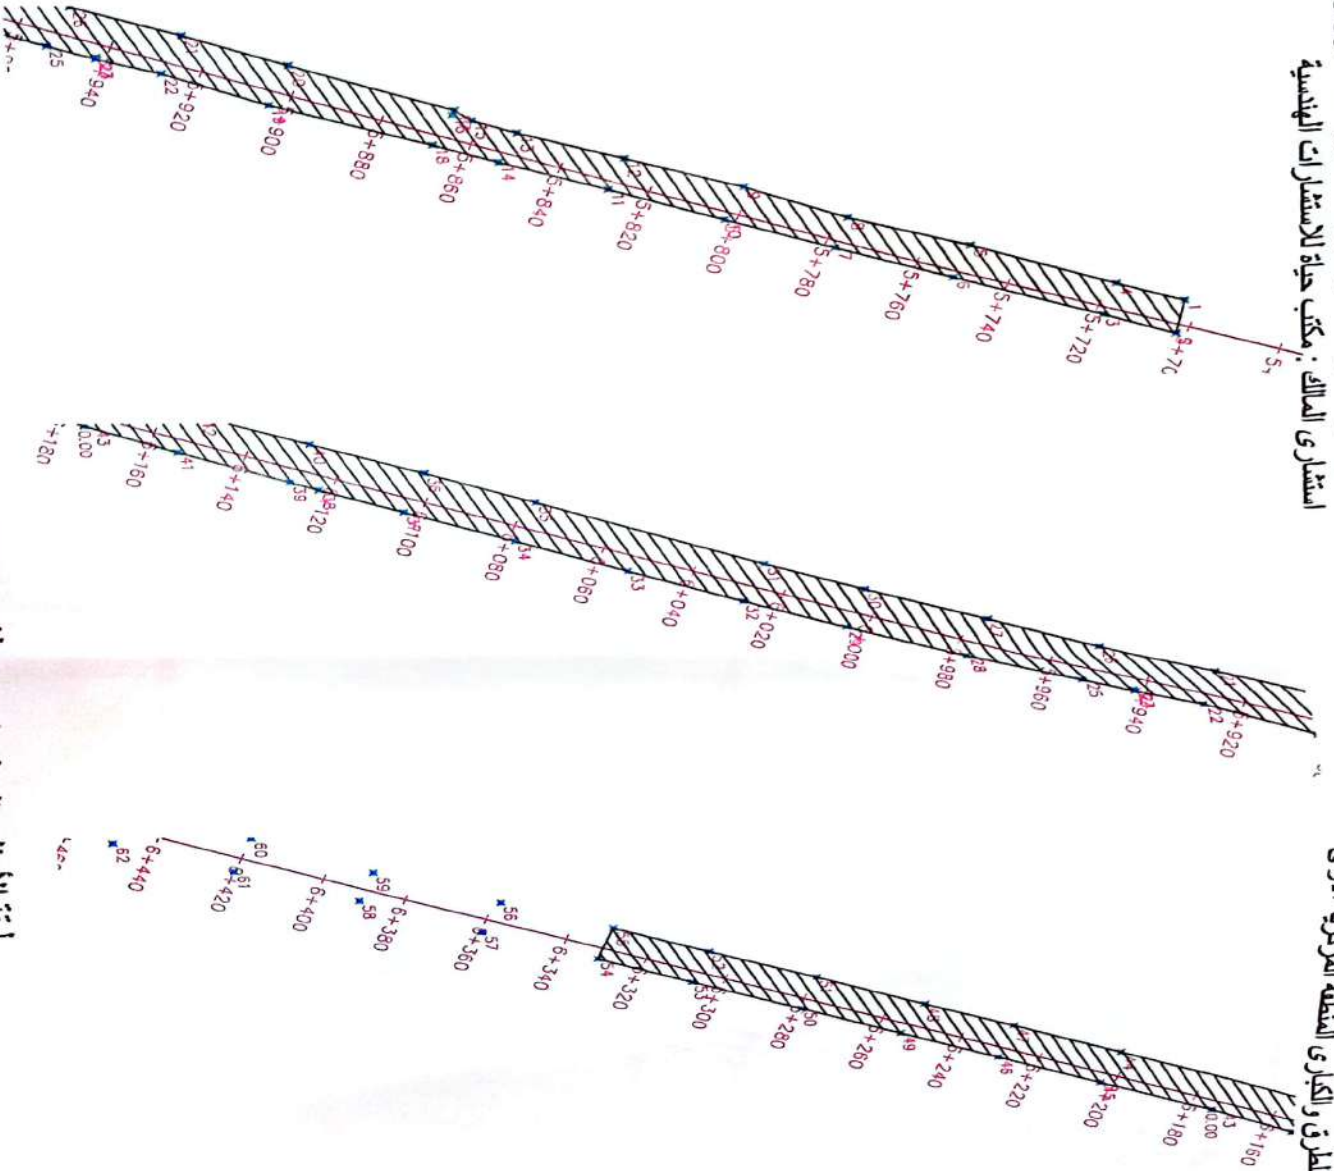

اسم المشروع : رفع كفاءة طريق قليوب - شبين القناطر القطاع الثاني
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة المركزية الاولى

طبقة الاسفلت السطحية من محطة 5+700 الى محطة 6+330

الترتيب ووقت التسليم										الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)										الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)										الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)										الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)																																																																																																																																																																																																																																																											
شهر يناير					شهر فبراير					شهر مارس					شهر أبريل					شهر مايو					شهر يونيو					شهر يوليو					شهر أغسطس					شهر سبتمبر					شهر أكتوبر					شهر نوفمبر					شهر ديسمبر																																																																																																																																																																																																																																												
الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع كلالة الوقت)	الوقت المستعمل (مع

المقاول

الشركة المُنفذة (الولاد نصر الدين لإنشاء ورصف الطرق والمقاولات العامة)

لتوزيع /

م/ مصطفى السيد هاشم

over / 9

استشاري المشروع / مكتب حيازة الاستشارات الهندسية
التوقيع / 
م / إبراهيم الحادي

التوقيع / 
م / علي الحادي

۱۱ / اکتبر ۱۳۵۵

مهندس البيئة
التوقيع / أحمد محمد صادق
م / محمد صادق

2/5

مدير عام التفتيش والصيانة
التوقيع /
م/ محمد عبدالرؤوف راجح

2/15

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

المسألة

Explain this

2/
