



مشروع أصل الجسر الترابي والاصال الصناعية لخط المسكة الحديدية (الروبيلي - العنصر من رمضان - بابيس)

المقاييس المعدلة لبيروت الاصل لتأخذ شركة ترانست للتطوير والمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٧٠٠) في المحطة (١٠٢٠٠) اتجاه الروبيلي بطول ١٥٠٠ م بقيمة ٧.٥ مليون

م	البيان	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملي
	بيروت سيتم تنفيذها طبقا للمدونة بتاريخ ٢٠٢٣ وزيادة الترمين (٢٠٢٣/٣/١) وزيادة السور (٢٠٢٣/٥/١)				
١	أصل الإزالة والتطهير				
١-١	بالمر المكعب أصل تكسر و إزالة المباني الخرسانية عادية أو مملحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكسر خارج الموقع لتقليل المصومية طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مساحة المكعب لمسافة نقل حتى ٣٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل متر مكعب في حالة الزيادة والتفصيل .	م ^٣	٠,٠١	٨٦,٠٠	٠,٨٦
٢-١	بالمر المكعب أصل إزالة المخلفات بجميع أنواعها البناء والرخس والفناء السنوية و..... وتسلم موقع خالي ونظيف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أصل نقل المخلفات خارج الموقع على مسئولية المقاول وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وذلك لمسافة ٥٠٠ م . وفي حالة زيادة مساحة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة يتم احتساب علاوة ٢ جنيه لم ^٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل إنشاء مخلفات ومطامير ومنازل.	م ^٣	٠,٠١	١٧,٠٠	٠,١٧
٣-١	بالمر المسطح إزالة وتطهير المزروعات المتعارضة مع المسار والتي تستلزم لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية بسك ١٥ سم والبيد يشمل التطهير وإزالة الجنور وملئ الحفر والتسوية مع نقل المخلفات لتقليل المصومية وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وتلك لمسافة نقل ١ كم مع احتساب علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١ كم في حالة الزيادة والتفصيل	م ^٢	٠,٠١	٦,١٠	٠,٠٦
٤-١	بالعدد إزالة الأشجار من مسار الطريق والتفصيل منها على أن لا يقل قطر الأشجار عن ٣٠ سم شمل الخيل بارتفاع لا يقل عن ١ متر طبقاً لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	العدد			
٤-١-١	الأشجار لا تقل قطرها عن ٣٠ سم		١	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠
٤-١-٢	الخيل بارتفاع لا يقل عن ١ متر		١	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٥-١	القيام بالاختبار (plate load test) طبقاً لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقاً لملاحق ١ الاختصاص الفنية لجسر المسكة ومادة التريل في كراسة الشروط الخاصة والدواصف الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	العدد	٢٠	٢,٧٥٠	٥٥,٠٠٠





مشروع أعمال الجسر الترابي والاصول الصناعية لخط المسلة الحديدية (الروبيكي - العنبر من رمضان - بابيس)

المقايمة المعدلة لبيوت الاصل لتلبية شركة تراسيت للتطوير والمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٧٠٠) الى المحطة (١٠٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ١٠٠٠ م بقيمة ٧,٥ مليون

م	الرد	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجملي
١	أعمال الحفر				
١_٢	بالمترو المكعب اصلي حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة هذا التربة الصخرية بالمسح المطلوب للوصول للتأسيس اسفل المشروب التسميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المشارون التي تحدها الهيئة لا عدة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارتكاز لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للتصميم الموضحة بالرسومات الطولية والقطاعية المقايمة طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بمسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م			
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة				
	يتم احتساب علاوة ٢ جنيه لم ٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء منقبات ومطامير ومنازل.				
	عمق ٥ متر		٢١,١٣٧,٠٠٠	٢٣,٦٠	٤٩٨,٨٣٣,٢٠
	عمق ١٠ متر		١,٠٠	٢٥,٦٠	٢٥,٦٠
٢_٢	بالمترو المكعب اصلي حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البشور) بالمسح المطلوب للوصول للتأسيس اسفل المشروب التسميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الابعاد والمقاسات والمناسيب الموضحة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح او نقل التربة الصالحة الزائدة الى المشارون التي تحدها الهيئة لا عدة تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والارتكاز لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقا للتصميم الموضحة بالرسومات الطولية والقطاعية المقايمة طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بمسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م			
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة.				
	يتم احتساب علاوة ٢ جنيه لم ٣ لكل ٥ متر عمق وذلك يشمل انشاء منقبات ومطامير ومنازل.				
	عمق حتي ٥ متر		١٠,٤,٨٢٠,٠٠٠	٢٦,٧٠	٢,٧٩٨,٦٩٤,٠٠٠
	عمق حتي ١٠ متر		٤,١١١,٠٠٠	٢٨,٧٠	١١٧,٩٨٥,٧٠
٣_٢	بالمترو المكعب اصلي حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المشروب التسميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ونسك الجيد بالمهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) . وبم تنفيذ طبقا للمناسيب التسميمية والقطاعية العرضية المقايمة بالرسومات التنفيذية المقايمة والمهند بجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بمسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٠٥ جنيه لكل متر زيادة	٣م			
	أ- ذات الجهد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم اسم ٢		٠,٠١	٦١,٧٠	٠,٦٢
	ب- ذات الجهد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم اسم ٢		٠,٠١	٧١,٩٠	٠,٧٢
	ج- ذات الجهد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم اسم ٢		٠,٠١	٨٤,٣٠	٠,٨٤
	د- ذات الجهد اعلى من ٤٠٠ كجم اسم ٢		٠,٠١	٩٨,٩٠	٠,٩٩

هـ





مشروع أصل الجسر الترابي والاصال الصناعية لحظ السفة الحديد (الروبيكي - المنظر من رمضان - باليس)

المقايمة المعدلة لبيود الاصل تنفيذ شركة ترانست للتطوير والمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٧٠٠) الى المحطة (١٠٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ١٠٠٠ م بقيمة ٧.٥ مليون

٢	البنية	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٣	أصل الردم				
١٣	بالمتر المكعب أصل استخدام ناتج الحفر في أصل الردم والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر الترابي والاكتاف (على ان تكون لمبة تحمل كاليفورنيا طبقا للهيئة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياد الاسفلتيه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والتمك الجيد بالمراسات للوصول القصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ ٪ من الكثافه الجافه التسوي ويتم التنفيذ طبقا للمنسب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبيد يجمع مشكلاته طبقا لاسول الصناعه و كراسه الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٠,٠١	٣٤,٠٠٠	٠,٣٤
	السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرة ، على ان يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتأمين وإدارة واستغلال المعابر والملاحات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر.				
	- مسافة النقل حتى ٢ كم.				
	يتم احتساب علاوة ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة				
	في حالة وجود مثقات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنية علي مسافة ١٢ كم في المنق وعند التغير في طول المنق يتم احتسابها نسبة وتناسب				
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدك عن ٩٥ ٪ بحسب زيادة ١ جنية علي كل ١ ٪				
٢٣	بالمتر المكعب أصل تحميل وتوريد ونقل اتره مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياد الاسفلتيه للوصول الي لمبة الرطوبه المطلوبه والتمك الجيد بالمراسات للوصول القصى كثافه جافه لا تقل عن ٩٥ ٪ من الكثافه الجافه التسوي ويتم التنفيذ طبقا للمنسب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبيد يجمع مشكلاته طبقا لاسول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصه بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	٣م			
	- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرة مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المعابر .				
	- مسافة النقل حتى ٢ كم				
	- يتم تشغيل القرمه - اعلي طبقة الردم العلوية بمسلة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام آلات التسويه بسك لا يزيد عن ٢٥ سم				
	- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع القرمه - باستخدام آلات التسويه بسك لا يزيد عن ٢٥ سم				
	- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - علي طبقات باستخدام آلات التسويه بسك لا يزيد عن ٥٠ سم				
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ ٪) للجزء القرمه		٧٠٠٠,٠٠	٤٤,٦٠	٣١٤,٢٠٠,٠٠
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ ٪) للجزء العلوي		٥٤٠٠,٠٠	٤١,٤٠	٢٢٣,٥٦٠,٠٠
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ ٪) للجزء السفلي		١٢٠,٠٠	٢٥,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠
	يتم احتساب علاوة ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .				
	في حالة وجود مثقات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنية علي مسافة ١٢ كم في المنق وعند التغير في طول المنق يتم احتسابها نسبة وتناسب				
	يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام البلوزر في التحجير للأرض المتعاسكة و ذلك طبقا لتحميل القرمه .				
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدك عن ٩٥ ٪ بحسب زيادة ١ جنية علي كل ١ ٪				

شركة ترانست للتطوير والمقاولات





مشروع أصل الجسر القرائي والأصل الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العائر من رمضان - بابيس)

المقابلة المحطة لنبود الأصل تنفيذ شركة ترانست للمقاولات

القطاع من المحطة (٢٠٧٠٠) إلى المحطة (١٤٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ١٥٠٠ م بقيمة ٧,٥ مليون

م	الب	الوحدة	الكمية	القيمة	الأجمالي
٣-٣	بالمنز المسطح أصل تشغيل الأرض الطبيعية بسك ٣٠ سم - في حالة سك الردم أو الحفر لا يزيد عن ٢٠ سم - عندما لا يوجد اختلاف في منسوب التصميم والأرض الطبيعية والأصل تشمل تشغيل التربة مع السك الجديد للوصول في أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى والقيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع. كل ٥٠ متر بطولي لتعديد معايير المرونة بعد التشغيل. وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٠٠,٠٠	١٥,٠٠	٤٥٠٠,٠٠
٤-٣	بالمنز أصل توريد وانضقة اسمنت مطابق للشروط ومواصفات ويضاف بالنسبة المقررة والخطلة التصميمية والبنء شامل كل ما يلزم لتهيئ العمل طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	بالطن	١,٠١	٢,٣٠٠,٠٠	٢٣,٠٠
١	أعمال الخرسانات والعدايات والحماية من المخاطر السيول				
١-١	بالمنز المسطح أصل توريد وسب خرسانة عادية بسك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر راسي لحماية الانكشاف والسيول الجانبية تتكون من ٢م,٠٨ من دولوميت متخرج ٢م,٠٤+ ٢م,٠٤ ومن حرش ٢م,٠٤+ ٢م,٠٤ طبقا لتعليمات الاستشاري (غير + سكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع موضع قوم (بالفاصل) بسك ٦ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبنء يشمل تجهيز ونمك وتثبيت واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة الوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتطبيق السطح وملء الفواصل بالبيتومين الرمل والتفتيش طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣,٩٨٥,٤٣	٤٢٠,٠٠	٩,٦٧٣,٨٨٠,٦٠
	يتم انضقة علوة قعر ٥٠ جنبه بعد أول ١٠ متر راسي على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي).				
٢-٤	بالمنز المكعب أصل توريد وسب خرسانة عادية لتنفيذ قامة سفلية وعلوية للانكشاف والسيول الجانبية تتكون من ٢م,٠٨ من دولوميت متخرج ٢م,٠٤+ ٢م,٠٤ ومن حرش ٢٨٠+ ٢٨٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى الانضقات طبقا لتعليمات الاستشاري (غير + سكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبنء يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وتطبيق السطح والتفتيش طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبنء بجميع مشتملاته وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٣٠٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠	٦٩٠,٠٠٠,٠٠
٣-٤	بالمنز المكعب توريد خرسانة عادية أسفل القواعد الملحمة للامساك تتكون من ٢م,٠٨ من دولوميت متخرج ٢م,٠٤+ ٢م,٠٤ ومن حرش ٢٥٠+ ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى والرمل نظيف وخالي من الطفلة والأملاح والمواد الغريبة بمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وتحت أي ظروف في منطقة العمل والبنء يشمل تجهيز واستبدال السطح مع الرش والدهك أسفل البلاطة الوصول إلى المناسيب التصميمية طبقا للرسومات المعتمدة على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والتفتيش مما جديعه طبقا للروخات المعتمدة وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقا لكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١,٠١	١,٥٥٠,٠٠	١٥,٥٠
٤-٤	بالمنز المكعب أصل تنفيذ خرسانة مسلحة حوائط متباعدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومستوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتهيئ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقا لكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١,٠١	٢,٨٩٠,٠٠	٢٨,٩٠

مصدق





مشروع أعمال الجسر الترابي والاصال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العنابر من رمضان - بنيس)

المقايمة المعدلة لبنود الاصل تنفيذ شراصة تراست للتطوير و التعقولات

القطاع من المصلحة (٢٠٧٠٠) الى المصلحة (١٠٢٠٠) اثناء الروبيكي بطول ١٥٠٠ م بقيمة ٧,٥ مليون

م	البند	الوحدة	الكمية	القيمة	الاصال
١-٤	بالترى الطولى توريد وتركيب برابغ مواسير سائلة التجهيز قطر داخلى كالالى (١١) اسلج منروج من إنتاج شركة مسجورت أو ما يمثها من الفوسفة المسلحة بأبعاد ٣٠٠ كجم / سم ٢ بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم الكبريتات + ٠,٨ م زلط ٠,١٥ م رمل) مع تدعيم نهاليت المسورة بفوس الحديد مع عزل الوصلات بفخيش المطرون مع انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو كسور ويتم رفع أو استبدال أي مسورة يحدث لها شروخ أو كسور مع تقديم نوتة حسابية و ملحق مواصفاتها و والفئة شاملة اصال الحفر حتى منسوب التسعيس وراح البناء و عمل السور و الفئة غير شاملة الردم و لمرسل حول و اعلى المواسير و يتم التنفيذ طبقا لتعليمات المنطقة المختصة و الرسوات المعتمدة المرفقة و البلد لا يشمل الجلب و التنفيذ مما جيمه طبقا للبركات المعتمدة و كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبرى و تعليمات المهندس المشرف و كراسة الشروط و مواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.	م.م			
	أ. قطر ١ متر		٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠
	ب. قطر ١,٥ متر		٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠
	ج. قطر ٢ متر		٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠
	د. قطر ٢,٥ متر		٠,٠١	٢٠,٥٤٥,٥٢	٢٠,٥٤٦
٦-٤	بالحل توريد حديد تسليح (١٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية و السور بشكل التشليح و التشكيل و النقل و التركيب و وصل الوصلات التي لم ترد في الرسومات و التنفيذ مما جيمه طبقا للبركات المعتمدة و كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و طبقا لكراسة الشروط و المواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) و تعليمات المهندس المشرف	طن	٠,٠١	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
٧-٤	بالترى الطولى توريد وتركيب مواسير U.P.V.C تتحمل ضغط ٦ بار و الفئة تشمل توريد جميع الإكسسوارات لجميع المراسير و ضبط المنول و المواد اللاصقة و دفع الكاربات و كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط و مواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبرى و تعليمات المهندس المشرف	م.م			
	١ بوصة		٠,٠١	٢٧٥,٠٠	٢,٧٥
	٦ بوصة		٠,٠١	٤٧٥,٠٠	٤,٧٥
٥	أعمال طبقات الاساس للسكة الحديد				
١-٥	بالترى المكعب اصال توريد وفرش و تشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبة الصخرية من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية لسكة الحديد و الصني حجم الحبيبات ما بين ٢١,٥ مم الى ٥٠ مم و الا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الولد بالاشراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحصيل كالفورنيا لا تقل عن ٨٠ % و لا يقل معامل الصلابة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٦٠ ميجاباسكال و لا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٢٠ % و لا يزيد الاستساس عن ١٠ % و الفئة تشمل اصال الردم الخلط الجيد و إضافة المياه المطلوبه للوصول الى الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات و التمسك على طبقات حتى الوصول للتصميم و الانحدارات و القواعد الطولية و العرضية باستخدام المعدات بمنظف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جقة لا تقل عن ٩٨ % من الكثافة الجقة القصوى و كل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و طبقا لكراسة الشروط و المواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) و تعليمات المهندس المشرف.	م.م	٤٠٠٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٩,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
	مساحة النقل ٢٠ كم				
	السور لا يشمل قيمة المادة المحجورة و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر				
	القيام بالتحليل (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشارى العام للمشروع لكل ٥٠ متر طولى				
	يتم احتساب علاوة ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم.				

م.م





مشروع أصل الجسر الترابي والأصل الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العنبر من رمضان - باليس)

المقاييس المعدلة لبيدود الأصل لتتلاءم شركة ترانس لتطوير والمقاولات

القطاع من المحطة (٢٥٧٠٠) إلى المحطة (١٥٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ١٥٠٠ م بقيمة ٧.٥ مليون

م	البند	الوحدة	الكمية	القيمة	الأجمالي
١	أعمال الطرق				
١-١	بالعمر المكعب أصل تروريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المنتزجة ناتج تكسير الكسرات والمسطحة للمواصفات والفرش الفردي بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة القادح بجهاز لوس أنجلوس عن ١٠% ولا يزيد الانتماس عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام القادح عن ٢٠سم ورشها بالهواء الأسفلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمراسم للوصول إلى أقصى كثافة جافة نسوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المسلية والقناة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقات الأساس الصناعية والرسومات التنفيذية المشددة والمهندسين مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحمورة و على الشركة التعاقد تقديم ما يلزم من الجهات الرسمية المشروقة عن المعايير .	٣م	١,٠١	٢١٤,٠٠	٢,١٤
٢-١	بالعمر المسطح أصل تروريد ورش طبقة تشريب من الببتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ فرش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المشددة والمهندسين مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١,٠١	٣٠,٩٠	٠,٣١
٣-١	بالعمر المسطح أصل تروريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد القادح باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والببتومين السلب ٦٠/٧٠ وإردة شركة النصر بالموسم أو ما يعادلها والقناة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المشددة والمهندسين مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١,٠١	١٦٤,٠٠	١,٦٤
٤-١	بالعمر المسطح أصل تروريد وفرش طبقة لاصقة من الببتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م ^٢ فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المشددة والمهندسين مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١,٠١	١٠,٦٠	٠,١١
٥-١	بالعمر المسطح أصل تروريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد القادح باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والببتومين السلب ٦٠/٧٠ وإردة شركة النصر بالموسم أو ما يعادلها والقناة تشمل إجراءات التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المشددة والمهندسين مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١,٠١	١٥٩,٠٠	١,٥٩
	الأجمالي			٧,٥٠٠,٠٠٠	

مدير الإدارة المركزية
سلطان
م/سلطان صالح





حصر اعمال مستخلص رقم (٢)

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٢+٧٠٠ الى الكم ٤+٢٠٠

بند رقم 5_1

اختبار (plate load test)


طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع.

القيام بعدد ١٦ عينة اختبار PLATE Load Test

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

كويت





حصر اعمال مستخلص رقم (٢)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)

بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٢+٧٠٠ الي الكم ٤+٢٠٠

بند رقم 2_1

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة
عدا التربة المتماسكة و الصخرية والتي تشمل تباب مخلفات مدموكة

من محطة	الي محطة	كمية الحفر حتى - ٥	كمية الحفر حتى - ١٠	كمية الحفر حتى - ١٥	ملاحظات
2+700	4+200	13,150.00	-	-	(EG1-EG2)
الإجمالي =		13,150.00	-	-	

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

م. ك. ك.





حصر اعمال مستخلص رقم (٢)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٢+٧٠٠ الى الكم ٤+٢٠٠

بند رقم 2_2

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخريه (باستخدام البلدوزر)

كمية الحفر حتى -١٥	كمية الحفر حتى -١٠	كمية الحفر حتى -٥	الى محطه	من محطه
-	-	2,077.77	2+860	2+700
-	-	27,962.21	3+720	3+260
-	-	1,960.87	3+840	3+800
-	2,758.17	34,073.23	4+200	3+920
-	2,758.17	66,074.08	الإجمالي =	

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

كورد





حصر اعمال مستخلص رقم (٢)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس) بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٢+٧٠٠ الي الكم ٤+٢٠٠

بند رقم 2_3

بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه
(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمة

من محطة	الي محطة	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمة
2+700	2+840	788.48
3+260	3+360	563.20
3+720	3+920	549.70
3+920	4+200	1,576.96
الإجمالي =		3,478.34

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

كسور





جسر اتصال مستطابق رقم (٢)

ملاحظة : اتصال الجسر الفرعي المتكروخ الكفاء وحيدة مسكة خلية (الروبوتاني / العائلي من ريشان / بلهوس)
يعطى ٢٠ كم وحيدة العينة الجاهل للمحافظة من الكم ٢٠٠٠٠ كم الكم ٢٠٠٠٠ كم

بنا رقم 2_3


بالمعنى المكعب اتصال تحميل وتوريد وتلك التربة
(على ١٠ كل وحدة تحميل كالكولور لها من ٠ ٠ %) التحز + التحوي

من محطة	الي محطة	(على ٠ كل وحدة تحميل كالكولور لها من ٠ ٠ %) التحز + التحوي
2٠700	2٠840	2,442.88
3٠720	3٠920	١,272.23
الإجمالي *		3,715.09

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

ك. م. م. م.





حصر اعمال مستخلص رقم (٢)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بليس)
بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٢+٧٠٠ الى الكم ٤+٢٠٠

بند رقم 2_3

بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية
(على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي

من محطة	الى محطة	كمية الردم (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي
3+720	3+920	77.32
الإجمالي =		77.32

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

كوثر





حصر اصال مستخلص رقم (٢)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمصالح من الكم ٢+٧٠٠ الي الكم ٤+٢٠٠

بند رقم 1_5

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة
اساس سكة (Subballast)

من محطة	الى محطة	كمية اساس سكة SUBBALLAST
3+260	3+340	132.00
3+400	4+200	1,320.00
الإجمالي =		1,452.00

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

كويت



محضر اعتماد حصر كميات تقطاع

تاريخ	02/10/2023	الموافق يوم الاثنين	
اسم المشروع	اعمال الحصر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بنيس)		
قطاع	(2+700.4+200)	النقطة	الروبيكي
		اسم الشركة المنفذة	تراست

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنقذة الخاصة بشركة (تراست) ، واعتمادها من الاستشاري العام للهيئة القومية للسكة الحديد مصر (خط الروبيكي) .

م	البيد	الكمية الاجمالية المنقذة	ملاحظات
١	اعمال الازالة والتطهير		
5_1	اختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع	16	
٢	بند الحفر		
2_1	حفر في جميع انواع التربة عدا التربة المتماسكة والتربة الصخرية		
	عمق الحفر حتى ٥ متر	13,150.00	
	عمق الحفر حتى ١٠ متر		
2_2	حفر في تربة متماسكة		
	عمق الحفر حتى ٥ متر	66,074.08	
	عمق الحفر حتى ١٠ متر	2,758.17	
	اجمالي كميات الحفر	81,982	
٣	بند الردم		
3_2	تحميل ونقل الاتربة		
	للجزء السفلي	77 32	
	للجزء العلوي	3,715.00	
	للترمة	3,478.00	
	اجمالي كميات التربة	7,270.32	
٥	بند الاساس		
1_5	اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس السكة (subballast)	1452.00	
	اجمالي كميات الاساس	1,452.00	

يوسف ويحيى
الاستشاري العام للمشروع

مدير عام المشروعات

سب

مدير للمشروع

مستع

مهندس الشركة

اسماعيل

المهندس المشرف

رؤف

اصال العصر الترمي من مشروع إنشاء وصلة منكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلدي) قطاع الميناء الخاف

الهيئة الروبيكي تأييد شركة ترانس

عقد صلابة (١٨٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

بيان الاصل التي تمت في العقد الى تاريخ ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٣

م	البند	عقد صلابة (١٨٧٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)			
		اجملي	جاري ٢	مقبولة معدلة (١)	جاري ١
١	اصال الآلة والتجهيز				
5_1	اختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشرى وتم تشروع	16	0	20	0
2	بند الحفر				
2_1	حفر في جميع انواع التربة عدا التربة المتوسطة والتربة الصخرية				
	عنى الحفر حتى ٢ متر	13,150.00	750.00	21,137.00	12,400.00
	عنى الحفر حتى ١٠ متر	0	0	0	0
2_2	حفر في تربة متوسطة				
	عنى الحفر حتى ٥ متر	64,500.00	3,400.00	104,820.00	61,100.00
	عنى الحفر حتى ١٠ متر	2,500.00	250.00	4,111.00	2,250.00
3	بند الآلية				
	تحميل ونقل الآلية				
3_2	تجزء سطحي	0	0	120.00	0
	تجزء عموي	3,200.00	3,200.00	5,400.00	0
	تقربة	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0
5	بند الاسفلت				
1_5	اصال عمود وبارش وتشمل طبقة اسفلت (subballast)	1,100.00	1,100.00	4,000.00	0

مدير الموقع

المهندس المشرف

مهندس التربة

اعمال الجسر الثرابي من مشروع إنشاء وصيانة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) قطاع الميناء الجاف

اتحاد الروبيكي تنفيذ شركة تراست

بيان بأجمالي الاعمال التي تمت صرفها من بداية العمل حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢١

م	البند	حسب عملية (١٨٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)			الكمية المنصرفة للقطاع
		اجملى	جاري ٢	جاري ١	
١	اعمال الازقة والتفتير				
5_1	اختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع	16	16	-	16
2	بند الحفر				
	حفر في جميع أنواع التربة عدا التربة المتسقة والتربة الصخرية				
2_1	صق الحفر حتى ٥ متر	13,150.00	750.00	12,400.00	13,150.00
	عمق الحفر حتى ١٠ متر	-	-	-	-
2_2	حفر في تربة متمسكة				
	صق الحفر حتى ٥ متر	64,500.00	3,400.00	61,100.00	64,500.00
	صق الحفر حتى ١٠ متر	2,500.00	250.00	2,250.00	2,500.00
3	بند الاتربة				
	لحميل ونقل الاتربة				
3_2	للجزء السفلي	-	-	-	-
	للجزء العلوي	3,200.00	3,200.00	-	3,200.00
	للرمة	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
5	بند الاسس				
5_1	اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اسس (subballast)	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00

مدير المشروع



المهندس المشرف



مهندس الشركة



محضر مسافة توريد سن

٢٠٢٣ / ٩ / ٢٦	التاريخ
تراسـت للمقاولات والتطوير	اسـم الشركة
قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس	اسـم المشروع
٤+٢٠٠ الى ٢+٧٠٠ من	نطاق العمل

قام كلا من مهندس الاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد السن المتواجد في عتاقه (كسارة ٦ أكتوبر) الى قطاع الشركة بوصلة الميناء الجاف الخاص بشركة تراسـت للمقاولات للتطوير ،

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل إلى عتاقه (كسارة ٦ أكتوبر) هي (١٣٥) كم .

لمحمد لؤي
مهندس الاستشاري العام

١٣
٢٠٢٣

مهندس الهيئة

١٣
٢٠٢٣

مهندس الشركة
شركة تراسـت للتطوير والمقاولات
إدريس محمد
ب.ض: ٦٥٢-١١٢٠١٧٣
س.ن: ٢٢٦٥٥
٢٠٢٣



محضر معاينة أرض طبيعية M2

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ٢٧

المشروع : (أعمال الجسر لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس)

المادة : المهندسون الإستشاريون العرب مكتب (محرم بالخموم)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالمروور على قطاع شركة تراسست لمعاينة القطاع لمسار خط سكة حديد الروبيكي - بلبس

تبيين وجود الآتي :

STATION	وصف القطاع
2+700 : 2+860	تربة متماسكة
2+860 : 3+300	عوائق متمثلة في (طريق أسفلتي + خطوط مياه + خطوط غاز)
3+300 : 3+740	تربة متماسكة
3+780 : 3+860	تربة متماسكة
3+900 : 4+200	تربة متماسكة

وبالتالي يتم عمل جسفت إسترشادية باستخدام اللودر تبيين تحجرها وتماسكها مما يصعب قطعها باستخدام اللودر وقد تم أخذ

عينات بأماكن متفرقة من القطاع تم توضيحها في المحضر وذلك للتأكد من صلاحية تلك التربة ،

وبناء عليه يتطلب قطع هذه التربة (باستخدام البلدوزر) للوصول إلى منسوب أرض طبيعية التي يحددها

عمل الجسفت البريمية .

التاريخ :


مقدمه لسيادتكم

الإستشاري العلم

مهندس الإستشاري

المهندسون الإستشاريون العرب

مكتب محرم - بالخموم



محضر مسافة مقلب

بداية من تاريخ / ٢٢ / ٥ / ٢٠٢٣

مشروع وصلة السمك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) شركة تراسن من

المحطة ٧+٧٠٠ الى محطة ٤+٢٠٠

قام مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص بشركة قراست إلى المقلب المحدد عن طريق مهندس الهيئة ..

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذه
مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

1- م / ب - م / د
2- م / ص - م / ح

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الى موقع المقلب هي ٧,٥ كم

فصل الفروع
الإستشاري العام
١٢/٥/٢٠٢٢

مهندس الهيئة العامة
د. محمد

مهندس الشركة المنظمة

شركة تراث العرب للمقاولات
الشارع ١٠٠، حي الميناء، بيروت - لبنان
هاتف: 731-720-652
فاكس: 22605

محضر مسافة مقلب

مع سناء إيهاب كيات الحفلة المنفذة من ١٥/٩/٢٠١٢ إلى ٢٠/٩/٢٠١٢ وقطاع المسافة النقل ١٤/١٥

(١-٥) من م/١٤١٥٠,٠٢ إلى م/١٤١٥٠,٠٢

(٢-٥) من م/١٤١٥٠,٠٢ إلى م/١٤١٥٠,٠٢

في م/١٤١٥٠,٠٢

التاريخ ١٤/٩/٢٠١٢

إبامبا ١١/٩/٢٠١٢

مشروع وصلة السكك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) شركة تراسيت من

م/١٤١٥٠,٠٢

المحطة ٧٠٠ + ٢ إلى محطة ٢٠٠ + ٤

قام مكتب المهندسين الاستشاريين العرب (محرم - باخوم) برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص
شركة تراسيت إلى المقلب المحدد عن طريق مهندس الهيئة ..

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذة
مهندس استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م/١٤١٥٠,٠٢

٢- م/١٤١٥٠,٠٢

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل إلى موقع المقلب هي ١٤١,٥٠ كم

١٤١,٥٠

مهندس استشاري الهيئة العامة

المهندس الاستشاري

١٤١,٥٠

مهندس الشركة المنفذة

١٤١,٥٠

شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
١٤١,٥٠
٧١٠-٧١٠-٧١٠
٧١٠-٧١٠-٧١٠

نقل أنرجي A3 من مشون شركة يسري

محضر مسافة نقل مشون شركة يسري

التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٦
اسم الشركة	ترست للتطوير والمقاولات
اسم المشروع	قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس
نطاق العمل	من ٢٠٧٠٠ الى ١٠٢٠٠

قام مهندس الاستشاري العام ومهندس الهيئة برصد مسافة توريد تربة (A3) من مشون شركة يسري المتواجد في وصلة الميناء الجاف إلى القطاع الخاص شركة ترست المتواجد في وصلة الميناء الجاف .
وذلك بحضور كلا من :

- ١- م / إسلام كامل مهندس الشركة المنفذة
- ٢- م / محمد بساميل مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- م / محمد يحيى مهندس الاستشاري العام

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المشون هي (٧) كم.

الإحداثي	Y	X
إحداثي المشون	٨٣٧٢٩٧,٠٨٣	٦٩٠١٩٧,٣١٦
إحداثي الموقع (القطاع)	٨٣٤٢٣٥,٦٤٩	٦٨٦٥١٤,٧٢٠

مع العلم باننا تم تنفيذ كمية قدرها (٢٣٨٠) م^٣ التراب والتربة في مكانه وتسليمه لمركبة مقطورة الشركة
على هذه المسافة المسجلة

مهندس الاستشاري العام
ع.ع

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري
ك.ع

مهندس الشركة المنفذة
ترست للتطوير والمقاولات
٢٢٦٥٥
٢٢٦٥٥

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٩	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (49)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة فيرما لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة فيرما لقطاع ردم
مكان العمل	2+700 : 2+840		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
ليوفر ملاحظات المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

مهندس الاستشاري العام :
غير التوقيع
الاسم
التوقيع

الاسم
التوقيع

شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
الإسم
التوقيع
731-720-652
22605



القاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراس٩ للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٤٧٠٠ حتى المحطة ٤٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (48)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم (- ٠,٢٥)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (قطاع ردم)
مكان العمل	2+700 : 2+860		
		☐ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

رقم تكرار تقديم الطلب

المسؤول

موقف الأعمال :

☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض	١ - الأعمال المساحية :
☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض	٢ - أعمال الجودة :
☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض	٣ - الأعمال المدنية :
☐ مستوفي	☐ غير مستوفي		٤ - العرض الكامل :

ملاحظات :

لم يستلم (المساحة)

☐ موافق	☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐ مرفوض ويعد تقديمه	نتيجة هذه الأعمال :
--------------------------------	--	--	---------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

لعمد المرفوع
مهندس الاستشاري العام :

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة تراس٩ للتطوير والمقاولات
الإسم /
التوقيع /
٧٣١-٧٢٥-٦٢٢
٢٥٥٥



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١١	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترامت للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٧٠٠ حتى المحطة ٤٠٢٠٠

RB – RSCCE – GARBL – IR - EMB – (47)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة سن (١) (+ ٠,١٥) SUBBALLAST

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة سن (٠,١٥) SUBBALLAST
مكان العمل	3+720 : 3+920		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
لهم استلام المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام :

الاسم / التوقيع : الاسم / التوقيع : الاسم / التوقيع :

١٢ طر عبد الناصر حاتم - زمرية - الجيزة - مصر
ب.ص: 731-720-652
ت: 22605



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٩	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (46)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم (- ٠,٥٠)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (قطاع ردم)
مكان العمل	2+700 : 2+860		
رقم تكرار تقديم الطلب		☒ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض وبعك تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صور و رقمية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام :

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (45)

برجاء التكرم باستلام الآتي : طبقة من	SUBBALLAST (1)
--------------------------------------	----------------

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة من SSUBBALLAST (1)
مكان العمل	4+140 : 4+200		
	رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢- أعمال الجودة :	مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :
بموجب هذا الترخيص


نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات يعالجه	مرفوض ويعتد بتكديده
---------------------	-------	-------------------------------	---------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٣	الإتجاه	وصلة بابيس
الشركة المنفذة	شركة تراسك للتطوير و المقاولات	لطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (44)

برجاء الفكرم بإستلام الأتي : طابقة من ١ (٠,١٥+) Subballast 1
--

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	Subballast 1 (+0.15)
مكان العمل	3+940 : 4+140		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- المعالجة الظاهرية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
تم العمل على الموقع مع ملاحظات بمليه

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بمليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	---	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
محمد خالد	محمد خالد	محمد خالد

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٣٠	الإنتهاء	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترامت للنظوبر و المفاولات	نظام العمل	من المحطة ٢٤٧٠٠ حتى المحطة ١٤٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (42)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة ردم - ٠,٧٥

نوع العمل	أعمال ممساحة و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم
مكان العمل	2+860 : 2+700		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقييمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (41)

برجاء التكرم باستلام الأتي : طبقة فيرما

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة فيرما
مكان العمل	3+720 : 3+920		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :

شركة تراسيت للتطوير والمقاولات

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام

الاسم / حبه إبراهيم
التوقيع /

مهندس الشركة :
شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
الاسم /
التوقيع /



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٢	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (40)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة فيرما لقطاع احلال

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة فيرما (قطاع احلال)
مكان العمل	4+080 : 4+120		
	رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال : ☒
---------	--

١- الأعمال المساحية :	☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢- أعمال الجودة :	☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٤- العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	☐ موافق	☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐ مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	--------------------------------	--	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
الاسم /	الاسم /	الاسم /
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الزوبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٢ / ٨ / ٢٢	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (39)

برجاء التكرم باستلام الأتي : طبقة فيرما لقطاع احلال

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة فيرما (قطاع احلال)
مكان العمل	3+380 : 3+260		
	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	


المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالیه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
مهندس الشركة :	الاسم / م. ابراهيم /	الاسم / م. احمد /
مهندس الشركة :	التوقيع /	التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٢	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترانست للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB – RSCCE – GARBL – IR - EMB – (38)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم لقطاع احلال (-٢٥,٠)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم لقطاع احلال
مكان العمل	3+720 : 3+780		
	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري العام :
الإسم / التوقيع	الإسم / التوقيع	الإسم / التوقيع
محمد بنور	محمد بنور	محمد بنور



التاريخ	٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٧٠٠ حتى المحطة ٢٠٢٠٠

RB – RSCCE – GARBL – IR - EMB – (37)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : طبقة ردم لقطاع احلال (٢٥٠٠)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم لقطاع احلال
مكان العمل	3+860 : 3+900		
	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشوري العام :
الإسم / التوقيع	الإسم / التوقيع	الإسم / التوقيع
محمد محمود	أحمد الكود	أحمد



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠	الاتجاه	وسيلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترانسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٢+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (36)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم لقطاع احلال (١ -)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (قطاع احلال)
مكان العمل	2+700 : 2+840		
		الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال : ع
---------	------------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرغوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرغوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرغوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرغوض ويعد تقبمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .
الاسم / هبة إبراهيم علي	الاسم / هبة إبراهيم علي	
التوقيع / هبة	التوقيع / هبة	
شركة ترانسيت للتطوير والمقاولات	مهندس الاستشاري العلم	
الاسم / هبة إبراهيم علي		
التوقيع / هبة		
شركة ترانسيت للتطوير والمقاولات		
الاسم / هبة إبراهيم علي		
التوقيع / هبة		
شركة ترانسيت للتطوير والمقاولات		
الاسم / هبة إبراهيم علي		
التوقيع / هبة		



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB – RSCCE – GARBL – IR - EMB – (35)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم لقطاع احلال (٠,٢٥)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (قطاع احلال)
مكان العمل	4+120 : 4+080		
	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال : ع	المعمول
------------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد نقضيه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة -

بمعد
مهندس الاستشاري العلم

الاسم / هبة لياح
التوقيع /

شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
١١ ش. عبد المنعم رياض
ب. ش. ٦٣٠-٦٣١
الاسم /
التوقيع /



القاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسم للتطوير والمخاولات	نطال العمل	من المحطة ٢٧٠٠ حتى المحطة ١٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (34)

برجاء التكرم باستلام الأتي : طبقة ردم (٠,٥٠)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (قطاع ردم)
مكان العمل	3+720 : 3+780		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال : E
---------	------------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعلية ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	---	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	تتقدم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .
الإسم / التوقيع : محمد غازي	الإسم / التوقيع : هبة إبراهيم	مهندس الاستشاري : العبد



القاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسن للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٧٠٠ حتى المحطة ٢٠٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (33)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم (٠,٥٠ -)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (قطاع ردم)
مكان العمل	3+860 : 3+900		
	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال : ع
---------	------------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

Handwritten signature

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صور و رقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

Handwritten signature

مهندس الاستشاري العام

الاسم / هبة / هبة
التوقيع / هبة

الاسم / محمد / محمد
التوقيع / محمد



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٧	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB – RSCCE – GARBL – IR - EMB – (32)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم (٠,٧٥)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (قطاع ردم)
مكان العمل	3+720 : 3+780		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

يعتمد ...

مهندس الاستشاري العام





التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٧	الإنتاج	وصلة المعيناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسم للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٤٧٠٠ حتى المحطة ١٤٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (31)

برجاء التكرم باستلام الأتي : طبقة ردم (٠,٧٥)

طبقة ردم (قطاع ردم)		وصف العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	نوع العمل
			3+900 : 3+860	مكان العمل
☐ الثالث	☐ الثاني	☐ الأول	رقم تكرار تقديم الطلب	

المصنوعون

موقف الأعمال :

	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☒ مقبول	١- الأعمال المساحية :
	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول	٢- أعمال الجودة :
	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول	٣- الأعمال المدنية :
		☐ غير مستوفي	☐ مستوفي	٤- العرض الكامل :

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :

موافق

موافق مع عمل الملاحظات بعاليه

11

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

١٢١ بعد

(6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)

مهندس الاستشاري العلم

الاسم
للقول

مهندس
الفرقة الأولى للتطوير والمقاولات
11 شارع عبد القادر جليل - أرياف - الجزائر
الإيميل: 73373214-6682
التليفون: 2260507



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسن للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٤٧٠٠ حتى المحطة ٤٤٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (30)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة فرما لقطاع احلال

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة فرما
مكان العمل	4+120 : 4+200		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
الإسم / التوقيع	الإسم / التوقيع	الإسم / التوقيع
.....		

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٥	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (29)

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقة ردم لقطاع احلال (٠,٢٥ -)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (قطاع احلال)
مكان العمل	3+260 : 3+380		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال : ع
---------	------------------

١ - الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢ - أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣ - الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤ - العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .		
مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	يعتمد ...
شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	مهندس جبريل	مهندس الاستشاري العام
باسم : ٢٠٢٣ / ٨ / ١٥	التوقيع	
٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣		

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابيبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٥	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٧٠٠ حتى المحطة ٢٠٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (28)

برجاء التكرم باستلام الآتي : تسليم طبقة سن SUBBALLAST (1)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة سن SUBBALLAST (1)
مكان العمل	3+560 : 3+700		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال
---------	--------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض ويعد تقنيته ☐
---------------------	--------------------------------	--	--


تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

بمقتضى
مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٥	الإتجاه	وصلة العيناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترامت للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (27)

برجاء التكرم باستلام الآتي : تسليم طبقة فيرما

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة فيرما
مكان العمل	3+920 : 4+080		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

تم الاستلام

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعبارة ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

يعتمد :

مهندس الاستشاري العام

الإسم / محمد دلال

التوقيع / محمد دلال

الإسم /
التوقيع /

مهندس الاستشاري العام

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



وصلة الميناء الجاف	الاتجاه	٢٠٢٣ / ٨ / ١٤	التاريخ
من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠	نطاق العمل	شركة تراست للتطوير والمقاولات	الشركة المنفذة

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (26)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة استبدال لقطاع ردم (- ١,٢٥)

توصيل	توصيل مساحية و أعمال جردة	توصيل
مكان العمل	2+700 : 2+840	مكان العمل
رقم تكرار تقديم الطلب		رقم تكرار تقديم الطلب

موقف الأعمال :

١- الأعمال المساحية :	مقبول	☒	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول	☐	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	☐	مقبول مع ملاحظات	☐	مرفوض	☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي	☐	غير مستوفي	☐		

ملاحظات :

مرفوض ويقتضي	☐	موافق مع عمل الملاحظت بعاليه	☐	موافق	☐
--------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-------	--------------------------

نتيجة هذه الأعمال :

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقيه أو ضوئية من طلب الإستلام .


مهندس الهيئه : مهندس ()

مهندس الاستشاري العام : مهندس ()

التوقيع : ()

الاسم : ()

التوقيع : ()





التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (25)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة ردم (١ - م)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم
مكان العمل	3+720 : 3+780		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام :
 الإسم / مكرم كرم
 شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
 ١٠ ش. عبد الله حاتم - أريحا - قطاع غزة
 ب.ص: 731-720-652
 ت: 22605

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (24)

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقة ردم (م ١ -)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم
مكان العمل	3+860 : 3+900		
رقم تكرار تقديم الطلب		الاول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐






المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكلي :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صور ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :  مهندس الهيئة :  يعتمد ،،
مهندس الاستشاري العام :  التوقيع : 
شركة تراسيت للتطوير والمقاولات : 



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترانست للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتي المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (23)

يرجاء التكرم بإستلام الأتي : عروض ارض طبيعية لقطاع احلال (٠,٥٠ -)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض ارض طبيعية
مكان العمل	3+260 : 3+380		
رقم فكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☒	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :	كم الإجمالي (3 + 260 3 + 340)
-----------	---

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة :
 الاسم / التوقيع :
 مهندس الاستشاري العام :
 شركة ترانست للتطوير والمقاولات
 ٢٢٦٠٥ / ٢٢٦٠٥
 ٢٢٦٠٥ / ٢٢٦٠٥

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (22)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة سن (٠,١٥+) SUBBALLAST (1)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	SUBBALLAST (1) (+0.15)
مكان العمل	3+400 : 3+560		
	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام :

الإسم / التوقيع : الإسم / التوقيع : الإسم / التوقيع :



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - EMB - (21)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم طبقة ردم (١,٢٥ م)

نوع العمل	اعمال مساحية و اعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم
مكان العمل	3+860 TO 3+900	توقيع مهندس الشركة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
إستلام المهندس الإستشاري		ب. ش: 731-720-652 ت. 22605	
رقم تكرار تقديم الطلب		☒ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

موقف الأعمال :	المسؤول
١- الأعمال المساحية :	☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
٢- أعمال الجودة :	☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
٤- العرض الكامل :	☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
تم إستلام بحسب الموازنة المقطعة المصممة لمرحلة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☒ موافق مع عمل الملاحظات بعينه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام.

مهندس الإستشاري العام :
الاسم /
التوقيع /

مهندس الإستشاري :
الاسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



ACE CONSULTING ENGINEERS
MONARRAM BAKHOUM



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٤٧٠٠ حتى المحطة ٢٤٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - EMB - (20)

برجاء التكرم بإستلام الأثر : تسليم طبقه ردم (١,٢٥٠ م)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
مكان العمل	3+720 TO 3+760	توقيع مهندس الشركة	22605
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب			
☐ الثالث ☐ الثاني ☒ الأول			

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- الأعمال العتنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
تم استلام العمل الى جهة القطاع المقدم له المرفوض

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☒ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري العام :

الاسم /
التوقيع

مهندس الإستشاري :

الاسم /
التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترست للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - IR - EMB - (19)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة ردم لقطاع احلال (٠,٢٥)

نوع العمل	أعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم (قطاع احلال) شركة ترست للتطوير والمقاولات ب. ض. ٧٣١ ٢٢٦٥٥٤٤
مكان العمل	4+120 TO 4+200	توقيع مهندس الشركة	
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعائنه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .	
مهندس الشركة :	مهندس الاستشاري العام :
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع

مشروع (أعمال الجسر و الأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلديس)



الشارع	٢٠٢٣ / ٧ / ٢٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترانست للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٤٧٠٠ حتى المحطة ٤٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - IR - EMB - (18)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم طبقة ردم لقطاع احلال (٠,٢٥)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم (قطاع احلال)
مكان العمل	4+120 TO 4+200	توقيع مهندس الشركة	شركة ترانست للتطوير والمقاولات
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	ب. ش. ٢٢٥٠ - ٧٣١	٢٢٥٠ - ٧٣١

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

تم مراجعة المسطح الموجود تحته بالصورة من قبل المهندس السيد
والله ولي العتد

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

مهندس الاستشاري :

الاسم /
التوقيع /
٢٠٢٣ / ٧ / ٢٦

الاسم /
التوقيع /
٢٠٢٣ / ٧ / ٢٦

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٧ / ٢٦	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترست للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (17)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة إحلال (٠,٢٥)

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	شركة ترست للتطوير والمقاولات ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ٢٣١-٢٢٠-٦٥٢ ٢٢٠٥-٢٢٠٥-٢٢٠٥
مكان العمل	3+920 TO 4+080	توقيع مهندس الشركة	
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول	الثاني
		الثالث	

موقف الأعمال :

١- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تنقيمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

الاسم /
التوقيع /

مهندس الإحصاء :

الاسم /
التوقيع /

مهندس الإحصاء :

الاسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	٢٠٢٣ / ٧ / ٢٥	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - IR - EMB - (16)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة ردم (١,٥٠ -)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم (قطع ردم)
مكان العمل	3+860 TO 3+900	توقيع مهندس الشركة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١ - الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢ - أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣ - الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤ - العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
تم إستلام المكان الباقى من المقادير التى يجب ان تكون
تم إستلام أعمال الجود وال Sand Comp مقبول

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☒	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	---	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري :

مهندس الاستشاري العام :

الاسم / م. محمد عبد الله

التوقيع /

٢٣/٧

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٥ / ٧ / ٢٠٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترانست للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - IR - EMB - (15)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة ردم (١,٥٠ -)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم (قطاع ردم)
مكان العمل	3+720 TO 3+760	توقيع مهندس الشركة	شركة ترانست للتطوير والمقاولات ب.ص: 731-720-652 ت. 22605
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول		

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :
يجب إستلام الأعمال كإسدية للصالح العام
بكم : مستخدم أعمال الجودة وار sand comp (مقبول)

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقنيته
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

الاسم / م. محمد عبد الله
التوقيع /
٢٣/٧

مهندس الاستشاري :

الاسم / م. محمد عبد الله
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٧ / ١٨	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترانسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - IR - EMB - (14)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة إستعداد قطع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة إستعداد (قطاع ردم)
مكان العمل	3+860 TO 3+900	توقيع مهندس الشركة	شركة ترانسيت للتطوير والمقاولات
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	تاريخ التسليم	٢٠٢٣ / ٧ / ١٨

المسؤول

موقف الأعمال :

١- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

يتم إستلام الأعمال المساحية للمصالح المختصة حسب المراسلة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهديه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

الاسم / م. م. احمد
التوقيع /

مهندس الإستشاري :

الاسم / م. م. احمد
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٧ / ١٧	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ١+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - IR - EMB - (12)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم طبقة فيرما لقطاع قطع

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة فيرما (قطاع قطع)
مكان العمل	3+260 TO 3+380	توقيع مهندس الشركة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات ب.ب. ٧٣١-٧٢٠-٦٥٢ تل. ٢٢٦٠٥
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
موقف الأعمال :	المسؤول		

١- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

١- سكة حديد الروبيكي - بابيس
٢- الخط الصناعي
٣- الخط الرئيسي
٤- الخط الفرعي
٥- الخط الثانوي
٦- الخط الثالث
٧- الخط الرابع
٨- الخط الخامس
٩- الخط السادس
١٠- الخط السابع
١١- الخط الثامن
١٢- الخط التاسع
١٣- الخط العاشر
١٤- الخط الحادي عشر
١٥- الخط الثاني عشر
١٦- الخط الثالث عشر
١٧- الخط الرابع عشر
١٨- الخط الخامس عشر
١٩- الخط السادس عشر
٢٠- الخط السابع عشر
٢١- الخط الثامن عشر
٢٢- الخط التاسع عشر
٢٣- الخط العشرون
٢٤- الخط الحادي والعشرون
٢٥- الخط الثاني والعشرون
٢٦- الخط الثالث والعشرون
٢٧- الخط الرابع والعشرون
٢٨- الخط الخامس والعشرون
٢٩- الخط السادس والعشرون
٣٠- الخط السابع والعشرون
٣١- الخط الثامن والعشرون
٣٢- الخط التاسع والعشرون
٣٣- الخط الثلاثين

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعينه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري :

مهندس الاستشاري العام :

الاسم :
التوقيع :

الاسم :
التوقيع :

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2023 / ٦ / ١٨	الإتجاه	وصلة العنقاء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة 2+700 حتي المحطة 4+200

طلب استلام أعمال رقم (10)

برجاء التكرم باستلام الأتي :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	أرض طبيعية قطاني روم
مكان العمل	3+900 = 3+860	توقيع مهندس الشركة	شركة تراسيت للتطوير و المقاولات
إستلام المهندس الإستشاري		ب.ش: 731-720-652 ت.ش: 22605	
رقم تكرار تقديم الطلب		☒ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

المسؤول

موقف الأعمال :

1- الأعمال المساحية :	☐ مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
2- أعمال الجودة :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
3- الأعمال المدنية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
4- العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :

براسم السيد المهندس

نتيجة هذه الأعمال :	☐ موافق	☒ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐ مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	--------------------------------	---	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صور و رقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري :

يختم

الاستلام العام

الإسم / مرسى محمد
التوقيع

الاستلام العام
التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابيس)



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	2023 / 6 / 18	الإجراء	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة 2+700 حتى المحطة 4+200

طلب استلام أعمال رقم (9)

يرجاء التكرم باستلام الآتي :

نوع العمل	أعمال خاصة	وصف العمل	توقيع مهندس الشركة
مكان العمل	3+780 ± 3+740	نطاق العمل	ب. هـ : 731-720-652 س. ت : 22605
استلام المهندس الاستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول

موقف الأعمال :

1- الأعمال المصاحبة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☒	مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
3- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
4- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

تم استلام المقادير

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعليه ☒	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري :

يعتمد الاستشاري العام

الإسم :
التوقيع :

3+780 ± 3+740

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2023 / 6 / 18	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترانست للتطوير و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة 2+700 حتى المحطة 4+200

طلب استلام أعمال رقم (9)

برجاء التكرم بإستلام الأتي :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	توقيع مهندس الشركة
مكان العمل	3+740 ~ 3+780	توقيع مهندس الشركة	شركة ترانست للتطوير والمقاولات ب.ش. 731-720-652 س.ت. 22605
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		☒ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

1- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

تم استلام المقادير

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري :

الإسم :
التوقيع :

يتمتع ...
الإسم :
التوقيع :

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الزويكي - بلبيس)



التاريخ	2023 / 6 / 18	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة 2+700 حتى المحطة 4+200

طلب استلام أعمال رقم (8)

برجاء التكرم باستلام الأتي :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	تأجيل أعمال
مكان العمل	3+920 : 4+200	توقيع مهندس الشركة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
استلام المهندس الاستشاري		ب. ق. ص : 731-720-652 س. ت. : 22605	
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث

المسؤول

موقف الأعمال :

1- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

تم استلام القطع و يوجد جزء قامت بـمساحة مشروع

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض وبعد تعقيبه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري :

يعتمد

الإستشاري العام

المطابق

الموافق

الإسم / م. م. م.
التوقيع / م. م. م.

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابليس)



التاريخ	١٥ / ٢ / ٢٠٢٢	الإجراء	المستشار الفني
شركة المنفذة	شركة ترأسست للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	2+700 : 4+200

طلب استلام أعمال رقم (7) :

برجاء التكرم باستلام الأتي : توبة سطح أرضية

نوع العمل	أعمال مائية	وصف العمل	تسوية السطح قبل البزوم
مكان العمل	2+700 : 2+860	توقيع مهندس الشركة	محمد رسلان
استلام المهندس الإله تشاري	شركة ترأسست للتطوير والمقاولات 11 شارع النصارى - بابليس - الجيزة - القاهرة ج.م.س. 731-720-652 ت.م. 2260599		
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول		

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- الأعمال المصاحبة : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- الأعمال المدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

تم استلام السطح بالمساحة المزمومة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري :

يعتمد

أ. محمد رسلان
م.م.س. ٧٣١-٧٢٠-٦٥٢
ت.م. ٢٢٦٠٥٩٩

الإسم : محمد رسلان
التوقيع :



التاريخ	٢٠٢٣ / ١ / ٢٥	الإتجاه	وصلة العبء الجانبي
الشركة المنفذة	شركة ترانسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٧٠٠ حتى ١٠٢٠٠


طلب استلام أعمال رقم (٦)

برجاء التكرم باستلام الآتي :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	توقيع مهندس الشركة
	مكان العمل		
استلام المهندس الاستثماري			
رقم تكرار تقديم الطلب		☒ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث	

المسؤول	موقف الأعمال :
 ٢٠٢٣ - ١ - ٢٥	١ - الأعمال المساحية : ☐ مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢ - أعمال الجودة : ☐ مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣ - الأعمال المدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤ - العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
 ١ - حوائط الأعمال المساحية لا تقبل المراجعة مع وجود ختم جاكيتا بالبريد
 ٢ - حوائط الأعمال المدنية لا تقبل المراجعة مع وجود ختم جاكيتا بالبريد
 ٣ - حوائط الأعمال المدنية لا تقبل المراجعة مع وجود ختم جاكيتا بالبريد
 ٤ - حوائط الأعمال المدنية لا تقبل المراجعة مع وجود ختم جاكيتا بالبريد

نتيجة هذه الأعمال :	☐ موافق ☒ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض ويعد تقديمه
تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .	
مهندس الاستثماري :	يعتمد
الاسم / التوقيع	م / موني شريفة  ٢٠٢٣ / ١ / ٢٥

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بليبس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ١ / ٢٥	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة ترانسيت للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٧٠٠ حتى ٢٠٢٠٠

طلب استلام أعمال رقم (٤)

برجاء التكرم بالاستلام الآتي :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	توقيع مهندس الشركة
مكان العمل	3+720 - 3+260	توقيع مهندس الشركة	ب.ش: 711-720-652 س.ت: 22603
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
 C-11-1-1	١- الأعمال المساحية : ☐ مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- الأعمال المدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
 تم استلام الأعمال والمساحة الموجودة في الموقع المذكور في الجدول أعلاه
 مع ملاحظة أن الأعمال المذكورة أعلاه هي الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع المذكور في الجدول أعلاه
 ولا تشمل الأعمال التي لم يتم تنفيذها في الموقع المذكور في الجدول أعلاه

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعلابه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الإستشاري :
 (الاسم / التوقيع)
 م/منوكي شبيقة
 يعمد :
 ٢٠٢٣ / ١ / ٢٥

م/منوكي شبيقة
 م/منوكي شبيقة

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بالبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ١ / ١٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسات للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى ٤+٢٠٠
طلب استلام أعمال رقم (٣)			

يرجاء التكرم باستلام الأتي :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	تسليم وتوقيع مهندس ٣
مكان العمل	St 2+700 - 2+800	توقيع مهندس الشركة	استلام (٣)
إستلام المهندس الإستشاري		شركة تراسات للتطوير والمقاولات ١١ ش. عبد الله الناصر - أ. بابنا - الترميم الخامس ب. خ. ٦٥٢ - ٧٣١ - ٧٢٥ ت. ٢٢٥	
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول	

موقف الأعمال :

١ - الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢ - أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣ - الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤ - العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

تم استلام الأعمال المساحية والجودة والمدنية من قبل الشركة المنفذة وتم التحقق من دقة القياسات والقياسات بالقياس إلى المخطط الهندسي المقدم من قبل الشركة المنفذة وتم التحقق من دقة القياسات والقياسات بالقياس إلى المخطط الهندسي المقدم من قبل الشركة المنفذة.

نتيجة هذه الأعمال :

موافق	موافق مع عمل الملاحظات بغيره	مرفوض وبعد تقديمه
-------	------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

يعتمد

مهندس الإستشاري :

م/ أماني شبيبة

الاسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٧	الإتجاه	وصلة ← الميادان الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسن للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	St 2+600 - 4+200

طلب استلام أعمال رقم (٣)

برجاء التكرم باستلام الآتي :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	تسليم مقبلة أرض من مخرج جدار المصنع
مكان العمل	St 2+600 - 4+200	توقيع مهندس الشركة	استلام كامل
استلام المهندس الاستشاري	شركة تراسن للتطوير والمقاولات أ. ش. محمد محمد، حاتم، إبراهيم، الشكراني، الخليل ب. ص. 731-720-652 ل. ص. 226022		
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول		

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- الأعمال العدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

بمعتد
م. / صوكي سيدة

مهندس الاستشاري :
الإسم /
التوقيع /

استلام

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ١١ / ١٦	الإتجاه	وصلة العيلاء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	لطاق العمل	St 2+700 - 4+200
طلب استلام أعمال رقم (١)			

يرجاء التكرم باستلام الأتي :

نوع العمل	أعمال صناعية	وصف العمل	تسليم إسباج الأرض المزمع
مكان العمل	St 2+700 - 4+200	توقيع مهندس الشركة	إسباج كامل
إستلام المهندس الإستشاري		شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	
رقم تكرر تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐

شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
ش. م. عبد القادر فتوكو - إدارتها : القاهرة - شارع النجاشي
ت. ٢٢٠-٦٥٢-٧٣١
ف. ٢٢٦٠٥٥

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- الأعمال المدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☒	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	---	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري :

يعتمد

٢ / متولي شيعه

عبد الله
التوقيع / الاسم

بسم الله الرحمن الرحيم



التاريخ	٢٠٢٣ / ٧ / ١٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة تراسن للتطوير والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٧٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - MAT - (8)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تقرير صلاحية السد

المرفقات :

- ١- أصل تقرير صلاحية المواد من المعمل .
- ٢- صورة من محضر العينات .
- ٣- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعالیه	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام /

مهندس الاستشاري /

الإسم / محمد درويش
التوقيع / محمد درويش
٢٠٢٣ / ٧ / ١٣

الإسم / رامي محمد صالح
التوقيع / رامي محمد صالح



إدارة شؤون اللاجئين السوريين
الشركة السورية للتأمين
إدارة واستقبال اللاجئين والمهاجرين

مكتب التسجيل والتوثيق

عناقة

الطاقة

٦١٢

اسم المستاجر

مخلوط

نوع الخيام

١٩

اسم السائق

١٦ / ٢٠٢٢

التاريخ

التوقيع

خط السير:

الحمولة: ٠٠/٨٠/٦٠/٤٠/٢٠/١٠ (طن / م^٣)

رقم العربية ٧٣٩٤ / ٣٨٧٦

رقم العربية

سنة: (٢٠٢٢)

3/612

12201968

كسارطة
/ محمد الهاشمي

ش. ١١٤١١٤١٨
٠١١٤٢٥٩٩٦٤٤

(يون آجل)

رقم السيارة :
رقم القطر :
القيمة :
اسم العميل :
التاريخ :
اسم المالك :
رمضان الحبيب

١١٣١٢٢٢

وصلة الميناء الجاف	الاتجاه	2023 / ٦ / ١٢	التاريخ
من المحطة 2+700 حتى المحطة 4+200	نطاق العمل	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات	الشركة المنفذة

طلب استلام أعمال رقم (٨١٣)

برجاء الفكرم بإستلام الأتي معaine مقويات من مة كارة الكبريتات باضة ميناء لعل لصلوكة العذبة

نوع العمل	وصف العمل	شركة تراسيت للتطوير والمقاولات
مكان العمل	توقيع مهندس الشركة	الاسم / م.ع.م ب.ص: 731-720-652 س.ت: 22605
إستلام المهندس الإستشاري	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
م.ع.م	1- الأعمال المباحية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
م.ع.م	2- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
	3- الأعمال الفنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
	4- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه - ☐
-------	-------------------------------	---

نتيجة هذه الأعمال :

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام

مهندس الإستشاري العام :

مهندس الإستشاري :

الاسم / م.ع.م
التوقيع / م.ع.م

الاسم / م.ع.م
التوقيع / م.ع.م

شركة اردمان سبييت
لاختبارات المواد والمنشآت
=====

طلب عمل اختبار

مستند

صورة التسجيل الضريبي (شركات):

صورة الرقم القومي (افراد):

اسم المشروع: الشركة العميد (الرويكلي) - العاشر - بليس

اسم العميل: شركة قرايت

عنوان العميل:

رقم التليفون: ٠١٠٥١٨٧٤٢٩٩

التجارب المطلوبة:

العينات المرفقة:

ملاحظة: كاملة - نهج - تفصيل - امتصاص
Los Angeles - سيولة ولدونة
CBR بروكتر

(١) عينة

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

التاريخ

١٣/٦/٢٠٢٣

امضاء العميل

محمد

ARDAMAN Split
MATERIALS CONSTRUCTION TESTING
S.A.E.

25 Adger Bura Compound Maadi - Cairo
Tel: (+2) 0233448413 - (+2) 01006030248
Tel: 0227658447 - 01006030248

شركة اردمان سبليت

للمختبرات المواد والمعدات
شركة مساهمة مصرية
25 ميدان الشجر دارنا والمعدى - القاهرة
هاتف: 01006030248 - 0227658447
بريد إلكتروني: ardamaninternational@gmail.com

File No.: 4983/S

Invoice No.: 687/2023

PROJECT: الخرسانة خفيفة - البروبيكس - العائش من رمضان - هليوس

CLIENT: كراست

Item	Description	Tax Code	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	C.B.R. Test for Soil Sample	EG-602150515-D1001	1	Test	660	660
2	Compaction of Soil (Using Proctor Test)	EG-602150515-D1003	1	Test	330	330
3	Complete Sieve Analysis of Soil Sample	EG-602150515-D1004	1	Test	165	165
4	Plastic Limit of Soil Sample	EG-602150515-D1005	1	Test	165	165
5	Liquid Limit of Soil Sample	EG-602150515-D1006	1	Test	165	165
6	Los Angeles Abrasion	EG-602150515-D0101	1	Test	265	265
7	Clay Lumps & Friable Particles	EG-602150515-D0105	1	Test	110	110
8	Specific Gravity and Absorption of Fine, or Coarse Aggregates	EG-602150515-D0111	1	Test	135	135
Total						1995.00
Value Added Tax 10%						199.50
Total						2194.50

*) Please reimburse by a cheque.

Signature: Reda El Rahaf

Date: June 2023

للتسجيل الضريبي رقم 515-150-602 سجل تجاري رقم 156221 مأمورية ضرائب الشركات المساهمة

Project: خط سكة حديد - الروبيكي - الماسر من رمضان - بلبيس

File No.: 4983/8

Client: نراست

Date: 25-06-2023


Standard Test Method Of Particle size analysis
Of Soil According to ASTM D - 422

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Sieve No.	2"	1.5"	1.0"	3/4"	1/2"	3/8"	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening Size (mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.50	4.75	2.000	0.425	0.075
Sample Passing %	100.0	99.0	94.0	77.5	56.0	48.5	40.3	28.1	12.3	6.4
Project Specs (Min)	100.0	70.0	55.0	50.0	-	40.0	30.0	20.0	10.0	5.0
Project Specs (Max)	100.0	100.0	100.0	100.0	-	80.0	65.0	50.0	30.0	15.0

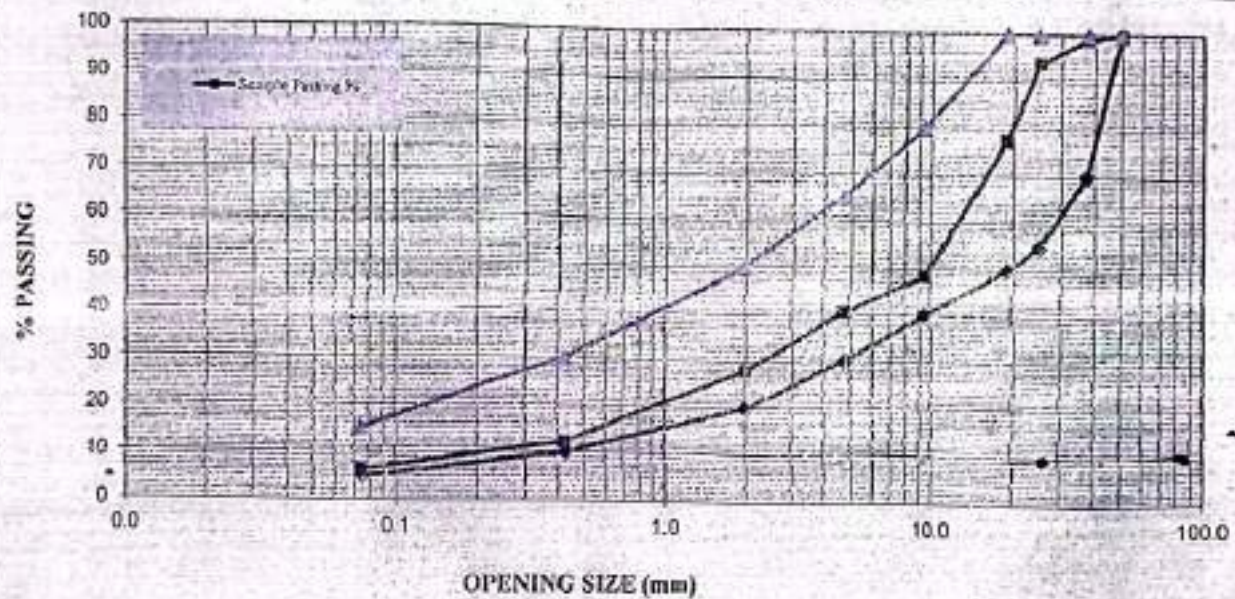

Note (s)

- 1- The sample was provided by the client.
- 2- These results are related only to the received samples.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy
Reviewed by : Eng. Hanan Youssry

ARDAMAN-Split

شركة اردمان - سبليت
(الإدارة)

General Manager : Eng. Reda El-Rahab

Project: خط سكة حديد - الروبيكي - العاشر من رمضان - بلديس

File No.: 4983/S

Client: ثراست

Date: 25-06-2023

LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT, AND PLASTICITY INDEX OF SOILS

ACCORDING TO ASTM D4318

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Sample Identification No.	Liquid Limit (%)	Plastic Limit (%)	Plasticity Index (%)
Soil sample	N.P	N.P	N.P
Project Specs	25.0 Max	-	6.0 Max

Note (s):

- 1- The sample was provided by the client .
- 2- These results are related only to the received samples.

ARDAMAN-Split

Prepared by : Eng. Peter Sobhy

شركة اردمان - سبلت
(الادارة)

Reviewed by : Eng. Hanan Youssef

General Manager: Eng. Reda El-Raheb

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING
S.A.E

25 Ashgar Darna Compound Maadi - Cairo
Tel. : 02- 27468647 - 01006030248
Email: ardamaninternational@gmail.com

Project: خط سكة حديد - الروبيكي - العاشر من رمضان - بالفيوس

File No.: 4983/S

Client: ثراست

Date: 25-06-2023


MOISTURE DENSITY RELATIONSHIP OF SOIL
ACCORDING TO ASTM D 1557

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Wet Unit Weight, gm/cm ³	2.219	2.280	2.387	2.385	2.315
Water Content, %	2.0	3.0	5.0	7.0	8.0
Dry Unit Weight, gm/cm ³	2.175	2.214	2.273	2.229	2.144

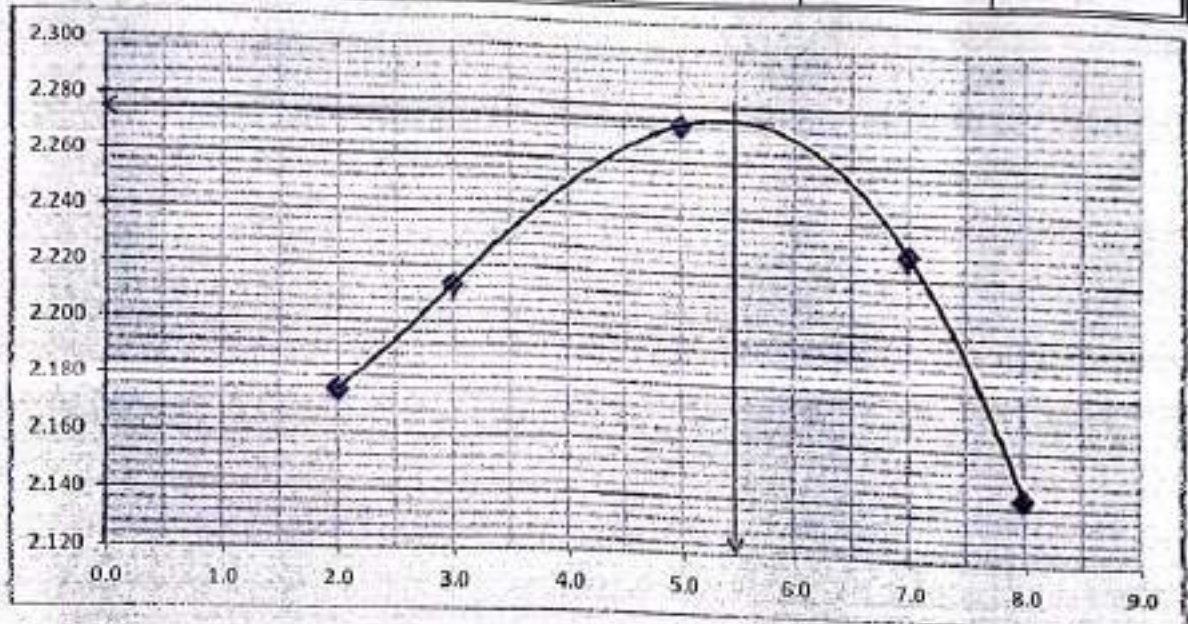

Result (s):

- Maximum dry density = 2.273 t/m³
- Optimum moisture content = 5.50 %

Note (s):

*The sample was provided by the client.

*These results are related only to the received sample.

Prepared by: Eng. Peter Sobhy

Reviewed by: Eng. Hanan Yousree

ARDAMAN-Split
شركة اردمان - سبليت
الادارة
General Manager: Eng. Reda El-Rohcb

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING**S.A.E**

25 Ashgar Darna Compound Maadi - Cairo

Tel. : 02- 27468647 - 01006030248

Email: ardamaninternational@gmail.com

Project: خط سكة حديد - الدويكي - العاشر من رمضان - بلبيس**File No.:** 4983/S**Client:** ترامت**Date:** 25-06-2023**SPECIFIC GRAVITY AND ABSORPTION
OF COARSE AGGREGATES****ACCORDING TO ASTM C 127****Sample Description:** Soil sample for Base layer**Source / Zone of sample:** By client**Delivery Date :** 15-06-2023

Sample No.	Absorption (%)	Bulk Specific Gravity	Bulk Specific Gravity (Saturated - Surface - Dry)	Apparent Specific Gravity
Soil sample	1.85	2.586	2.634	2.716
Project Specification	10.0 % Max			

Note (s):

*The sample was provided by the client .

*These results are related only to the received sample.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy**Reviewed by :** Eng. Hanan Yousry**ARDAMAN-Split**شركة اردمان - ميبلت
(الإدارة)**General Manager:** Eng. Reda El-Raheb

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING

S.A.E

25 Ashgar Darna Compound Maadi - Cairo

Tel. : 02- 27468647 - 01006030248

Email: ardamaninternational@gmail.com

Project: خط سكة حديد - الدويكي - العاشر من رمضان - بلبيس

File No.: 4983/S

Client: تراسن

Date: 25-06-2023

CLAY LUMPS AND FRIABLE PARTICLES

According To ASTM C 142

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Sample No.	Result (%)
Soil sample	0.45
Project Specification	5.0 % Max

Note (s):

*The sample was provided by the client.

*These results are related only to the received sample.

ARDAMAN-Split

شركة اردمان - سبليت
(الإدارة)

Prepared by: Eng. Peter Sobhy

Reviewed by: Eng. Hanan Yousry

General Manager: Eng. Reda El-Raheb

Project: خط سكة حديد - البرويكى - العائلى من رمضان - بنهيس

File No.: 4983/S

Client: ترامت

Date: 25-06-2023

LOS ANGELES TEST
ACCORDING TO ASTM C - 131

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

% of WEAR 24.4 %

Project Specification % of WEAR < 50.0 %

* After 500 Revolutions.

Note (s):

*The sample was provided by the client.

*These results are related only to the received sample.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy

Reviewed by : Eng. Hanan Yousry

ARDAMAN-Split

شركة اردمان - سبليت
(الإدارة)

General Manager: Eng. Reda El-Rakeb

Project: إنشاء جسر خط سكة حديد
(الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)
Client: شركة ترانسيت للمقاولات

File No.: 4980/S

Date: 10/07/2023


CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO)
OF LABORATORY - COMPACTED SOILS
ASTM D - 1883

Sample No. : 1

Sample delivery date: 15/06/2023

Description of sample: طبقة اساس

Source / Zone of sample: by client

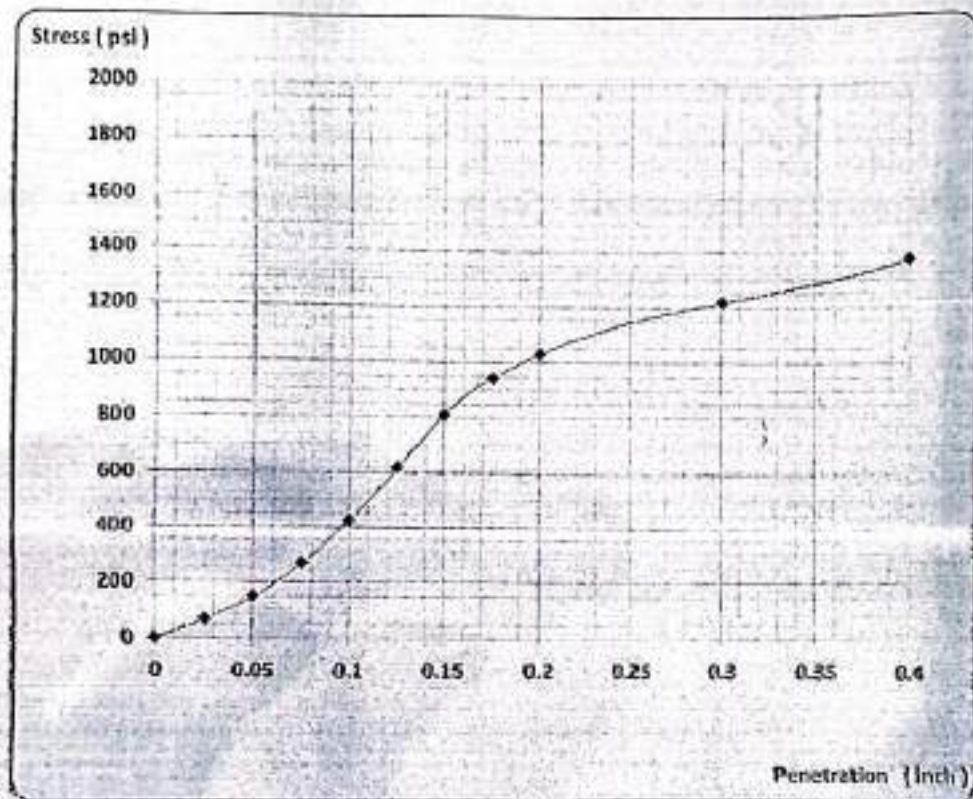

CBR VALUE (at 0.1 in) = $424 \times 100 / 1000 = 42.7 \%$

CBR VALUE (at 0.2 in) = $1020 \times 100 / 1500 = 68 \%$

Swelling after 96 hours = 0.02 %


After soaking for 96 hrs.

*The sample was provided by the client.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy

Reviewed by : Eng. Hanan Yousry

General Manager: Eng. Reda El-Rabea



١٩-٣-٢) طبقة أساس المسكة (Subballast):

يتم التنفيذ على طبقات و تتكون طبقة أساس المسكة من كسر أحجار مندرجة طبقا لما ورد بالملحق رقم (١) بالاضافة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
أساس المسكة (Subballast - Blanket)	سمك الطبقة	لا تقل عن ٣٠ سم
	تصنيف التربة	كسر حجر
	أكبر قطر للحبيبات (D_{max})	يتراوح بين (٣١,٥ - ٥٠) مم
	نسبة المواد الناعمة (مار من منخل ٢٠٠)	أقل من ٥ %
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E_{v2})	أكبر من ١٢٠ ميجا باسكال
	حد السيولة	أقل من ٢٥ %
	امتصاص المياه	أقل من ١٠ %
	نسبة التآكل (طبقا لإختبار لوس انجلوس)	أقل من ٣٠ %
	إختبار المخروط الرملي	الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ١٥ سم، وبحيث تحقق الكثافة الجافة ٩٨ % من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة
	إختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	أكبر من ٨٠ %

يجب ألا تزيد نسبة المواد القابلة للتفتت في المياه والمحجوزة على منخل رقم (٤) عن ٥ % من وزن العينة، ويجب اتباع التدرج المتصور من عليه في المواصفة هـ من ٦٠٣ لسنة ١٩٨٦.

١٩-٣-٣) طبقة الفرمة (Prepared subgrade):

يتم تنفيذها على طبقات ويجب أن تكون طبقة الفرمة من مواد ردم جيدة طبقا لما ورد بالملحق رقم (١) بالاضافة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
الفرمة (Form - Prepared subgrade layer)	سمك الطبقة	لا تقل عن ٥٠ سم
	تصنيف التربة	(متغير حسب نوعية المواد أسفل الطبقة*)
	نسبة المواد الناعمة (مار من منخل ٢٠٠)	AASHTO (A1-a) and (A1-b) Or UIC (QS3 - 3.1 or QS2 - 2.1 & 2.2)
	معامل اللدونة (إن أمكن حسابه)	أقل من ١٢ %
	الانتفاش الحر	أقل من ٦ %
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E_{v2})	أقل من ٣ %
	إختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	أكبر من ٨٠ ميجا باسكال
	إختبار المخروط الرملي	أكبر من ٢٥ %
		الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم، وبحيث تكون الكثافة الجافة أكبر من ٩٥ % من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة



Date:

23/08/2023

Project:

إنشاء المسار النجدي و طريق الخدمة العامة
شركة حديد الحديد / باديس

Contractor:

شركة تراسد

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: Trust /EV/029

Location: from 3+260 To 3+360

3+280

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3748	4123	4282	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3723	4096	4263	0.25	0.27	0.19	0.24
86	11.31	0.160	3709	4077	4251	0.39	0.46	0.31	0.39
135	17.67	0.250	3686	4055	4235	0.62	0.68	0.47	0.59
178	23.33	0.330	3666	4036	4219	0.82	0.87	0.63	0.77
226	29.69	0.420	3650	4016	4206	0.98	1.07	0.76	0.94
269	35.34	0.500	3637	4000	4196	1.11	1.23	0.86	1.07
135	17.67	0.250	3641	4005	4200	1.07	1.18	0.82	1.02
67	8.84	0.125	3651	4015	4209	0.97	1.08	0.73	0.93
5	0.71	0.010	3672	4039	4229	0.76	0.84	0.53	0.71
43	5.65	0.080	3670	4037	4228	0.78	0.86	0.54	0.73
86	11.31	0.160	3665	4031	4223	0.83	0.92	0.59	0.78
135	17.67	0.250	3654	4020	4211	0.94	1.03	0.71	0.89
178	23.33	0.330	3647	4013	4206	1.01	1.10	0.76	0.96
226	29.69	0.420	3635	4002	4196	1.13	1.21	0.86	1.07

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: Trust /EV/029


Location: from 3+260 To 3+360

3+280

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

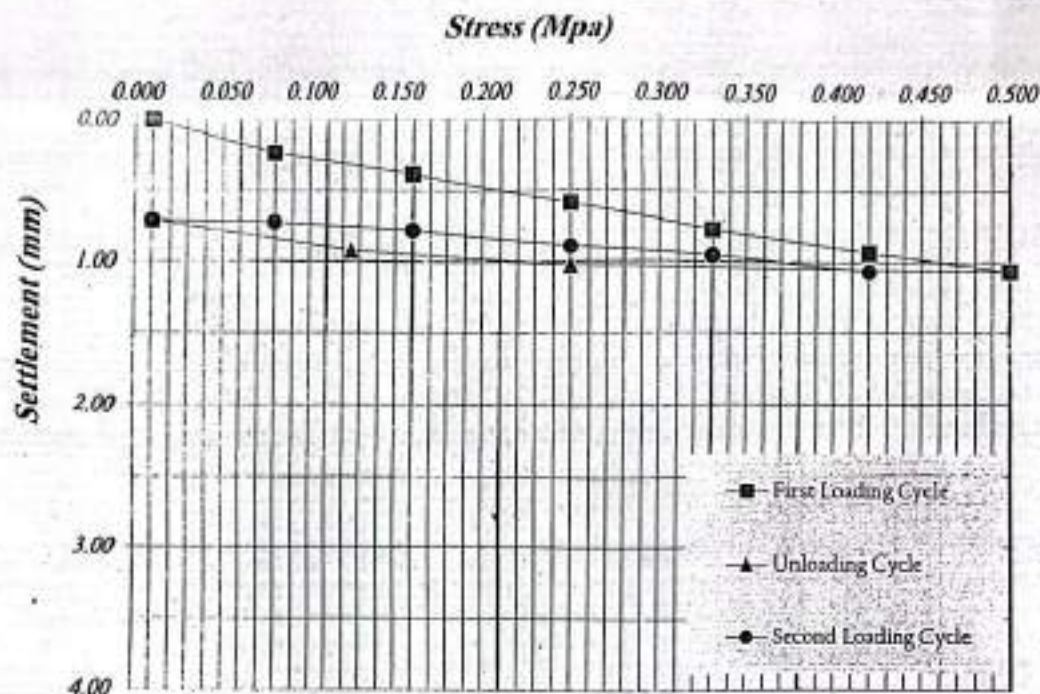

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.663	2.406	0.037
Second Cycle	1.083	0.437	0.696

Strain Modulus		
Ev1	108.5	Mpa
Ev2	229.9	Mpa
Ev2 / Ev1	2.1	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





Date: 23/08/2023

Project: إنشاء الجسر النواحي و طريق الخدمة لحدائق
مكة حديد الروملي / باديس

Contractor: شركة نواس

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: Trust /EV/029

Location: from 3+260 To 3+360 3+340

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Encirpck Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
5	0.71	0.010	3500	3850	4204	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3492	3835	4191	0.08	0.15	0.13	0.12
86	11.31	0.160	3472	3812	4174	0.28	0.38	0.30	0.32
135	17.67	0.250	3453	3786	4141	0.47	0.64	0.63	0.58
178	23.33	0.330	3420	3757	4111	0.80	0.93	0.93	0.89
226	29.69	0.420	3398	3734	4081	1.02	1.16	1.23	1.14
269	35.34	0.500	3372	3705	4048	1.28	1.45	1.56	1.43
135	17.67	0.250	3380	3715	4056	1.20	1.35	1.48	1.34
67	8.84	0.125	3394	3732	4070	1.06	1.18	1.34	1.19
5	0.71	0.010	3421	3764	4097	0.79	0.86	1.07	0.91
43	5.65	0.080	3420	3762	4095	0.80	0.88	1.09	0.92
86	11.31	0.160	3415	3755	4090	0.85	0.95	1.14	0.98
135	17.67	0.250	3401	3743	4082	0.99	1.07	1.22	1.09
178	23.33	0.330	3390	3729	4070	1.10	1.21	1.34	1.22
226	29.69	0.420	3378	3712	4054	1.22	1.38	1.50	1.37

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**


Test No.: Trust /EV/029

Location: from 3+260 To 3+360 3+340

Level: 0

Soil Type: Fcma

Plate Diameter: 300 mm

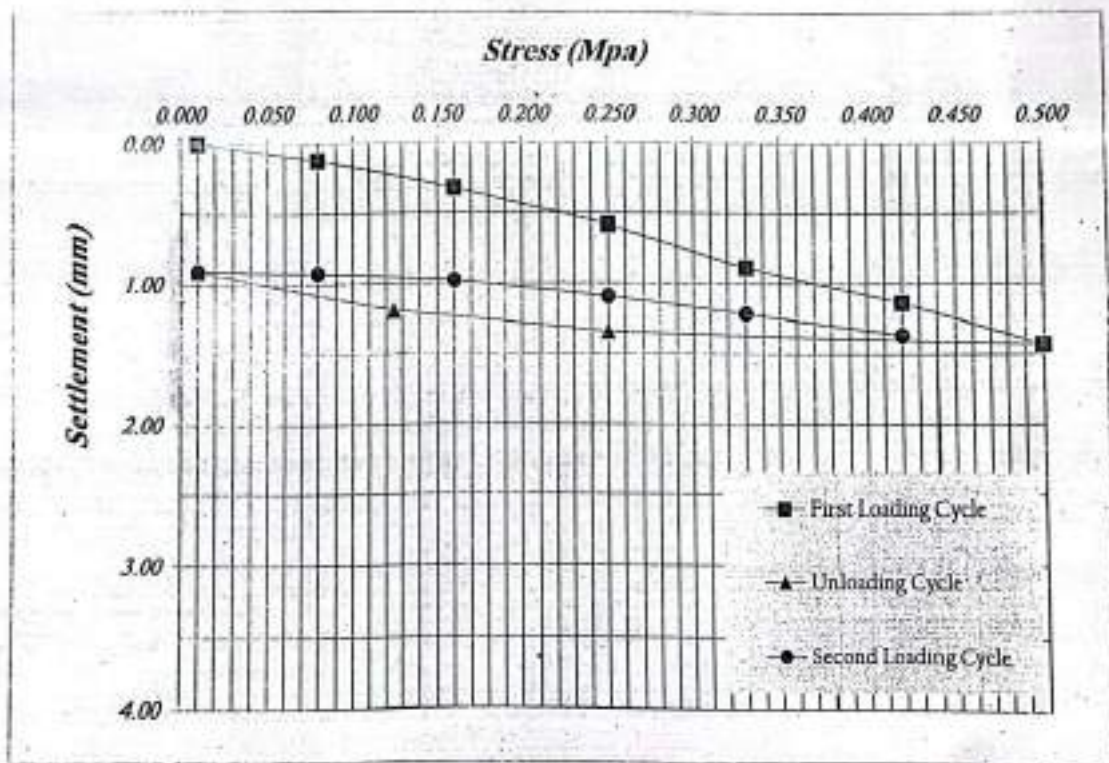

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	1.072	2.521	-0.098
Second Cycle	2.168	0.220	0.898

Strain Modulus		
Ev1	73.6	Mpa
Ev2	172.5	Mpa
Ev2 / Ev1	2.3	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: 1RUST /EV/006

Location: from 3+920 to 4+080 (3+950)

Level: -0.25

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3360	3290	3335	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3352	3281	3322	0.08	0.09	0.13	0.10
86	11.31	0.160	3340	3265	3317	0.20	0.25	0.18	0.21
135	17.67	0.250	3325	3252	3293	0.35	0.38	0.42	0.38
178	23.33	0.330	3310	3231	3280	0.50	0.59	0.55	0.55
226	29.69	0.420	3287	3212	3264	0.73	0.78	0.71	0.74
269	35.34	0.500	3278	3198	3253	0.82	0.92	0.82	0.85
135	17.67	0.250	3280	3200	3255	0.80	0.90	0.80	0.83
67	8.84	0.125	3283	3208	3258	0.77	0.82	0.77	0.79
5	0.71	0.010	3287	3222	3262	0.73	0.68	0.73	0.71
43	5.65	0.080	3282	3220	3260	0.78	0.70	0.75	0.74
86	11.31	0.160	3278	3218	3258	0.82	0.72	0.77	0.77
135	17.67	0.250	3270	3213	3255	0.90	0.77	0.80	0.82
178	23.33	0.330	3265	3208	3252	0.95	0.82	0.83	0.87
226	29.69	0.420	3260	3200	3247	1.00	0.90	0.88	0.93

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: TRUST /EV/006

Location: from 3+920 to 4+080 (3+950)

Level: -0.25

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

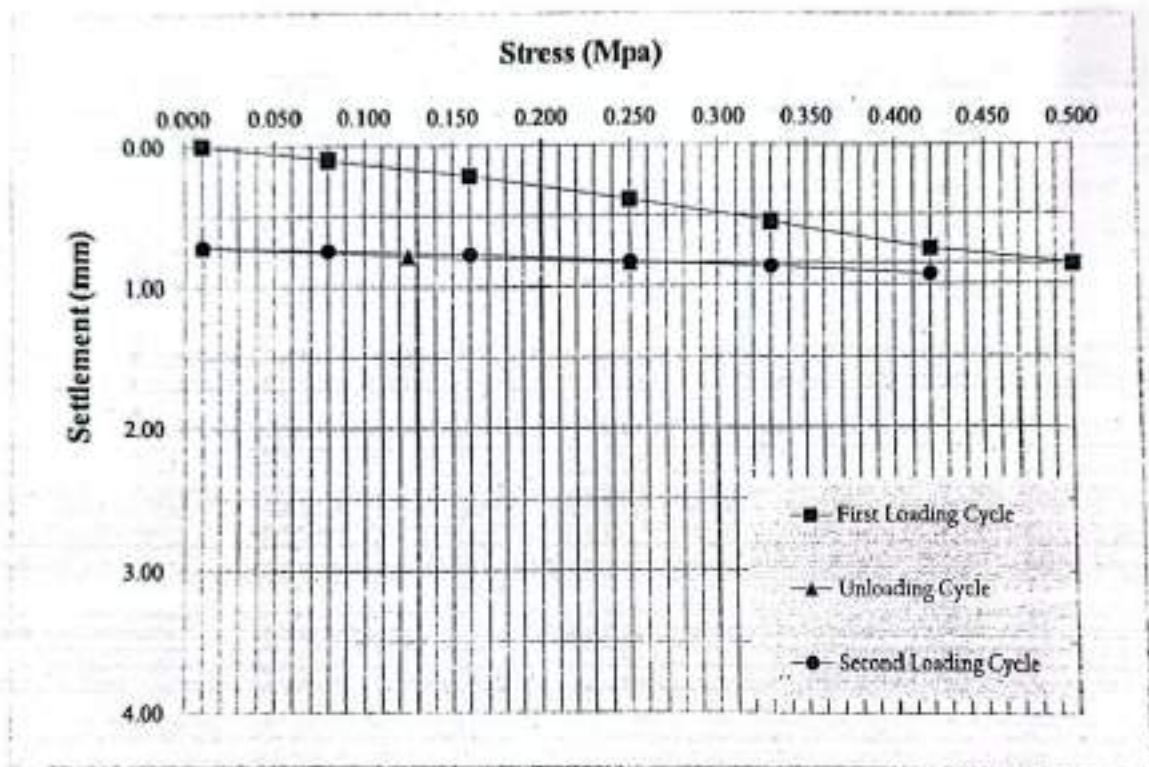

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.253	1.719	-0.053
Second Cycle	0.445	0.327	0.711

Strain Modulus		
Ev1	121.9	Mpa
Ev2	409.6	Mpa
Ev2 / Ev1	3.4	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/007
 Location: from 3+920 to 4+080 (4+020)
 Level: -0.25
 Soil Type: Ferma
 Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	2681	3657	3668	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	2660	3627	3638	0.21	0.30	0.30	0.27
86	11.31	0.160	2638	3605	3617	0.43	0.52	0.51	0.49
135	17.67	0.250	2622	3588	3596	0.59	0.69	0.72	0.67
178	23.33	0.330	2600	3564	3576	0.81	0.93	0.92	0.89
226	29.69	0.420	2580	3542	3556	1.01	1.15	1.12	1.09
269	35.34	0.500	2574	3534	3545	1.07	1.23	1.23	1.18
135	17.67	0.250	2576	3542	3550	1.05	1.15	1.18	1.13
67	8.84	0.125	2578	3552	3557	1.03	1.05	1.11	1.06
5	0.71	0.010	2588	3570	3574	0.93	0.87	0.94	0.91
43	5.65	0.080	2586	3567	3571	0.95	0.90	0.97	0.94
86	11.31	0.160	2584	3562	3569	0.97	0.95	0.99	0.97
135	17.67	0.250	2580	3554	3564	1.01	1.03	1.04	1.03
178	23.33	0.330	2577	3547	3557	1.04	1.10	1.11	1.08
226	29.69	0.420	2571	3538	3547	1.10	1.19	1.21	1.17

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Page 1 of 2

فريق
 Haisa

شركة كيو لصنط الجودة




Date: 01/08/2023
Project: إنشاء الجسر الترابي و طرق
الخدمة لخط سكة حديد
Contractor: شركة تراست

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST/EV/007
Location: from 3+920 to 4+080 (4+020)
Level: -0.25
Soil Type: Fcma
Plate Diameter: 300 mm

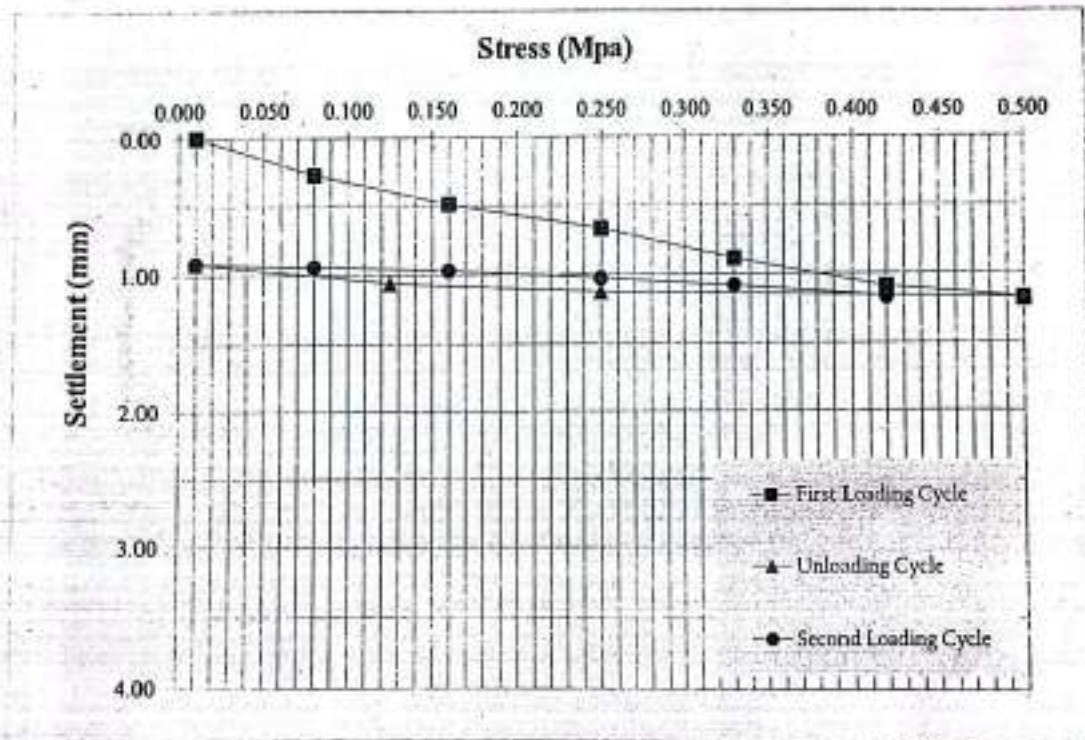

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.390	3.027	0.031
Second Cycle	0.890	0.229	0.913

Strain Modulus		
Ev1	96.5	Mpa
Ev2	333.8	Mpa
Ev2 / Ev1	3.5	


For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Page 2 of 2

فaisal



شركة كيو لابت الحودة



Date:

إنشاء الجسر النرابي و طرق

Project:

إنشاء الجسر النرابي و طرق
الخدمة لخط سكة حديد

Contractor:

Date:

01/08/2023

Project:

إنشاء الجسر النرابي و طرق
الخدمة لخط سكة حديد

Contractor:

شركة لراست

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No: TRUST /EV/008

Location: from 3+920 to 4+080 (4+070)

Level: -0.25

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Energy Reading - bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement , mm
5	0.71	0.010	3515	3262	3104	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3493	3240	3071	0.22	0.22	0.33	0.26
86	11.31	0.160	3470	3218	3053	0.45	0.44	0.51	0.47
135	17.67	0.250	3445	3200	3033	0.70	0.62	0.71	0.68
178	23.33	0.330	3430	3181	3020	0.85	0.81	0.84	0.83
226	29.69	0.420	3410	3162	3001	1.05	1.00	1.03	1.03
269	35.34	0.500	3392	3149	2985	1.23	1.13	1.19	1.18
135	17.67	0.250	3396	3156	2990	1.19	1.06	1.14	1.13
67	8.84	0.125	3405	3165	2998	1.10	0.97	1.06	1.04
5	0.71	0.010	3431	3185	3022	0.84	0.77	0.82	0.81
43	5.65	0.080	3429	3182	3020	0.86	0.80	0.84	0.83
86	11.31	0.160	3425	3176	3015	0.90	0.86	0.89	0.88
135	17.67	0.250	3416	3168	3005	0.99	0.94	0.99	0.97
178	23.33	0.330	3409	3161	2999	1.06	1.01	1.05	1.04
226	29.69	0.420	3400	3153	2992	1.15	1.09	1.12	1.12

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**


Test No.: TRUST /EV/008

Location: from 3+920 to 4+080 (4+070)

Level: -0.25

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

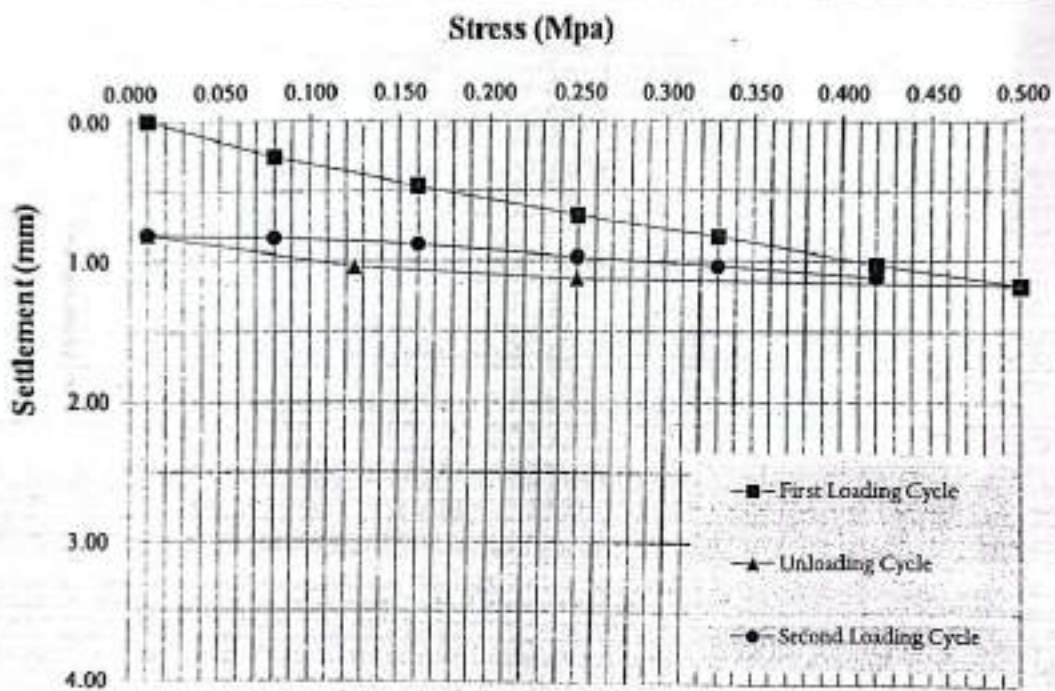

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.838	2.672	0.054
Second Cycle	0.697	0.487	0.798

Strain Modulus		
Ev1	99.9	Mpa
Ev2	269.2	Mpa
Ev2 / Ev1	2.7	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/013
Location: from 3+020 to 4+080 (3+945)
Level: 0
Soil Type: Ferra
Plate Diameter: 300 mm

Energy Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
5	0.71	0.010	4165	4175	4200	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	4154	4145	4175	0.11	0.30	0.25	0.22
86	11.31	0.160	4144	4134	4165	0.21	0.41	0.35	0.32
135	17.67	0.250	4130	4120	4156	0.35	0.55	0.44	0.45
178	23.33	0.330	4116	4106	4148	0.49	0.69	0.52	0.57
226	29.69	0.420	4099	4090	4135	0.66	0.85	0.65	0.72
269	35.34	0.500	4088	4076	4128	0.77	0.99	0.72	0.83
335	17.67	0.250	4094	4085	4134	0.71	0.90	0.66	0.76
57	8.84	0.125	4100	4092	4140	0.65	0.83	0.60	0.69
5	0.71	0.010	4121	4121	4162	0.44	0.54	0.38	0.45
43	5.65	0.080	4117	4116	4155	0.48	0.59	0.45	0.51
86	11.31	0.160	4113	4111	4150	0.52	0.64	0.50	0.55
135	17.67	0.250	4109	4104	4146	0.56	0.71	0.54	0.60
178	23.33	0.330	4100	4093	4137	0.65	0.82	0.63	0.70
226	29.69	0.420	4093	4084	4129	0.72	0.91	0.71	0.78

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

2023
Page 1 of 2



Project:

إنشاء الجسر القبابى وطريق
الخدمة لخط سكة حديد

Contractor:

شركة نراست

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**


Test No.: TRUST /EV/013

Location: from 3+920 to 4+080 (3+945)

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

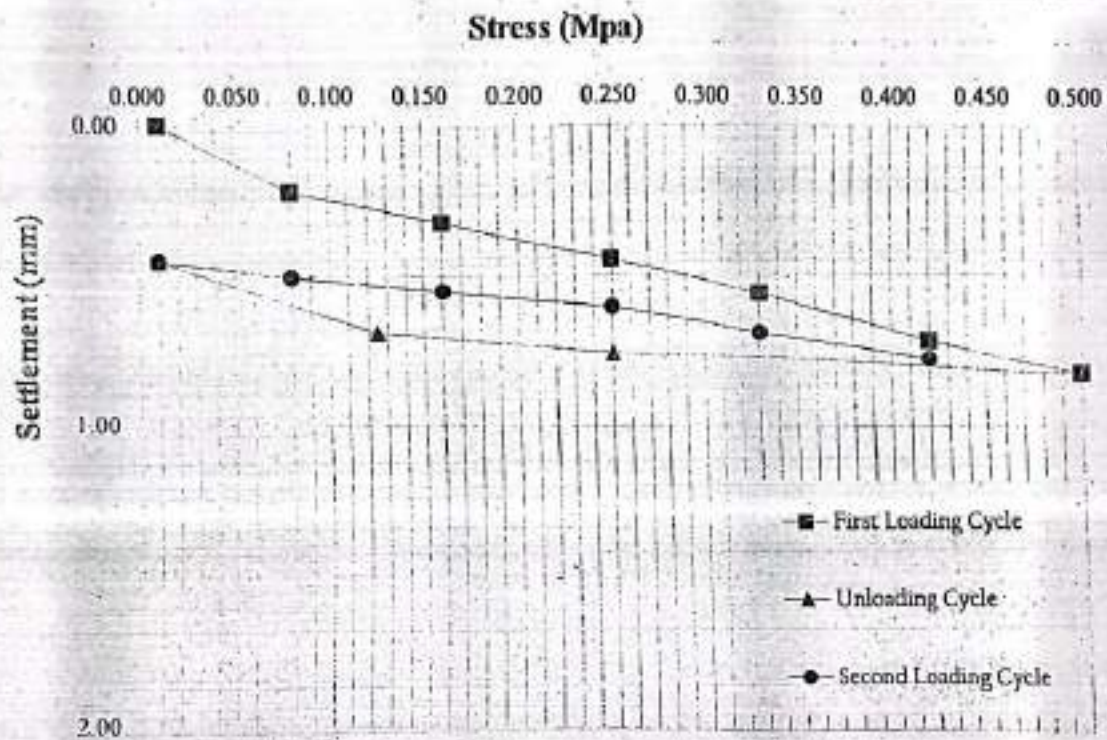

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.356	1.261	0.114
Second Cycle	0.698	0.486	0.454

Strain Modulus		
Ev1	156.3	Mpa
Ev2	269.5	Mpa
Ev2 / Ev1	1.7	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

2023
25
فبراير
2023
Q Lab

Page 2 of 2



Date:
Project: إنشاء الجسر النرابى و طرق
الخدمة لخط سكة حديد
Contractor: شركة تراسن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/014
Location: from 3+920 to 4+080 (3+995)
Level: 0
Soil Type: Ferra
Plate Diameter: 300 mm

Encapack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
5	0.71	0.010	3784	3770	4636	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3759	3752	4618	0.25	0.18	0.18	0.20
86	11.31	0.160	3748	3737	4602	0.36	0.33	0.34	0.34
135	17.67	0.250	3724	3717	4583	0.60	0.53	0.53	0.55
178	23.33	0.330	3701	3697	4565	0.83	0.73	0.71	0.76
226	29.69	0.420	3682	3677	4546	1.02	0.93	0.90	0.95
269	35.34	0.500	3667	3661	4532	1.17	1.09	1.04	1.10
135	17.67	0.250	3673	3668	4538	1.11	1.02	0.98	1.04
67	8.84	0.125	3683	3679	4549	1.01	0.91	0.87	0.93
5	0.71	0.010	3698	3698	4565	0.86	0.72	0.71	0.76
43	5.65	0.080	3697	3696	4563	0.87	0.74	0.73	0.78
86	11.31	0.160	3693	3692	4560	0.91	0.78	0.76	0.82
135	17.67	0.250	3684	3685	4551	1.00	0.85	0.85	0.90
178	23.33	0.330	3675	3675	4538	1.09	0.95	0.98	1.01
226	29.69	0.420	3665	3666	4530	1.19	1.04	1.06	1.10

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

2023
9/28/23

Page 1 of 2






Date: 2025/06/25
Project: إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد
Contractor: شركة ترانست

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/014
Location: from 3+920 to 4+080 (3+995)
Level: 0
Soil Type: Ferma
Plate Diameter: 300 mm

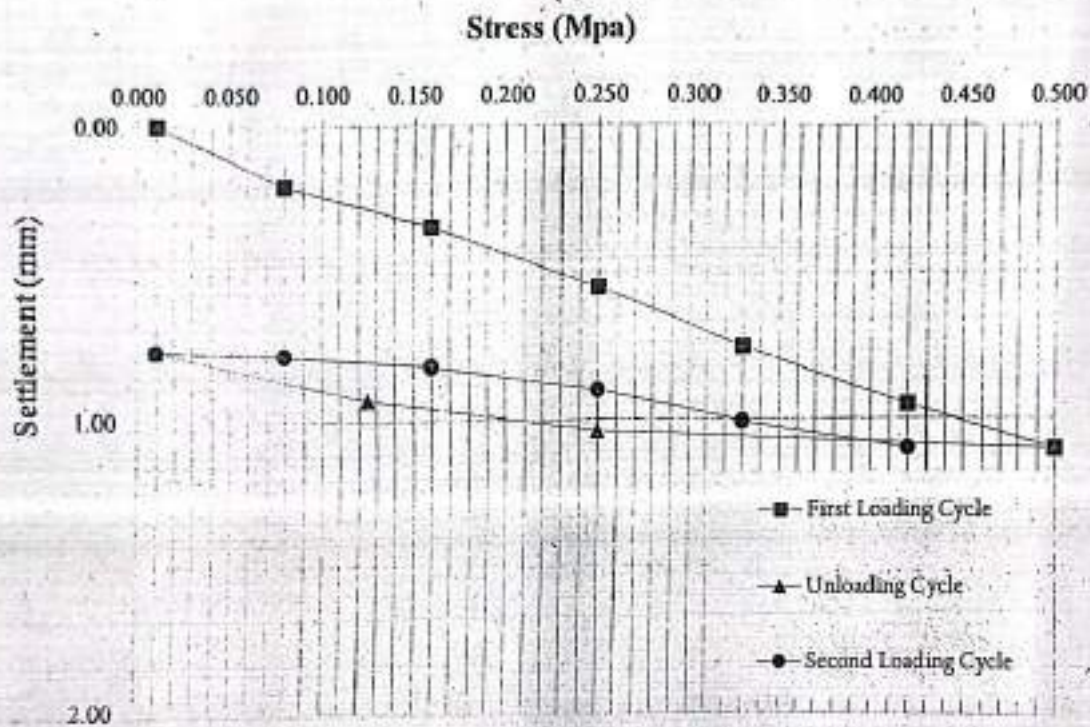

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.044	2.224	0.011
Second Cycle	1.475	0.215	0.756

Strain Modulus		
Ev1	102.2	Mpa
Ev2	236.1	Mpa
Ev2/Ev1	2.3	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





Date:

Project: إنشاء الجسر الترابي وطرق
الخدمة لخط سكة حديد

Contractor: شركة تراسن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**

Test No.: TRUST /EV/015
Location: from 3+020 to 4+080 (4+050)
Level: 0
Soil Type: Ferra
Plate Diameter: 300 mm

Unpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3963	3457	3800	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3930	3428	3765	0.33	0.29	0.35	0.32
86	11.31	0.160	3910	3405	3743	0.53	0.52	0.57	0.54
135	17.67	0.250	3880	3376	3715	0.83	0.81	0.85	0.83
178	23.33	0.330	3850	3350	3690	1.13	1.07	1.10	1.10
226	29.69	0.420	3827	3326	3670	1.36	1.31	1.30	1.32
269	35.34	0.500	3805	3303	3650	1.58	1.54	1.50	1.54
135	17.67	0.250	3711	3311	3656	2.52	1.46	1.44	1.81
67	8.84	0.125	3721	3322	3663	2.42	1.35	1.37	1.71
5	0.71	0.010	3743	3348	3688	2.20	1.09	1.12	1.47
43	5.65	0.080	3741	3346	3687	2.22	1.11	1.13	1.49
86	11.31	0.160	3736	3340	3681	2.27	1.17	1.19	1.54
135	17.67	0.250	3730	3332	3675	2.33	1.25	1.25	1.61
178	23.33	0.330	3720	3320	3664	2.43	1.37	1.36	1.72
226	29.69	0.420	3707	3309	3654	2.56	1.48	1.46	1.83

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien




Page 1 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST / EV015
Location: from 3+920 to 4+080 (4+050)
Level: 0
Soil Type: Ferma
Plate Diameter: 300 mm

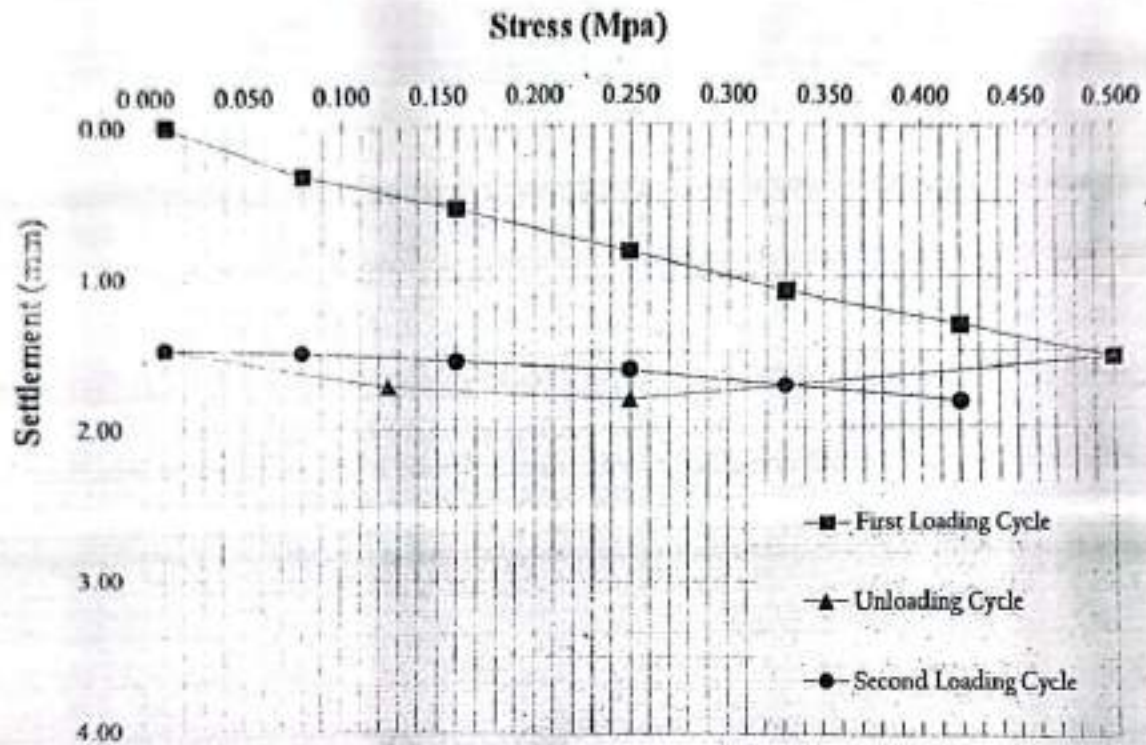

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.687	3.339	0.047
Second Cycle	1.614	0.209	1.465

Strain Modulus		
Ev1	75.1	Mpa
Ev2	221.5	Mpa
Ev2 / Ev1	2.9	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

2023
Page 2 of 2

شركة كيو لابتيف الجودة



Date:

30/08/2023

Project:

إنشاء الجسر النرابي و طرق الخدمة لخط
سكة حديد الروديكي / باديس

Contractor:

شركة تراسم

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**

Test No.: Trust /EV/025

Location: from 3+720 To 3+920

3+750

Level: 0

Soil Type: Fcma

Plate Diameter: 300 mm

Energy Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
5	0.71	0.010	3686	3848	4167	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3665	3825	4154	0.21	0.23	0.13	0.19
86	11.31	0.160	3652	3806	4140	0.34	0.42	0.27	0.34
135	17.67	0.250	3628	3782	4123	0.58	0.66	0.44	0.56
178	23.33	0.330	3605	3763	4110	0.81	0.85	0.57	0.74
226	29.69	0.420	3585	3746	4097	1.01	1.02	0.70	0.91
269	35.34	0.500	3569	3727	4086	1.17	1.21	0.81	1.06
135	17.67	0.250	3571	3730	4089	1.15	1.18	0.78	1.04
67	8.84	0.125	3581	3741	4098	1.05	1.07	0.69	0.94
5	0.71	0.010	3600	3765	4119	0.86	0.83	0.48	0.72
43	5.65	0.080	3599	3763	4117	0.87	0.85	0.50	0.74
86	11.31	0.160	3595	3759	4112	0.91	0.89	0.55	0.78
135	17.67	0.250	3588	3751	4105	0.98	0.97	0.62	0.86
178	23.33	0.330	3578	3742	4098	1.08	1.06	0.69	0.94
226	29.69	0.420	3568	3733	4090	1.18	1.15	0.77	1.03

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



شركة كيو لابتيف الجودة



Date:

30/08/2023

Project:

إنشاء الجسر الناري و طرق الخدمة لخط
محطة حديد الروديكي / باديس

Contractor:

شركة فراست

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**

Test No.: Trust /EV/025


Location: from 3+720 To 3+020

3+750

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

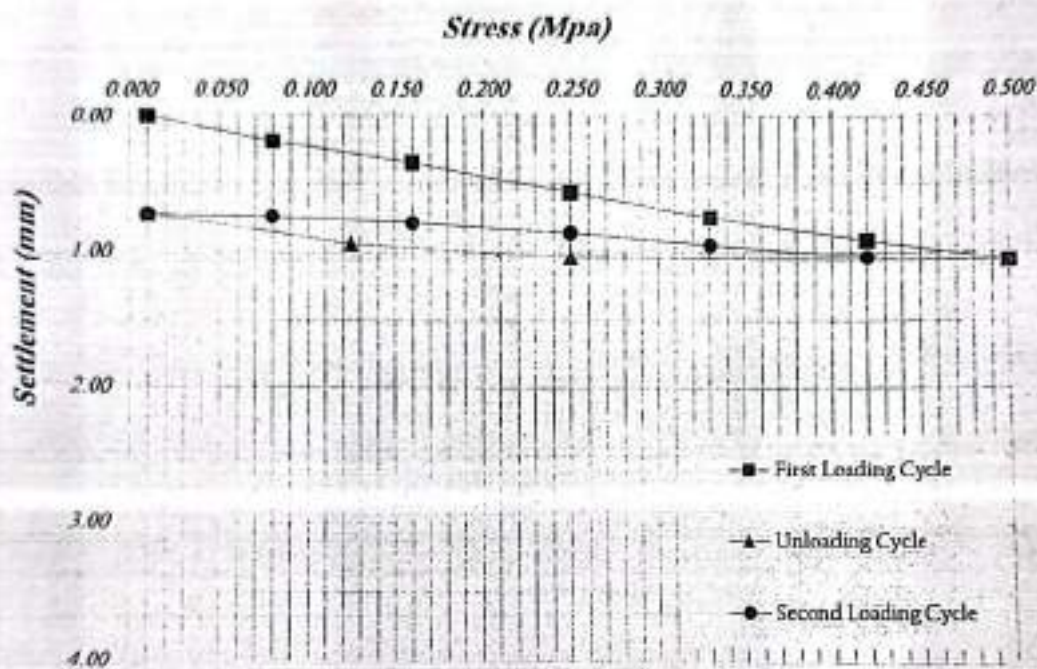

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.516	2.411	-0.010
Second Cycle	1.218	0.256	0.716

Strain Modulus		
Ev1	104.5	Mpa
Ev2	260.0	Mpa
Ev2 / Ev1	2.5	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: Trust /EV/026

Location: from 3+720 To 3+920

3+800

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Emerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	4072	3787	4195	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	4055	3758	4175	0.17	0.29	0.20	0.22
86	11.31	0.160	4040	3741	4160	0.32	0.46	0.35	0.38
135	17.67	0.250	4015	3706	4137	0.57	0.81	0.58	0.65
178	23.33	0.330	3991	3679	4113	0.81	1.08	0.82	0.90
226	29.69	0.420	3969	3653	4092	1.03	1.34	1.03	1.13
269	35.34	0.500	3946	3633	4071	1.26	1.54	1.24	1.35
135	17.67	0.250	3950	3637	4075	1.22	1.50	1.20	1.31
67	8.84	0.125	3964	3651	4088	1.08	1.36	1.07	1.17
5	0.71	0.010	3991	3681	4115	0.81	1.06	0.80	0.89
43	5.65	0.080	3990	3680	4113	0.82	1.07	0.82	0.90
86	11.31	0.160	3985	3675	4109	0.87	1.12	0.86	0.95
135	17.67	0.250	3976	3665	4100	0.96	1.22	0.95	1.04
178	23.33	0.330	3966	3653	4089	1.06	1.34	1.06	1.15
226	29.69	0.420	3956	3643	4080	1.16	1.44	1.15	1.25

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: Trust /EV/026


Location: from 3+720 To 3+920

3+800

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

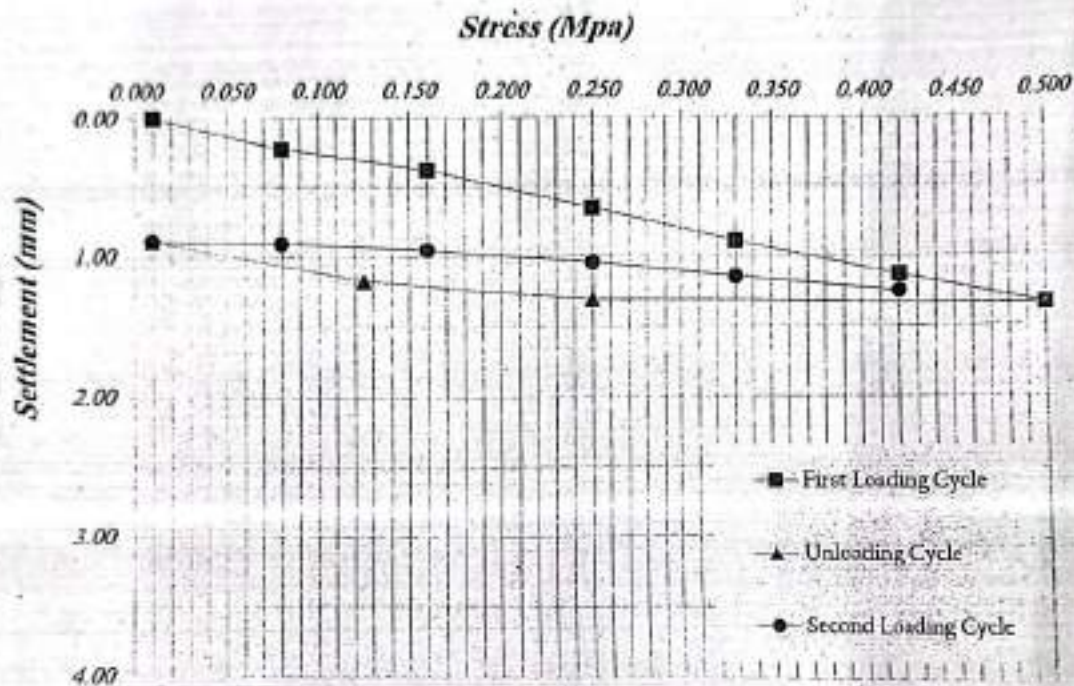

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.231	2.621	-0.012
Second Cycle	1.508	0.276	0.879

Strain Modulus		
Ev1	82.2	Mpa
Ev2	218.6	Mpa
Ev2 / Ev1	2.7	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: Trust /EV/027

Location: from 3+720 To 3+920 3+850

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Emcapack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3488	4230	3962	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3465	4210	3940	0.23	0.20	0.22	0.22
86	11.31	0.160	3450	4193	3925	0.38	0.37	0.37	0.37
135	17.67	0.250	3426	4170	3904	0.62	0.60	0.58	0.60
178	23.33	0.330	3404	4146	3883	0.84	0.84	0.79	0.82
226	29.69	0.420	3389	4129	3870	0.99	1.01	0.92	0.97
269	35.34	0.500	3371	4110	3852	1.17	1.20	1.10	1.16
135	17.67	0.250	3375	4114	3856	1.13	1.16	1.06	1.12
67	8.84	0.125	3380	4120	3862	1.08	1.10	1.00	1.06
5	0.71	0.010	3399	4142	3885	0.89	0.88	0.77	0.85
43	5.65	0.080	3398	4140	3883	0.90	0.90	0.79	0.86
86	11.31	0.160	3394	4136	3880	0.94	0.94	0.82	0.90
135	17.67	0.250	3386	4129	3873	1.02	1.01	0.89	0.97
178	23.33	0.330	3376	4120	3863	1.12	1.10	0.99	1.07
226	29.69	0.420	3365	4110	3854	1.23	1.20	1.08	1.17

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 1 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04


Test No.: Trust /EV/027

Location: from 3+720 To 3+920 3+850

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

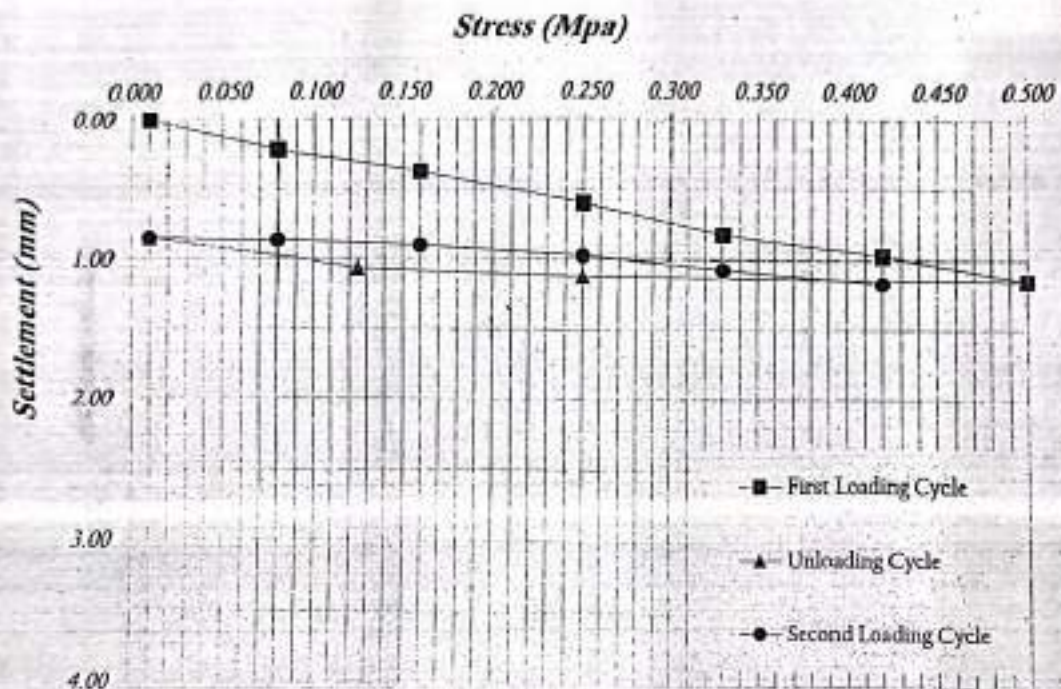

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.458	2.537	0.003
Second Cycle	1.530	0.150	0.842

Strain Modulus		
Ev1	97.5	Mpa
Ev2	245.8	Mpa
Ev2 / Ev1	2.5	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: Trust /EV/028

Location: from 3+720 To 3+920

3+900

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
5	0.71	0.010	3075	4010	4381	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3065	3990	4361	0.10	0.20	0.20	0.17
86	11.31	0.160	3055	3973	4349	0.20	0.37	0.32	0.30
135	17.67	0.250	3040	3958	4334	0.35	0.52	0.47	0.45
178	23.33	0.330	3021	3945	4322	0.54	0.65	0.59	0.59
226	29.69	0.420	3008	3933	4312	0.67	0.77	0.69	0.71
269	35.34	0.500	2988	3919	4296	0.87	0.91	0.85	0.88
135	17.67	0.250	2993	3925	4301	0.82	0.85	0.80	0.82
67	8.84	0.125	3001	3933	4309	0.74	0.77	0.72	0.74
5	0.71	0.010	3024	3958	4331	0.51	0.52	0.50	0.51
43	5.65	0.080	3022	3955	4329	0.53	0.55	0.52	0.53
86	11.31	0.160	3018	3950	4325	0.57	0.60	0.56	0.58
135	17.67	0.250	3010	3942	4318	0.65	0.68	0.63	0.65
178	23.33	0.330	3003	3935	4312	0.72	0.75	0.69	0.72
226	29.69	0.420	2993	3926	4302	0.82	0.84	0.79	0.82

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: Trust /EV/028

Location: from 3+720 To 3+920 3+900

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

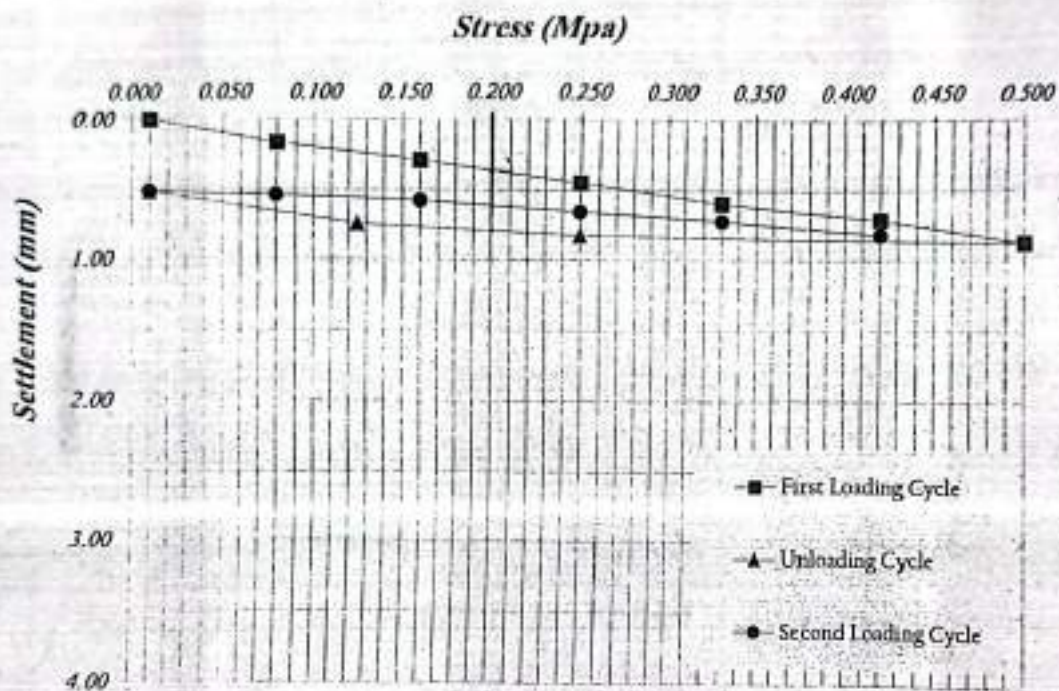

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.116	1.600	0.039
Second Cycle	1.023	0.317	0.504

Strain Modulus		
Ev1	135.7	Mpa
Ev2	271.5	Mpa
Ev2/Ev1	2.0	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/012

Location: from 2+700 to 2+840 2+735

Level: -1.5

Layer: Upper Embankment

Plate Diameter: 600 mm

Energy Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
11	1.42	0.005	1825	3090	3167	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	1802	3064	3141	0.23	0.26	0.26	0.25
172	22.62	0.080	1769	3036	3115	0.56	0.54	0.52	0.54
269	35.34	0.125	1739	3012	3092	0.86	0.78	0.75	0.80
355	46.66	0.165	1717	2994	3078	1.08	0.96	0.89	0.98
452	59.38	0.210	1693	2975	3060	1.32	1.15	1.07	1.18
538	70.68	0.250	1677	2963	3052	1.48	1.27	1.15	1.30
269	35.34	0.125	1680	2969	3055	1.45	1.21	1.12	1.26
135	17.68	0.063	1688	2985	3062	1.37	1.05	1.05	1.16
11	1.42	0.005	1714	3010	3090	1.11	0.80	0.77	0.89
86	11.30	0.040	1711	3006	3087	1.14	0.84	0.80	0.93
172	22.62	0.080	1707	2995	3080	1.18	0.95	0.87	1.00
269	35.34	0.125	1693	2982	3069	1.32	1.08	0.98	1.13
355	46.66	0.165	1680	2974	3060	1.45	1.16	1.07	1.23
452	59.38	0.210	1670	2964	3052	1.55	1.26	1.15	1.32

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





شركة كيو لاصط الجوده



Date:

19/09/2023

Project:

إنشاء الجسر القروي و طرق الخدمة لخط
سكة حديد الروبيكي / باديس
شركة تراسنت

Date:

09/08/2023

Project:

إنشاء الجسر القروي و طرق
الخدمة لخط سكة حديد

Contractor:

شركة تراسنت

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**


Test No: TRUST /EV/012

Location: from 2+700 to 2+840 2+735

Level: -1.5

Layer: Upper Embankment

Plate Diameter: 600 mm

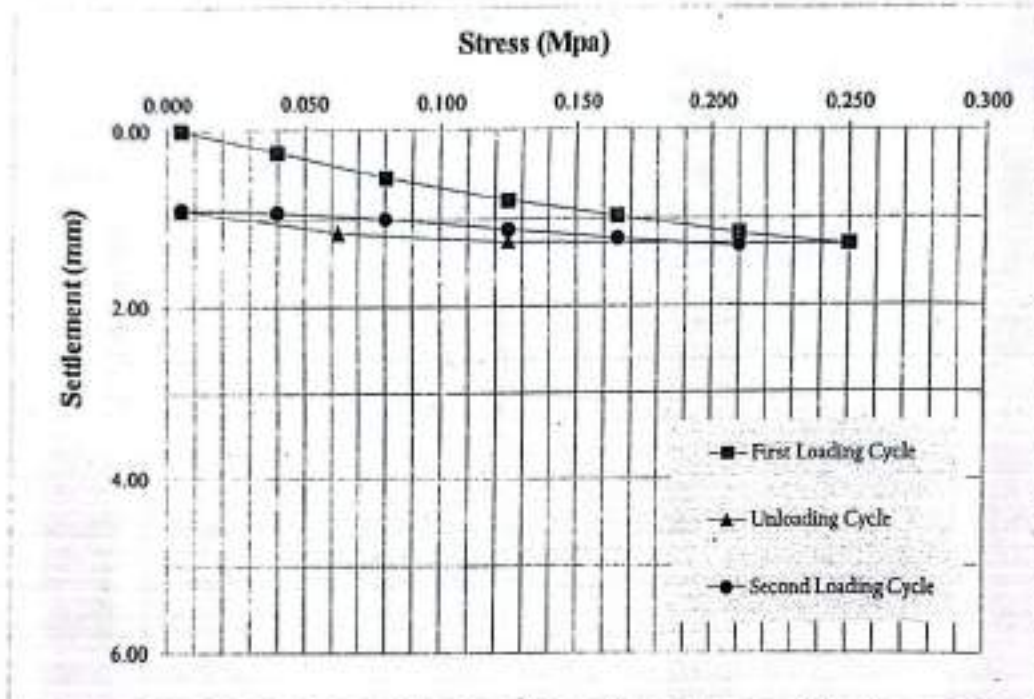

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-10.724	8.075	-0.049
Second Cycle	2.950	1.564	0.873

Strain Modulus		
Ev1	83.4	Mpa
Ev2	195.5	Mpa
Ev2 / Ev1	2.3	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 2 of 2

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: TRUST /EV/011

Location: from 2+700 to 2+840 2+805

Level: -1.5

Layer: Upper Embankment

Plate Diameter: 600 mm

Energy Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement , mm
11	1.42	0.005	2715	1360	2664	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	2675	1321	2640	0.40	0.39	0.24	0.34
172	22.62	0.080	2640	1283	2616	0.75	0.77	0.48	0.67
269	35.34	0.125	2616	1252	2590	0.99	1.08	0.74	0.94
355	46.66	0.165	2585	1231	2575	1.30	1.29	0.89	1.16
452	59.38	0.210	2560	1211	2563	1.55	1.49	1.01	1.35
538	70.68	0.250	2542	1195	2552	1.73	1.65	1.12	1.50
269	35.34	0.125	2545	1198	2555	1.70	1.62	1.09	1.47
135	17.68	0.063	2550	1210	2560	1.65	1.50	1.04	1.40
11	1.42	0.005	2565	1236	2575	1.50	1.24	0.89	1.21
86	11.30	0.040	2563	1234	2573	1.52	1.26	0.91	1.23
172	22.62	0.080	2558	1226	2566	1.57	1.34	0.98	1.30
269	35.34	0.125	2547	1215	2550	1.68	1.45	1.14	1.42
355	46.66	0.165	2541	1208	2544	1.74	1.52	1.20	1.49
452	59.38	0.210	2536	1200	2537	1.79	1.60	1.27	1.55

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04


Test No.: TRUST /EV/011

Location: from 2+700 to 2+840 2+805

Level: -1.5

Layer: Upper Embankment

Plate Diameter: 600 mm

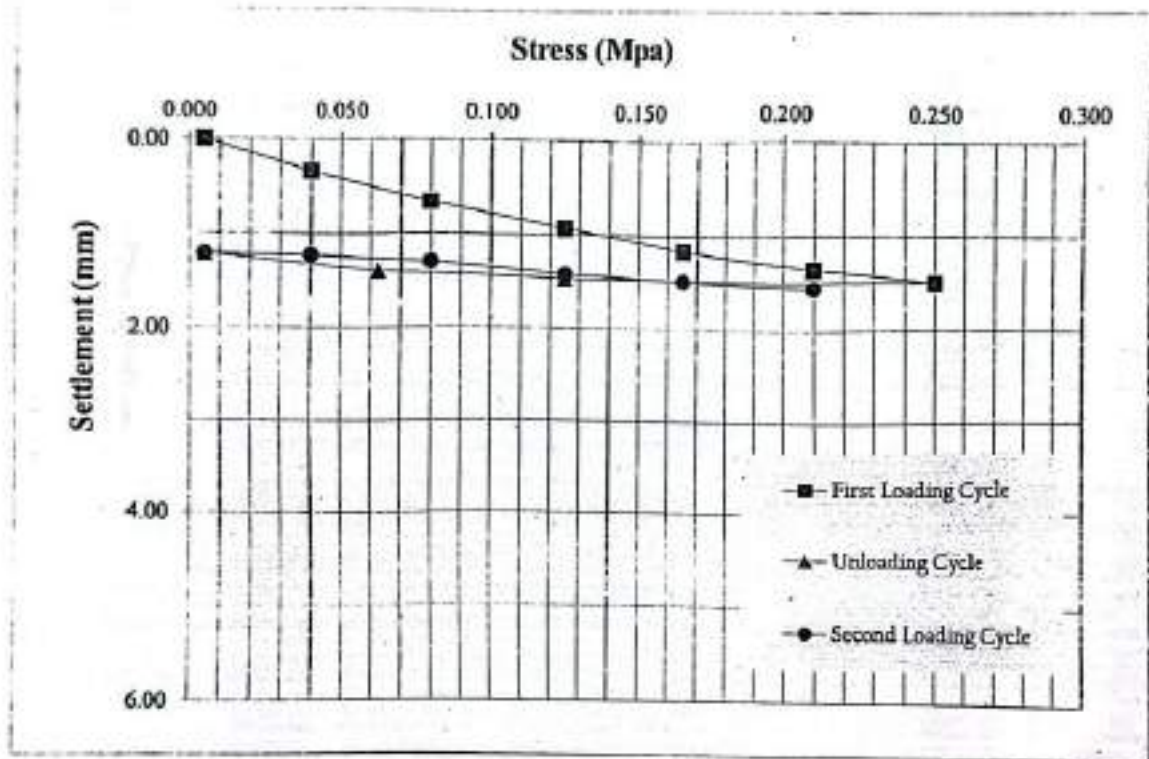

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-11.998	8.921	0.014
Second Cycle	1.091	1.582	1.185

Strain Modulus		
Ev1	76.0	Mpa
Ev2	242.6	Mpa
Ev2 / Ev1	3.2	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: Trust /EV/030

Location: from 2+700 To 2+840

2+740

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Emperpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3696	2704	2748	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3675	2680	2745	0.21	0.24	0.03	0.16
86	11.31	0.160	3662	2665	2728	0.34	0.39	0.20	0.31
135	17.67	0.250	3637	2637	2705	0.59	0.67	0.43	0.56
178	23.33	0.330	3615	2617	2680	0.81	0.87	0.68	0.79
226	29.69	0.420	3586	2590	2656	1.10	1.14	0.92	1.05
269	35.34	0.500	3572	2576	2645	1.24	1.28	1.03	1.18
135	17.67	0.250	3576	2579	2649	1.20	1.25	0.99	1.15
67	8.84	0.125	3585	2589	2657	1.11	1.15	0.91	1.06
5	0.71	0.010	3604	2622	2677	0.92	0.82	0.71	0.82
43	5.65	0.080	3602	2620	2676	0.94	0.84	0.72	0.83
86	11.31	0.160	3599	2616	2673	0.97	0.88	0.75	0.87
135	17.67	0.250	3592	2610	2666	1.04	0.94	0.82	0.93
178	23.33	0.330	3583	2600	2656	1.13	1.04	0.92	1.03
226	29.69	0.420	3573	2588	2646	1.23	1.16	1.02	1.14

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 1 of 2

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**


Test No.: Trust /EV/030

Location: from 2+700 To 2+840 2+740

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

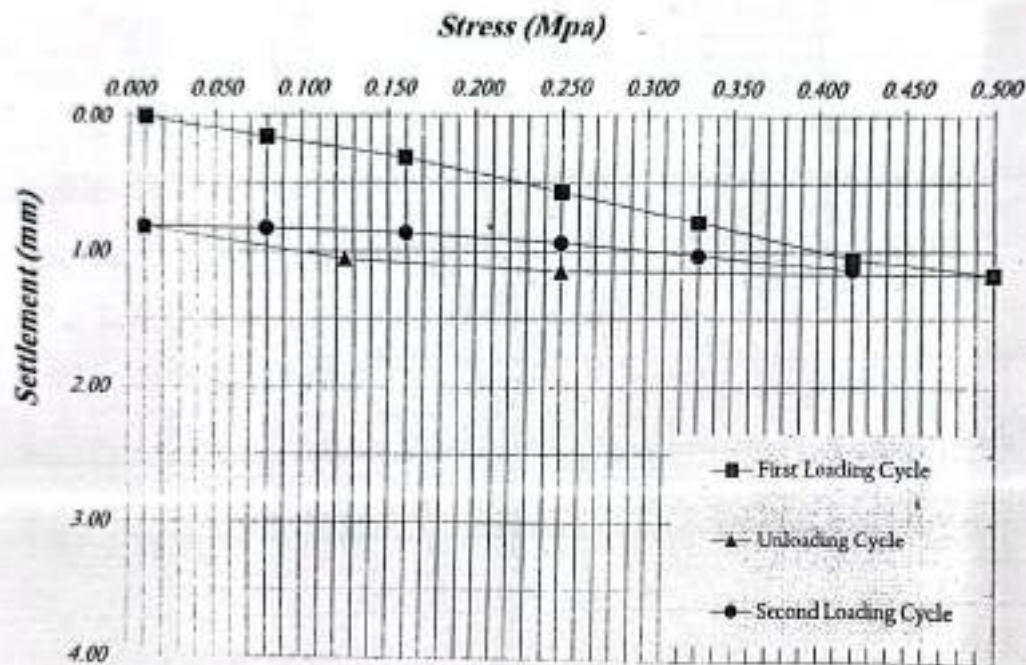

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.107	2.621	-0.073
Second Cycle	1.670	0.072	0.815

Strain Modulus		
Ev1	87.6	Mpa
Ev2	248.0	Mpa
Ev2 / Ev1	2.8	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: Trust /EV/030

Location: from 2+700 To 2+840

2+790

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	4073	2933	3899	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	4067	2909	3887	0.06	0.24	0.12	0.14
86	11.31	0.160	4053	2893	3874	0.20	0.40	0.25	0.28
135	17.67	0.250	4029	2866	3853	0.44	0.67	0.46	0.52
178	23.33	0.330	4010	2855	3846	0.63	0.78	0.53	0.65
226	29.69	0.420	4005	2851	3843	0.68	0.82	0.56	0.69
269	35.34	0.500	3993	2847	3837	0.80	0.86	0.62	0.76
135	17.67	0.250	3995	2848	3838	0.78	0.85	0.61	0.75
67	8.84	0.125	4000	2853	3842	0.73	0.80	0.57	0.70
5	0.71	0.010	4013	2873	3854	0.60	0.60	0.45	0.55
43	5.65	0.080	4012	2872	3853	0.61	0.61	0.46	0.56
86	11.31	0.160	4009	2865	3847	0.64	0.68	0.52	0.61
135	17.67	0.250	4005	2857	3840	0.68	0.76	0.59	0.68
178	23.33	0.330	3995	2850	3835	0.78	0.83	0.64	0.75
226	29.69	0.420	3985	2844	3829	0.88	0.89	0.70	0.82

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: Trust /EV/030

Location: from 2+700 To 2+840 2+790

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

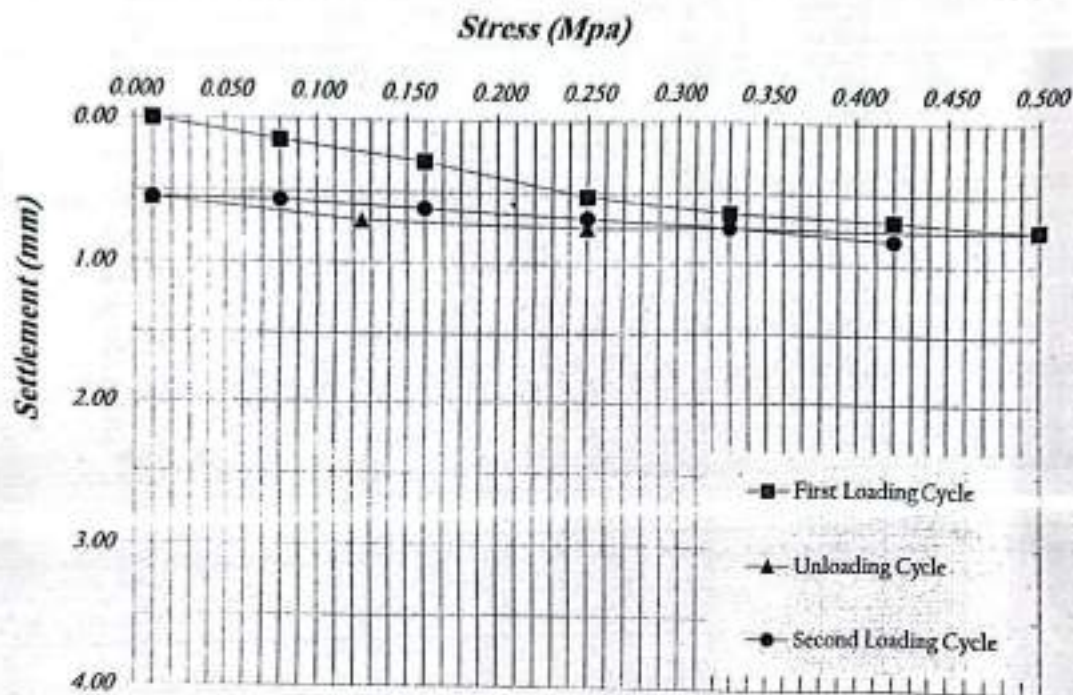

Regression Analysis

Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-2.953	3.211	-0.114
Second Cycle	0.847	0.333	0.539

Strain Modulus

Ev1	129.8	Mpa
Ev2	297.3	Mpa
Ev2 / Ev1	2.3	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: Trust /EV/030

Location: from 2+700 To 2+840 2+820

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Emerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3347	4299	3411	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3321	4270	3388	0.26	0.29	0.23	0.26
86	11.31	0.160	3306	4254	3370	0.41	0.45	0.41	0.42
135	17.67	0.250	3284	4229	3346	0.63	0.70	0.65	0.66
178	23.33	0.330	3263	4204	3326	0.84	0.95	0.85	0.88
226	29.69	0.420	3245	4183	3309	1.02	1.16	1.02	1.07
269	35.34	0.500	3230	4165	3292	1.17	1.34	1.19	1.23
135	17.67	0.250	3238	4174	3300	1.09	1.25	1.11	1.15
67	8.84	0.125	3249	4187	3310	0.98	1.12	1.01	1.04
5	0.71	0.010	3271	4220	3333	0.76	0.79	0.78	0.78
43	5.65	0.080	3269	4215	3331	0.78	0.84	0.80	0.81
86	11.31	0.160	3265	4210	3327	0.82	0.89	0.84	0.85
135	17.67	0.250	3256	4197	3319	0.91	1.02	0.92	0.95
178	23.33	0.330	3245	4185	3307	1.02	1.14	1.04	1.07
226	29.69	0.420	3237	4173	3297	1.10	1.26	1.14	1.17

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 1 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: Trust /EV/030


Location: from 2+700 To 2+840

2+820

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

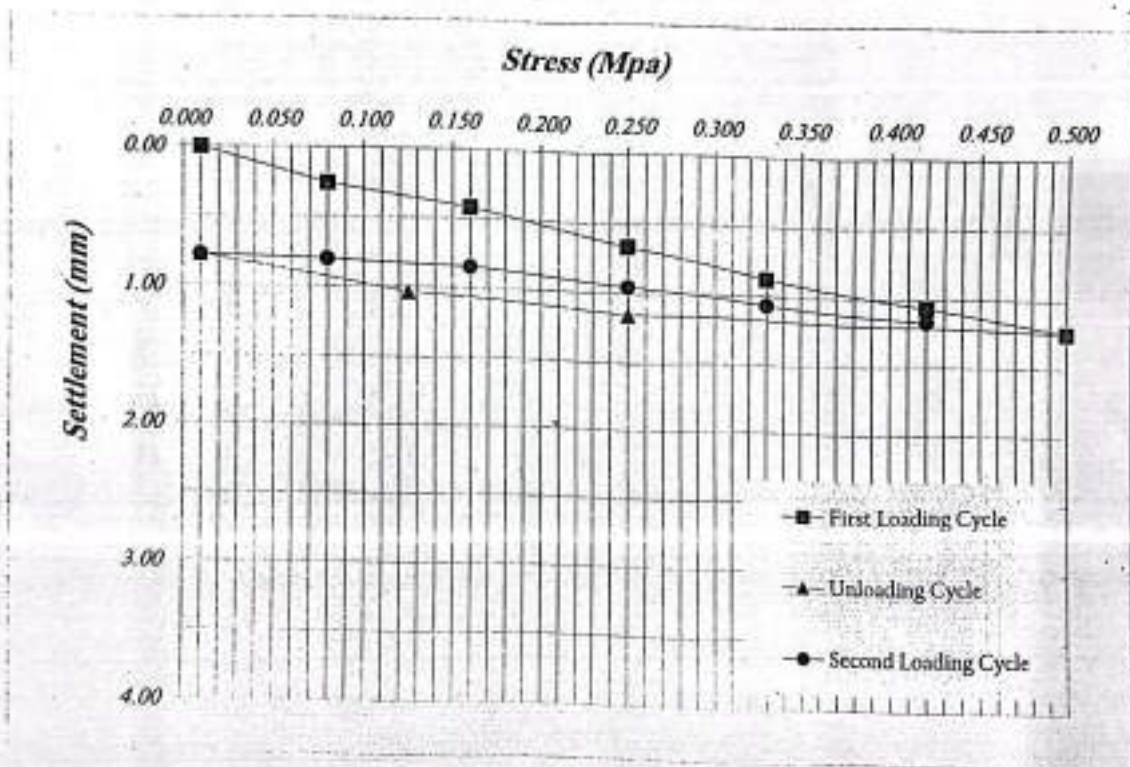

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.473	2.645	0.036
Second Cycle	1.429	0.373	0.768

Strain Modulus		
Ev1	93.4	Mpa
Ev2	206.8	Mpa
Ev2/Ev1	2.2	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/005

Location: from 4+120 to 4+200 (4+130)

Level: -0.25

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Emperpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3400	2947	2987	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3388	2929	2958	0.12	0.18	0.29	0.20
86	11.31	0.160	3363	2906	2924	0.37	0.41	0.63	0.47
135	17.67	0.250	3348	2888	2898	0.52	0.59	0.89	0.67
178	23.33	0.330	3327	2864	2867	0.73	0.83	1.20	0.92
226	29.69	0.420	3296	2842	2835	1.04	1.05	1.52	1.20
269	35.34	0.500	3278	2825	2810	1.22	1.22	1.77	1.40
135	17.67	0.250	3280	2831	2812	1.20	1.16	1.75	1.37
67	8.84	0.125	3283	2844	2823	1.17	1.03	1.64	1.28
5	0.71	0.010	3310	2866	2849	0.90	0.81	1.38	1.03
43	5.65	0.080	3308	2863	2847	0.92	0.84	1.40	1.05
86	11.31	0.160	3305	2859	2845	0.95	0.88	1.42	1.08
135	17.67	0.250	3302	2850	2838	0.98	0.97	1.49	1.15
178	23.33	0.330	3292	2841	2828	1.08	1.06	1.59	1.24
226	29.69	0.420	3278	2832	2818	1.22	1.15	1.69	1.35

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Page 1 of 2

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**


Test No.: TRUST /EV/005

Location: from 4+120 to 4+200 (4+130)

Level: -0.25

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

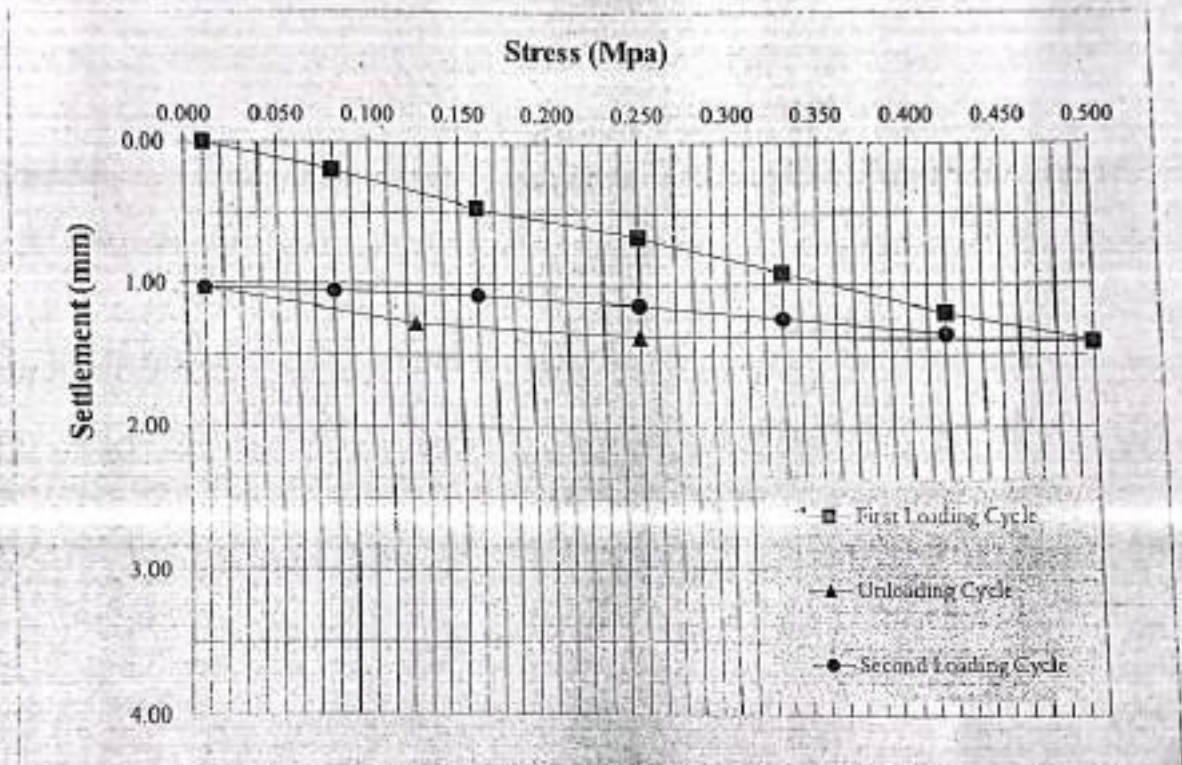

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.013	2.874	-0.022
Second Cycle	1.673	0.068	1.032

Strain Modulus		
Ev1	78.5	Mpa
Ev2	248.7	Mpa
Ev2 / Ev1	3.2	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Page 2 of 2



شركة كيو لابتيف الجوده



Date: 17/08/2023

Project: إنشاء الجسر الترابي و طريق المائدة لحدود
الخدمة / -

Date: 01/08/2023

Project: إنشاء الجسر الترابي و طريق
الخدمة لخط سكة حديد

Contractor: شركة تراسيت

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: TRUST /EV/004

Location: from 4+120 to 4+200 (4+175)

Level: -0.25

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

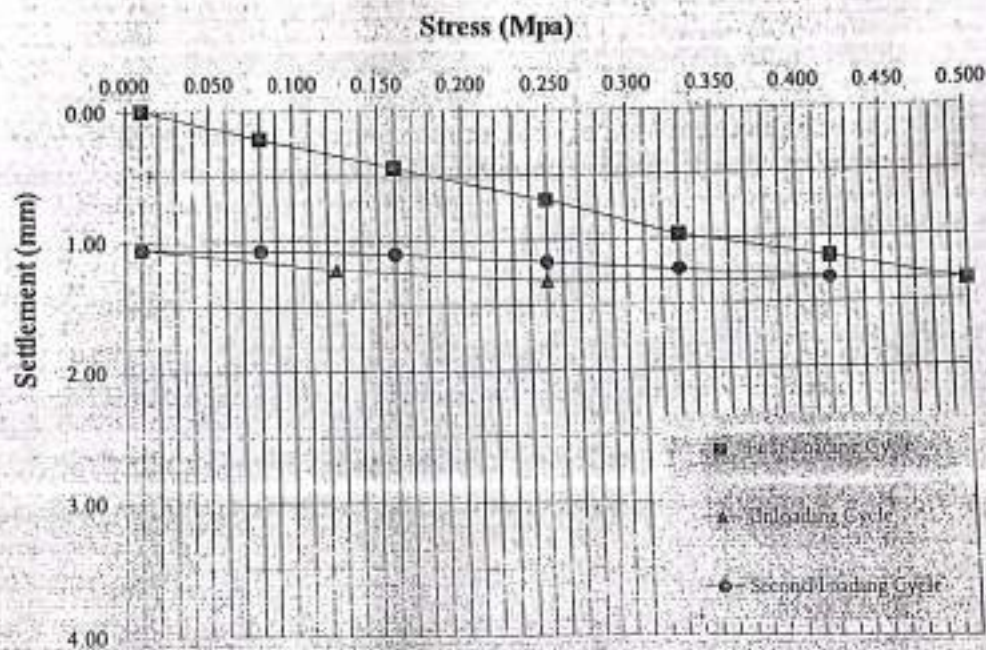

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.939	3.243	-0.039
Second Cycle	1.192	0.129	1.054

Strain Modulus		
Ev1	81.1	Mpa
Ev2	310.4	Mpa
Ev2 / Ev1	3.8	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04


Test No.: TRUST /EV/004

Location: from 4+120 to 4+200 (4+175)

Level: -0.25

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

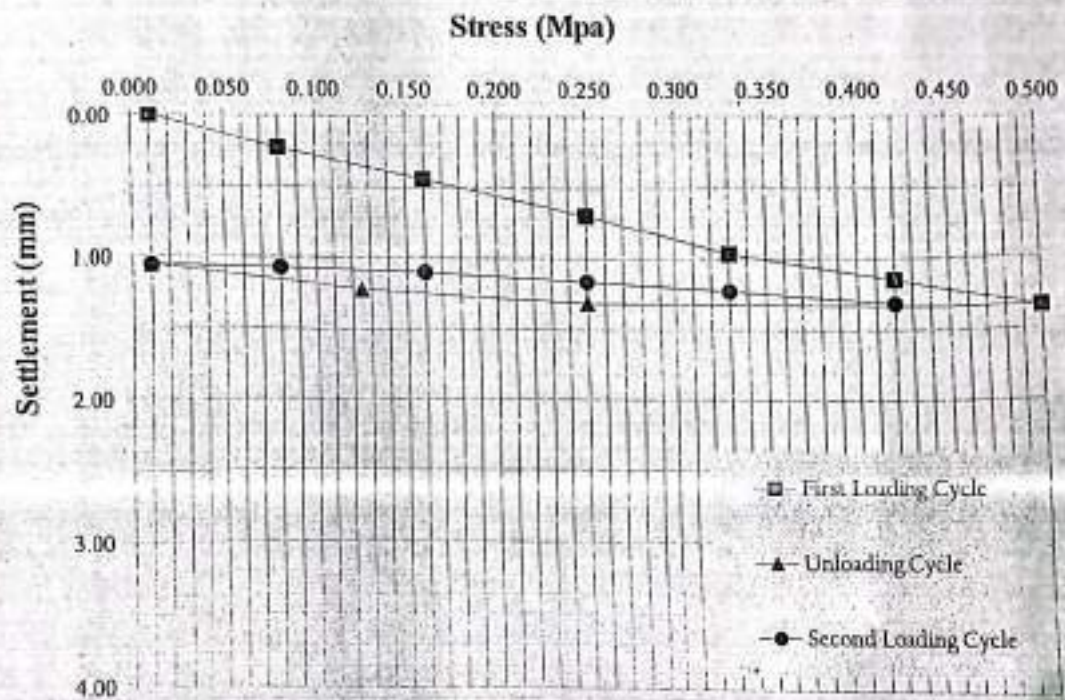

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.939	3.243	-0.039
Second Cycle	1.192	0.129	1.054

Strain Modulus		
Ev1	81.1	Mpa
Ev2	310.4	Mpa
Ev2 / Ev1	3.8	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Date: 17/08/2023

Project: إنشاء المصدر البرقي و طرق الخدمة العامة
مسكة حديد الروميكس / بادينج

Contractor: شركة كواند

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**

Test No.: Trust /EV/030

Location: from 4+120 To 4+200 4+180

Level: 0

Soil Type: Fuma

Plate Diameter: 300 mm

Encapack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	1860	3010	3709	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	1847	2992	3693	0.13	0.18	0.16	0.16
86	11.31	0.160	1840	2980	3681	0.20	0.30	0.28	0.26
135	17.67	0.250	1827	2966	3665	0.33	0.44	0.44	0.40
178	23.33	0.330	1815	2955	3653	0.45	0.55	0.56	0.52
226	29.69	0.420	1800	2940	3637	0.60	0.70	0.72	0.67
269	35.34	0.500	1788	2928	3623	0.72	0.82	0.86	0.80
135	17.67	0.250	1790	2931	3626	0.70	0.79	0.83	0.77
67	8.84	0.125	1794	2939	3630	0.66	0.71	0.79	0.72
5	0.71	0.010	1798	2956	3636	0.62	0.54	0.73	0.63
43	5.65	0.080	1795	2952	3634	0.65	0.58	0.75	0.66
86	11.31	0.160	1790	2948	3631	0.70	0.62	0.78	0.70
135	17.67	0.250	1787	2942	3627	0.73	0.68	0.82	0.74
178	23.33	0.330	1783	2937	3624	0.77	0.73	0.85	0.78
226	29.69	0.420	1776	2929	3618	0.84	0.81	0.91	0.85

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

2023

Page 1 of 2



Date

17/06/2023

Project


test results and calculation
and length of test

Contractor

Supervisor

PLATE LOADING TEST STRAIN MODULUS (EV1 & EV2) DIN 51714 2012 04

Test No: 100514-040
Test type: given EV1 to EV2
Test: 0
Soil type: Legma
Plate Diameter: 300 mm

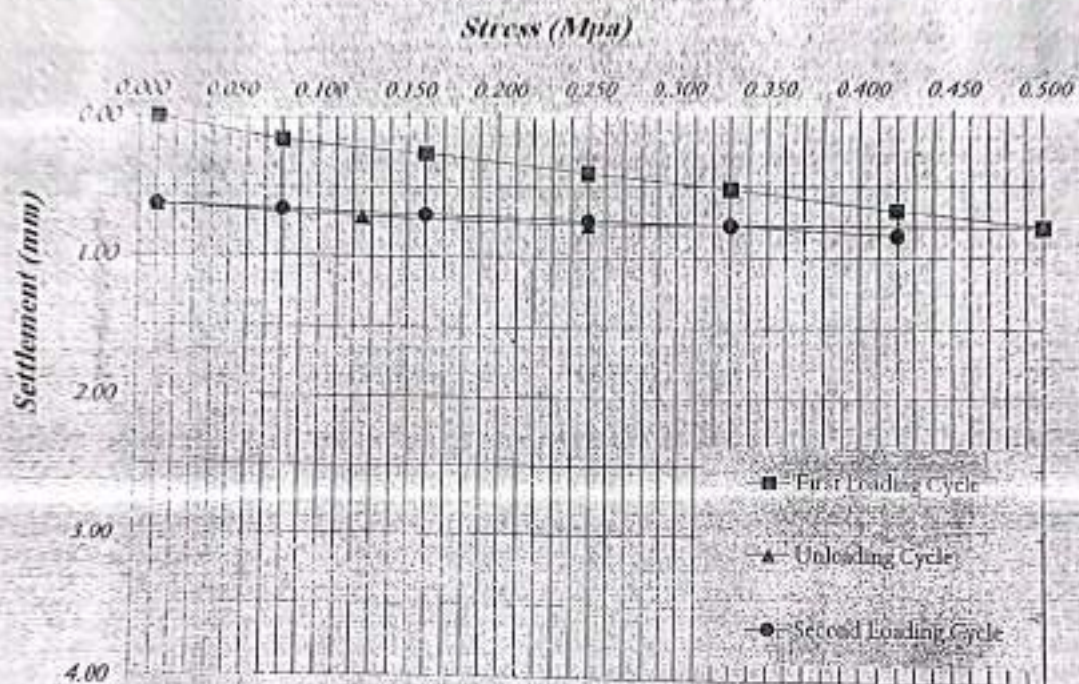

Regression Analysis

Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.399	1.314	0.046
Second Cycle	0.407	0.357	0.628

Strain Modulus

Ev1	148.7	Mpa
Ev2	401.7	Mpa
Ev2 / Ev1	2.7	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 2 of 2



Date: 13/08/2023
Project: Highway Construction
Contractor: Al-Baladiya

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (I.V1 & I.V2)
DIN 18134:2012-04

Test No: T101 / FV/030
Location: from 4*120 to 4*200 4*140
Level: 0
Soil Type: Fcma
Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	1171	3472	2145	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	1160	3443	2122	0.11	0.29	0.23	0.21
86	11.31	0.160	1140	3420	2100	0.31	0.52	0.45	0.43
135	17.67	0.250	1122	3396	2080	0.49	0.76	0.65	0.63
178	23.33	0.330	1112	3381	2068	0.59	0.91	0.77	0.76
226	29.69	0.420	1095	3363	2051	0.76	1.09	0.94	0.93
269	35.34	0.500	1082	3350	2040	0.89	1.22	1.05	1.05
135	17.67	0.250	1086	3359	2048	0.85	1.13	0.97	0.98
67	8.84	0.125	1090	3372	2053	0.81	1.00	0.92	0.91
5	0.71	0.010	1100	3395	2075	0.71	0.77	0.70	0.73
43	5.65	0.080	1092	3390	2073	0.79	0.82	0.72	0.78
86	11.31	0.160	1085	3380	2068	0.86	0.92	0.77	0.85
135	17.67	0.250	1080	3371	2061	0.91	1.01	0.84	0.92
178	23.33	0.330	1076	3363	2054	0.95	1.09	0.91	0.98
226	29.69	0.420	1070	3355	2044	1.01	1.17	1.01	1.06

Notes:

34.72 2145

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: Trust /EV/031

Location: 0.3m 4+080 To 4+120


4+1001

Level:

0

Soil Type: Fenna

Plate Diameter: 300 mm

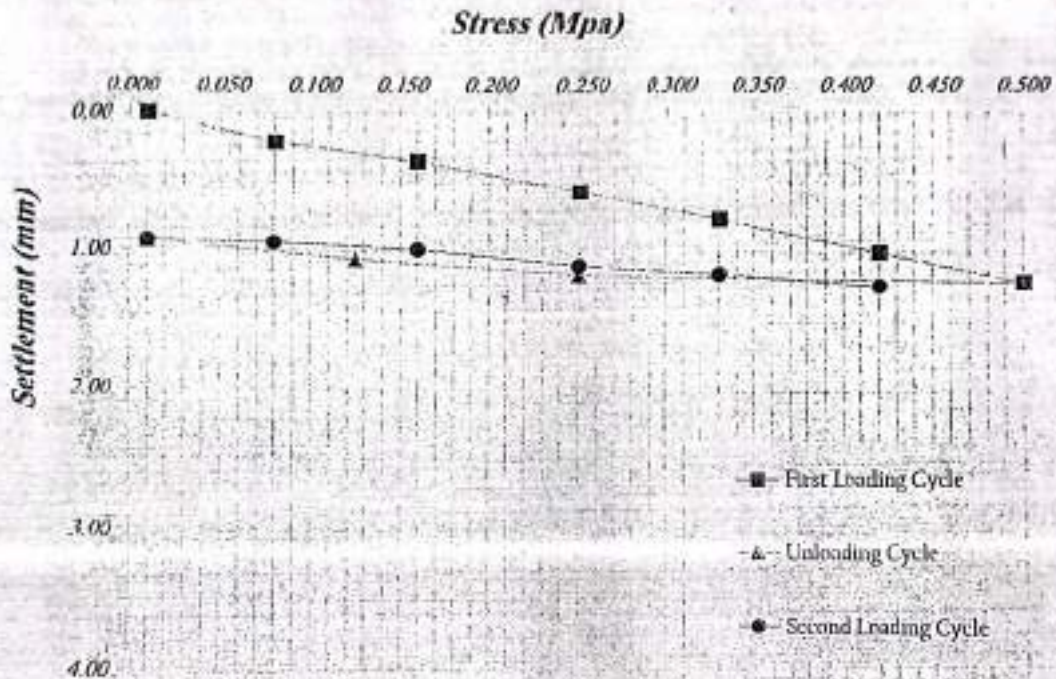

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	1.347	1.645	0.068
Second Cycle	0.823	0.459	0.912

Strain Modulus		
Ev1	97.1	Mpa
Ev2	258.5	Mpa
Ev2/Ev1	2.7	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إشادة الجسر الرابع و طرق القنطرة لخط متكا حديد السودان / باس
Client	شركة ترانسك
Testing Date	17-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مليون المحمود
Location	From 2+700 To 2+840
Layer	Upper Embankment
Level	-0.25
Sample No	Trust/SC/374-376
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1072.0	975.0	1070.0		
Weight of Water	(g)	22.0	23.0	24.0		
Weight of Dry Soil	(g)	478.0	477.0	476.0		
In-Place Water Content	(%)	4.6	4.8	5.0		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		2+830	2+780	2+730		
Cone Ref.		3	4	1		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4172.0	4791.0	4428.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4145.0	4764.0	4401.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	9200	9000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5667.0	4526.0	4564.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1429.0	1436.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2863.0	3245.0	3000.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	1921.5	2177.9	2013.4		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.157	2.187	2.186		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.062	2.087	2.081		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089		
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.7	99.9	99.6		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab Eng. Abdallah Hussien

Date of Report 18-Sep-23

Form Number QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القريب و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بايس
Client	شركة ترانس
Testing Date	19-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشروع المحمود
Location	From 2+700 To 2+840
Layer	Ferna
Level	0.0
Sample No	Trust/SC/377-379
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0	974.0	1070.0		
Weight of Water	(g)	23.0	24.0	24.0		
Weight of Dry Soil	(g)	477.0	476.0	476.0		
In-Place Water Content	(%)	4.8	5.0	5.0		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		2+830	2+780	2+730		
Cone Ref.		5	5	3		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4325.0	3860.0	4640.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4298.0	3833.0	4613.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	9000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5685.0	5033.0	5400.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1348.0	1348.0	1470.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2967.0	2619.0	3130.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	1991.3	1757.7	2100.7		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.158	2.181	2.196		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.059	2.076	2.091		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089		
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.6	99.4	100.1		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 20-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الرابع و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / باريس		
Client	شركة ترانست		
Testing Date	30-Aug-23		
Sample Description	Reddish Soil		
Source	مشروع المجمع		
Location	From 2+700 To 2+720	Retest	
Layer	Upper Embankment		
Level	-1.0		
Sample No	Trust/SC/293		
Sampled by	Abdelrahman Gaber		

Moisture Content	Can Ref.				
	Weight of Container	(g)	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1065.0		
	Weight of Water	(g)	29.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	471.0		
	In-Place Water Content	(%)	6.2		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9		

Field Density	Station	2+710			
	Cone Ref.	4			
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4935.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	4908.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5304.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3267.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2192.6		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.238		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.109		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	100.9		
Acceptance Criterion			(%)	95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 31-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الثنائي و طرق الخدمة للطريق حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة ترانس
Testing Date	23-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مخزون المحمود
Location	From 2+700 To 2+840
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0
Sample No	Trust/SC/252-254
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0	975.0	1075.0		
Weight of Water	(g)	19.0	23.0	19.0		
Weight of Dry Soil	(g)	481.0	477.0	481.0		
In-Place Water Content	(%)	4.0	4.8	4.0		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		2+720	2+770	2+820		
Cone Ref.		5	1	1		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4750.0	5795.0	5110.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4723.0	5768.0	5083.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	9500	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4615.0	4595.0	4910.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1348.0	1436.0	1436.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3537.0	3969.0	3654.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2373.8	2663.8	2452.3		
In-Place Wet density	(g/cc)	1.990	2.165	2.073		
In-Place Dry density	(g/cc)	1.914	2.066	1.994		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089		
Degree of Compaction at Field*	(%)	91.6	98.9	95.4		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien
Date of Report : 24-Aug-23
Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / باليس
Client	شركة ترانست
Testing Date	21-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+080 To 4+120
Layer	Upper Embankment
Level	-0.25
Sample No	Trust/SC/229
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1				
Weight of Container	(g)	594.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1064.0			
Weight of Water	(g)	30.0			
Weight of Dry Soil	(g)	470.0			
In-Place Water Content	(%)	6.4			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

Station	4+100				
Cone Ref.	5				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6250.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	6223.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	4225.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4305.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2889.3			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.154			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.025			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089			
Degree of Compaction at Field*	(%)	96.9			
Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 22-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إشادة الجسر القرائي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بايس
Client	شركة ثراست
Testing Date	7-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مئون المحمود
Location	From 2+700 To 2+840
Layer	Upper Embankment
Level	-0.750
Sample No	Trust/SC/342-344
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Moistur Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
e Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	970.0	1068.0		
Content Weight of Water	(g)	25.0	28.0	26.0		
Weight of Dry Soil	(g)	475.0	472.0	474.0		
In-Place Water Content	(%)	5.3	5.9	5.5		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		2+740	2+790	2+830		
Cone Ref.		1	2	1		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5660.0	4690.0	5120.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	5633.0	4663.0	5093.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4670.0	5195.0	4977.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1436.0		
Field Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3894.0	3290.0	3587.0		
Density Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2613.4	2208.1	2407.4		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.155	2.112	2.116		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.048	1.994	2.006		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089		
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.0	95.4	96.0		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report : 8-Sep-23

Form Number : QLab/Soil/07/ver.01



كيو لضبط الجودة

Tel : 01023405673

Website: www.qlabeg.com

e-mail info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء جسر الخراسي و طرق الدفعة لخط سكة حديد القويعة / بالبحر
Client	شركة ترانسك
Testing Date	13-Sep-23
Sample Description	Crushed stones
Source	By client
Location	From 4+140 To 4+200
Layer	Sub Ballast
Level	0.15
Sample No	Trust/SC/373
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1			
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0		
	Weight of Water	(g)	23.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	477.0		
	In-Place Water Content	(%)	4.8		
Optimum Moisture Content		(%)	5.5		

Station		4+180			
Cone Ref.		3			
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5587.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	5560.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5041.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3489.0		
	Bulk Density of Sand	(p/cc)	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2341.6		
	In-Place Wet density	(p/cc)	2.374		
	In-Place Dry density	(p/cc)	2.265		
	Max. Dry Density	(p/cc)	2.273		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	99.7		
Acceptance Criterion		(%)		98.0	

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 14-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:

2023
14-Sep-23
ASAP



كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة للطريق حادي الزويتاني / بانيس
Client	شركة تراسات
Testing Date	13-Sep-23
Sample Description	Crushed stones
Source	By client
Location	From 3+720 To 3+920
Layer	Sub Ballast
Level	0.15
Sample No	Trust/SC/369-372
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0	973.0	1070.0	975.0
Weight of Water	(g)	23.0	25.0	24.0	23.0
Weight of Dry Soil	(g)	477.0	475.0	476.0	477.0
In-Place Water Content	(%)	4.8	5.3	5.0	4.8
Optimum Moisture Content	(%)	5.5	5.5	5.5	5.5

Station		3+900	3+840	3+780	3+720
Cone Ref.		4	5	3	3
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6588.0	4428.0	5416.0	6655.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	6561.0	4401.0	5389.0	6628.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4490.0	5894.0	5168.0	4400.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1348.0	1470.0	1470.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4081.0	2758.0	3362.0	4130.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2738.9	1851.0	2256.4	2771.8
In-Place Wet density	(g/cc)	2.395	2.378	2.388	2.391
In-Place Dry density	(g/cc)	2.285	2.259	2.274	2.281
Max. Dry Density	(g/cc)	2.273	2.273	2.273	2.273
Degree of Compaction at Field*	(%)	100.5	99.4	100.0	100.4
Acceptance Criterion	(%)	98.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 14-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:

2023
14 Sep
Hussien



كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808671

Website: www.qlabeg.com

e-mail info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	شارع الجسر القوي و طريق القنطرة الجديدة / القاهرة	
Client	شركة ترانسكو	
Testing Date	30-Aug-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مشروع القنطرة	
Location	From 2+700 To 2+720	Retest
Layer	Upper Embankment	
Level	-1.0	
Sample No	Trust/SC/293	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		I			
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1065.0		
	Weight of Water	(g)	29.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	471.0		
	In-Place Water Content	(%)	6.2		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9		

Station		2+710			
Cone Ref.		4			
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4935.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	4908.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5304.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3267.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2192.6		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.238		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.109		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	100.9		
	Acceptance Criterion	(%)	95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 31-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver 01

Signature:





كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لطريق حديد الروبيكي / بابيبي
Client	شركة تراس
Testing Date	13-Sep-23
Sample Description	Crushed stones
Source	By client
Location	From 3+940 To 4+140
Layer	Sub Ballast
Level	0.15
Sample No	Trust/SC/364-368
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0	975.0	1070.0	979.0
Weight of Water	(g)	19.0	23.0	24.0	19.0
Weight of Dry Soil	(g)	481.0	477.0	476.0	481.0
In-Place Water Content	(%)	4.0	4.8	5.0	4.0
Optimum Moisture Content	(%)	5.5	5.5	5.5	5.5

Station		4+130	4+090	4+040	3+990	3+950
Cone Ref.		4	3	4	5	3
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	4508.0	5124.0	5022.0	5296.0	4575.0
	Weight of Plastic Bag (g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil (g)	4481.0	5097.0	4995.0	5269.0	4548.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	10000	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone (g)	5690.0	5276.0	5454.0	5273.0	5715.0
	Weight of Sand to Fill Cone (g)	1429.0	1470.0	1429.0	1348.0	1470.0
	Weight of Sand to Fill Hole (g)	2881.0	3254.0	3117.0	3379.0	2815.0
	Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole (cc)	1933.6	2183.9	2091.9	2267.8	1889.3
	In-Place Wet density (g/cc)	2.317	2.334	2.388	2.323	2.407
	In-Place Dry density (g/cc)	2.229	2.227	2.273	2.235	2.292
	Max. Dry Density (g/cc)	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
	Degree of Compaction at Field* (%)	98.1	98.0	100.0	98.3	100.8
Acceptance Criterion (%)		98.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 14-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature: Stamp:

2023
T. H. Hussien
14



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

	إنشاء الجسر الترابي و طرق الكفحة لطب سكة حديد الروبيكي / بابيس شركة تراس	
Date	21-Aug-23	
Description	Reddish Soil مشون المحمود	
n	From 4+080 To 4+120 Upper Embankment	
	-0.25	
No	Trust/SC/229	
ed by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.					
Weight of Container	(g)	594.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1064.0			
Weight of Water	(g)	30.0			
Weight of Dry Soil	(g)	470.0			
In-Place Water Content	(%)	6.4			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

Station	4+100				
Cone Ref.	3				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6250.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	6223.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4225.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4305.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2889.3			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.154			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.025			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089			
Degree of Compaction at Field*	(%)	96.9			
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

Lab : Eng. Abdallah Hussien

f Report : 22-Aug-23

Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	الدراسه الجيوتقنيه و طرق البناء الجيد لاجل احياء الرويدان / بورس	
Client	شركة اعمار	
Testing Date	23-Aug-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مخزون الحصى	
Location	Point 2+700 To 2+800	
Layer	Upper Embankment	
Level	-1.0	
Sample No	Trinet/SC/252-254	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		1	2	3		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0	975.0	1075.0	
	Weight of Water	(g)	19.0	23.0	19.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	481.0	477.0	481.0	
	In-Place Water Content	(%)	4.0	4.8	4.0	
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	

Station	2+720	2+770	2+820		
Cone Ref.	5	1	1		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4750.0	5795.0	5110.0	
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	
Weight of Wet Soil	(g)	4723.0	5768.0	5083.0	
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	9500	10000	10000	
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	4615.0	4595.0	4910.0	
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1348.0	1436.0	1436.0	
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3537.0	3969.0	3654.0	
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	
Gross Volume of Hole	(cc)	2373.8	2663.8	2452.3	
In-Place Wet density	(g/cc)	1.990	2.165	2.073	
In-Place Dry density	(g/cc)	1.914	2.066	1.994	
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089	
Degree of Compaction at Field*	(%)	91.6	98.9	95.4	
Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For OLab

Eng. Abdallah Hussien

Signature: _____

Date of Report:

24-AUG-23

Form Number

QLab/Soil'07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / باييس		
Client	شركة احمد ترامت		
Testing Date	21-Aug-23		
Sample Description	Reddish Soil		
Source	مشون المحمود		
Location	From 3+260 To 3+380	Retest	
Layer	Upper Embankment		
Level		-0.25	
Sample No	Trust/SC/228		
Sampled by	Abdelrahman Gaber		

Moisture Content	Can Ref.				
	Weight of Container	(g)	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1065.0		
	Weight of Water	(g)	29.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	471.0		
	In-Place Water Content	(%)	6.2		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9		

Field Density	Station		3+340			
	Cone Ref.		3			
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4510.0			
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
	Weight of Wet Soil	(g)	4483.0			
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
	Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5470.0			
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0			
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3060.0			
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
	Gross Volume of Hole	(cc)	2053.7			
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.183			
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.056			
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089			
	Degree of Compaction at Field*	(%)	98.4			
	Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab.: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 22-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إشادة الجسر القوي و طرق الدفعة الثالثة على طريق الدوحة / باليس
Client	شركة ترانسك
Testing Date	19-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مستون المحمود
Location	From 3+260 To 3+380
Layer	Upper Embankment
Level	-0.25
Sample No	Trust/SC/214-215
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	974.0		
	Weight of Water	(g)	25.0	24.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	475.0	476.0		
	In-Place Water Content	(%)	5.3	5.0		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9		

Station		3+290	3+340			
Cone Ref.		2	3			
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4210.0	4235.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	4183.0	4208.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5560.0	5415.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2925.0	3115.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	1963.1	2090.6		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.131	2.013		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.024	1.916		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	96.9	91.7		
Acceptance Criterion		(%)	95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien
Date of Report : 20-Aug-23
Form Number : QLab/Soil/07/ver 01

Signature:





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إستاد الجسر الترابي وطريق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكن / بلبيس
Client	شركة ترامت
Testing Date	16-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+120 To 4+200
Layer	Ferna
Level	0.0
Sample No	Trust/SC/199-200
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.					
	Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
Moistur e	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	981.0		
Content	Weight of Water	(g)	24.0	17.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	476.0	483.0		
	In-Place Water Content	(%)	5.0	3.5		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9		

	Station		4+190	4+170		
	Cone Ref.					
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5713.0	5262.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	5686.0	5235.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4549.0	4597.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1429.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3981.0	3974.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2671.8	2667.1		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.128	1.963		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.026	1.896		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089		
Degree of Compaction at Field*	(%)	97.0	90.8			
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 17-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الرئيسي و طرق الخدمة لخط متكا حديد الرويدان / باس
Client	شركة ترامت
Testing Date	16-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشتون المعمود
Location	From 3+920 To 4+080
Layer	Fernh
Level	0.0
Sample No	Trust/SC/195-198
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Cont. Ref.		1		2	
			1	2	1	2
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	971.0	1065.0	975.0
	Weight of Water	(g)	24.0	27.0	29.0	23.0
	Weight of Dry Soil	(g)	476.0	473.0	471.0	477.0
	In-Place Water Content	(%)	5.0	5.7	6.2	4.8
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		4+080	4+030	3+980	3+930	
Cone Ref.		3	4	3	4	
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5342.0	5540.0	4495.0	5025.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	5315.0	5513.0	4468.0	4998.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	4870.0	4662.0	5445.0	4760.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1429.0	1470.0	1429.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3660.0	3909.0	3085.0	3811.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2456.4	2623.5	2070.5	2557.7
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.164	2.101	2.158	1.954
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.060	1.988	2.033	1.864
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089	2.089
	Degree of Compaction at Field*	(%)	98.6	95.2	97.3	89.2
Acceptance Criterion		(%)	95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 17-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القراي و طرق الخدمة للطريق حديد الروبياني / بابيس
Client	شركة تراس
Testing Date	14-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	Natural Ground
Location	From 2+700 To 2+840
Layer	Upper Embankment
Level	1.25
Sample No	Trust/SC/159-160
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2
Weight of Container	(g) 594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g) 1247.0	1136.0
Weight of Container + Dry Soil	(g) 1200.0	1107.0
Weight of Water	(g) 47.0	29.0
Weight of Dry Soil	(g) 606.0	609.0
In-Place Water Content	(%) 7.8	4.8
Optimum Moisture Content	(%) 7.9	7.9

Station	2+850	2+770
Cone Ref.	4	2
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g) 4637.0	5012.0
Weight of Plastic Bag	(g) 27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g) 4610.0	4985.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g) 10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g) 5439.0	4923.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g) 1429.0	1515.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g) 3132.0	3562.0
Bulk Density of Sand	(g/cc) 1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc) 2102.0	2390.6
In-Place Wet density	(g/cc) 2.193	2.085
In-Place Dry density	(g/cc) 2.035	1.990
Max. Dry Density	(g/cc) 2.089	2.089
Degree of Compaction at Field*	(%) 97.4	95.3
Acceptance Criterion	(%) 95.0	

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 15-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة للطريق حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة ترانس
Testing Date	14-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	Natural Ground
Location	From 3+720 To 3+780
Layer	Upper Embankment
Level	-1.00
Sample No	Trust/SC/147
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1
Weight of Container	(g) 594.0
Moisture Weight of Container + Wet Soil	(g) 1131.0
Weight of Container + Dry Soil	(g) 1104.0
Content Weight of Water	(g) 27.0
Weight of Dry Soil	(g) 510.0
In-Place Water Content	(%) 5.3
Optimum Moisture Content	(%) 7.9

Station	3+750
Cone Ref.	1
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g) 5246.0
Weight of Plastic Bag	(g) 27.0
Weight of Wet Soil	(g) 5219.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g) 10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g) 4853.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g) 1429.0
Field Weight of Sand to Fill Hole	(g) 3718.0
Density Bulk Density of Sand	(g/cc) 1.490
Gross Volume of Hole	(cc) 2495.3
In-Place Wet density	(g/cc) 2.092
In-Place Dry density	(g/cc) 1.986
Max. Dry Density	(g/cc) 2.089
Degree of Compaction at Field*	(%) 95.1
Acceptance Criterion	(%) 95.0

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 15-Aug-23

Form Number: QLab/Soll/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القريب و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويكن / بانيس
Client	شركة ترامت
Testing Date	14-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	Natural Ground
Location	From 3+860 To 3+900
Layer	Upper Embankment
Level	-1.00
Sample No	Trust/SC/148
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1
Weight of Container (g)	594.0
Weight of Container + Wet Soil (g)	1214.0
Weight of Container + Dry Soil (g)	1158.0
Weight of Water (g)	56.0
Weight of Dry Soil (g)	564.0
In-Place Water Content (%)	9.9
Optimum Moisture Content (%)	7.9

Station	3+880
Cone Ref.	1
Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	5285.0
Weight of Plastic Bag (g)	27.0
Weight of Wet Soil (g)	5258.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	9000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone (g)	3980.0
Weight of Sand to Fill Cone (g)	1515.0
Weight of Sand to Fill Hole (g)	3505.0
Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490
Gross Volume of Hole (cc)	2352.3
In-Place Wet density (g/cc)	2.235
In-Place Dry density (g/cc)	2.033
Max. Dry Density (g/cc)	2.089
Degree of Compaction at Field* (%)	97.3
Acceptance Criterion (%)	95.0

For Q Lab Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 15-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة للطا سكة حديد الرويكس / بابيس	
Client	شركة ترامت	
Testing Date	21-Aug-23	
Sample Description	Sub Ballast	
Source	كسارة اسكلدية	
Location	From 3+400 To 3+700	
Layer	Sub Ballast	
Level	0.15	
Sample No	Trust/SC/227	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.	1				
Weight of Container	(g)	594.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0			
Weight of Water	(g)	23.0			
Weight of Dry Soil	(g)	477.0			
In-Place Water Content	(%)	4.8			
Optimum Moisture Content	(%)	5.5			

Station	3+430				
Cone Ref.	4				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5770.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	5743.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4935.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3636.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2440.3			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.353			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.245			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.273			
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.8			
Acceptance Criterion	(%)	98.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 22-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الرابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد القويدي / بايوس
Client	شركة ترامت
Testing Date	21-Aug-23
Sample Description	Sub Ballast
Source	مستارة اسفلتية
Location	From 3+400 To 3+700
Layer	Sub Ballast
Level	0.15
Sample No	Trust/SC/222-226
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0	1069.0	975.0	1073.0
Weight of Water	(g)	24.0	23.0	25.0	23.0	21.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0	475.0	477.0	479.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8	5.3	4.8	4.4
Optimum Moisture Content	(%)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

Station		3+680	3+630	3+580	3+530	3+480
Cone Ref.		3	4	4	4	3
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6235.0	5620.0	5420.0	5530.0	5510.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	6208.0	5593.0	5393.0	5503.0	5483.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4635.0	5060.0	5200.0	5075.0	4985.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1429.0	1429.0	1429.0	1470.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3895.0	3511.0	3371.0	3496.0	3545.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2614.1	2356.4	2262.4	2346.3	2379.2
In-Place Wet density	(g/cc)	2.375	2.374	2.384	2.345	2.305
In-Place Dry density	(g/cc)	2.261	2.264	2.265	2.237	2.208
Max. Dry Density	(g/cc)	2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.5	99.6	99.6	98.4	97.1
Acceptance Criterion	(%)	98.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien
Date of Report : 22-Aug-23
Form Number : QLab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / باديس	
Client	شركة نراست	
Testing Date	3-Aug-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	Natural Ground	
Location	From 3+720 To 3+760	3+860 To 3+900
Layer	Lower Embankment	
Level	-1.25	
Sample No		
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		1	2		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1187.0	1248.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1174.0	1209.0	
	Weight of Water	(g)	13.0	39.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	580.0	711.0	
	In-Place Water Content	(%)	2.2	5.5	
Optimum Moisture Content		(%)	7.9	7.9	

Station		3+720 - 3+760	3+860 - 3+900		
Cone Ref.		5	4		
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4682.0	4634.0	
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	
	Weight of Wet Soil	(g)	4655.0	4607.0	
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5450.0	5307.0	
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1136.0	1515.0	
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3414.0	3178.0	
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	
	Gross Volume of Hole	(cc)	2291.3	2132.9	
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.032	2.160	
	In-Place Dry density	(g/cc)	1.987	2.048	
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	
	Degree of Compaction at Field*	(%)	95.1	98.0	
	Acceptance Criterion	(%)	95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 4-Aug-23

Form Number: QLah/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إشياء الجسر القرائي و طرق الخدمة للطبقة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة تراس
Testing Date	23-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشروع المحمود
Location	From 4+080 To 4+120
Layer	Ferma
Level	0.0
Sample No	Trust/SC/259
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1				
Weight of Container	(g)	594.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0			
Weight of Water	(g)	25.0			
Weight of Dry Soil	(g)	475.0			
In-Place Water Content	(%)	5.3			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

Station	4+100				
Cone Ref.	1				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6180.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	6153.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4325.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4239.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2845.0			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.163			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.055			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089			
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.4			
Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 24-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر النجدي و طرق الخدمة للطريق حديد الروبياني / باريس
Client	شركة ترانسيت
Testing Date	23-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 3+740 To 3+760
Layer	Upper Embankment
Level	-0.25
Sample No	Trust/SC/257
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1				
Weight of Container	(g)	594.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0			
Weight of Water	(g)	23.0			
Weight of Dry Soil	(g)	477.0			
In-Place Water Content	(%)	4.8			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

Station	3+750				
Cone Ref.	1				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5595.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	5568.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4710.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3854.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2586.6			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.153			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.054			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089			
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.3			
Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 24-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروماني / بانيس	
Client	شركة ترانسك	
Testing Date	23-Aug-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مشروع المحمود	
Location	From 3+860 To 3+900	
Layer	Upper Embankment	
Level	-0.25	
Sample No	Trust/SC/258	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		U				
Weight of Container	(g)	594.0				
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0				
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1066.0				
Weight of Water	(g)	28.0				
Weight of Dry Soil	(g)	472.0				
In-Place Water Content	(%)	5.9				
Optimum Moisture Content	(%)	7.9				

Station		3+880				
Conc Ref.		1				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6140.0				
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0				
Weight of Wet Soil	(g)	6113.0				
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	9500				
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	3870.0				
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0				
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4194.0				
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490				
Gross Volume of Hole	(cc)	2814.8				
In-Place Wet density	(g/cc)	2.172				
In-Place Dry density	(g/cc)	2.050				
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089				
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.1				
Acceptance Criterion	(%)				95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 24-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لحظ سعة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة ترست
Testing Date	26-Jul-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	Natural Ground
Location	3+920 To 4+060
Layer	Ferma
Level	-0.25
Sample No	Trust/SC/031-33
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1029.0	1127.0	891.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1000.0	1102.0	876.0		
Weight of Water	(g)	29.0	25.0	15.0		
Weight of Dry Soil	(g)	406.0	604.0	282.0		
In-Place Water Content	(%)	7.1	4.1	5.3		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		3+930	4+010	4+060		
Cone Ref.		1	2	1		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5002.0	4959.0	4654.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4975.0	4932.0	4627.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5224.0	5081.0	5282.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1436.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3340.0	3404.0	3282.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2241.6	2284.6	2202.7		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.219	2.159	2.101		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.071	2.073	1.995		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089		
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.2	99.2	95.5		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 27-Jul-23

Form Number: Qlab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القاربي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / بالبيد
Client	شركة ترامت
Testing Date	30-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 3+720 To 3+920
Layer	Ferma
Level	0.0
Sample No	Trust/SC/289-292
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		2		1		2	
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1066.0	970.0	1065.0	971.0		
	Weight of Water	(g)	28.0	28.0	29.0	27.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	472.0	472.0	471.0	473.0		
	In-Place Water Content	(%)	5.9	5.9	6.2	5.7		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9		

Station		3+740	3+790	3+840	3+890	
Cone Ref.		1	2	4	2	
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5144.0	4697.0	5118.0	4370.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	5117.0	4670.0	5091.0	4343.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5044.0	5295.0	5045.0	5528.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1515.0	1429.0	1515.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3527.0	3190.0	3526.0	2957.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2367.1	2140.9	2366.4	1984.6
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.162	2.181	2.151	2.188
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.041	2.059	2.027	2.070
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089	2.089
	Degree of Compaction at Field*	(%)	97.7	98.6	97.0	99.1
	Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 31-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر البري و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / بابي
Client	شركة قراحت
Testing Date	25-Jul-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	Natural Ground
Location	3+760 TO 3+720
Layer	Upper Embankment
Level	-1.5
Sample No	Trust/SC/014
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Moisture Content	Can Ref.		2
	Weight of Container	(g)	594.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	837.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	826.0
	Weight of Water	(g)	11.0
	Weight of Dry Soil	(g)	232.0
	In-Place Water Content	(%)	4.7
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9

Field Density	Station		3+740
	Cone Ref.		2
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4932.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	4905.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5105.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3380.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2268.5
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.162
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.064
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.170
	Degree of Compaction at Field*	(%)	95.1
	Acceptance Criterion	(%)	95.0

For Q Lab

Eng. Abdollah Hussien

Signature:

Date of Report

26 Jul 23

Form Number

QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القناري وطريق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / باديس
Client	شركة لرأست
Testing Date	25-Jul-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	Natural Ground
Location	3+860 To 3+900
Layer	Upper Embankment
Level	-1.5
Sample No	Trust/SC/015
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Moisture Content	Can Ref.		3
	Weight of Container	(g)	498.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	889.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	872.0
	Weight of Water	(g)	17.0
	Weight of Dry Soil	(g)	374.0
	In-Place Water Content	(%)	4.5
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9

	Station	3+860
	Cone Ref.	3
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	5483.0
	Weight of Plastic Bag (g)	27.0
	Weight of Wet Soil (g)	5456.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone (g)	4940.0
	Weight of Sand to Fill Cone (g)	1470.0
	Weight of Sand to Fill Hole (g)	3590.0
	Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490
	Gross Volume of Hole (cc)	2409.4
	In-Place Wet density (g/cc)	2.264
	In-Place Dry density (g/cc)	2.166
	Max. Dry Density (g/cc)	2.170
	Degree of Compaction at Field* (%)	99.8
	Acceptance Criterion (%)	95.0

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 26-Jul-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / باريس
Client	شركة ترانس
Testing Date	26-Jul-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	Natural Ground
Location	3+920 To 4+060
Layer	Ferma
Level	-0.25
Sample No	Trust/SC/031-33
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Moisture Content	Can Ref.		1				
			1	1	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1029.0	1127.0	891.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1000.0	1102.0	876.0			
Weight of Water	(g)	29.0	25.0	15.0			
Weight of Dry Soil	(g)	406.0	604.0	282.0			
In-Place Water Content	(%)	7.1	4.1	5.3			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9			

Field Density	Station	Cone Ref.	3+930			4+010			4+060				
			1	2	3	1	2	3	1	2	3		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5002.0	4959.0	4654.0									
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0									
Weight of Wet Soil	(g)	4975.0	4932.0	4627.0									
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000									
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5224.0	5081.0	5282.0									
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1436.0									
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3340.0	3404.0	3282.0									
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490									
Gross Volume of Hole	(cc)	2741.6	2284.6	2202.7									
In-Place Wet density	(g/cc)	2.219	2.159	2.101									
In-Place Dry density	(g/cc)	2.071	2.073	1.995									
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089									
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.2	99.2	95.5									
Acceptance Criterion	(%)			95.0									

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 27-Jul-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لسطح حديد الروبياني / بانيس	
Client	شركة ترانست	
Testing Date	19-Aug-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مطون المحمود	
Location	3+930	Retest
Layer	Ferma	
Level	0.0	
Sample No	Trust/SC/217	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		1			
Weight of Container	(g)	594.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0			
Weight of Water	(g)	19.0			
Weight of Dry Soil	(g)	481.0			
In-Place Water Content	(%)	4.0			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

Station		3+930			
Cone Ref.		4			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5215.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	5188.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4825.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3746.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2514.1			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.064			
In-Place Dry density	(g/cc)	1.985			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089			
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.0			
Acceptance Criterion	(%)		95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 20-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة للطريق حديد الرويني / بابيس
Client	شركة تراسات
Testing Date	23-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 3+260 To 3+360
Layer	Ferma
Level	0.0
Sample No	Trust/SC/255-256
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	970.0		
Weight of Water	(g)	21.0	28.0		
Weight of Dry Soil	(g)	479.0	472.0		
In-Place Water Content	(%)	4.4	5.9		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9		

Station	3+240	3+280			
Cone Ref.	5	1			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5555.0	5400.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	5528.0	5373.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4720.0	4890.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1348.0	1436.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3932.0	3674.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2638.9	2465.8		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.095	2.179		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.007	2.057		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089		
Degree of Compaction at Field*	(%)	96.1	98.5		
Acceptance Criterion	(%)		95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 24-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة تراس
Testing Date	4-Sep-23
Sample Description	Crushed stones
Source	By Client
Location	From 3+260 To 3+340
Layer	Sub Ballast
Level	0.15
Sample No	Trust/SC/332-333
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1079.0	980.0			
Weight of Water	(g)	15.0	18.0			
Weight of Dry Soil	(g)	485.0	482.0			
In-Place Water Content	(%)	3.1	3.7			
Optimum Moisture Content	(%)	5.5	5.5			

Station		3+270	3-320			
Cone Ref.		2	3			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5310.0	4340.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	5283.0	4313.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4975.0	5765.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3510.0	2765.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2355.7	1855.7			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.243	2.324			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.175	2.241			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.273	2.273			
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.7	98.6			
Acceptance Criterion	(%)	98.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 5-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة ترامت
Testing Date	31-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مخزون المحمود
Location	From 2+700 To 2+840
Layer	Upper Embankment
Level	-0.75
Sample No	Trust/SC/306-307
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	973.0		
Weight of Water	(g)	25.0	25.0		
Weight of Dry Soil	(g)	475.0	475.0		
In-Place Water Content	(%)	5.3	5.3		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9		

Station	2+750	2+800			
Cone Ref.	2	2			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4790.0	4815.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4763.0	4788.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5100.0	5090.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1515.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3385.0	3395.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2271.8	2278.5		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.097	2.101		
In-Place Dry density	(g/cc)	1.992	1.996		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089		
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.3	95.6		
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 1-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد القرويين / بناس	
Client	شركة ترانسيت	
Testing Date	23-Aug-23	
Sample Description	Crushed stones	
Source	By client	
Location	3+480	Retest
Layer	Sub Ballast	
Level	0.15	
Sample No	Trust/SC/229	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		1			
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1076.0		
	Weight of Water	(g)	18.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	482.0		
	In-Place Water Content	(%)	3.7		
	Optimum Moisture Content	(%)	5.5		

Station		3+480			
Cone Ref.		1			
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5430.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	5403.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5080.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3484.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2338.3		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.311		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.228		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.270		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	98.1		
	Acceptance Criterion	(%)		98.0	

For Q Lab

Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report

24-Aug-23

Form Number

QI 50/Soil/07/ver.01

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط مسكة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة ترامت
Testing Date	16-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+120 To 4+200
Layer	Ferma
Level	0.0
Sample No	Trust/SC/199-200
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	981.0			
Weight of Water	(g)	24.0	17.0			
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	483.0			
In-Place Water Content	(%)	5.0	3.5			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		4+190	4+140			
Cone Ref.		3	4			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5713.0	5262.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	5686.0	5235.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4549.0	4597.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1429.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3981.0	3974.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2671.8	2667.1			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.128	1.963			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.026	1.896			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089			
Degree of Compaction at Field*	(%)	97.0	90.8			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 17-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة للطريق حديد الرويني / باليس	
Client	شركة تراميت	
Testing Date	19-Aug-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مشروع المجدود	
Location	4+140	Retest
Layer	Ferma	
Level	0.0	
Sample No	Trust/SC/218	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		1				
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0			
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0			
	Weight of Water	(g)	24.0			
	Weight of Dry Soil	(g)	476.0			
	In-Place Water Content	(%)	5.0			
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

Station		4+140				
Cone Ref.		4				
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5260.0			
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
	Weight of Wet Soil	(g)	5233.0			
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4970.0			
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0			
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3601.0			
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
	Gross Volume of Hole	(cc)	2416.8			
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.165			
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.061			
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089			
	Degree of Compaction at Field*	(%)	98.7			
Acceptance Criterion		(%)			95.0	

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 20-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الزيباني / جاليس
Client	شركة ترانس
Testing Date	19-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مخزون المحمود
Location	From 3+860 To 3+900
Layer	Upper Embankment
Level	-0.75
Sample No	Trust/SC/216
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1				
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0			
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1059.0			
	Weight of Water	(g)	35.0			
	Weight of Dry Soil	(g)	465.0			
	In-Place Water Content	(%)	7.5			
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

Station		3+880				
Cone Ref.		2				
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6182.0			
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
	Weight of Wet Soil	(g)	6155.0			
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4337.0			
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0			
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4148.0			
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1490			
	Gross Volume of Hole	(cc)	2783.9			
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.211			
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.056			
	Max Dry Density	(g/cc)	2.089			
	Degree of Compaction at Field*	(%)	98.4			
Acceptance Criterion		(%)		95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 20-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / بناس
Client	شركة تراس
Testing Date	19-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 3+720 To 3+780
Layer	Upper Embankment
Level	-0.75
Sample No	Trust/SC/213
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1				
Weight of Container	(g)	594.0				
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0				
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1065.0				
Weight of Water	(g)	29.0				
Weight of Dry Soil	(g)	471.0				
In-Place Water Content	(%)	6.2				
Optimum Moisture Content	(%)	7.9				

Station		3+750				
Cone Ref.		2				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4867.0				
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0				
Weight of Wet Soil	(g)	4840.0				
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000				
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5172.0				
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0				
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3313.0				
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490				
Gross Volume of Hole	(cc)	2223.5				
In-Place Wet density	(g/cc)	2.177				
In-Place Dry density	(g/cc)	2.051				
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089				
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.2				
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 20-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروماني / باريس
Client	شركة ترانس
Testing Date	21-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المنجود
Location	From 3+860 To 3+900
Layer	Upper Embankment
Level	-0.5
Sample No	Trust/SC/221
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref					
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0		
	Weight of Water	(g)	25.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	475.0		
	In-Place Water Content	(%)	5.3		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9		

Station					
3+880					
Cone Ref.					
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4785.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	4758.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5270.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3301.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2215.4		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.148		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.040		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.089		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	97.7		
	Acceptance Criterion	(%)	95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 22-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver 01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة ترانس
Testing Date	21-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مخزون المحمود
Location	From 3+720 To 3+780
Layer	Upper Embankment
Level	-0.5
Sample No	Trust/SC/220
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1				
Weight of Container	(g)	594.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1064.0			
Weight of Water	(g)	30.0			
Weight of Dry Soil	(g)	470.0			
In-Place Water Content	(%)	6.4			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

Station	3+750				
Cone Ref.	3				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6480.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	6453.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4120.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4410.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2959.7			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.180			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.049			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089			
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.1			
Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 22-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel: 01025800673


Website: www.qlabrg.com

e-mail: info@qlabrg.com

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis - ASTM D6913

Project	إعداد القسم الثاني وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروشدي / باس	Sample weight (gm):	7001
Client	TRUST		
Sampling Date	13-Jul-23		
Sample Description	Reddis Gravelly Sand Soil		
Source	تربة طبيعية محسنة بامسية (2 تربة الى 1 رمل)		
Location	مشروع المحمود		
Level	-		
Sample No	TRUST/SIV/02		
Sampled by	Abdelrahman Gaber		

Sieve	Opening (mm)	% Retained	% Passing
3 in	75	0.0	100.0
2 in.	50	0.0	100.0
1.5 in.	37.5	0.0	100.0
1 in.	25	1.1	98.9
3/4 in.	19	3.8	96.2
1/2 in.	12.5	9.1	90.9
3/8 in.	9.5	13.5	86.5
No.4	4.75	24.4	75.6
No.10	2	38.0	62.0
No.40	0.425	69.7	30.3
No.200	0.075	89.4	10.6

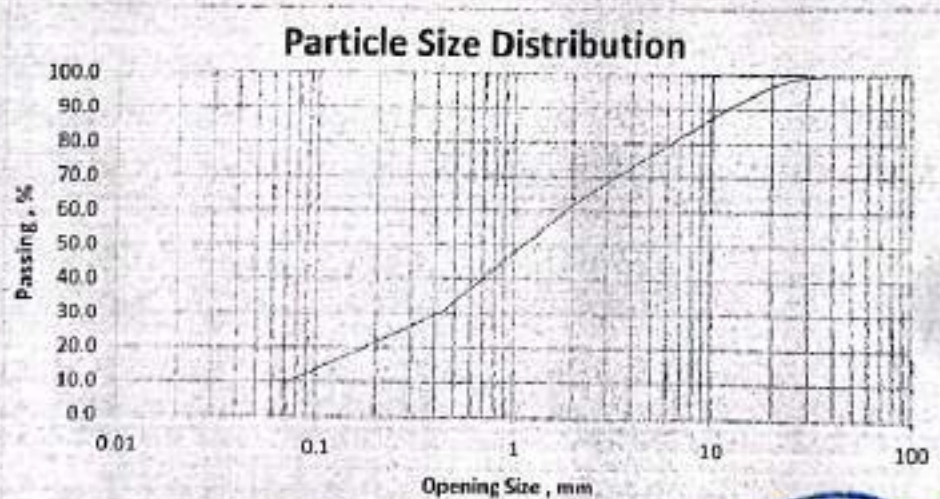

For QLab: Eng. Abdallah Hussien
Date of Report: 18-Jul-23
Form Number: QLab/Soil/01/ver.01



Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils - ASTM D4318


Project	إعداد الجسر القوي و طرق الخدمة لخط سكة حديد القوي / باريس
Client	TRUST
Sampling Date	13-Jul-23
Sample Description	Reddis Gravelly Sand Soil
Source	ثربة طبيعية محملة بكمية (2 ثربة الى 1 رمل)
Location	مشون المعبود
Level	.
Sample No	TRUST/PI/02
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Plastic Limit :

Container No.	QL-PL/01	QL-PL/02	QL-PL/03	Average
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	25.87	25.61	25.68	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	23.98	23.79	23.79	
Mass of Container , M_3 (g)	16.76	15.32	16.20	
Water Content, w, (%)	26.2	21.5	24.9	24.2

Liquid Limit :

Container No.	QL-LL/01	QL-LL/02	QL-LL/03	LL
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	35.48	36.74	36.59	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	32.80	32.80	31.60	
Mass of Container , M_3 (g)	17.55	17.19	16.75	
Water Content, w, (%)	17.6	25.2	33.6	25.5
Number of Blows, N	31	24	20	25.0

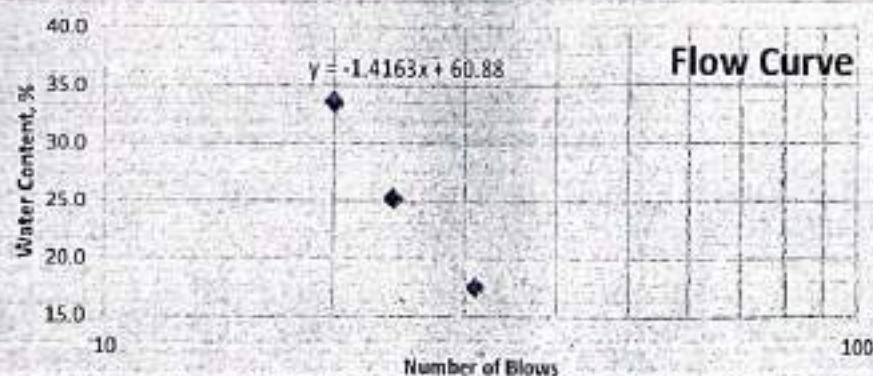

Plasticity Index = L.L - P.L = 1.3 %

For QLab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 18-Jul-23

Form Number : QLab/Soil/02/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website : www qlabeg.com

e-mail : info@qlabeg.com

AASHTO Classification - M 145

Project	إدارة العمران و طرق الخدمة لخط سكة حديد البرونزي / نابجا	
Client	TRUST	
Sampling Date	13-Jul-23	
Sample Description	Reddis Gravelly Sand Soil	
Source	ثربة طبيعية محملته بنسبة (2 ثرية الي 1 رمل)	
Location	مشون المحمود	
Level	-	
Sample No	TRUST/CLA/02	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

General Classification	Granular Materials							Silty Clay Materials			
Group Classification	A - 1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				
Percent Passing, %											
2 mm	50 max	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
0.425 mm	30 max	50 max	51 min	---	---	---	---	---	---	---	---
0.075 mm	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min
Atterberg Limits											
Liquid Limit, %	---	---	---	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min
Plasticity Index, %	6 max	6 max	N.P.	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	11 min
Usual Types	Stone fragments gravel and sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel Sand				Silty Soils		Clayey Soils	
Rating as Subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor			

Test	Result	AASHTO Classification
2 mm	62.00	A-1-b
0.425 mm	30.3	
0.075 mm	10.6	
Liquid Limit, %	25.5	
Plasticity Index, %	1.3	

For Qlap : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 18-Jul-23

Form Number : QLab/Soil/03a/ver.01



Moisture Density Relationship Of Soil ASTM D 1557

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / بابيس	
Client	TRUST	
Sampling Date	13-Jul-23	
Sample Description	Reddis Gravelly Sand Soil	
Source	تربة طبيعية محسنة بآسبة (2 تربة الي 1 رمل)	
Location	مشون المحمود	
Level	-	
Sample No	TRUST/Pr/002	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Wet Unit Weight, gm/cm ³	1.910	2.105	2.251	2.233	1.989
Water Content, %	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
Dry Unit Weight, gm/cm ³	1.837	1.986	2.084	2.030	1.776






Fig. 1. Division of Circle into Four Quadrants for 15.0 & 10.0 mm

Fig. 2. Division of Circle into Eight Segments for 15.0 & 10.0 mm

Optimum Water Content (Mod- w_{opt}) %	8.5
Optimum Dry Unit Weight (Mod- γ_{dmax}) gm/cm ³	2.089


For Qlap : Eng. Abdallah Hussien
Date of Report : 18-Jul-23
Form Number : QLab/Soil/01/ver.01

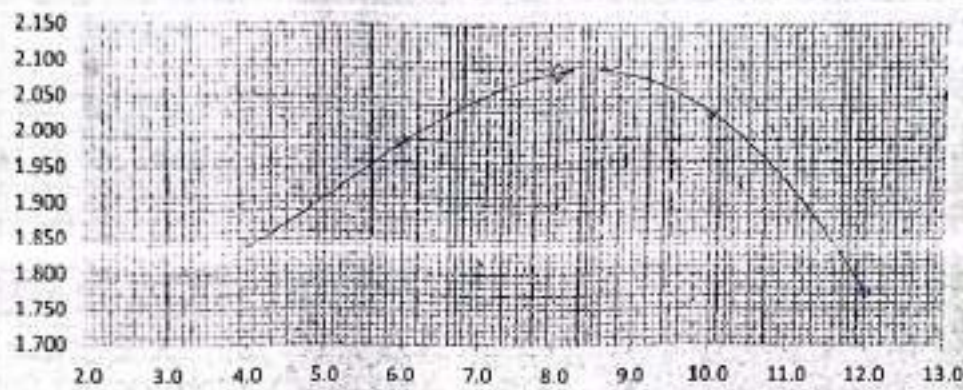

California Bearing Ratio - ASTM D1883

Project	إنشاء الجسر القراي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بابيس	ASSHTO Classification:
Client	TRUST	A-I-b
Sampling Date	13-Jul-23	MDD: 2.089
Sample Description	ترية طبيعية محسنة بنسبة ١ : ٢	OMC: 8.5
Source	محجر المحمود	
Location	-	
Level	-	
Sample No	TRUST/CBR/002	
Sampled by	Abdelrahman Mohamed	

Penetration		Dial Reading	Load		Stress
inch	mm		kN	lb	
0.000	0.00	0	0.00	0.0	0
0.025	0.64	94	0.92	206.80	69
0.050	1.27	193	1.89	424.6	142
0.075	1.91	287	2.81	631.40	210
0.100	2.54	386	3.78	849.2	283
0.125	3.18	484	4.75	1064.80	355
0.150	3.81	576	5.65	1267.2	422
0.175	4.45	704	6.90	1548.80	516
0.200	5.08	810	7.94	1782.0	594
0.300	7.62	1135	11.13	2497.00	832
0.400	10.16	1196	11.73	2631.2	877
0.500	12.70	1244	12.20	2736.80	912

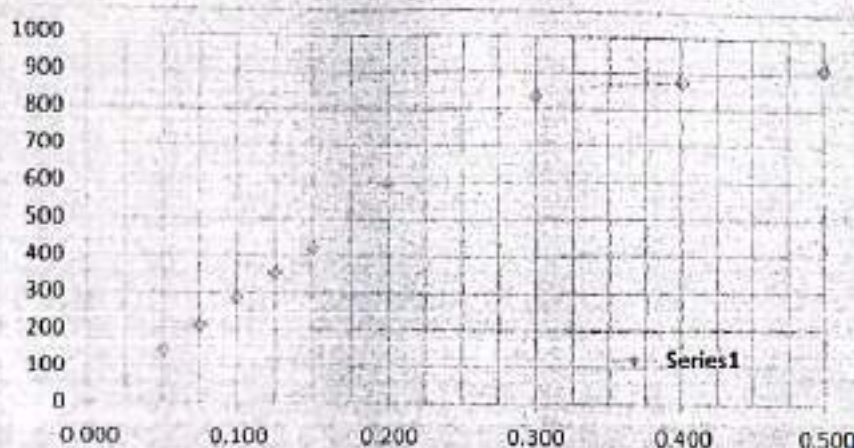

CBR	Value, %
@100% MDD	
0.1 inch	28.3
0.2 inch	39.6
Swelling	0

For QI-ap Abdallah Hussien

Date of Report : 21-Jul-23

Form Number: QLab/Soil/01/ver.01

Signature:

