



مشروع أعمال الجسر الترابي والاتصال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بابيس)
المقاييس المعدلة لبيوتة الاتصال لتأدية شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسن للمقاولات العامة والتوريدات
القطاع من المنطقة (٤٤٢٠٠) الي المنطقة (٤٤٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ٤٠٠٠ م بكلفة ٢٠ مليون

م	البيان	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
بيوتة سواك تنفيذها طبقا لقيمة يناير ٢٠٢٣ و زيادة الحكومة (٢٠٢٣/٣/٦) وزيادة السواك (٢٠٢٣/٤/٦)					
١	أعمال الإنشاء والتشطيب				
١-١	بالمتر المكعب أصل تكبير و إزالة الديكورات الخرسانية عادية أو مملحة أو أرضية أو ديش مع نقل ناتج التكبير خارج الموقع للتدوير المعمورة طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. و الفئة شاملة مما جمعة بالمتر المكعب لمسافة نقل حتى ٣٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل م في حالة الزيادة والنقصان.	م ^٣	٥٣,٥٧	٨٢,٠٠	٤٣٩٢,٧٤
٢-١	بالمتر المكعب أصل إزالة المخططات بجميع أنواعها البناء والقرش والمواد العضوية و..... و تسليم موقع خلى ونظير طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة أصل نقل المخططات خارج الموقع على مسافة لا تقل عن ١٠٠ م و يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل م في حالة الزيادة والنقصان. وتلك المسافة ٥٠٠ م.	م ^٣	١٠,١	١٧,٠٠	٠,١٧
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة				
	يتم احتساب علاوة ٢ جنيه لم ٢ لكل ٥ متر عمق وتلك تشمل إنشاء منقذات ومطامير وملازم				
٣-١	بالمتر المصطح إزالة وقطع المزروعات المتعارضة مع المصارف والتي لا يمكن لها التنفيذ بالمعدات الميكانيكية بسعة ٥ سم والبند يشمل لتطهير وإزالة الجذور وطين الحفر والتسوية مع نقل الممتلكات للمقالب العمومية وكل ما يلزم طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٠,٠١	٦,١٠	٠,٠٦
	وتلك لمسافة نقل ١ كم مع احتساب علاوة ٠,٥٢٥ جنيه لكل ١ كم في حالة الزيادة والنقصان				
٤-١	بالعدد إزالة أشجار من مسار الطريق والتخلص منها على أن لا يقل قطر الأشجار عن ٣٠ سم شمل الشتل بارفاج لا يقل عن ٤ متر طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	العدد			
٤-١-١	الأشجار لا يقل قطرها عن ٢٠ سم	١	١	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠
٤-١-٢	لخليل بارفاج لا يقل عن ٤ متر	١	١	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٥-١	القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشارى العام للمشروع وطبقا لملاحق ١ الخصائص الفنية لجسر السكة ومادة التزييل في كراسة الشروط والموصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	العدد	٣٥	٢,٧٥٠	٩٦,٢٥٠

شركة أحمد عبد الرحمن
مقاولات العامة والتوريدات



مشروع أعمال الجسر الثرابي والاتصال الصناعية لخط السكة الحديد (التروبيكي - العنابر من بيشان - بنيس)
المقايمة المعدلة لبيانات الاتصال لتأدية شركة أحمد عبد الرحمن منصور حسين للمقاولات العامة والتوريدات
القطاع من المنطقة (٤٢٢٠٠) في المنطقة (٨١٢٠٠) اتجاه التروبيكي بطول ٤٠٠٠ م بمساحة ٢٠ مليون

م	البيانات	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٢	أعمال الحفر				
٢-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاطع والمناسيب الموضحة بالرسمات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الخيز صالغ أو نقل التربة الصالحة الرائدة في المشاور التي تحددها الهيئة لأعمال تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والأرصفة لمواكب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للمقاطع التصميمية العرضية والتوجيه والقطاع الطولي والرسمات التفصيلية المعتمدة والقراس طبقاً لأبعاد الرسمات وكل ما يلزم لظهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م			
	وفي حالة زيادة مساحة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة				
	يتم احتساب علاوة ٢ جنيه لكل ٣ متر عمق وذلك يشمل إنشاء مدقات ومطامع ومنزل				
	عمق ٥ متر				
	عمق ١٠ متر				
			١٥٦,٣٨٧,٠٠	٢٣,٦٠	٣,٦٩٠,٧٣٣,٢٠
			٠,٠١	٢٥,٦٠	٠,٢٦
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية (استخدام القلويزر) بالمقيد المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للتأسيس أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقاً لما ورد بتقرير التربة وحسب الأبعاد والمقاطع والمناسيب الموضحة بالرسمات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الخيز صالغ أو نقل التربة الصالحة الرائدة في المشاور التي تحددها الهيئة لأعمال تشغيلها وذلك لمسافة ٥٠٠ م مع التسوية والأرصفة لمواكب الحفر وتشغيل قاع الحفر طبقاً للمقاطع التصميمية العرضية والتوجيه والقطاع الطولي والرسمات التفصيلية المعتمدة والقراس طبقاً لأبعاد الرسمات وكل ما يلزم لظهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م			
	وفي حالة زيادة مساحة النقل عن ٥٠٠ م يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زيادة				
	يتم احتساب علاوة ٢ جنيه لكل ٣ متر عمق وذلك يشمل إنشاء مدقات ومطامع ومنزل				
	عمق حتي ٥ متر				
	عمق حتي ١٠ متر				
			٢٥٠,٧٠٢,٠٠	٢٦,٧٠	٦,٦٩٣,٧٤٣,٤٠٠
			٨٤,٢٠٠,٠٠	٢٨,٧٠	٢,٤١٦,٥٤٠,٠٠
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة قبول الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد تربة مطيئة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة حمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والسك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة للجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والمقاطع العرضية التوجيهية والرسمات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مساحة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٠٥ جنيه لكلومتر زيادة أ- ذات الجهد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم /سم ٢ ب- ذات الجهد (٢٠٠ - ٢٥٠) كجم /سم ٢ ج- ذات الجهد (٢٥٠ - ٣٠٠) كجم /سم ٢ د- ذات الجهد اعلى من ٣٠٠ كجم /سم ٢	٣م			
			٠,٠١	٦١,٧٠	٠,٦٢
			٠,٠١	٧١,٩٠	٠,٧٢
			٠,٠١	٨٤,٣٠	١
			٠,٠١	٩٨,٩٠	٠,٩٩

مختص

شركة أحمد عبد الرحمن



مشروع أعمال الجسر الترابي والاتصال الصناعية لمطبعة النبعة (الزويكي - العنبر من رمضان - بابون)
 المظلة: المظلة: لنموذج الاتصال للنموذج شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات
 القطاع من المظلة (٤٠٢٠٠) إلى المظلة (٤٠٢٠٠) اتجاه الزويكي بطول ٤٠٠٠ م بكثافة ٢٠ مليون

م	الرمز	الوحدة	الكمية	المبلغ	الاجملي
٢	أعمال الردم				
١-٢	بالمتر المكعب أعمال استخدام ناتج الحفر في أعمال الردم والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التصويبه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على أن تكون نسبة الحمل كاليفورنيا طبقا للهيئة القومية لسكة الحديد مصر) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالمخراسات للوصول إلى كثافته جافة لا تقل عن ٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى ويتم تنفيذ طبقا للمواصفات التصميمية والمطابقة للمواصفات والمواصفات الخاصة بتسليط الخرسانة بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٠,٠١	٣٤,٠٠٠	٠,٣٤
	السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة ، على أن يتم سداد القيمة للشركة المصرية للتأمين وإدارة واستغلال الحامير والملاحات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر.				
	- معادلة النقل حتى ٢ كم				
	يتم احتساب علاوة ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة				
	في حالة وجود منقعات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنية على مسافة ١٢ كم في المنقوع وعند التغير في طول المنقوع يتم احتسابها نسبة وتلف				
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الزمك عن ٩٥ ٪ بحسب زيادة ١ جنية على كل ١ ٪				
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات التصويبه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمكك الجيد بالمخراسات للوصول إلى كثافته جافة لا تقل عن ٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى ويتم تنفيذ طبقا للمواصفات التصميمية والمطابقة للمواصفات والمواصفات الخاصة بتسليط الخرسانة بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعة والشروط و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	٣م			
	- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة مع قيام الشركة المنفذة بتوفير ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.				
	- مسافة النقل حتى ٢ كم				
	- يتم تشغيل الردم المطوية بمساحة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الآلات التصويبه بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم				
	- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع القوامة - باستخدام الآلات التصويبه بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم				
	- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - على طبقات باستخدام الآلات التصويبه بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم				
	(على ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ ٪) للجزء القوام				
	(على ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ ٪) للجزء العلوي				
	(على ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ ٪) للجزء السفلي				
	يتم احتساب علاوة ١,٤٥ جنية لكل ١ كم زيادة و ذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم				
	في حالة وجود منقعات في مسافات النقل يتم إضافة ٣ جنية على مسافة ١٢ كم في المنقوع وعند التغير في طول المنقوع يتم احتسابها نسبة وتلف				
	يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام البلوز في التجميع للأرض المتناكسة و ذلك طبقا لتحويل التربة .				
	في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة التمسك عن ٩٥ ٪ بحسب زيادة ١ جنية على كل ١ ٪				
٣-٤	بالمتر المربع أعمال تشغيل الأرض الطبيعية بسلك ٣٠ سم - في حالة سلك الردم أو الحفر لا يزيد عن ٢٠ سم - عندما لا يوجد اختلاف في منسوب التأسيس والأرض الطبيعية والاتصال بالشمل لتشغيل التربة مع التمسك الجيد للوصول إلى كثافته جافة لا تقل عن ٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى والقيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع كل ٥٠ متر طولي لتحديد معيار المرونة بعد التشغيل وكل ما يلزم لهر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥٠٠,٠٠٠
٤-٣	بالطن أعمال توريد وإضافة إسمنت مطابق للشروط ومواصفات وينتج بالمطبعة المقررة والاختلاف التصميمية والبناء شمل كل ما يلزم لهر العمل طبقا لاصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	بالطن	٠,٠١	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢٣,٠٠٠

أحمد

الشركة أحمد عبد الرحمن
 ٢٠٢٠
 ٢٠٢٠



٢	البيان	الوحدة	الكمية	الوقت	المصدر
١	أصل الرسومات والتفاصيل و الحماية من انظار السور				
١-١	بالمتر المسطح أصل توريد وجب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لإرتفاع ١٠ متر رئيسي لحماية الإنكشاف والسور العالية لتكون من ٣٠.٨ من تولجيت مترج ٣٠.١٥ رمل حرق ١٨٠٠+ كم سمكت بور تاندي عادي والإصطفاة خلفا لتطبيقات الاستلاري (غير + سبكا) على ان يكون السن لطيف ومضول والريل على من الثواب والطفه والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناديب التربة الطبيعية أصل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٦٥٠ كجم/سم ^٢ وتطليب السطح وبله القواصل باليد من العمل والتفتد خلفا لاصول الصناعة والرمومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملكه طبقا لوصافات الجهة العامة لشرف والكاري وتطبيقات المهندس المشرف	٣٠	١٨٠٠	٣٠	١٨٠٠
	بالم اصنافه خلاوة قمر ٥ حده بعد اول ١٠ متر رئيسي على ان تصنف لكل مسطح (الابل عن ٥ متر رئيسي)				
٢-١	بالمتر المكعب أصل توريد وجب خرسانة عالية لتقيد قبة سطحية وطرية للإنكشاف والسور الجشبة تكون من ٣٠.٨ من تولجيت مترج ٣٠.١٥ رمل حرق ١٨٠٠+ كم سمكت بور تاندي عادي والإصطفاة خلفا لتطبيقات الاستلاري (غير + سبكا) على ان يكون السن لطيف ومضول والريل على من الثواب والطفه والاملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناديب التربة الطبيعية أصل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٦٥٠ كجم/سم ^٢ وتطليب السطح والتفتد خلفا لاصول الصناعة والرمومات التفصيلية والبند يجمع مشتملكه وتطبيقات المهندس المشرف	٣٠	١٨٠٠	٣٠	١٨٠٠
٣-١	بالمتر المكعب توريد خرسانة عالية أصل القواعد المسلحة للامساكنات لتكون من ٣٠.٨ من تولجيت مترج ٣٠.١٥ رمل حرق ١٥٠٠+ كم سمكت بور تاندي عادي على ان يكون السن والريل لطيف وعلى من الطفه والاملاح والمواد الغريبة وبمختلف الارتفاعات وفي أي مكان وانحت أي ظروف في منطقة العمل والبند يشمل تجهيز واستعمال السطح مع فرش والبند أصل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية طبقا لرمومات المعتمدة على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٦٠٠ كجم/سم ^٢ والتفتد بما يجنبه طبقا للوحات المعتمدة وكل ما يلزم لجر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والوصافات وفيما تكملة لقراسة الشروط والوصافات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتطبيقات المهندس المشرف	٣٠	١٥٠٠	٣٠	١٥٠٠
٤-١	بالمتر المكعب أصل تقيد خرسانة مسلحة حوائط مسكنة مع استخدام اسمنت بور تاندي عادي وبمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ السطح لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لجر العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والوصافات وفيما تكملة لقراسة الشروط والوصافات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتطبيقات المهندس المشرف	٣٠	١٥٠٠	٣٠	١٥٠٠

[Signature]



مشروع أعمال الجسر القرائي والاتصال الصناعية لمط السكة الحديد (الروسي - العاشر من رمضان - باريس)
 المباشرة: الهيئة العامة للإسكان شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات
 القطاع من المحطة (١١٢٠٠) في المحطة (٨١٢٠٠) اتجاه الروسي بطول ١٠٠٠ م بارتفاع ٢٠ مليون

م	البيان	الوحدة	الكمية	القيمة	الأجمالي
٥-١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مزيج مواسير مدفونة التجهيز قطر داخلي ٢٢٢ (إرنه ١١) لتسليح مدحج من إنتاج شركة ميجوريت كز ما يمثلها من الخرسانة المسلحة بأجود ٢٠٠ كجم / سم ٢ بنسبة خلط (٢٥٠ كجم اسمنت مقوم لكثافات + ٠,٨ م ٢ زلط + ٢٠,١ م ٢ رمل) مع تدعيم نهايات المدحج بخرق من الحديد مع عزل التوصلات بالخرق المقطون مع ازال المواسير لمواقع تركيبها بحيث لا يحدث شروخ لها أو كسور وسيتم رفع أو استبعاد أي مضرورة يحدث لها شروخ أو كسور مع تقديم نوتة حسابية وملحق مواصفاتها وارتفاعه شاملة أعمال الحفر حتى منسوب التصميمي ونزاح المياه وعمل المدود والقفة غير شاملة الردم بالرمل حول وأعلى المواسير ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة الموافقة والبند لا يشمل الجلب والتنفيذ مما جود به طبقا لدرجات المعتمدة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر.	مط			
	أ. قطر ١ متر		٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠
	ب. قطر ١,٥ متر		٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠
	ج. قطر ٢ متر		٠,٠١	٠,٠٠	٠,٠٠
	د. قطر ٢,٥ متر		٠,٠١	٢٠,٥٤٥,٥٢	٢٠,٥٤٦
٦-١	بالطن توريد حديد تسليح (٤٠/٦٠) لزود جميع العناصر الانشائية والسور يشمل التقطيع والتشكيل ونقل وتركيب وعمل التوصلات التي لم ترد في الرسومات والتنفيذ مما جود به طبقا لدرجات المعتمدة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقا لكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الخامس) وتعليمات المهندسين المشرف	لطن	٠,٠١	٤٥,٠٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠
٧-١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C لتعمل ضغط ٦ بار والقفة تشمل توريد جميع الإكسسوارات لجميع المواسير وضبط البول والمواد اللاصقة ورفع الكترانات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرف	مط			
	١ بوصة		٠,٠١	٣٢٥,٠٠	٣,٢٥
	١,٥ بوصة		٠,٠١	٤٢٥,٠٠	٤,٢٥
٨	أعمال طبقات الأسفلت لسكة الحديد				
٩-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة أساس سكة (Subballast) من الأحجار الصلبة المقترحة من نتائج تكمير الدراسات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية لسكة الحديد والقسم حجم الحبيبات ما بين ٢١,٥ مم إلى ٥٠ مم و الأ يزيد نسبة الماء من مائيل ٢٠٠ عن ٥ ٪ و التخرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كاتنورييا لا تقل عن ٨٠ ٪ ولا يقل معدل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاسكال ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز أوس الجولوس عن ٣٠ ٪ ولا يزيد الانكماش عن ١٠ ٪ والقفة تشمل أعمال الفرش الخلط الجيد وإضافة المياه المطلوبة للوصول إلى الخلطة المنجاسة ذات التخرج الذي يحقق المواصفات والشك على طبقات حتى الوصول للتدعيم التصميمية والانحدارات والقطاعات الطولية والعرضية باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن ٩٨ ٪ من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقا لكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندسين المشرف مسافة النقل ٦٠ كم -السور لا يشمل قيمة المادة المحجزة وعلى الشركة المتفاد تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن السحفر -القيام بتجريب (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل ٥٠ متر طولي	م ٣	٤,٦٦٥,٤٠٤	٩٨٠,٠٠	٦,١٩٤,٣١٣,١٢
	يتم احتساب عملاء ١,٢٥ حبة لكل ١ كم زيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ حبة لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم.				

م. ط. ح. ح.



مشروع أعمال الجسر الثنائي والاعمال الصناعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العنبر من بيشان - بابيس)
 المقايمة المعلقة لبيد الاعمال تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للتقانات العامة والتوريدات
 القطاع من المنطقة (١١٢٠٠) في المنطقة (٨١٢٠٠) اتجاه الروبيكي بطول ١٠٠٠ م بكثافة ٦٠ مليون

م	البنية	الوحدة	الكمية	القيمة	الأجمالي
٦	أعمال الطرق				
١-٦	بالمتر المكعب أصل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة لمواصفات والارج الوارد بالانشاءات العامة والخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة القاد بجهاز لوس أنجلوس عن ١٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التمهك عن ٢٠سم ورشها بالماء الأسورية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والقلبة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٢٥ جنيه لكل ١ كم زيادة أو نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٠٥ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المتاجر .	م ^٣	١,٠٠١	٢١٤,٠٠٠	٢,١٤
٢-٦	بالمتر المسطح أصل توريد ورش طبقة تزيين من البتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام تمكها وتنظيفها جيداً ويتم تنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١,٠٠١	٣٠,٩٠	٠,٣١
٣-٦	بالمتر المسطح أصل توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد التمهك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبتومين الصلب ٦٠/٧٠ وأردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقلبة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١,٠٠١	١٦٤,٠٠٠	١,٦٤
٤-٦	بالمتر المسطح أصل توريد ورش طبقة لاسقة من البتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام تمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١,٠٠١	١٠,٦٠	٠,١١
٥-٦	بالمتر المسطح أصل توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد التمهك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبتومين الصلب ٦٠/٧٠ وأردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والقلبة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١,٠٠١	١٥٩,٠٠٠	١,٥٩
	الأجمالي			٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	

م.م. عبد الرحمن محمود حسين
 مدير إدارة الأعمال
 شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للتقانات العامة والتوريدات

م.م. عبد الرحمن محمود حسين

شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للتقانات العامة والتوريدات



يُنَوِّدُ الْأَعْمَالُ تَتْلِيًا

[illegible]

مهندس المتطلبات

شركة أحمد عبد الرحمن
للخدمات المنزلية المتخصصة ش.م.م.
ب. 2 (المنطقة الصناعية)
118537
118537



حصار اصل مستخلص رقم (٢)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ١٤٢٠٠ الى الكم ٨٤٢٠٠

بند رقم 5_1

الختبار (plate load test)
طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع.

القيام بعدد ٢٢ عينة اختبار PLATE Load Test

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

مهندس الشركة





حصر اعمل مستقلص رقم (٢)

عملية : اعمل الجسر القراي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بليس)

بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٤+٢٠٠ الى الكم ٨+٢٠٠

بند رقم 1_2

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة
عدا التربة المتعاسكة و الصخرية والتي تشمل ثياب مخلفات مدموكة

من محطة	الى محطة	كمية الحفر حتى ٥٠	كمية الحفر حتى ١٠٠	كمية الحفر حتى ١٥٠	ملاحظات
4+200	8+200	102,977.00	-	-	(EG1-EG2)
الإجمالي =		102,977.00	-	-	

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة





حصر أعمال مستخلص رقم (٢)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٤+٢٠٠ الي الكم ٨+٢٠٠

بند رقم 2_2

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخريه (باستخدام البلدوزر)

كمية الحفر حتى - ١٥	كمية الحفر حتى - ١٠	كمية الحفر حتى - ٥	الي محطه	من محطه
-	16,771.92	69,842.45	4+600	4+200
-	1,934.74	25,983.80	4+800	4+600
-	22,716.00	32,585.64	6+440	6+100
-	-	1,770.00	6+100	5+900
-	2,500.00	38,843.64	7+340	6+840
-	43,922.66	169,025.53	الإجمالي =	

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

مهندس الشركة

كرو





مجلس أمناء المنطقة رقم (٢)

ملاحظة : اتصال الجسر القوسي لمشروع إنشاء ومعالجة مياه (الرومياني / العائلي من ريف دمشق / حلب) بطول ٢٢ كم ومعالجة المياه الجوفية المسافة من الكم ١٨٠٠ الى الكم ٢٠٠٠

بنا رقم 2_3

بالمشروع المخطط اتصال لمعالجة مياه (الرومياني / العائلي من ريف دمشق / حلب) بطول ٢٢ كم ومعالجة المياه الجوفية المسافة من الكم ١٨٠٠ الى الكم ٢٠٠٠

من محطة	الى محطة	١ الى ٢ كم لمعالجة مياه (الرومياني / العائلي من ريف دمشق / حلب) بطول ٢٢ كم ومعالجة المياه الجوفية المسافة من الكم ١٨٠٠ الى الكم ٢٠٠٠
4+200	4+600	2,252.80
4+600	4+780	1,013.78
الإجمالي =		3,266.58

مجلس المنطقة رقم (٢)

مجلس المنطقة

مجلس المنطقة

مجلس المنطقة





حصر اصال مستخلص رقم (٢)

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ١+٢٠٠ الى الكم ٨+٢٠٠

بند رقم 2_3

بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة
(على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي

من محطة	الى محطة	(على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي
4+600	4+780	2,263.64
5+100	5+880	12,785.59
6+480	6+680	102.40
6+680	6+760	511.00
الإجمالي =		15,662.63

مهندس الاستشاري العلم

مهندس المنطقة

كسر





حصر اعمال مستخلص رقم (٢)

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)
بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٤+٢٠٠ الى الكم ٨+٢٠٠

بند رقم 2_3

بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة
(على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي

من محطة	الى محطة	كمية الترم (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي
5+100	5+880	4,331.00
6+480	6+680	1,879.77
7+440	7+720	2,257.03
7+760	7+860	1,032.00
8+040	8+140	1,318.00
الإجمالي =		10,817.80

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة





حصر اعمال مستخلص رقم (٢)

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول ٥٧ كم وصلة الميناء الجاف للمسافة من الكم ٤+٢٠٠ الى الكم ٨+٢٠٠

بند رقم 1_5

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة
اساس سكة (Subballast)

من محطة	الى محطة	كمية اساس السكة SUBBALLAST
4+200	4+320	198.00
4+320	4+560	396.00
الإجمالي =		594.00

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة



محضر اعتماد حصر كميات للقطاع

تاريخ	02/10/2023	الموافق يوم الاثنين
اسم المشروع	اصال الحصر الترابي من مشروع إنشاء وصيانة شبكة العنيد (الروبيكي / العائش من رمضان / بنس)	
قطاع	(4+200 : 8+200)	التعداد
	الروبيكي	اسم الشركة المنفذة : أحمد عبد الرحمن

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة الكميات المنفذة الخاصة بشركة (أحمد عبد الرحمن) بواسطة من الاستشاري العام للهيئة القومية لشبكة حديد مصر (خط الروبيكي) .


م	البيد	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
١	اصال الازالة والتنظيف		
5_1	اختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع	22	
1	بيد الحفر		
2_1	حفر في جميع انواع التربة عدا التربة المتماسكة والتربة الصخرية		
	عمق الحفر حتى ٥ متر	102,977.00	
	عمق الحفر حتى ١٠ متر		
2_2	حفر في تربة متماسكة :		
	عمق الحفر حتى ٥ متر	169,025.53	
	عمق الحفر حتى ١٠ متر	43,922.66	
	اجمالي كميات الحفر	315,925.19	
٣	بيد الردم		
3_2	تحميل ونقل التربة		
	للجزء السفلي	10,817.80	
	للجزء العلوي	15,662.63	
	للترمة	3,266.00	
	اجمالي كميات التربة	29,746.43	
*	بيد الاساس		
1_5	اصال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس السكة (subballast)	594.00	
	اجمالي كميات الاساس	594.00	

مدير المشروع



مدير عام المشروعات



مهندس الشركة


المهندس المشرف



م. ط. و. م. م.
الاستشاري العام للمشروع

أعمال الجسر الترامى من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكى / العاشر من رمضان / بابلس) قطاع الميناء الجاف اتجاه الروبيكى تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن

عقد صلية (٢٠٢٣/٢٠٢٣/٢٠٢٣)
٢/١٠/٢٠٢٣

بيان الأعمال التى تمت فى العقد الى تاريخه ٢/١٠/٢٠٢٣

عقد صلية (٢٠٢٣/٢٠٢٣/٢٠٢٣)						البيد	م
اجملى	جارى ٢	مقايمة معطلة (١)	جارى ١	كميات	جارى ١		
22	22	35	0	22		اصصال الآلة والتطهير	1
						الخبر (plate load test)	5_1
						طفا لتعليمات الاستشارى العلم للمشروع	
						بند الحفر	2
						حفر فى جميع انواع التربة عدا التربة المتعسكة والتربة الصخرية	2_1
95,000.00	10,000.00	156,387.00	85,000.00	102,977.00		عشق الحفر حتى ٥ متر	
0	0	0	0	0		عشق الحفر حتى ١٠ متر	
						حفر فى تربة متعسكة	
160,000.00	31,077.00	250,702.00	128,923.00	169,025.53		عشق الحفر حتى ٥ متر	2_2
40,000.00	9,904.00	84,200.00	30,096.00	43,922.66		عشق الحفر حتى ١٠ متر	
						بند الآتية	3
						تحميل ونقل الآتية	
10,000.00	10,000.00	66,800.00	0	10,817.80		التجزء السفلى	3_2
15,000.00	15,000.00	64,200.00	0	15,662.63		التجزء العلوى	
2,700.00	2,700.00	20,000.00	0	3,266.00		تتربة	
						بند الأساس	5
350.00	350.00	4,265.404	0	594.00		اصصال توريد وغرش وتنفيذ طبقة اسفل السكة (subballast)	1_5

المهندس المشرف

مهندس الشركة

مدير المشروع

حسب

حسب

حسب

اعمال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة مكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس) قطاع الميناء الجاف الحجاز الربيكي
تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن

بيان بالجمالي الاعمال التي تمت صرفها من بداية العمل حتى تاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣

م	البيد	عقد عملية (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٥٥)			اجمالي الكمية المنصرفة للقطاع
		اجمالي	جاري ٢	جاري ١	
1	اعمال الازالة والتطهير				
5_1	اختبار (plate load test) طبقة تضخمات الاستناري العلم للمشروع	22	22	-	22
2	بند الحفر				
2_1	حفر في جميع انواع التربة عدا التربة الشمعية والتربة الصخرية				
	عق الحفر حتى ٥ متر	95,000.00	10,000.00	85,000.00	95,000.00
	عق الحفر حتى ١٠ متر	-	-	-	-
2_2	حفر في تربة متوسطة				
	عق الحفر حتى ٥ متر	160,000.00	31,077.00	128,923.00	160,000.00
	عق الحفر حتى ١٠ متر	40,000.00	9,904.00	30,096.00	40,000.00
3	بند الاتربة				
3_2	تحميل ونقل الاتربة				
	للجزء السلي	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
	للجزء الطوي	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
	للترمة	2,700.00	2,700.00	-	2,700.00
5	بند الاساس				
1_5	اعمال توريد وخرش وتشغيل طبقة اساس المسة (subballast)	350.00	350.00	-	350.00

مهندس الشركة
اسعد شوي

المهندس المشرف
زكي

مدير المشروع
عبد

محضر مسافة مقلب

التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٣
اسم الشركة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات
اسم المشروع	قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس
نطاق العمل	من ٤+٢٠٠ الي ٨+٢٠٠

قام برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص بشركة أحمد عبد الرحمن الي المقلب المحدد عن طريق مهندس الهيئة ..

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذة
مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م / محمد سالم
٢- م / هبة إبراهيم عيسى

X	Y	الإحداثي
693539.137	839855.187	إحداثي المقلب
688648.179	835970.821	إحداثي الموقع (القطاع)

وثبت الآتي :

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المقلب هي ١١,٥٠٠ كم

يعتمد من
مهندس الاستشاري العام

م / محمد سالم

مهندس الهيئة العامة

م / هبة إبراهيم عيسى

شركة أحمد عبد الرحمن
للمقاولات والبناء
ب.ض. ١٢٠٩١٢-٥٧٧-٦٧٧
س.ت: ١٧٨٥٣٧١

۱۰
۰۰۶/۰۶/۱۰

محضر معاينة أرض طبيعية

التاريخ: ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢

المشروع: (أعمال الجسر لخط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

السادة: المهندسون الاستشاريون العرب مكتب (محرم باخوم)

تحية طيبة وبعد ...

بالممرور على قطاع شركة أحمد عبد الرحمن من المحطة (4+200) حتى المحطة (8+200) لمعاينة القطاع

لمسار (خط سكة حديد الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) تبين وجود الآتي :

وصف القطاع	STATION
تربة متماسكة	4+200 : 4+600
تربة متماسكة	4+600 : 4+800
تربة متماسكة	4+800 : 5+100
تربة متماسكة	5+100 : 5+640
تربة متماسكة	6+000 : 6+100
تربة متماسكة	6+100 : 6+440
تربة متماسكة	6+820 : 7+340

وبالتفصيل يعمل جسرات (مترشادية) باستخدام اللور تبين تحجرها وتماسكها مما يصعب قطعها باستخدام اللور وقد تم أخذ

عينات بلمكان متفرقة من القطاع تم توضيحها في المحضر وذلك للتأكد من صلاحية تلك التربة .

وبناء عليه يتطلب قطع هذه التربة (باستخدام البلدوزر) للوصول إلى مقصود أرض طبيعية التي يحددها

عمل الجسرات البريمية .


الإستشاري العام



مهندس الاستشاري

المهندسون الاستشاريون العرب

مكتب محرم - باخوم



مقدمه لسيادكم

شركة أحمد عبد الرحمن
المستشارين والمهندسين المعماريين ش.م.م
شركة العامة للطرق والكباري
محافظة القاهرة
ت. ١٧٨٥٣٧
ف. ٠٢٠٠٦٧٢٤٥٣٧



محضر مسابقة توريد سن

٢٠٢٣ / ٩ / ٢٦	التاريخ
أحمد عبد الرحمن للمقاولات	اسم الشركة
قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس	اسم المشروع
من ١+٢٠٠ الي ٨+٢٠٠	نطاق العمل

قام كلا من مهندس الاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسابقة توريد السن المتواجد في عتاقه (كسارة ٦ أكتوبر) الي قطاع الشركة بوصلة الميناء الجاف الخاص بشركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات ،

وثبت الاتي :

ان المسابقة من موقع العمل إلى عتاقه (كسارة ٦ أكتوبر) هي (١٣٧) كم .

مهندس الاستشاري العام
أحمد عبد الرحمن

مهندس الهيئة
أحمد عبد الرحمن

شركة أحمد عبد الرحمن
للمقاولات والتوريدات المعمورة ش.م.م
ب.ع.ن: ١٢٩١٢-٥٦٦٦
س.ع.ن: ١٧٨٥٣٧
أحمد عبد الرحمن

محضر مسافة توريد تربة

التاريخ	٢٠٢٣ / ٧ / ١٩
اسم الشركة	أحمد عبد الرحمن للمقاولات
اسم المشروع	قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس
نطاق العمل	من ٤+٢٠٠ الي ٨+٢٠٠

قام كلا من مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) و الاستشاري العام و مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد تربة من مشون شركة المحمود الي القطاع الخاص بشركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات ،

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الي مشون شركة المحمود هي (٩,٧٥) كم من ضمنهم (٢) كم مدق ترابي .
على اية تم تنفيذ كمية ردم قدرها ١٠١,١٦٣ (عشرة اثنى و مائة وثلاث وستون متر مكعب فقط من غير)
على هذه المانة

الإحداثي	Y	X
إحداثي المحجر	٨٣١٩٩١,٥٣٣	٦٨٤٦٨٠,٥٧٠
إحداثي الموقع (القطاع)	٨٣٥٩٧٠,٨٢١	٦٨٨٦٤٨,١٧٩

مهندس الشركة

مهندس استشاري الهيئة العامة

مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة

م. أحمد عبد الرحمن

م. محمد عبد الرحمن
٢٠٢٣ / ٧ / ١٩

م. محمد عبد الرحمن
م. ابراهيم عبد الرحمن



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ١٠ / ٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (67)

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم قاع حفر (فيرما)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	تسليم قاع حفر (فيرما)
مكان العمل	4+800 : 4+900		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- الأعمال المدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

لهم، استلامه

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

٨/١٥/٢٠٢٣
مهندس الاستشاري العام

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /
مهندس احمد عبد الرحمن
للتنفيذ والتوريدات المعمورة ش.م.م
ب.ض: 912-577-677
س.ت: 178537



التاريخ	٢٠٢٣ / ١٠ / ١	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٠ + ٤ حتى المحطة ٢٠٠ + ٨

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (66)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم AS BUILT لقطاعات ردم

AS BUILT	وصف العمل	أعمال ممسوحة	نوع العمل
		6+680 : 6+760 7+760 : 7+860 8+020 : 8+140	مكان العمل
☐ الثالث	☐ الثاني	☐ الأول	رقم تكرار تقديم الطلب

المسؤول		موقف الأعمال :		
	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☒ مقبول	١- الأعمال المساحية :
	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول	٢- أعمال الجودة :
	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول	٣- الأعمال المدنية :
		☐ غير مستوفي	☐ مستوفي	٤- العرض الكامل :

ملاحظات :

لِيُؤْتِيَ عِدَّةَ حَقَاتٍ مِنَ الْمَاءِ

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام.

مهندس الاستشاري العام

مهندس الزينة :

مهندس الشركة :

الإسم /
التوقيع /

الاسم: محمد
التوقيع: محمد



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (65)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	طبقة استبدال
مكان العمل	8+020 : 8+140		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

للمرجع ملاحظات لملاح

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلقزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام

الإسم /
التوقيع

الإسم /
التوقيع



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابيبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (64)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	طبقة استبدال
مكان العمل	7+760 : 7+860		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

لا يوجد ملاحظات

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

111012023
مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة أحمد عبد الرحمن
للمقاولات والأعمال الصناعية
ب.إ.ر. ٢٠٢٣
٦٦٦-٥٦٦-٥٦٦
١٧٥٨٦١
التمثيل



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠	الإتجاه	وصلة العيناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (63)

برجاء التكرم باستلام الأتي : قاع احلال (٠,٥٠)

نوع العمل		أعمال مساحية	
		6+840 : 7+360	
مكان العمل		رقم تكرار تقديم الطلب	
☐ الثالث	☐ الثاني	☒ الأول	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١ - الأعمال المساحية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢ - أعمال الجودة :	☐ مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣ - الأعمال المدنية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٤ - العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات ;

مَضْعُوفٌ مَعَهُ وَدُعَاةُ الْمُحْرَمِينَ أَيْ مَنَعُوا

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	☐	موافق مع صل الملاحظات بهاليه	☐	مرفوض ويعد تنقيمه	☐
---------------------	-------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

تلتزم الشركة المتفذة بأخذ صورته ورشّية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العلم

مهندس الهيئة :

الإسم :
التوقيع :

الاسم: أحمد
التوقيع: أحمد

مهندسة الشركة
طيركة أحمد عبد الرحمن
 للعقارات والتطوير العقاري ش.م.م
 ب.ش.م.م 7-912
 الاسم: 17-17
 التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (61)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية وأعمال جوده	وصف العمل	طبقة استبدال
مكان العمل	6+680 : 6+760		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
تم الإستمالة من قبل السيد / محمد عبد الحليم حجازي

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري العام :
شركة أحمد عبد الرحمن	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
677-527-912 : 5178537		

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابييس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٧	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (60)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم طبقة ردم لقطاع ردم (٤,٠٠٠)

نوع العمل	أعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم
مكان العمل	7+440 : 7+500		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☒
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تنقيمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابوين)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٤	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB – RSCCE – GARBL – IR - EMB – (59)

برجاء التكرم باستلام الأتي : عروض ارض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية وأعمال جوده	وصف العمل	عروض ارض طبيعية
مكان العمل	6+680 : 6+760		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

بسم الله الرحمن الرحيم. مسامحة فيما ليسه السليم (مرفوض منقطة)

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقييمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام :

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢١	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (57)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم شبكية AS BUILT لقطاعات ردم

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	تسليم شبكية AS BUILT
مكان العمل	5+100 : 5+880 6+480 : 6+680 7+440 : 7+720		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☒ مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :
مقبول مع ملاحظات على الملاحظات الواردة في الجدول التالي

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐ مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام :

الإسم / التوقيع : الإسم / التوقيع : الإسم / التوقيع :

شركة أحمد عبد الرحمن
التقنية والهندسة
ب.م.م
٦٧٦-٩١٢-٩١٢
١٧٨٥٣٧

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢١	الإنتهاء	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (56)

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم شبكية AS BUILT

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	تسليم شبكية AS BUILT
مكان العمل	6+100 : 6+480		
	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

شركة أحمد عبد الرحمن

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

بالفريق / أحمد عبد الرحمن
التوقيع / أحمد عبد الرحمن ش.م.م
ب.ض: 677-577-912
ت: 178537

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (55)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم طبقة استبدال

نوع العمل	أعمال مساحية وأعمال جوده	وصف العمل	طبقة استبدال
مكان العمل	5+800 : 5+880		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☒	مرفوض ☐
٣- الأعمال العدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :	ملاحظات :
ملاحظات :	ملاحظات :
ملاحظات :	ملاحظات :
ملاحظات :	ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقنية ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري العلم :
ملاحظات :	ملاحظات :	ملاحظات :
ملاحظات :	ملاحظات :	ملاحظات :
ملاحظات :	ملاحظات :	ملاحظات :



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (54)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة ردم (٠,٥٠ -)

نوع العمل	أعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم لقطاع ردم
مكان العمل	5+100 : 5+400		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١ - الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢ - أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☒	مرفوض ☐
٣ - الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤ - العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

مملوكا ماحيا مع وجود بعض الملاحظات من قسم المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام



الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (53)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم قاع احلال AS BUILT

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	تسليم قاع احلال AS BUILT
مكان العمل	5+900 : 6+100		
		☐ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث
			رقم تكرار تقديم الطلب

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢- أعمال الجودة :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٤- العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :

ليو محمد محمد

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐ مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الإستشاري العام

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٩	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (52)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة استبدال
مكان العمل	7+440 : 7+720		
رقم تكرار تقديم الطلب		☐ الأول	☒ الثاني ☐ الثالث

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- الأعمال المساحية :	مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- أعمال الجودة :	مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات : مقبول مساحيا

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام :



الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٨	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (51)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم قاع حفر (فيرما)

نوع العمل	أعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	قاع حفر (فيرما)
مكان العمل	6+840 : 7+000		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☒ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☒	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
 تم عمل مساحية معور يقف الكماك من
 فتح عمل الصلال

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .
 مهندس الشركة : مهندس الهيئة :

الإسم / التوقيع :
 الإسم / التوقيع :
 شركة أحمد عبد الرحمن
 للإحاطة لاند و إنفراستراكتشر العامة ش.م.م.
 ب.ص: ٩٩٢٠٠٦٧٧٠٦٣٢
 ت. ١٧٨٩٣٧



القاروب	٢٠٢٣ / ٩ / ١٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB – RSCCE – GARBL – IR - EMB – (50)

برجاء التكرم باستلام الآتي : تسليم قاع حفر (ايرما)

نوع العمل		أعمال مساحية وأعمال جوده	
		7+360 : 7+200	
مكان العمل		رقم تكرار تقديم الطلب	
☐ الثالث	☒ الثاني	☐ الأول	قاع حفر (غير ما)

موقف الأعمال :

١ - الأعمال المساحية :	مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢ - أعمال الجودة :	مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣ - الأعمال المدنية :	مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٤ - العرض الكامل :	مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :

یہ عمل! حلال ہے کہ

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	☐	موافق مع عمل الملاحظات بعمله	☐	مرفوض ويعد تقديمه	☐
---------------------	-------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام

شركة أحمد عبد الرحمن
للخدمات والتوريدات المعمورة ش.م.م.
677-577-912
178837

الإسم
التوقيف

الاسم / محمد
التوقيع /

الإسم :
التوقيع :



القاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٩	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاتلات	نطاق العمل	من المحطة ١٠٢٠٠ حتى المحطة ٨٠٢٠٠

٤٩ () RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB -

برجاء التكرم باستلام الآتي : عروض ارض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض ارض طبيعية
مكان العمل	7+760 : 7+860		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☒ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المستوفى
----------------	----------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفى ☐	غير مستوفى ☐	

ملاحظات :
صلى الله عليه وسلم

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

مهندس الهيئة :

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

مهندس الشركة
شركة احمد عبد الرحمن
للمقاولات والتوريدات المعمارية ش.م.م
ب.ص. ٥١٧٠٩١٢
س.ت. الرياض ١١٤٦٦



القاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٨	الإتجاه	وصلة العيلاء الجف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (48)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة فيرما لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة فيرما
مكان العمل	4+600 : 4+800		
		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

رقم تكرار تقديم الطلب

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
 يتم... الإحتفاظ بها... (٤+٦٠٠ - ٤+٨٠٠) ...

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابيبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (47)

يرجاء التكرم بإستلام الآتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة استبدال
مكان العمل	6+480 : 6+680		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
مقبول

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٧	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB -- (46)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم - ١,٧٥ م

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم - ١,٧٥ م
مكان العمل	5+400 : 5+640		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
تسليم حديد التسليح و حديد التسليح

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعدله	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

أحمد عبد الرحمن
مهندس
الهاتف : ٥١٦٦-٥١٦٦
١٧٨٥٣٧



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٤	الاتجاه	وصلة المناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (45)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم - ٠,٢٥ م

نوع العمل	أصبال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم - ٠,٢٥ م
مكان العمل	4+620 : 4+800		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- المعالجة الظاهرية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :	تم إستلام المساحه
-----------	-------------------

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري العام :
شركة أحمد عبد الرحمن	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
١٧٨٥٣٧	١٤١٩١٢٥٢٣	

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلديس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٢	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (44)

برجاء التكرم باستلام الأتي : عروض واحداثيات ارض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض ارض طبيعية
مكان العمل	7+560 : 7+720		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المعقول
----------------	---------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☒	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

لتم استلام المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

٧٢١٩/١٢٥٢٣

مهندس الاستشاري العام :

الاسم /
التوقيع /

مهندس الهيئة :

الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة :





الشاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٢	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (43)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم - ٠,٧٥ م

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم - ٠,٧٥ م
مكان العمل	5+100 : 5+400		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
١- المعالجة الظاهرية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :
تم إستلام المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بدالیه ☐ مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .
مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام :
12/9/2023

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة احمد عبدالرحمن
الاسم /
التوقيع /
178537

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١١	الإتجاه	وصلة الميناء الجانف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المعاومات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (42)

برجاء التكرم باستلام الأتي : طبقة ردم ٢- م

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم ٢- م
مكان العمل	5+700 : 5+820		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- المعايينة الظاهرية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرغوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرغوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرغوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرغوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقيع /
١٧٥٥٣٧



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١١	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (41)

برجاء التكرم باستلام الآتي : طبقة ردم (٠,٥٠)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم
مكان العمل	4+680 : 4+780		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

بسم الله الرحمن الرحيم

مرفوض ويعد تقديمه	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	موافق	نتيجة هذه الأعمال :
-------------------	-------------------------------	-------	---------------------

تلقم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العدم

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /



الإسم
التوقيع



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٨+٢٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (40)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : طبقة سن (+ ١٥٠) SUBBALLAST

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة سن (1) SUBBALLAST
مكان العمل	4+320 : 4+560		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

لعمري سكرتير المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

١٠/٩/٢٠٢٣


مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والأصبال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٩	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (39)

برجاء التكرم باستلام الآتي : عروض واحداثيات ارض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض ارض طبيعية
مكان العمل	7+440 : 7+560		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :	تم استلام المساحة
-----------	-------------------

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بماليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري العام :
شركة احمد عبدالرحمن	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
١٧٨٥٣٧٢		

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط منكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (38)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم (١ -)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (١ -)
مكان العمل	5+400 : 5+640		
		الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

رقم تكرار تقديم الطلب

المعمول

موقف الأعمال :

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	


ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض ويعد تقييمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .
مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٦	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (37)

برجاء التكرم باستلام الأتي : طبقة ردم - ٠,٧٥ م

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم - ٠,٧٥ م
مكان العمل	4+680 : 4+780		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :	بم. استلام المساحة
-----------	--------------------

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري العام :
مهندس الشركة : م.م. أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات الهندسية ش.م.م. الاسم : أحمد عبد الرحمن التوقيع : أحمد عبد الرحمن	الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٥	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٠+٤ حتى المحطة ٢٠٠+٨

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (36)

يرجاء التكرم بإستلام الآتي : عروض وأحداثيات أرض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض أرض طبيعية
مكان العمل	6+680 : 6+480		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
تم إستلام المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة احمد عبد الرحمن
للخدمات الهندسية والمقاولات
ب.م.م
٦٧٧٥٧٧
١١٠٥٠٠

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٥	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٢٠٠+٤ حتى المحطة ٢٠٠+٨

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (35)

برجاء التكرم باستلام الآتي : شبكة ارض طبيعية بعد التطهير	EG2
--	-----

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	شبكة ارض طبيعية
مكان العمل	7+840 : 8+140		
		☒ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- المعالجة الظاهرية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢- الأعمال المساحية :	☒ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣- أعمال الجودة :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٤- العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :
رسم ملاحظ

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعامية	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري العام :
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
أحمد عبد الرحمن	أحمد عبد الرحمن	أحمد عبد الرحمن
١٧٨٥٣٧	١٧٨٥٣٧	١٧٨٥٣٧

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نظام العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (34)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : طبقة سن (٠,١٥+) SUBBALLAST

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة سن (1) SUBBALLAST
مكان العمل	4+200 : 4+340		
	رقم تكرار تقديم الطلب ...	الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١ - الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢ - أعمال الجودة :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣ - الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤ - العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
تسليم العمل ...

موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقديمه
-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .	مهندس الهيئة :	مهندس الشركة
بمعدت ...	الاسم / التوقيع	شركة أحمد عبد الرحمن
مهندس الاستشاري العام		للمقاولات والتوريدات المعمورة ش.م.م
		ب. ص. ٩٣٢ - ٩٣٧

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (33)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : عروض واحداثيات ارض طبيعية قطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض ارض طبيعية
مكان العمل	5+800 : 5+880		
	رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

موقف الأعمال :	المعمول
----------------	---------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري الغام :

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

شركة احمد عبدالرحمن
للمقاولات والتوريدات المعمارية ش.م.م
ب.ض: ٥١٢-٥٧٧-٥٧٧
ت.٥: ١٧٥٥٣٧

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المفاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (32)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة ردم ١- م

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم ١- م
مكان العمل	4+680 : 4+780		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- المعالجة الظاهرية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقيه أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري :

مهندس الاستشاري العام

الاسم : التوقيع :

الاسم : التوقيع :





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٣	الإجراء	وصلة الميلاد الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن و المطاولات	نطاق العمل	من المحطة ١٤٢٠٠ حتى المحطة ٨٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (31)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : طبقة ردم - ١ م

ملبقة ردم ١- م		وصف العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	نوع العمل
			5+100 : 5+400	مكان العمل
☐ الثالث	☐ الثاني	☐ الأول	رقم تكرار تقديم الطلب	

موقف الأعمال :

١- المعاينة الظاهرية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢- الأعمال المساحية :	☐ مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣- أعمال الجودة :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٤- العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :

تم الامتحان وكنتم يتبينون العلم بقلوبكم بفتح العزم ٢٢ ثم مد يداك

نتيجة هذه الأعمال :

موافق

موانئ مع عمل الملاحظات بعاليه

☐ مرفوض ويعكس تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مفتوحی از اسرار است :

~~يعقوب~~

مهندس الاستشاري العام

شركة خدمات
 التوظيف والتدريب
 677-577-917
 1785



المشاريع	٢٠٢٣ / ٩ / ٢	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتي المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (29)

برجاء التكرم باستلام الأتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة استبدال
مكان العمل	5+600 : 5+800		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :
 مهندس الهيئة :
 مهندس الاستشاري العام :
 الاسم :
 التوقيع :
 شركة احمد عبدالرحمن
 للمقاولات والبناء
 ب.ص: ١٢
 ت. ١٧٨٥٣٧



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٩	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (28)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : عروض ارض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض ارض طبيعية
مكان العمل	5+600 : 5+800		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- المعينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعداياه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	---	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .		
مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
شركة أحمد عبد الرحمن للحياولة والبناء والتشييد ب.ص: ١٢٩٦٦ س.ت: ١٧٨٥٣٧		



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٩	الإتجاه	وصلة المناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن والمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (27)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة استبدال لقطاع ردم
مكان العمل	5+400 : 5+600		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- المعلننة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بماليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .		
مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :	مهندس الاستشاري :
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع
شركة احمد عبدالرحمن والمقاولات	الاسم / التوقيع	مهندس الاستشاري العلم
ب.ش: 677-577-912	ب.ش: 677-577-912	ب.ش: 677-577-912
س.ت: 178537	س.ت: 178537	س.ت: 178537

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٩	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (26)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة استبدال (قطاع ردم)
مكان العمل	4+600 : 4+640		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--


تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العلم

الاسم / التوقيع / كرم





التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (25)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طلب معاينة أرض طبيعية

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	معاينة ظاهرية لأرض طبيعية
مكان العمل	6+100 : 6+400		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
تمرجع مختلفات حرس الكفر حتى الوصول الى مستوى الأرض الطبيعية.

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

مهندس الاستشاري العام

الاسم / كوراسي
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٤	الإتجاه	وصلة العيلاء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (24)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أصل مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة استبدال لقطاع ردم
مكان العمل	5+100 : 5+260		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- المعلنة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

241812023

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة : مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري :
يعتمد ،، مهندس الاستشاري العام

اسم :
التوقيع :

اسم :
التوقيع :

اسم :
التوقيع :

شركة احمد عبدالرحمن
للحسابات والتقييم
ب.ض: 677-577-912
س.ت: 178537



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن و المغاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (23)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

طريقة استبدال لقطاع ردم		وصف العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	نوع العمل
			5+260 : 5+400	مكان العمل
☐ الثالث	☐ الثاني	☐ الأول	رقم تكرار تقديم الطلب	

موقف الأعمال :

١- المعينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه	☐	مرفوض وبعد تقديمه	☐
---------------------	-------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري :

مهندس الاستشاري العام

التوقيع :

للإقامة أحمد عبد الرحمان
التوقيع: / الكورس / الموضوعة ش. التوقيع
ب.ص: 677-577-912
ت.ص: 178537



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٣	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (22)

برجاء التكرم باستلام الأتي : عروض أرض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض أرض طبيعية (قطاع ردم)
مكان العمل	5+400 : 5+600		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورفقيه أو ضوئية من طلب الإستلام . مهندس الشركة : شركة أحمد عبد الرحمن المقاولات والتوريدات والهندسة ش.م.م ب.م.م ٦٧١-٦٧١ ت.م.م ١٧٨٥٣٧	مهندس الهيئة : الاسم / التوقيع /	يُعتمد ،،، مهندس الاستشاري العلم
--	---	--



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٠	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (21)

يرجاء التكرم بإستلام الآتي : طبقة استبدال لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة استبدال (قطاع ردم)
مكان العمل	4+780 : 4+640		
		الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

رقم تكرار تقديم الطلب

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهامه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	---	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (20)

برجاء التكرم باستلام الأتي : طلب معاينة أرض طبيعية

نوع العمل	أعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	معاينة أرض طبيعية
مكان العمل	5+900 : 6+100		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

بالمرسور دل على أن الأرض الطبيعية هي عبارة عن قطعة من الأرض
تحتلها مساحات من الأرض الطبيعية التي هي جزء من الأرض الطبيعية
التي هي جزء من الأرض الطبيعية التي هي جزء من الأرض الطبيعية

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة أحمد عبد الرحمن
للمقاولات والتوريدات المدنية
١٧٧٠٥١٢ : ١٧٧٠٥١٢
١٧٨٥٣٧ : ١٧٨٥٣٧

الاسم
التوقيع



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (18)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : طبقة فيرما (قطاع احلال)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (فيرما)
مكان العمل	4+400 : 4+600		
		☒ الأول	☐ الثاني ☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

يعتمد

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



الشارع	٢٠٢٣ / ٨ / ١٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	لطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (17)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : طبقة فيرما (قطاع احلال)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	طبقة ردم (فيرما)
مكان العمل	4+200 : 4+400		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

يعتمد ...

مهندس الاستشاري العلم

التوقيع

الإسم /

التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بليبين)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١٣	الإتجاه	وصلة العيناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (16)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تسليم طبقة ردم - ٢٥, ٠ م (قطاع احلال)

نوع العمل		أعمال مساحية و أعمال جودة		وصف العمل	طبقة ردم - ٠.٢٥ م
مكان العمل		4+360: 4+600			
رقم تكرار تقديم الطلب				☒ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث	

المسؤول

موقف الأعمال :

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المثبتة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

ملاحظات :
... ۱. ... ۲. ... ۳. ... ۴. ... ۵. ... ۶. ... ۷. ... ۸. ... ۹. ... ۱۰. ...

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .


مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام

الاسم

التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (15)

برجاء التكرم باستلام الأتي : منسوب قاع حفر فيرما (قطاع قطع)

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	منسوب قاع حفر فيرما
مكان العمل	7+000 : 7+200		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐	مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة :

مهندس الهيئة :

مهندس الاستشاري العام

الاسم / م / م
التوقيع / م / م



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن و المقاولات	لطاق العمل	من المحطة ٢٠٠+٤ حتى المحطة ٢٠٠+٨

RB - RSCCE - GARBL - IR - EMB - (14)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : عروض ارض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض ارض طبيعية (قطاع ردم)
مكان العمل	5+400 : 5+600		
	رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☒ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☒
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
١- المرفوض نيب كامل و لقطاع مرفوض حسب مكان المرفوض

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة : مهندس الاستشاري العام
التوقيع /

مهندس الشركة : شركة أحمد عبد الرحمن
للحفاظ والإستمرار في العمل
ب. صلاح رقم 577627
س. ت. 178537

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن و المقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - IR - EMB - (13)

برجاء التكرم باستلام الأتي : عروض ارض طبيعية لقطاع ردم

نوع العمل	أعمال مساحية و أعمال جودة	وصف العمل	عروض ارض طبيعية (قطاع ردم)
مكان العمل	5+260 : 5+400		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعلية	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإسلام .	مهندس الشركة :	مهندس الهيئة :
الإسم / عمرو سلال	مهندس الاستشاري العام	مهندس الهيئة :
شركة أحمد عبد الرحمن	مهندس الاستشاري العام	مهندس الهيئة :
المقاولات والتوريدات المعمورة ش.م.م	مهندس الاستشاري العام	مهندس الهيئة :
ب.ص: 912-577-677	مهندس الاستشاري العام	مهندس الهيئة :
ب.ت: 178537	مهندس الاستشاري العام	مهندس الهيئة :

مشروع (أعمال الجسر والأصبال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHAMMAD BAKHOUH



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ١	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١٤٢٠٠ حتى المحطة ٨٤٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - EMB - (11)

برجاء التكرم باستلام الآتي : تسليم قاع احلال لقطاع قطع (٠,٥٠)



نوع العمل	اعمال مساحية و اعمال جودة	وصف العمل	توقيع مهندس الشركة
مكان العمل	4+380 TO 4+600		
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب			
☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث			

موقف الأعمال :	المسؤول
١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :
تم استلام الأعمال المساحية ونحوها و قد تم فحصها و هي سليمة
ولا حاجة لغيرها من الأعمال باستكمال باقي الأعمال

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☒ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري العام :

الاسم :
التوقيع : ١١٥١٢٥٤٣

مهندس الإستشاري :

الاسم :
التوقيع : ٨٨٨١

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري :

الاسم /
التوقيع /

مهندس الاستشاري :

الاسم /
التوقيع /

١٣ حصة مكالمة
مستوفى

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابليس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٤ / ١٥	الإجراء	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١٤٢٠٠ حتى المحطة ٨٢٠٠

طلب استلام أعمال رقم (C٢)

برجاء التكرم باستلام الأتي :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	شركة أحمد عبد الرحمن للحقوقات والتوريدات المعمورة ش.م.م ب.هـ ٥٦٦٦-٥٦٦٦-٥٦٦٦ ت.هـ ٥٦٦٦-٥٦٦٦-٥٦٦٦
مكان العمل	6 + 500 : 6 + 700	توقيع مهندس الشركة	
استلام المهندس الاستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول	

المسؤول	موقف الأعمال :
١٦	١- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- الأعمال المدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
تم استلام القوائم حسب المرفقات بطلب الاستلام.

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهامه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

يعتمد

مهندس الاستشاري :

الإسم / محمد عبد الفتاح
التوقيع / ١٦

الإسم / محمد عبد الفتاح
التوقيع / ١٦

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٧ / ١٨	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - IR - EMB - (9)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : تسليم قاع إحلال

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	تسليم قاع إحلال
مكان العمل	4+200 TO 4+380	توقيع مهندس الشركة	شركة أحمد عبد الرحمن للحقوق والتأجير والتمويل بمصر 677-577-512 1785334
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول		

موقف الأعمال :	المسؤول
----------------	---------

١- الأعمال المساحية :	مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢- أعمال الجودة :	مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣- الأعمال المدنية :	مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :
يجب تسليم البنية التحتية المساحية حسب المرفقات
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

الاسم / م. م. م. م. م.
التوقيع /

مهندس الاستشاري :

الاسم / م. م. م. م. م.
التوقيع /



التاريخ	2023 / 05 / 03	الإتجاه	وصلة العيلاء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة 4+200 حتى المحطة 8+200

طلب استلام أعمال رقم (٨)

يرجاء التكرم باستلام الأتي تسليمه لشركة AS Bunt طلب الملاحظات :

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات
مكان العمل	6+440 : 6+100	توقيع مهندس الشركة	ب.ش. : 677-577-912 ت.ش. : 178537
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب			
☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

1- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	استلم
2- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	
3- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي		

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهاليه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

استلم

المهندس

شركة

مهندس الإستشاري :

ب.ش. : 677-577-912

ت.ش. : 178537

7/5/2023



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



وصلة الميناء الجاف	الاتجاه	2023 / ٣ / ١	التاريخ
من المحطة 4+200 حتى المحطة 8+200	نطاق العمل	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	الشركة المنفذة

طلب استلام أعمال رقم () ✓

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم منا سيب (As built) جبر إزالة مخلفات

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	تسليم منا سيب (As built) جبر إزالة مخلفات
مكن العمل	4+800 : 4+600	توقيع مهندس الشركة	توقيع مهندس الشركة
استلام المهندسين الاستشاري		م. ب. ٥١٢-٥٧٧-٦٧٧ ال. ٣: ١٧٥٥٣٧	
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث

المسؤول

موقف الأعمال :

1- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
2- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
3- الأعمال المدنية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
4- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
-------	-------------------------------	--------------------

نتيجة هذه الأعمال :

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري :

يعتمد

استلام

الاسم / اسامه محمد احمد
التوقيع / اسامه محمد احمد

مشروع (أعمال الجمر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلنيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ١٢٠٠ حتى المحطة ٨٢٠٠
(٨١١) طلب استلام أعمال رقم (٥)			

برجاء التكرم باستلام الأتي :

نوع العمل	أعمال مائية	وصف العمل	تأميم قاع حفر (فمريا)
مكان العمل	4+800 : 4+600	توقيع مهندس الشركة	 للمهندس: محمد علي محمد ب.م. 17-177 الت. 177-177
إستلام المهندس الإستشاري		☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث	
رقم تكرار تقديم الطلب			

المسؤول		موقف الأعمال :	
	☐ مرفوض	☒ مقبول مع ملاحظات	☒ مقبول
	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول
	☐ مرفوض	☐ مقبول مع ملاحظات	☐ مقبول
		☐ غير مستوفي	☐ مستوفي
		١- الأعمال المساحية :	
		٢- أعمال الجودة :	
		٣- الأعمال المدنية :	
		٤- العرض الكامل :	

ملاحظات :

ملاحظات :
 ١- استلزم منا تعيين مرسوم من مرسوم يوضح النقص في التوزيعات الجارية ويتم التوزيع على النماذج الجديدة
 ٢- استلزم منا تعيين الترتيب في الاستطاعة من حيث الجاهز
 ٣- تعيين أيد الترتيب المتأخر جبهة عند قيد قايح الحضور عنها ربح عند خلوها من الشا من تاريخ حضوره أما كمن
 ٤- جازية تم تحريمها بالمنشقة فعليه تحت التكاليف من توجبه الجماعا لا بأسا كما أن أعماله القلي والفرقته لم يزلوا المستخرج المستطاعة
 حق تجميع التامعين عليها

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرقوش ويعمل تنقيمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

الوفاء للصالحين

تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

يعتمد
111

مهندس الإستشاري :

الإسم / متولى حسي
التوقيع /

الإسم: محمد بن عبد الله بن محمد
التوقيع: محمد بن عبد الله بن محمد



(مشروع) أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بالبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ١١ / ١٦	الإتجاه	وسلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	لطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

طلب استلام أعمال رقم (١)

برجاء التكرم باستلام الآتي :

نوع العمل	أعمال صناعية	وصف العمل	توقيع مهندس الشركة
مكان العمل	٤+٢٠٠ - ٨+٢٠٠	توقيع مهندس الشركة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات ب.ش: 677-577-912 س.ش: 178537
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☒	الثاني ☐ الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال :
١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :
.....
.....
.....
.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☒ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري :

.....
.....
.....

يعتمد
.....
.....

الاسم /
التوقيع /
.....
٢٠٢٣ / ١١ / ١٦



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٧	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - MAT - (13)

برجاء التكرم باستلام الأتي : عينة صلاحية من الموقع (مشون المحمود) بعد تحسينها بنسبة (٢ تربة : ارملة)

نوع العمل	أعمال جودة	وصف العمل	عينة صلاحية
مكان العمل	4+200 : 8+200		
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث

المسؤول

موقف الأعمال :

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعلته	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورة ورقية أو صوتية من طلب الاستلام

مهندس الاستشاري (الحام)

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

الاسم /
التوقيع


الاسم /
التوقيع

الإمضاء / أحمد عبد الرحمن
التوقيع /
ص. ١١٢-٥٧٧
١٧٨٥٣٧

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913

Project	إنشاء الجسر الثرابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Ahmed Abdel Rahman
Sampling Date	27/08/2023
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	Stockpile Mahmoud
Location	--
Level	--
Sample No	CRG-AA-27-8-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Sieve	Opening (mm)	% Retained	% Passing
3 in.	75	0.0	100.0
2 in.	50	0.0	100.0
1.5 in.	37.5	0.0	100.0
1 in.	25	0.4	99.6
3/4 in.	19	1.9	98.1
1/2 in.	12.5	8.9	91.1
3/8 in.	9.5	15.3	84.7
No.4	4.75	30.2	69.8
No.10	2	51.9	48.1
No.40	0.425	75.3	24.7
No.200	0.075	87.6	12.4

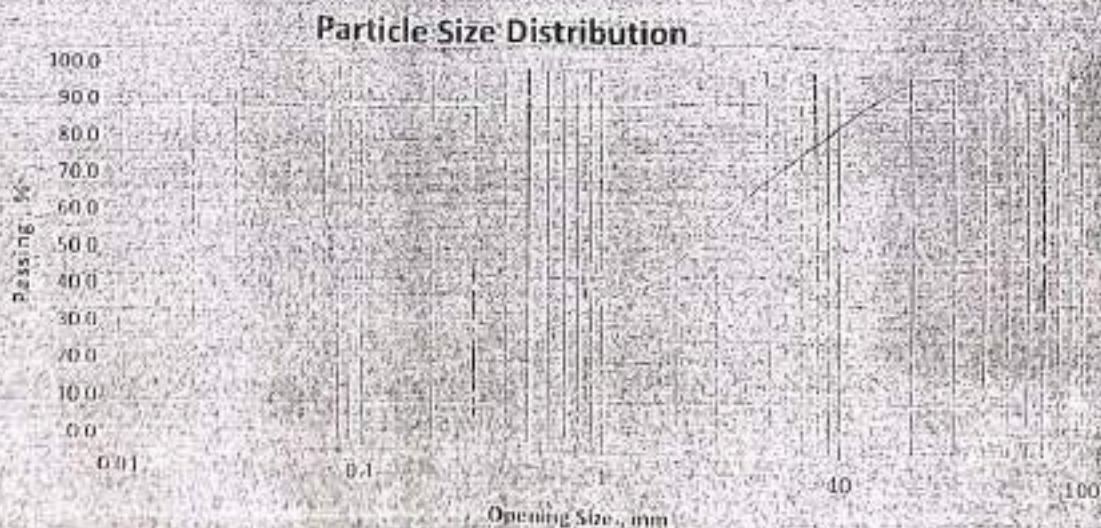

For Q/Rep : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 30-Aug-23

Form Number : Q/ lab/Soil/01/ver.01

Signature:



Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils - ASTM D4318

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Ahmed Abdel Rahman
Sampling Date	27/08/2023
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	Stockpile Mahmoud
Location	--
Level	--
Sample No	CRG-AA-27-8-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Plastic Limit :

Container No.	QL-PL/01	QL-PL/02	QL-PL/03	Average
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	27.03	25.32	25.91	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	25.40	23.80	24.31	
Mass of Container , M_3 (g)	16.10	15.80	15.60	
Water Content, w (%)	17.5	19.0	18.4	18.3

Liquid Limit :

Container No.	QL-LI/01	QL-LI/02	QL-LI/03	LI
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	41.38	44.68	48.56	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	38.50	41.20	44.70	
Mass of Container , M_3 (g)	29.10	28.80	29.60	
Water Content, w (%)	30.7	28.1	25.5	28.1
Number of Blows, N	17	25	33	



Plasticity Index (L.I. - P.I.) = 9.8

For QLab : Eng. Abdallah Hussien
Date of Report : 30-Aug-23
For QLab : QLab/Soil/01/ver.01

Signature:



AASHTO Classification - M 145

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Ahmed Abdel Rahman
Sampling Date	#####
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	Stockpile Mahmoud
Location	--
Level	--
Sample No	CRG-AA-27-8-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

General Classification	Granular Materials							Silt - Clay Materials				
	35% or less Passing No.200 (0.075 mm)							More than 35% Passing No.200 (0.075 mm)				
Group Classification	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5	A-7-6
Sieve analysis, Percent Passing												
No.10 (2.0 mm)	50 max											
No.40 (0.425 mm)	30 max	50 max	51 min									
No.200 (0.075 mm)	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min	36 min
Characteristics of fraction Passing No.40 (0.425 mm)												
Liquid Limit				40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	41 min
Plasticity Index	6 max	6 max	N.P.	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	$\leq (I_p - 30)$	$> (I_p - 30)$
Usual Types of Significant Constituent Materials	Stone Fragments Gravel and Sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel and Sand				Silty Soils		Clayey Soils		
General Rating as Subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor				

* Plasticity Index of (A-7-5) Subgrade is equal to less than I_p minus 30. Plasticity Index of (A-7-6) Subgrade is greater than I_p minus 30 (see figure 2)

Result:

Opening Size (mm)	2	0.425	0.075	Liquid Limit	28.1
Passing (%)	48.1	24.7	12.4	Plasticity Index	9.8

Classification of Soil according to AASHTO (M-145)

A-2-4

For QLab: Eng. Abdullah Hussien
Date of Report: 3 Jan 00
Form Number: QLab/Soil/01/ver.01

Signature:






Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913

Project إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بليس
Client Ahmed Abdel Rahman
Sampling Date 27/08/2023
Sample Description Gravelly Sand Soil
Source Stockpile Mahmoud
Location --
Level --
Sample No AA-Pr-005
Sampled by Abdelrahman Gaber

Wet Density, gm/cm ³	1.957	2.146	2.226	2.236	2.103
Moisture Content, %	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0
Dry Density, gm/cm ³	1.882	2.025	2.061	2.033	1.878

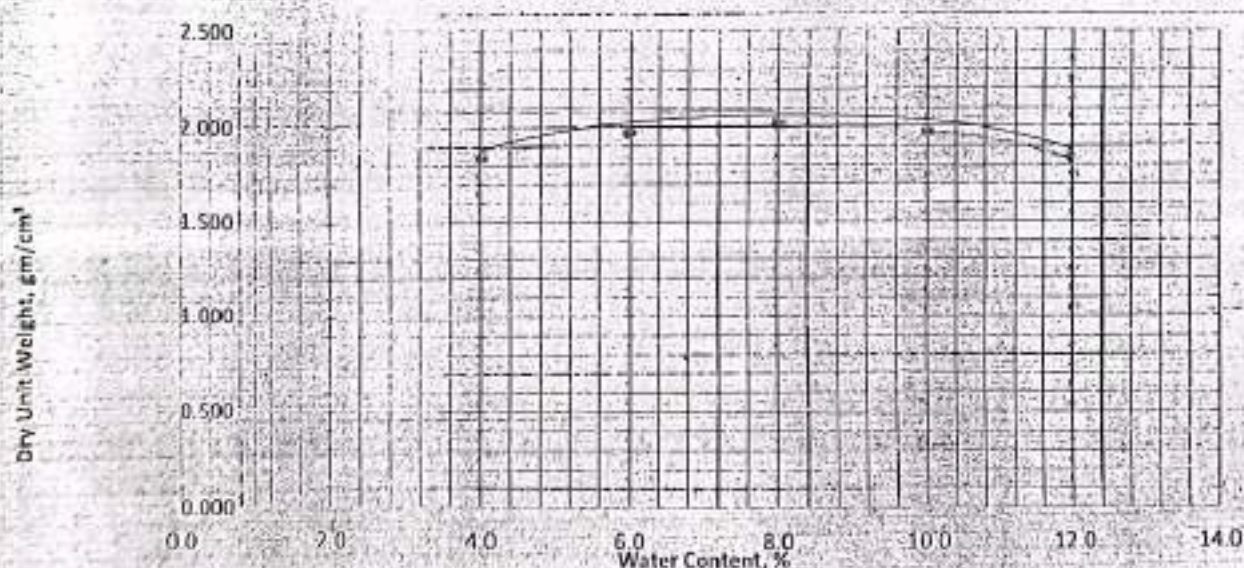

Optimum Dry Unit Weight (Mod-ydmax) gm/cm³ = 8%

Optimum Dry Unit Weight (Mod-ydmax) gm/cm³ = 2.079 gm/cm³

For QLab: Eng. Abdallah Hussien
Date of Report: 30-Aug-23
Form Number: QLab/Soil/01/ver.01

Signature:



كبو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673


Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

California Bearing Ratio - ASTM D1883

Project إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client Ahmed Abdel Rahman
Sampling Date 27/08/2023
Sample Description Gravelly Sand Soil
Source Stockpile Mahmoud
Location ---
Level ---
Sample No AA-Pr-005
Sampled by Abdelrahman Gaber

Penetration		Dial Reading	Load		Stress
inch	mm		kN	lb	
0.000	0.00	0	0.00	0.0	0
0.025	0.64	103	1.01	226.60	76
0.050	1.27	205	2.01	451.0	150
0.075	1.91	308	3.02	677.60	226
0.100	2.54	412	4.04	906.4	302
0.125	3.18	521	5.11	1146.20	382
0.150	3.81	621	6.09	1366.2	455
0.175	4.45	709	6.95	1559.80	520
0.200	5.08	813	7.97	1788.6	596
0.300	7.62	1129	11.07	2483.80	828
0.400	10.16	1215	11.91	2673.0	891
0.500	12.70	1238	12.14	2723.60	908

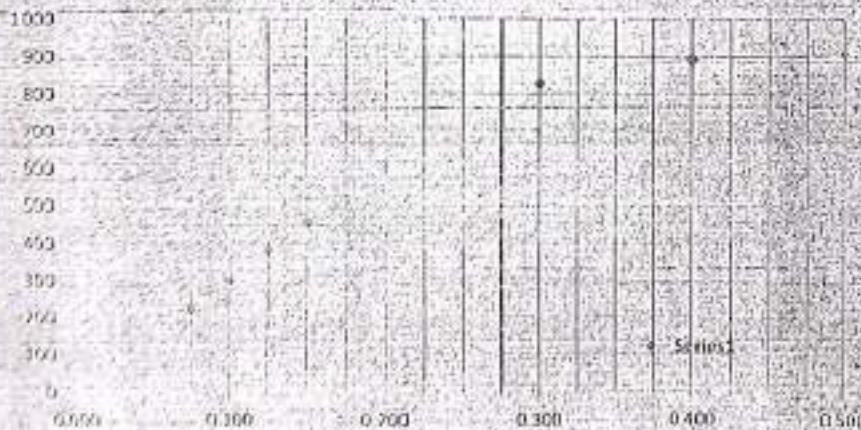

CBR	Value , %
@100%MDD	
0.1 inch	30.2
0.2 inch	39.7
Swelling	0

For QLab : Eng. Abdallah Hussien
Date of Report : 3-Sep-23
Form Number: QLab/Soil/01/ver.01

Signature:



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - MAT - (14)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : عينة صلاحية من الموقع (مشون الأمال) بعد تحسينها بنسبة (٢ ثربة : ١ رمل)

نوع العمل	أعمال جودة	وصف العمل	عينة صلاحية
مكان العمل	4+200 : 8+200		
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث

المسؤول

موقف الأعمال :

١- المعاينة الظاهرية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- الأعمال المساحية :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مقبول	غير مستوفي	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام


مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

المحتم

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913

Project إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بليس
Client Ahmed
Sampling Date 13/09/2023
Sample Description Gravelly Sand Soil
Source مشروبا الزمان
Location --
Level --
Sample No 064-CRG- AAR - 13-09-2023
Sampled by Abdelrahman Gaber

Sieve	Opening (mm)	% Retained	% Passing
3 in.	75	0.0	100.0
2 in.	50	0.0	100.0
1.5 in.	37.5	0.0	100.0
1 in.	25	1.8	98.2
3/4 in.	19	2.2	97.3
1/2 in.	12.5	5.5	94.5
3/8 in.	9.5	7.7	92.3
No. 4	4.75	16.2	83.8
No. 10	2	26.7	73.3
No. 40	0.425	43.4	56.6
No. 200	0.075	87.3	12.7

Particle Size Distribution



For QLab: Eng. Abdallah Hussien
Date of Report: 16-Sep-23
Form Number: QLab/Soil/01/ver.01

Signature:

Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils - ASTM D4318


Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بليس
Client	Ahmed
Sampling Date	13/09/2023
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	مشروع الجسر
Location	--
Level	--
Sample No	064-CRG- AAR - 13-09-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Plastic Limit :

Container No.	QL-PL/01	QL-PL/02	QL-PL/03	Average
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	23.43	25.51	23.26	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	22.10	23.80	21.90	
Mass of Container , M_3 (g)	15.60	16.00	15.40	
Water Content, w. (%)	20.5	21.9	20.9	21.1

Liquid Limit :

Container No.	QL-LI/01	QL-LI/02	QL-LI/03	LL
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	43.77	42.74	44.09	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	40.30	39.70	41.00	
Mass of Container , M_3 (g)	28.80	29.00	29.40	
Water Content, w. (%)	30.2	28.4	26.6	28.3
Number of Blows, N	18	24	32	

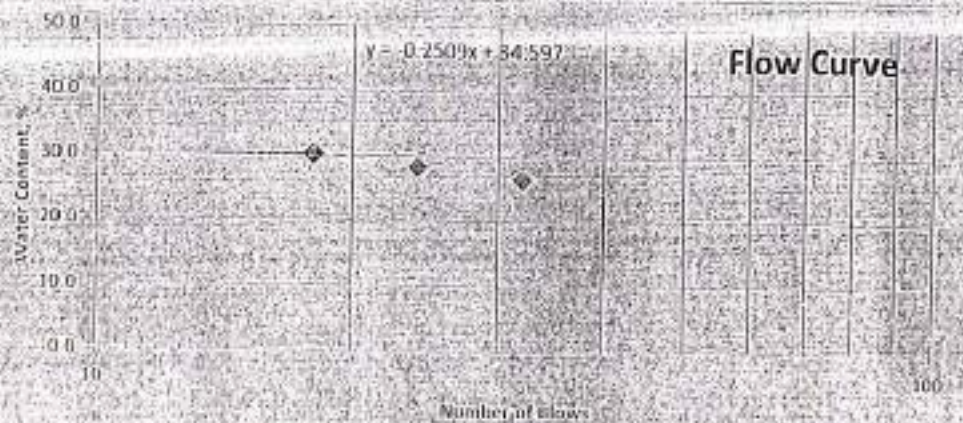

Plasticity Index (I_p = P_L - P_U) = 7.2

For QLab :

Eng. Abdallah Hussien

Signature

Date of Report :

16 Sep 23

Form Number :

QLab/Soil/01/ver.01



AASHTO Classification - M 145

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Ahmed
Sampling Date	13/09/2023
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	مسووال الزمان
Location	
Level	
Sample No	064-CRG- AAR -13-09-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

General Classification	Granular Materials 35% or less Passing No.200 (0.075 mm)							Silt - Clay Materials More than 35% Passing No.200 (0.075 mm)				
	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	
Group Classification	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7				A-7-5	A-7-6
Sieve analysis, Percent Passing												
No.10 (2.0 mm)	50 max											
No.40 (0.425 mm)	30 max	50 max	51 min									
No.200 (0.075 mm)	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min	36 min
Characteristics of fraction Passing No.40 (0.425 mm)												
Liquid Limit				40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	41 min
Plasticity Index	6 max	6 max	N.P.	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	<(L.L.-30)	>(L.L.-30)
Usual Types of Significant Constituent Materials	Stone Fragments, Gravel and Sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel and Sand				Silty Soils		Clayey Soils		
General Rating as Subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor				

* Plasticity Index of (A-7-5) Subgrade is equal to less than L.L.minus 30. Plasticity Index of (A-7-6) Subgrade is greater than L.L.minus 30 (see figure 2).

Result:

Opening Size (mm)	2	0.425	0.075
Passing (%)	73.3	56.1	12.7
Liquid Limit	28.3		
Plasticity Index	7.2		

Classification of Soil according to AASHTO (M-145)

A-2-4

For QLab: Eng. Abdallah Hussien
Date of Report: 3-Jan-09
Form Number: QLab/Soil/01/ver.01

Signature

[Signature]



كبر لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Free Swelling for Soil Sample - ECP 202

Project إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / بلبيس
Client Ahmed
Sampling Date 13/09/2023
Sample Description Gravelly Sand Soil
Source مشروعات الاسفلت
Location
Level
Sample No 064-CRG- AAR - 13-09-2023
Sampled by Abdelrahman Gaber

Test	Result	Project Spec
Free Swelling (%)	0.0	3.0% Max

For QLab

Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report

16 Sep 23

Form Number

QLab/Soil/01/ver.01



كبو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673


Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Ahmed
Sampling Date	13/09/2023
Sample Description	Gravelly Sand Soil
Source	
Location	
Level	
Sample No	064-CRG- AAR - 13-09-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Wet Density, gm/cm ³	2.022	2.132	2.207	2.215	2.204
Moisture Content, %	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Dry Density, gm/cm ³	1.982	2.050	2.082	2.051	2.004

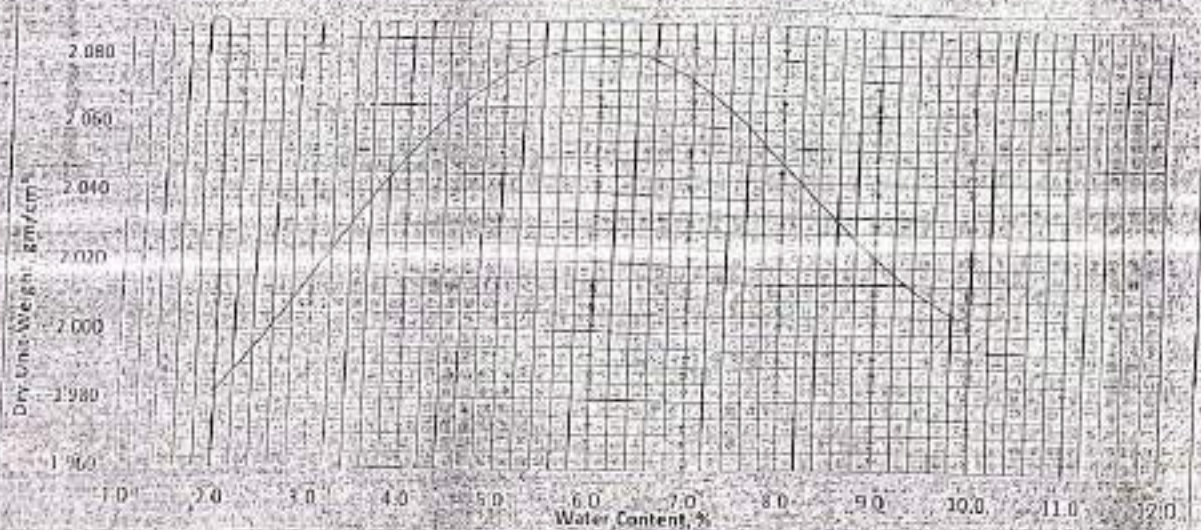

Optimum Dry Unit Weight (Mod-ydmax) gm/cm³ = 6%

Optimum Dry Unit Weight (Mod-ydmax) gm/cm³ = 2.082 gm/cm³

For: Colap:
Date of Report: 16-Sep-23
Drawn/Checked: Qlab/Sec/01/ver:01

Eng. Abdallah Hussein

Signature:

California Bearing Ratio - ASTM D1883

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكن / بلديس	ASSHTO Classification:
Client	Ahmed Abd-El Rahman	A-2-4
Sampling Date	13-Sep-23	MDD: 2.082
Sample Description	Redish Soil	OMC: 6.0
Source	مشروع الأمل	
Location		
Level		
Sample No	064-CRG-AAR-13-9-2023	
Sampled by	Abdelrahman Mohamed	

Penetration		Dial Reading	Load		Stress
inch	mm		kN	lb	
0.000	0.00	0	0.00	0.0	0
0.025	0.64	100	0.98	220.00	73
0.050	1.27	190	1.86	418.0	139
0.075	1.91	280	2.75	616.00	205
0.100	2.54	385	3.77	847.0	282
0.125	3.18	490	4.80	1078.00	359
0.150	3.81	580	5.69	1276.0	425
0.175	4.45	690	6.76	1518.00	506
0.200	5.08	800	7.84	1760.0	587
0.300	7.62	1125	11.03	2475.00	825
0.400	10.16	1203	11.79	2646.6	882
0.500	12.70	1240	12.16	2728.00	909



CBR	Value, %
@100% MDD	
0.1 inch	28.2
0.2 inch	39.1
Swelling	0

For: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 21-Sep-23

Form Number: Qlab/Soil/01/ver.01

Signature:





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٩	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - MAT - (15)

برجاء التكرم باستلام الأتي : عينة صلاحية من الموقع (مشون الأمال) بعد تحسينها بنوعية (٢ تربة : ١ رمل)

نوع العمل	أعمال جودة	وصف العمل	عينة صلاحية
مكان العمل	4+200 : 8+200		

رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث
-----------------------	-------	--------	--------

المسؤول	موقف الأعمال :
---------	----------------

١- المعاينة الظاهرية	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٢- الأعمال المنجزة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٣- أعمال الجودة :	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض
٤- العرض الكامل :	مستوفي	غير مستوفي	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعده	مرفوض ويعد نقية
---------------------	-------	-----------------------------	-----------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام :

مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :

العام

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

شركة أحمد عبد الرحمن
المقر: ٥١١ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦ ١٥٩٧ ١٥٩٨ ١٥٩٩ ١٦٠٠ ١٦٠١ ١٦٠٢ ١٦٠٣ ١٦٠٤ ١٦٠٥ ١٦٠٦ ١٦٠٧ ١٦٠٨ ١٦٠٩ ١٦١٠ ١٦١١ ١٦١٢ ١٦١٣ ١٦١٤ ١٦١٥ ١٦١٦ ١٦١٧ ١٦١٨ ١٦١٩ ١٦٢٠ ١٦٢١ ١٦٢٢ ١٦٢٣ ١٦٢٤ ١٦٢٥ ١٦٢٦ ١٦٢٧ ١٦٢٨ ١٦٢٩ ١٦٣٠ ١٦٣١ ١٦٣٢ ١٦٣٣ ١٦٣٤ ١٦٣٥ ١٦٣٦ ١٦٣٧ ١٦٣٨ ١٦٣٩ ١٦٤٠ ١٦٤١ ١٦٤٢ ١٦٤٣ ١٦٤٤ ١٦٤٥ ١٦٤٦ ١٦٤٧ ١٦٤٨ ١٦٤٩ ١٦٥٠ ١٦٥١ ١٦٥٢ ١٦٥٣ ١٦٥٤ ١٦٥٥ ١٦٥٦ ١٦٥٧ ١٦٥٨ ١٦٥٩ ١٦٦٠ ١٦٦١ ١٦٦٢ ١٦٦٣ ١٦٦٤ ١٦٦٥ ١٦٦٦ ١٦٦٧ ١٦٦٨ ١٦٦٩ ١٦٧٠ ١٦٧١ ١٦٧٢ ١٦٧٣ ١٦٧٤ ١٦٧٥ ١٦٧٦ ١٦٧٧ ١٦٧٨ ١٦٧٩ ١٦٨٠ ١٦٨١ ١٦٨٢ ١٦٨٣ ١٦٨٤ ١٦٨٥ ١٦٨٦ ١٦٨٧ ١٦٨٨ ١٦٨٩ ١٦٩٠ ١٦٩١ ١٦٩٢ ١٦٩٣ ١٦٩٤ ١٦٩٥ ١٦٩٦ ١٦٩٧ ١٦٩٨ ١٦٩٩ ١٧٠٠ ١٧٠١ ١٧٠٢ ١٧٠٣ ١٧٠٤ ١٧٠٥ ١٧٠٦ ١٧٠٧ ١٧٠٨ ١٧٠٩ ١٧١٠ ١٧١١ ١٧١٢ ١٧١٣ ١٧١٤ ١٧١٥ ١٧١٦ ١٧١٧ ١٧١٨ ١٧١٩ ١٧٢٠ ١٧٢١ ١٧٢٢ ١٧٢٣ ١٧٢٤ ١٧٢٥ ١٧٢٦ ١٧٢٧ ١٧٢٨ ١٧٢٩ ١٧٣٠ ١٧٣١ ١٧٣٢ ١٧٣٣ ١٧٣٤ ١٧٣٥ ١٧٣٦ ١٧٣٧ ١٧٣٨ ١٧٣٩ ١٧٤٠ ١٧٤١ ١٧٤٢ ١٧٤٣ ١٧٤٤ ١٧٤٥ ١٧٤٦ ١٧٤٧ ١٧٤٨ ١٧٤٩ ١٧٥٠ ١٧٥١ ١٧٥٢ ١٧٥٣ ١٧٥٤ ١٧٥٥ ١٧٥٦ ١٧٥٧ ١٧٥٨ ١٧٥٩ ١٧٦٠ ١٧٦١ ١٧٦٢ ١٧٦٣ ١٧٦٤ ١٧٦٥ ١٧٦٦ ١٧٦٧ ١٧٦٨ ١٧٦٩ ١٧٧٠ ١٧٧١ ١٧٧٢ ١٧٧٣ ١٧٧٤ ١٧٧٥ ١٧٧٦ ١٧٧٧ ١٧٧٨ ١٧٧٩ ١٧٨٠ ١٧٨١ ١٧٨٢ ١٧٨٣ ١٧٨٤ ١٧٨٥ ١٧٨٦ ١٧٨٧ ١٧٨٨ ١٧٨٩ ١٧٩٠ ١٧٩١ ١٧٩٢ ١٧٩٣ ١٧٩٤ ١٧٩٥ ١٧٩٦ ١٧٩٧ ١٧٩٨ ١٧٩٩ ١٨٠٠ ١٨٠١ ١٨٠٢ ١٨٠٣ ١٨٠٤ ١٨٠٥ ١٨٠٦ ١٨٠٧ ١٨٠٨ ١٨٠٩ ١٨١٠ ١٨١١ ١٨١٢ ١٨١٣ ١٨١٤ ١٨١٥ ١٨١٦ ١٨١٧ ١٨١٨ ١٨١٩ ١٨٢٠ ١٨٢١ ١٨٢٢ ١٨٢٣ ١٨٢٤ ١٨٢٥ ١٨٢٦ ١٨٢٧ ١٨٢٨ ١٨٢٩ ١٨٣٠ ١٨٣١ ١٨٣٢ ١٨٣٣ ١٨٣



كبر لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com


e-mail: info@qlabeg.com

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Ahmed
Sampling Date	19/09/2023
Sample Description	--
Source	مشون الأمل
Location	--
Level	--
Sample No	069-CRG- AAR - 19-09-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Sieve	Opening (mm)	% Retained	% Passing
3 in	75	0.0	100.0
2 in	50	0.0	100.0
1.5 in	37.5	0.5	99.5
1 in	25	1.1	98.9
3/4 in	19	2.1	97.9
1/2 in	12.5	4.0	96.0
3/8 in	9.5	5.5	94.5
No. 4	4.75	10.1	89.9
No. 10	2	18.1	81.9
No. 40	0.425	57.7	42.3
No. 200	0.075	88.9	11.1

Particle Size Distribution

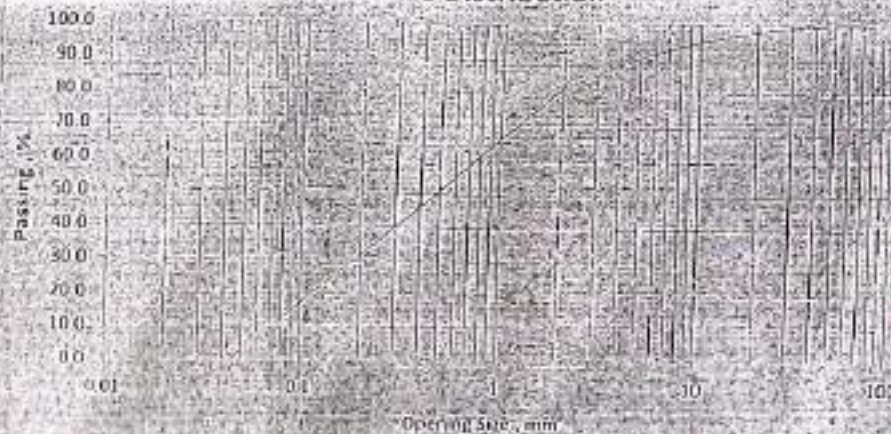

For QLab: Eng. Abdallah Hussien
Date of Report: 23-Sep-23
Form Number: QLab/Soil/01/ver.01

Signature:

Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils - ASTM D4318

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Ahmed
Sampling Date	19/09/2023
Sample Description	---
Source	مشون الأمل
Location	---
Level	---
Sample No	069-CRG- AAR - 19-09-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Plastic Limit :

Container No.	QL-PL-01	QL-PL-02	QL-PL-03	Average
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	22.09	24.74	22.39	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	20.80	23.10	21.20	
Mass of Container , M_3 (g)	14.80	16.00	15.80	
Water Content, w (%)	21.5	23.1	22.0	22.2

Liquid Limit :

Container No.	QL-LI-01	QL-LI-02	QL-LI-03	PL
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	35.51	42.50	39.60	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	33.80	39.40	37.20	
Mass of Container , M_3 (g)	28.40	29.00	28.60	
Water Content, w (%)	31.7	29.8	27.9	28.9
Number of Blows, N	14	21	29	



Plasticity Index ($U.I. = P.L.$) = 6.7

For QLab :

Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report :

23/Sept/23


Form Number :

QLab/Soil/01/ver.01

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	Ahmed
Sampling Date	19/09/2023
Sample Description	---
Source	مشون الأمل
Location	---
Level	---
Sample No	069-CRG- AAR - 19-09-2023
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Wet Density, gm/cm ³	2.093	2.182	2.242	2.259	2.265
Moisture Content, %	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Dry Density, gm/cm ³	2.052	2.098	2.115	2.092	2.059

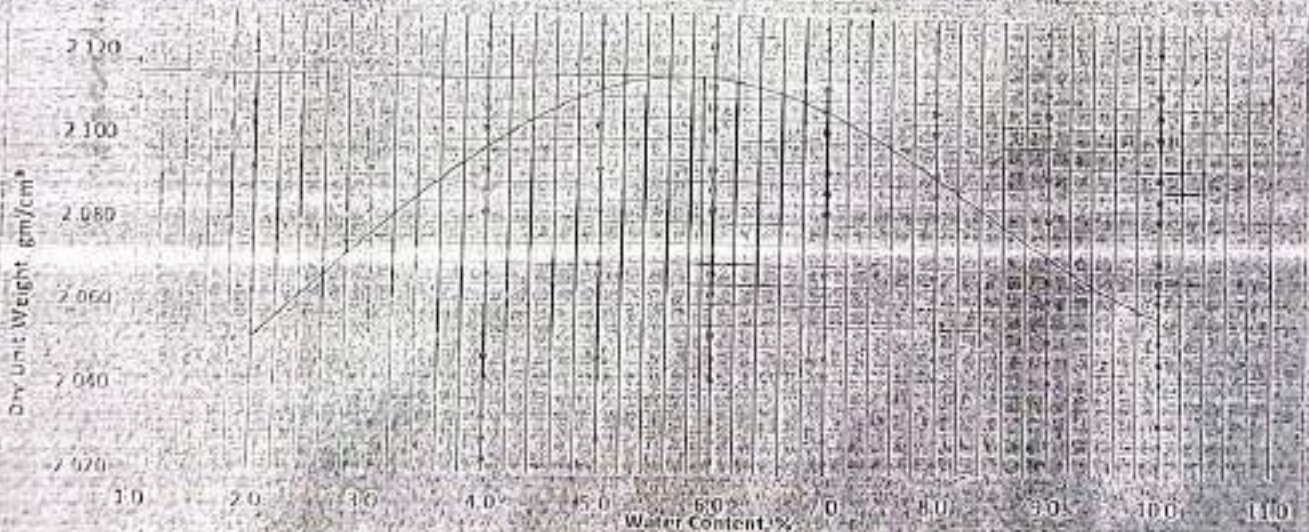

Optimum Water Content (Mod-wop) % = 5.9%

Optimum Dry Unit Weight (Mod-ydmax) gm/cm³ = 2.115 gm/cm³

Prepared by: Eng. Abdelrahman Gaber
 Checked by: Eng. Gaber
 Date: 19/09/2023

Signature:



California Bearing Ratio - ASTM D1883

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط مسكة حديد الروبيكي / بلعين	ASSHTO Classification:
Client	Ahmed Abd-El Rahman	A-2-4
Sampling Date	19-Sep-23	MDD: 2.115
Sample Description	Redish Soil	OMC: 5.9
Source	مشروع الأمان	
Location		
Level		
Sample No	069-CRG-AAR-19-9-2023	
Sampled by	Abdelrahman Mohamed	

Penetration		Dial Reading	Load		Stress
inch	mm		kN	lb	
0.000	0.00	0	0.00	0.0	0
0.025	0.64	98	0.96	215.60	72
0.050	1.27	185	1.81	407.0	136
0.075	1.91	271	2.66	596.20	199
0.100	2.54	379	3.72	833.8	278
0.125	3.18	482	4.73	1060.40	353
0.150	3.81	573	5.62	1260.6	420
0.175	4.45	683	6.70	1502.60	501
0.200	5.08	792	7.76	1742.4	581
0.300	7.62	1117	10.95	2457.40	819
0.400	10.16	1200	11.76	2640.0	880
0.500	12.70	1235	12.11	2717.00	906



CBR	Value %
@100% MDD	
0.1 inch	27.8
0.2 inch	38.7
Swelling	0

For QI ap/Abdullah Hussein

Date of Report 19-Sep-23

Project number QI ad/Soil/DH/Level III

Signature:

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٢ / ٩ / ١٩	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٤+٢٠٠ حتى المحطة ٤+٢٠٠

RB - RSCCE - GARBL - IR - MAT - (16)

برجاء التكرم باستلام الآتي : عينة صلاحية من الموقع (مثنون الأمال) بعد تحسينها بنسبة (٢ترية : ارمل)

نوع العمل	أعمال جودة	وصف العمل	عينة صلاحية
مكان العمل	4+200 : 8+200		
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

موقف الأعمال :	المسؤول
١- المعالجة الظاهرية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- الأعمال المتساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعالیه ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صور ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام

مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة :

مهندس الشركة :
الطعم

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

شركة أحمد عبد الرحمن
الاسم /
التوقيع
١٦٥٥٣١٦



كبو للصنعة الجوده

Tel: 01025808673


Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Particle Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis ASTM D6913

Project: إنشاء الجسر النوايس وطرق الخدمة لخطاتكة حدوة الروبيكن / بلبنين
Client: Ahmed
Sampling Date: 19/09/2023
Sample Description:
Source: مشون الايبان
Location:
Level:
Sample No: 070-CRG- AAR - 19-09-2023
Sampled by: Abdelrahman Gaber

Sieve	Opening (mm)	% Retained	% Passing
3 in	75	0.0	100.0
2 in	50	0.0	100.0
1.5 in	37.5	0.4	99.6
1 in	25	1.3	98.7
3/4 in	19	2.4	97.6
1/2 in	12.5	3.6	96.4
3/8 in	9.5	5.1	94.9
No. 4	4.75	10.9	89.1
No. 10	2	20.1	79.9
No. 40	0.425	53.4	46.6
No. 200	0.075	88.1	11.9

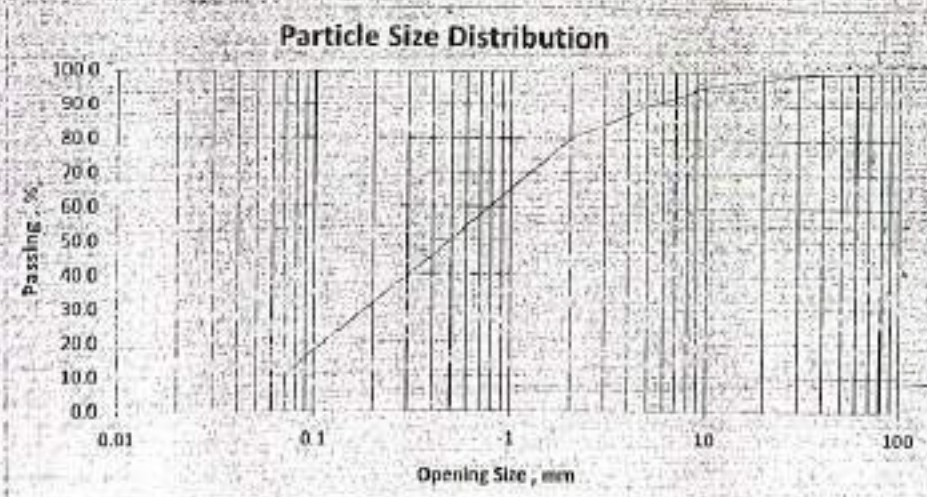

For QLab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 23-Sep-23

Form Number: QLab/Soll/01/ver.01

Signature:



كلية الهندسة - جامعة القاهرة

Tel: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils - ASTM D4318

Project: إنشاء الجسر البراسي و طرق الخدمة لخط متكة حديد الزوايلي / السيلين
Client: Ahmed
Sampling Date: 19/09/2023
Sample Description: ---
Source: مشون الامان
Location: ---
Level: ---
Sample No: 070-CRG-AAR-19-09-2023
Sampled by: Abdelrahman Gaber

Plastic Limit :

Container No.	Q1-PL-01	Q1-PL-02	Q1-PL-03	Average
Mass Moist Soil + Container, M_1 (g)	22.76	24.34	24.65	
Mass Dry Soil + Container, M_2 (g)	21.38	22.64	22.91	
Mass of Container, M_3 (g)	15.60	16.00	15.80	
Water Content, w, (%)	23.9	25.6	24.5	24.7

Liquid Limit :

Container No.	Q1-LL-01	Q1-LL-02	Q1-LL-03	LL
Mass Moist Soil + Container, M_1 (g)	43.96	46.05	41.81	
Mass Dry Soil + Container, M_2 (g)	40.10	41.60	38.71	
Mass of Container, M_3 (g)	29.00	28.00	28.60	
Water Content, w, (%)	34.8	32.7	30.7	32.6
Number of Blows, N	17	25	32	



Plasticity Index (L.L. - P.L.) = 8.0

For QLab :

Eng. Abdallah Hussien

Date of Report :

23-Sep-23

Form Number:

QLab/Soil/01/ver.01

Signature:



كبي لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Free Swelling for Soil Sample - ECP 202

Project : إنشاء الجسر القرائي وطريق الخلفاء للقطار حديد الزوابع / البليمن
Client : Ahmed
Sampling Date : 19/09/2023
Sample Description :
Source : مشون الامال
Location :
Level :
Sample No : 070-CRG-AAR - 19.09.2023
Sampled by : Abdelrahman Gaber

Test	Result	Project Spec
Free Swelling (%)	0.0	3.0% Max.

For QLab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 23-Sep-23

Form Number : QLab/Soil/01/ver.01

Signature:



كبيو لضبط الجودة

Tel: 01025808673

Website: www qlabeg com


e-mail: info@qlabeg com

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis

ASTM D6913

Project: إنشاء الحوض المرآتي و طرق / الخدات الخط سكة حديد إربيل / بليمن
Client: Ahmed
Sampling Date: 19/09/2023
Sample Description:
Source: مشيخ الامال
Location:
Level:
Sample No: 070-CRG-AAR-19-09-2023
Sampled by: Abdelrahman Gaber

Wet Density, gm/cm ³	2.068	2.170	2.234	2.257	2.265
Moisture Content, %	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Dry Density, gm/cm ³	2.027	2.086	2.108	2.090	2.059

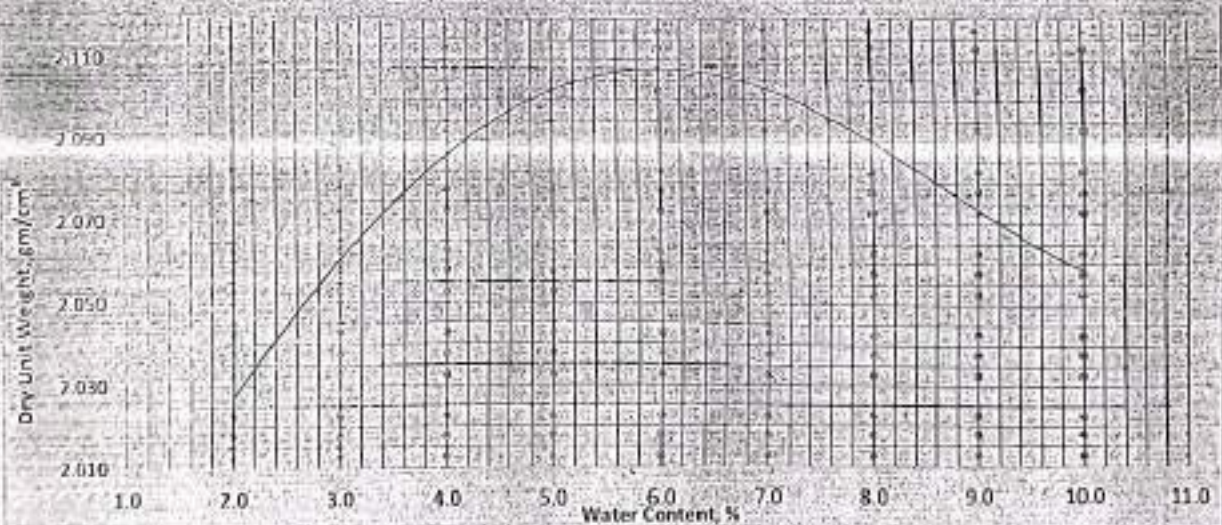

Optimum Water Content (Mod-wopt) % = 6%

Optimum Dry Unit Weight (Mod-ydmax) gm/cm³ = 2.108 gm/cm³

For Qlap: Eng. Abdallah Hussien
Date of Report: 23-Sep-23
Form Number: QLab/Soll/01/ver.01


Signature:



California Bearing Ratio- ASTM D1883

Project client:	مجلس القمار القرايى و طرق الخدمة لخطاسية جليله / اربيل / العراق	ASTM Classification:	A-24
Sampling Date:	19-Sep-23	MDD:	2108
Sample Description:	Redish Soil	OMC:	60
Source:	مستوى الامتال		
Location:			
Level:			
Sample No:	070-CRG-AAR-19-9-2023		
Sampled by:	Abdelrahman Mohamed		

Penetration		Dial Reading	Load		Stress
Inch	mm		kN	lb	
0.000	0.00	0	0.00	0.0	0
0.025	0.64	91	0.89	200.20	67
0.050	1.27	193	1.89	424.6	142
0.075	1.91	282	2.76	620.40	207
0.100	2.54	389	3.81	855.8	285
0.125	3.18	485	4.75	1067.00	356
0.150	3.81	573	5.62	1260.6	420
0.175	4.45	694	6.80	1526.80	509
0.200	5.08	796	7.80	1751.2	584
0.300	7.62	1125	11.03	2475.00	825
0.400	10.16	1193	11.70	2624.6	875
0.500	12.70	1227	12.03	2699.40	900

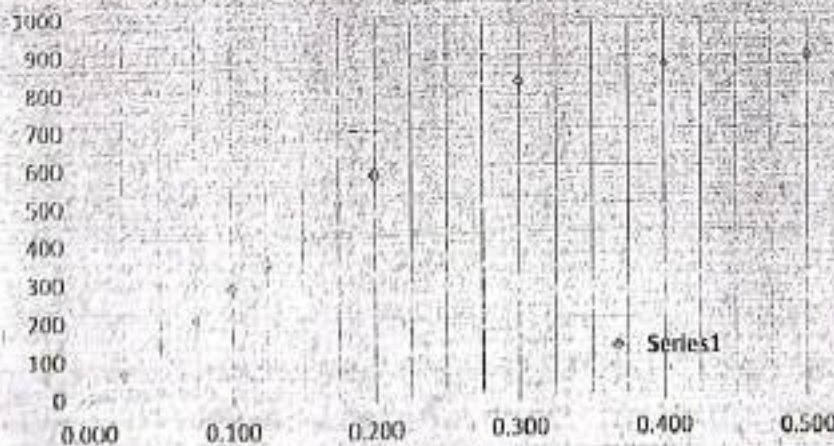

CBR	Value, %
@100% MDD	
0.1 inch	28.5
0.2 inch	38.9
Swelling	0

For QLab Abdallah Hussien

Date of Report : 27-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/01/ver.01

Signature:

Quc

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القراي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	2-Oct-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 8+020 To 8+140
Layer	Lower Embankment
Level	--
Sample No	AA/SC/136-139
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0	974.0	1070.0
	Weight of Water	(g)	23.0	24.0	24.0
	Weight of Dry Soil	(g)	477.0	476.0	477.0
	In-Place Water Content	(%)	4.8	5.0	5.0
Optimum Moisture Content		(%)	7.9	7.9	7.9
Level			-6.5	-6.5	-7
Station			8+030	8+060	8+090
Cone Ref.			4	3	4
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5820.0	4135.0	4695.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	5793.0	4108.0	4668.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	9500	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	4670.0	5240.0	5375.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1470.0	1429.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3901.0	2790.0	3196.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2618.1	1872.5	2145.0
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.213	2.194	2.176
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.111	2.089	2.072
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.115	2.115	2.115
	Degree of Compaction at Field*	(%)	99.8	98.8	98.0
Acceptance Criterion		(%)	95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 3-Oct-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الثرابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويداني / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	1-Oct-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الآمال
Location	From 7+760 To 7+840
Layer	Lower Embankment
Level	-4.5
Sample No	AA/SC/133-135
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0	974.0	1070.0		
Weight of Water	(g)	23.0	24.0	24.0		
Weight of Dry Soil	(g)	477.0	476.0	476.0		
In-Place Water Content	(%)	4.8	5.0	5.0		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		7+770	7+800	7+840		
Cone Ref.		1	3	3		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4160.0	4876.0	4513.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4133.0	4849.0	4486.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5780.0	5174.0	5500.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1470.0	1470.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2784.0	3356.0	3030.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	1868.5	2252.3	2033.6		
In-Place Wet-density	(g/cc)	2.212	2.153	2.206		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.110	2.050	2.100		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.115	2.115	2.115		
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.8	96.9	99.3		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report: 2-Oct-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القوسي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيلي / باهيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	27-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 7+440 To 7+500
Layer	Lower Embankment
Level	-2.5
Sample No	AA/SC/129-130
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	970.0		
Weight of Water	(g)	24.0	28.0		
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	472.0		
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.9		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9		

Station		7+450	7+470		
Cone Ref.		1	2		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4266.0	4935.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4239.0	4908.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5702.0	5233.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2862.0	3252.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	1920.8	2182.6		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.207	2.249		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.101	2.123		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.115	2.115		
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.3	100.4		
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 28-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Stamp:



كيفية ضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لقط سكة حديد الروبيكي / بنيس	
Client	شركة احمد عبدالرحمن	
Testing Date	27-Sep-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مشون الامال	
Location	From 6+680 To 6+760	Retest
Layer	Lower Embankment	
Level	-2.0	
Sample No	AA/SC/131-132	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Rel.		1	2		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0	
	Weight of Water	(g)	24.0	23.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0	
	In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8	
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	

Station		6+700	6+740		
Cone Ref.		1	2		
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4735.0	4285.0	
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	
	Weight of Wet Soil	(g)	4708.0	4258.0	
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5320.0	5507.0	
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3244.0	2978.0	
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	
	Gross Volume of Hole	(cc)	2177.2	1998.7	
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.162	2.130	
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.059	2.032	
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.115	2.115	
	Degree of Compaction at Field*	(%)	97.3	96.1	
Acceptance Criterion		(%)	95.0		

For Q Lab Pnp. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report : 28-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القروي طريق الكرامة لقرية الكرامة
Client	شركة احمد محمد احمد
Testing Date	26-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشروع الإسفلت
Location	From 6+680 To 6+760
Layer	Lower Embankment
Level	-2.0
Sample No.	AA/SC/127-128
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Con Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	978.0			
Weight of Water	(g)	21.0	20.0			
Weight of Dry Soil	(g)	479.0	480.0			
In-Place Water Content	(%)	4.4	4.2			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		6+700	6+740			
Con Ref.		3	4			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	3995.0	4090.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	3968.0	4063.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5600.0	5620.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1429.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2930.0	2951.0			
bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	1966.4	1980.5			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.018	2.051			
In-Place Dry density	(g/cc)	1.933	1.969			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.115	2.115			
Degree of Compaction at Field*	(%)	91.4	93.1			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdullah Hussein

Signature:

Stamp:

Date of Report: 27 Sep 23

Issue Number: Q Lab/SC/07/rev 01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لطبقة حديد الروبياني / بابوس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	26-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 8+020 To 8+140
Layer	Natural Ground
Level	ارض طبيعية
Sample No	AA/SC/124-126
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1072.0	977.0	1070.0		
Weight of Water	(g)	22.0	21.0	24.0		
Weight of Dry Soil	(g)	478.0	479.0	476.0		
In-Place Water Content	(%)	4.6	4.4	5.0		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		8+040	8+080	8+120		
Cone Ref.		3	4	4		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5170.0	5155.0	4800.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	5143.0	5128.0	4773.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4905.0	4930.0	5285.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1429.0	1429.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3625.0	3641.0	3286.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2432.9	2443.6	2205.4		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.114	2.099	2.164		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.021	2.010	2.060		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.115	2.115	2.115		
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.6	95.1	97.4		
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 27-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	بناء الجسر القوي و طرق القاهرة لاسكك حاد القوي و اسكك / اسكك
Client	شركة اتصالات
Testing Date	21-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مستوى الاسفل
Location	From 7+440 To 7+720
Layer	Lower Embankment
Level	-
Sample No	AA/SC/128-131
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		1	2	1	2	
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0	976.0	1070.0	975.0	
	Weight of Water	(g)	19.0	22.0	24.0	23.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	481.0	478.0	476.0	477.0	
	In-Place Water Content	(%)	4.0	4.6	5.0	4.8	
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9	

	Station		7+450	7+500	7+550	7+600	
Field Density	Cone Ref.		1	5	3	4	
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4460.0	4660.0	4270.0	4120.0	
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	
	Weight of Wet Soil	(g)	4433.0	4633.0	4243.0	4093.0	
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5485.0	5398.0	5575.0	5750.0	
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1348.0	1470.0	1429.0	
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3079.0	3254.0	2955.0	2821.0	
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	
	Gross Volume of Hole	(cc)	2066.4	2183.9	1983.2	1893.3	
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.145	2.121	2.139	2.162	
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.064	2.028	2.037	2.062	
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	2.082	
	Degree of Compaction at Field*	(%)	99.1	97.4	97.8	99.1	
	Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussein
Date of Report: 22-Sep-23
Exam / method: Q Lab Soil 007 ver 01

Signature:

Stamp:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لطريق حيد الروبيك / بليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	21-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 7+440 To 7+720
Layer	Lower Embankment
Level	—
Sample No	AA/SC/132-133
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0	977.0			
Weight of Water	(g)	19.0	21.0			
Weight of Dry Soil	(g)	481.0	479.0			
In-Place Water Content	(%)	4.0	4.4			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		7+650	7+700			
Cone Ref.		1	2			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4455.0	4490.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	4428.0	4463.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5480.0	5400.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1429.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3084.0	3171.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2069.8	2128.2			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.139	2.097			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.058	2.009			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082			
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.8	96.5			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report: 22-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	بناء الجسر الزراعي و طريق الكفاية لخط سكة حديد الزوابع / بالاس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	21-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الاسفل
Location	From 6+680 To 6+690
Layer	Lower Embankment
Level	-
Sample No	AA/SC/124-127
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0	1070.0	973.0
Weight of Water	(g)	24.0	23.0	24.0	25.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0	476.0	475.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8	5.0	5.3
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		6+500	6+550	6+600	6+650
Cone Ref.		2	3	2	4
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4456.0	4560.0	4265.0	4000.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4429.0	4533.0	4238.0	3973.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5450.0	5390.0	5570.0	5817.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0	1515.0	1429.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3035.0	3140.0	2915.0	2754.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2036.9	2107.4	1956.4	1848.3
In-Place Wet density	(g/cc)	2.174	2.151	2.166	2.150
In-Place Dry density	(g/cc)	2.070	2.052	2.062	2.042
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	2.082
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.4	98.6	99.1	98.1
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report: 22-Sep-23

Form Number: Q Lab/Soil 01/ ver 01

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بايس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	24-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 6+680 To 6+760
Layer	Natural Ground
Level	ارض طبيعية
Sample No	AA/SC/121-122
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	975.0		
Weight of Water	(g)	25.0	23.0		
Weight of Dry Soil	(g)	475.0	477.0		
In-Place Water Content	(%)	5.3	4.8		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9		

Station	6+700	6+750			
Cone Ref.	2	3			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4420.0	4190.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4393.0	4163.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5470.0	5555.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3015.0	2975.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2023.5	1996.6		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.171	2.085		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.062	1.989		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082		
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.1	95.5		
Acceptance Criterion	(%)		95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 25-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة للطبقة حديد الروبيلي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	24-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشروع الامال
Location	From 7+760 To 7+860
Layer	Natural Ground
Level	ارض طبيعية
Sample No	AA/SC/118-120
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	975.0	1070.0		
Weight of Water	(g)	25.0	23.0	24.0		
Weight of Dry Soil	(g)	475.0	477.0	476.0		
In-Place Water Content	(%)	5.3	4.8	5.0		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		7+780	7+810	7+840		
Cone Ref.		2	3	4		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4265.0	4760.0	5510.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4238.0	4733.0	5483.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5545.0	5255.0	4780.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0	1429.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2940.0	3275.0	3791.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	1973.2	2198.0	2544.3		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.148	2.153	2.155		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.040	2.054	2.052		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082		
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.0	98.7	98.5		
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 25-Sep-23

Form Number QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي وطول الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	23-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مخزون الامال
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Lower Embankment
Level	-0.5
Sample No	AA/SC/115
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.					
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0		
	Weight of Water	(g)	24.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	476.0		
	In-Place Water Content	(%)	5.0		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9		

Station					
5+380					
Cone Ref.					
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4605.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	4578.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5335.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3195.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2144.3		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.135		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.032		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.082		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	97.6		
	Acceptance Criterion	(%)	95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 24-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إشادة الجسر القراي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / باليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	23-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Lower Embankment
Level	-0.5
Sample No	AA/SC/115
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Moisture Content	Can Ref.	1			
	Weight of Container (g)	594.0			
	Weight of Container + Wet Soil (g)	1094.0			
	Weight of Container + Dry Soil (g)	1070.0			
	Weight of Water (g)	24.0			
	Weight of Dry Soil (g)	476.0			
	In-Place Water Content (%)	5.0			
	Optimum Moisture Content (%)	7.9			

Field Density	Station	5+380			
	Cone Ref.	3			
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	4605.0			
	Weight of Plastic Bag (g)	27.0			
	Weight of Wet Soil (g)	4578.0			
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	10000			
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone (g)	5335.0			
	Weight of Sand to Fill Cone (g)	1470.0			
	Weight of Sand to Fill Hole (g)	3195.0			
	Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490			
	Gross Volume of Hole (cc)	2144.3			
	In-Place Wet density (g/cc)	2.135			
	In-Place Dry density (g/cc)	2.032			
	Max. Dry Density (g/cc)	2.082			
	Degree of Compaction at Field* (%)	97.6			
	Acceptance Criterion (%)	95.0			

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report: 24-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة للطسفة حديد الروبيكي / باتيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	23-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Lower Embankment
Level	-0.5
Sample No	AA/SC/110-114
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0	1070.0	973.0	1069.0
Weight of Water	(g)	24.0	23.0	24.0	25.0	25.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0	476.0	475.0	475.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8	5.0	5.3	5.3
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+130	5+180	5+230	5+280	5+330
Cone Ref.		1	2	3	1	2
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4570.0	4920.0	4575.0	4330.0	4855.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4543.0	4893.0	4548.0	4303.0	4828.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5410.0	5115.0	5365.0	5530.0	5145.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1470.0	1436.0	1515.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3154.0	3370.0	3165.0	3034.0	3340.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2116.8	2261.7	2124.2	2036.2	2241.6
In-Place Wet density	(g/cc)	2.146	2.163	2.141	2.113	2.154
In-Place Dry density	(g/cc)	2.043	2.064	2.038	2.008	2.046
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.1	99.1	97.9	96.4	98.3
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 24-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الثنائي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	23-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Lower Embankment
Level	-0.5
Sample No	AA/SC/110-114
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0	1070.0	973.0	1069.0
Weight of Water	(g)	24.0	23.0	24.0	25.0	25.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0	476.0	475.0	475.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8	5.0	5.3	5.3
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+130	5+180	5+230	5+280	5+330
Cone Ref.		1	2	3	1	2
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4570.0	4920.0	4575.0	4330.0	4855.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4543.0	4893.0	4548.0	4303.0	4828.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5410.0	5115.0	5365.0	5530.0	5145.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1470.0	1436.0	1515.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3154.0	3370.0	3165.0	3034.0	3340.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2116.8	2261.7	2124.2	2036.2	2241.6
In-Place Wet density	(g/cc)	2.146	2.163	2.141	2.113	2.154
In-Place Dry density	(g/cc)	2.043	2.064	2.038	2.008	2.046
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.1	99.1	97.9	96.4	98.3
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussein

Date of Report: 24-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القراي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / باريس	
Client	شركة احمد عبدالرحمن	
Testing Date	23-Sep-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مشون الامال	
Location	From 5+800 To 5+880	
Layer	Natural Ground	استبدال
Level	-	
Sample No	AA/SC/116-117	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	973.0			
Weight of Water	(g)	24.0	25.0			
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	475.0			
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.3			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		5+820	5+860			
Cone Ref.		1	3			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4800.0	5360.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	4773.0	5333.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5300.0	4870.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3264.0	3660.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2190.6	2456.4			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.179	2.171			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.074	2.063			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082			
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.6	99.1			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 24-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الثرابي و طرق الخدمة للطريق حديد الروبيكي / باليس	
Client	شركة احمد عبدالرحمن	
Testing Date	23-Sep-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مشروع الامال	
Location	From 5+800 To 5+880	
Layer	Natural Ground	استعمال
Level	—	
Sample No	AA/SC/H16-117	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

	Can Ref.		1	2		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	973.0		
	Weight of Water	(g)	24.0	25.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	476.0	475.0		
	In-Place Water Content	(%)	5.0	5.3		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9		

	Station		5+820	5+860		
	Cone Ref.		1	3		
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4800.0	5360.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	4773.0	5333.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5300.0	4870.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1470.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3264.0	3660.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2190.6	2456.4		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.179	2.171		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.074	2.063		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	99.6	99.1		
	Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 24-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	تشييد الجسر على نهر النيل طريق القاهرة - الأقصر
Client	شركة الهندسة المعمارية
Testing Date	24-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشروع الإسفلت
Location	From 7+760 To 7+860
Layer	Natural Ground
Level	ارض طبيعية
Sample No	AA/SC/118-120
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Cone Ref.		1	2	3		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	975.0	1070.0	
	Weight of Water	(g)	25.0	23.0	24.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	475.0	477.0	476.0	
	In-Place Water Content	(%)	5.3	4.8	5.0	
Optimum Moisture Content		(%)	7.9	7.9	7.9	

Station		7+780	7+810	7+840		
Cone Ref.		2	3	4		
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4265.0	4760.0	5510.0	
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	
	Weight of Wet Soil	(g)	4238.0	4733.0	5483.0	
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5545.0	5255.0	4780.0	
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0	1429.0	
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2940.0	3275.0	3791.0	
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	
	Gross Volume of Hole	(cc)	1973.2	2198.0	2544.3	
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.148	2.153	2.155	
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.040	2.054	2.052	
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	
	Degree of Compaction at Field*	(%)	98.0	98.7	98.5	
Acceptance Criterion		(%)	95.0			

Prepared by: Eng. Abdelhadi Hossain

Signature:

Date of Report: 25-Sep-23

Revision: QLab/Soil/07-ver 01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القراي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / بليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	24-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 6+680 To 6+760
Layer	Natural Ground
Level	ارض طبيعية
Sample No	AA/SC/121-122
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	975.0			
Weight of Water	(g)	25.0	23.0			
Weight of Dry Soil	(g)	475.0	477.0			
In-Place Water Content	(%)	5.3	4.8			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		6+700	6+750			
Cone Ref.		2	3			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4420.0	4190.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	4393.0	4163.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5470.0	5555.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3015.0	2975.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	2023.5	1996.6			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.171	2.085			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.062	1.989			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082			
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.1	95.5			
Acceptance Criterion	(%)		95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 25-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	شركة أحمد عبدالرحمن
Testing Date	3-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+640 To 4+780
Layer	Upper Embankment
Level	-1.25
Sample No	AA/SC/051-053
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0	1071.0		
Weight of Water	(g)	24.0	23.0	23.0		
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0	477.0		
In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8	4.8		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		4+680	4+720	4+760		
Cone Ref.		4	5	4		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5500.0	5182.0	5672.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	5473.0	5155.0	5645.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4730.0	4963.0	4650.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1348.0	1429.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3841.0	3689.0	3921.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2577.9	2475.8	2631.5		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.123	2.082	2.145		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.021	1.986	2.046		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081		
Degree of Compaction at Field*	(%)	97.1	95.5	98.3		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 4-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / باويس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	10-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+400 To 5+640
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0 - 0.75
Sample No	AA/SC/073-075
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		1	2	1	
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	977.0	1074.0	
	Weight of Water	(g)	21.0	21.0	20.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	479.0	479.0	480.0	
	In-Place Water Content	(%)	4.4	4.4	4.2	
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	

	Station		5+550	5+590	5+630	
Field Density	Cone Ref.		2	2	1	
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6400.0	4475.0	4748.0	
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	
	Weight of Wet Soil	(g)	6373.0	4448.0	4721.0	
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	9000	
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	3932.0	5358.0	4174.0	
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1515.0	1436.0	
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4553.0	3127.0	3390.0	
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	
	Gross Volume of Hole	(cc)	3055.7	2098.7	2275.2	
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.086	2.119	2.075	
	In-Place Dry density	(g/cc)	1.998	2.030	1.992	
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	
	Degree of Compaction at Field*	(%)	96.0	97.6	95.7	
	Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussen

Signature:

Stamp:

Date of Report : 11-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسور القريب و طرق الخدمة للطرق حديد الربيكي / باليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	10-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+400 To 5+640
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0 - 0.75
Sample No	AA/SC/073-075
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		1	2	1		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	977.0	1074.0		
	Weight of Water	(g)	21.0	21.0	20.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	479.0	479.0	480.0		
	In-Place Water Content	(%)	4.4	4.4	4.2		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

	Station		5+550	5+590	5+630		
Field Density	Cone Ref.		2	2	1		
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6400.0	4475.0	4748.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	6373.0	4448.0	4721.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	9000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	3932.0	5358.0	4174.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1515.0	1436.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4553.0	3127.0	3390.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	3055.7	2098.7	2275.2		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.086	2.119	2.075		
	In-Place Dry density	(g/cc)	1.998	2.030	1.992		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	96.0	97.6	95.7		
	Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report: 11-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة للطبقة حديد الروبيكي / باهيس
Client	شركة أحمد عبدالرحمن
Testing Date	10-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشتون المحمود
Location	From 5+400 To 5+640
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0 - 0.75
Sample No	AA/SC/073-075
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	977.0	1074.0		
Weight of Water	(g)	21.0	21.0	20.0		
Weight of Dry Soil	(g)	479.0	479.0	480.0		
In-Place Water Content	(%)	4.4	4.4	4.2		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		5+550	5+590	5+630		
Cone Ref.		2	2	1		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6400.0	4475.0	4748.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	6373.0	4448.0	4721.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	9000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	3932.0	5358.0	4174.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1515.0	1436.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4553.0	3127.0	3390.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	3055.7	2098.7	2275.2		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.086	2.119	2.075		
In-Place Dry density	(g/cc)	1.998	2.030	1.992		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081		
Degree of Compaction at Field*	(%)	96.0	97.6	95.7		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien
Date of Report : 11-Sep-23
Form Number : QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القريب و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / باريس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	30-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+400 To 5+600
Layer	Upper Embankment
Level	-1.25
Sample No	AA/SC/042-046
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1065.0	971.0	1065.0	970.0
Weight of Water	(g)	29.0	27.0	29.0	28.0
Weight of Dry Soil	(g)	471.0	473.0	471.0	472.0
In-Place Water Content	(%)	6.2	5.7	6.2	5.9
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station	5+480	5+440	5+520	5+560	5+600	
Cone Ref.	2	4	4	2	2	
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	4747.0	4901.0	4748.0	4441.0	4959.0
	Weight of Plastic Bag (g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil (g)	4720.0	4874.0	4721.0	4414.0	4932.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	10000	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle +Cone (g)	5264.0	5197.0	5283.0	5378.0	4924.0
	Weight of Sand to Fill Cone (g)	1515.0	1429.0	1429.0	1515.0	1515.0
	Weight of Sand to Fill Hole (g)	3221.0	3374.0	3288.0	3107.0	3561.0
	Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole (cc)	2161.7	2264.4	2206.7	2085.2	2389.9
	In-Place Wet density (g/cc)	2.183	2.152	2.139	2.117	2.064
	In-Place Dry density (g/cc)	2.057	2.036	2.015	1.998	1.977
	Max. Dry Density (g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
	Degree of Compaction at Field* (%)	98.8	97.8	96.8	96.0	95.0
Acceptance Criterion (%)	95.0					

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 31-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إشاد الجسر القرائي و طرق الخدمة لخط سكة حديد القروبي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	29-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	ارض طبيعية
Location	From 5+600 To 5+800
Layer	Upper Embankment
Level	-2.5
Sample No	AA/SC/37-41
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		1	2	1	2	1
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0	971.0	1070.0	979.0	1072.0
	Weight of Water	(g)	19.0	27.0	24.0	19.0	22.0
	Weight of Dry Soil	(g)	481.0	473.0	476.0	481.0	478.0
	In-Place Water Content	(%)	4.0	5.7	5.0	4.0	4.6
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9

			5+610	5+660	5+710	5+760	5+800
Field Density	Cone Ref.		1	2	3	4	5
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5082.0	5920.0	6438.0	5567.0	5216.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	5055.0	5893.0	6411.0	5540.0	5189.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4920.0	4290.0	3965.0	4569.0	4809.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1470.0	1429.0	1470.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3644.0	4195.0	4565.0	4002.0	3721.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2445.6	2815.4	3063.8	2685.9	2497.3
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.067	2.093	2.093	2.063	2.078
	In-Place Dry density	(g/cc)	1.988	1.980	1.992	1.984	1.986
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
	Degree of Compaction at Field*	(%)	95.6	95.2	95.7	95.4	95.5
	Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 30-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:





مركز اختبار الجيوتقني
مركز اختبار الجيوتقني

Tel : 01025809673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق القامة لخط سكة حديد الزمامي / باليس
Client	شركة احمد الجليل حسن
Testing Date	20-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مخزون المصروف
Location	From 4+200 To 4+600
Layer	Ferns
Level	0.0
Sample No	AA/SC/018-022
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1065.0	970.0	1063.0	975.0	1069.0
Weight of Water	(g)	29.0	28.0	31.0	23.0	25.0
Weight of Dry Soil	(g)	471.0	472.0	469.0	477.0	475.0
In-Place Water Content	(%)	6.2	5.9	6.6	4.8	5.3
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		4+220	4+270	4+320	4+370	4+420
Cone Ref.		3	5	3	5	3
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5145.0	4990.0	5335.0	4515.0	5025.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	5118.0	4963.0	5308.0	4488.0	4998.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5030.0	5280.0	4940.0	5450.0	4990.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1348.0	1470.0	1348.0	1470.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3500.0	3372.0	3590.0	3202.0	3540.0
bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2349.0	2263.1	2409.4	2149.0	2375.8
In-Place Wet density	(g/cc)	2.179	2.193	2.203	2.088	2.104
In-Place Dry density	(g/cc)	2.052	2.070	2.066	1.992	1.998
Max Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.6	99.5	99.3	95.7	96.0
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

Tested by: Eng. Abdallah Hussein

Signature:

Date of Report: 21-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/rev 01



Field Density Test AASHTO T-191 ASTM D-1556

Project	إشغال البحر الأحمر - طريق الدمام للطريق الجديد (4-1-1)
Client	مؤسسة ركن
Testing Date	20-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مخبر معمور
Location	From 4+200 To 4+600
Layer	Fill
Depth	0.0
Specimen	ASTM D-1556 S-022

Station	4+200	4+300	4+400	4+500	4+600
Wet Density (g/cc)	2.179	2.193	2.203	2.088	2.104
Wet Density (g/cc)	2.052	2.070	2.060	1.992	1.998
Dry Density (g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
Compaction (%)	98.6	99.5	98.3	95.7	96.0

Weight of Wet Soil (g)	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0
Weight of Dry Soil (g)	3280.0	3440.0	3450.0	3200.0	3200.0
Weight of Sand (g)	1140.0	1048.0	1070.0	1060.0	1060.0
Weight of Sand (g)	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0	3500.0
Wet Density (g/cc)	2.179	2.193	2.203	2.088	2.104
Volume of Sample (cc)	2349.0	2269.4	2409.4	2149.0	2379.8
Wet Density (g/cc)	2.179	2.193	2.203	2.088	2.104
Wet Density (g/cc)	2.052	2.070	2.060	1.992	1.998
Dry Density (g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
Compaction (%)	98.6	99.5	98.3	95.7	96.0

Station	4+200	4+300	4+400	4+500	4+600
Wet Density (g/cc)	2.179	2.193	2.203	2.088	2.104
Wet Density (g/cc)	2.052	2.070	2.060	1.992	1.998
Dry Density (g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
Compaction (%)	98.6	99.5	98.3	95.7	96.0



Tel.: 01025808673
Website: www.qlabeg.com
e-mail: info@qlabeg.com
تيل: 01025808673
Website: www.qlabeg.com
e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	20-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+200 To 4+600
Layer	Ferma
Level	0.0
Sample No	AA/SC/018-022
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		1	2	1	2	1
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1065.0	970.0	1063.0	975.0	1069.0
	Weight of Water	(g)	29.0	28.0	31.0	23.0	25.0
	Weight of Dry Soil	(g)	471.0	472.0	469.0	477.0	475.0
	In-Place Water Content	(%)	6.2	5.9	6.6	4.8	5.3
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		4+220	4+270	4+320	4+370	4+420	
Cone Ref.		3	5	3	5	3	
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5145.0	4990.0	5335.0	4515.0	5025.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	5118.0	4963.0	5308.0	4488.0	4998.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5030.0	5280.0	4940.0	5450.0	4990.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1348.0	1470.0	1348.0	1470.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3500.0	3372.0	3590.0	3202.0	3540.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2349.0	2263.1	2409.4	2149.0	2375.8
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.179	2.193	2.203	2.088	2.104
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.052	2.070	2.066	1.992	1.998
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
	Degree of Compaction at Field*	(%)	98.6	99.5	99.3	95.7	96.0
	Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien
Date of Report: 21-Aug-23
Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر النرابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بايس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	4-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+200 To 5+400
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0
Sample No	AA/SC/056-059
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	970.0	1072.0	971.0
Weight of Water	(g)	24.0	28.0	22.0	27.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	472.0	478.0	473.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.9	4.6	5.7
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+390	5+340	5+290	5+240
Cone Ref.		1	2	5	3
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4075.0	4680.0	4570.0	3420.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4048.0	4653.0	4543.0	3393.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5680.0	5335.0	5410.0	6175.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1515.0	1348.0	1470.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2850.0	3150.0	3242.0	2355.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	1912.8	2114.1	2175.8	1580.5
In-Place Wet density	(g/cc)	2.116	2.201	2.088	2.147
In-Place Dry density	(g/cc)	2.015	2.078	1.996	2.031
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081
Degree of Compaction at Field*	(%)	96.8	99.8	95.9	97.6
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 5-Sep-23

Form Number: Qf.ab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بنيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	5-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0
Sample No	AA/SC/060-061
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1066.0	970.0			
Weight of Water	(g)	28.0	28.0			
Weight of Dry Soil	(g)	472.0	472.0			
In-Place Water Content	(%)	5.9	5.9			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		5+140	5+180			
Cone Ref.		2	1			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	3490.0	4350.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	3463.0	4323.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	9500			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	6115.0	5115.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1436.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2370.0	2949.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	1590.6	1979.2			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.177	2.184			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.055	2.062			
Max Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081			
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.8	99.1			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

To: Q Lab

Eng. Abdallah Hussein

Signature:

Date of Report

6-Sep-23

Form Number

QLab/Soil/007/ver 01





نيو تخطيط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الشراي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / بليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	4-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+680 To 4+780
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0
Sample No	AA/SC/054-055
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.			1	2			
Moisture Content	Weight of Container	(g)		594.0	498.0			
	Weight of Container + Wet Soil	(g)		1094.0	998.0			
	Weight of Container + Dry Soil	(g)		1072.0	970.0			
	Weight of Water	(g)		22.0	28.0			
	Weight of Dry Soil	(g)		478.0	472.0			
	In-Place Water Content	(%)		4.6	5.9			
	Optimum Moisture Content	(%)		7.9	7.9			

Field Density	Station		4+700	4+750		
	Cone Ref.		2	3		
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4150.0	4940.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	4123.0	4913.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5530.0	5145.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2955.0	3385.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	1983.2	2271.8		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.079	2.163		
	In-Place Dry density	(g/cc)	1.987	2.041		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081		
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.5	98.1			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 5-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي وطرق الخدمة لخط مكة حديد القويكي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	7-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	استبدال ارض طبيعية
Location	From 5+800 To 5+880
Layer	Upper Embankment
Level	-2.0
Sample No	AA/SC/068-069
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0			
Weight of Water	(g)	24.0	23.0			
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0			
In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		5+820	5+870			
Cone Ref.		1	2			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6630.0	5250.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	6603.0	5223.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	3850.0	4750.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4714.0	3735.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	3163.8	2506.7			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.087	2.084			
In-Place Dry density	(g/cc)	1.987	1.988			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081			
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.5	95.5			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 8-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Stamp:

[Signature]



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إشاد الجسر الترابي و طرق الخدمة لطبقة حديد الروبيكي / باليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	16-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشروع الامال
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Upper Embankment
Level	-0.75
Sample No	AA/SC/091-094
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	970.0	1069.0	971.0
Weight of Water	(g)	24.0	28.0	25.0	27.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	472.0	475.0	473.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.9	5.3	5.7
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+125	5+175	5+225	5+275
Cone Ref.		2	3	2	3
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4550.0	4595.0	4207.0	3903.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4523.0	4568.0	4180.0	3876.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5365.0	5412.0	5603.0	5823.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0	1515.0	1470.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3120.0	3118.0	2882.0	2707.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2094.0	2092.6	1934.2	1816.8
In-Place Wet density	(g/cc)	2.160	2.183	2.161	2.133
In-Place Dry density	(g/cc)	2.056	2.061	2.053	2.018
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	2.082
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.8	99.0	98.6	96.9
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report: 17-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:

2023
17/09/23
Abdallah Hussien



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكن / بلينس	
Client	شركة احمد عبدالرحمن	
Testing Date	16-Sep-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مشون الامال	
Location	From 5+100 To 5+400	
Layer	Upper Embankment	
Level	-0.75	
Sample No	AA/SC/095-096	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	970.0			
Weight of Water	(g)	24.0	28.0			
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	472.0			
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.9			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		5+325	5+375			
Cone Ref.		2	3			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4174.0	4092.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	4147.0	4065.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5637.0	5724.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2848.0	2806.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	1911.4	1883.2			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.170	2.159			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.065	2.038			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082			
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.2	97.9			
Acceptance Criterion	(%)		95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 17-Sep-23

Form Number : QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:



كيو لضبط الجودة

Tel: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

E-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إشاد الطرق القوية والخرق العامة للطرق الجديدة
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	18-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مخزون الامال
Location	From 5+400 To 5+640
Layer	Upper Embankment
Level	-0.75
Sample No	AA/SC/101-105
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		Station				
			5+425	5+475	5+525	5+575	5+625
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0	974.0	1070.0	975.0	1069.0
	Weight of Water	(g)	23.0	24.0	24.0	23.0	25.0
	Weight of Dry Soil	(g)	477.0	476.0	476.0	477.0	475.0
	In-Place Water Content	(%)	4.8	5.0	5.0	4.8	5.3
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9

	Station		Cone Ref.				
			1	4	5	1	5
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4085.0	5035.0	4145.0	5705.0	4245.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	4058.0	5008.0	4118.0	5678.0	4218.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5698.0	5085.0	5840.0	4580.0	5660.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1429.0	1348.0	1429.0	1348.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2866.0	3486.0	2812.0	3991.0	2992.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	1923.5	2339.6	1887.2	2678.5	2008.1
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.110	2.141	2.182	2.120	2.101
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.013	2.038	2.077	2.022	1.996
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	2.082	2.082
	Degree of Compaction at Field*	(%)	96.7	97.9	99.8	97.1	95.8
	Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 19-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:





كيو لابت الجوده

Tel: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

email: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191- ASTM D-1556

Project	مشاريع الطرق القومية (قناة السويس)
Client	شركة اميد عبدالرحمن
Testing Date	19-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشروع العمار
Location	From 4+600 To 4+780
Layer	Ferma
Level	0.0
Sample No	AA/SC/106-109
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		1	2	1	2
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	970.0	1070.0	969.0
Content	Weight of Water	(g)	25.0	28.0	24.0	29.0
	Weight of Dry Soil	(g)	475.0	472.0	476.0	471.0
	In-Place Water Content	(%)	5.3	5.9	5.0	6.2
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9


	Station		4+620	4+670	4+720	4+760
Field Density	Can Ref.		1	2	3	4
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5350.0	3962.0	4786.0	4391.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	5323.0	3935.0	4759.0	4364.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4900.0	5827.0	5355.0	5650.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1470.0	1429.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3664.0	2658.0	3175.0	2921.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2459.1	1783.9	2130.9	1960.4
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.165	2.206	2.233	2.226
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.056	2.082	2.126	2.097
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.155	2.155	2.155	2.155
	Degree of Compaction at Field*	(%)	95.4	96.6	98.7	97.3
	Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 20-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القريب و طريق القلعة لخط متعة جديد الزوبيكي / نابلس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	17-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشروع العمار
Location	From 4+620 To 4+800
Layer	Ferma
Level	-0.25
Sample No	AA/SC/097-100
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2	3	4
Weight of Container	(g) 594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g) 1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g) 1070.0	973.0	1070.0	975.0
Weight of Water	(g) 24.0	25.0	24.0	23.0
Weight of Dry Soil	(g) 476.0	475.0	476.0	477.0
In-Place Water Content	(%) 5.0	5.3	5.0	4.8
Optimum Moisture Content	(%) 7.9	7.9	7.9	7.9

Station	4+640	4+690	4+740	4+790
Conc. Ref.				
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g) 4178.0	5274.0	4475.0	4226.0
Weight of Plastic Bag	(g) 27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g) 4151.0	5247.0	4448.0	4199.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g) 10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g) 5710.0	4976.0	5580.0	5778.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g) 1470.0	1429.0	1436.0	1348.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g) 2820.0	3595.0	2984.0	2874.0
Bulk Density of Sand	(g/cc) 1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc) 1892.6	2412.8	2002.7	1928.9
In-Place Wet density	(g/cc) 2.193	2.175	2.221	2.177
In-Place Dry density	(g/cc) 2.088	2.066	2.114	2.077
Max. Dry Density	(g/cc) 2.155	2.155	2.155	2.155
Degree of Compaction at Field*	(%) 96.9	95.9	98.1	96.4
Acceptance Criterion	(%)	95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 18-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	28-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مئون المحفود
Location	From 5+100 To 5+260
Layer	Upper Embankment
Level	-1.25
Sample No	AA/SC/33-36
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		1	2	1	2
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1065.0	971.0	1070.0	970.0
	Weight of Water	(g)	29.0	27.0	24.0	28.0
	Weight of Dry Soil	(g)	471.0	473.0	476.0	472.0
	In-Place Water Content	(%)	6.2	5.7	5.0	5.9
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+240	5+200	5+160	5+120
Cone Ref.		2	3	3	2
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	5635.0	5180.0	5860.0	4180.0
	Weight of Plastic Bag (g)	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil (g)	5608.0	5153.0	5833.0	4153.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	10000	10000	9500	9500
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone (g)	4610.0	4960.0	3855.0	5065.0
	Weight of Sand to Fill Cone (g)	1515.0	1470.0	1470.0	1515.0
	Weight of Sand to Fill Hole (g)	3875.0	3570.0	4175.0	2920.0
	Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole (cc)	2600.7	2396.0	2802.0	1959.7
	In-Place Wet density (g/cc)	2.156	2.151	2.082	2.119
	In-Place Dry density (g/cc)	2.031	2.035	1.982	2.000
	Max. Dry Density (g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081
	Degree of Compaction at Field* (%)	97.6	97.8	95.2	96.1
Acceptance Criterion (%)			95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 29-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طريق الخدمة للطريق الجديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	23-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	طبقة استبدال
Location	From 5+240 To 5+400
Layer	Upper Embankment
Level	-1.25
Sample No	AA/SC/029-031
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2	3	4
Weight of Container	(g) 594.0	498.0	594.0	
Weight of Container + Wet Soil	(g) 1094.0	998.0	1094.0	
Weight of Container + Dry Soil	(g) 1075.0	975.0	1073.0	
Weight of Water	(g) 19.0	23.0	21.0	
Weight of Dry Soil	(g) 481.0	477.0	479.0	
In-Place Water Content	(%) 4.0	4.8	4.4	
Optimum Moisture Content	(%) 7.9	7.9	7.9	

Station	5+270	5+320	5+370	5+420
Cone Ref.	1	5	1	
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g) 5410.0	4670.0	4680.0	
Weight of Plastic Bag	(g) 27.0	27.0	27.0	
Weight of Wet Soil	(g) 5383.0	4643.0	4653.0	
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g) 9500	9500	9500	
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g) 4230.0	4835.0	4800.0	
Weight of Sand to Fill Cone	(g) 1436.0	1348.0	1436.0	
Weight of Sand to Fill Hole	(g) 3834.0	3317.0	3264.0	
Bulk Density of Sand	(g/cc) 1.490	1.490	1.490	
Gross Volume of Hole	(cc) 2573.2	2226.2	2190.6	
In-Place Wet density	(g/cc) 2.092	2.086	2.124	
In-Place Dry density	(g/cc) 2.012	1.990	2.035	
Max. Dry Density	(g/cc) 2.081	2.081	2.081	
Degree of Compaction at Field*	(%) 96.7	95.6	97.8	
Acceptance Criterion	(%)		95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 24-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة للطريق حديد الرويني / بابيس
Client	شركة أحمد عبدالرحمن
Testing Date	23-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	أرض طبيعية
Location	From 5+400 To 5+600
Layer	Upper Embankment
Level	-1.5
Sample No	AA/SC/025-028
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1066.0	975.0	1072.0	970.0
Weight of Water	(g)	28.0	23.0	22.0	28.0
Weight of Dry Soil	(g)	472.0	477.0	478.0	472.0
In-Place Water Content	(%)	5.9	4.8	4.6	5.9
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station					
Cone Ref.		1	5	1	5
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5210.0	5375.0	4546.0	5245.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	5183.0	5348.0	4519.0	5218.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	8500
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5005.0	4835.0	5460.0	3595.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1348.0	1436.0	1348.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3559.0	3817.0	3104.0	3557.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2388.6	2561.7	2083.2	2387.2
In-Place Wet density	(g/cc)	2.170	2.088	2.169	2.186
In-Place Dry density	(g/cc)	2.048	1.992	2.074	2.063
Max. Dry Density	(g/cc)	2.089	2.089	2.089	2.089
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.1	95.3	99.3	98.8
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien
Date of Report : 24-Aug-23
Form Number: Ql.ab/Soil/07/ver.01

Signature:



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / بابوس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	3-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+640 To 4+780
Layer	Upper Embankment
Level	-1.25
Sample No	AA/SC/051-053
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0	1071.0		
Weight of Water	(g)	24.0	23.0	23.0		
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0	477.0		
In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8	4.8		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		4+680	4+720	4+760		
Cone Ref.		4	5	4		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5500.0	5182.0	5672.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	5473.0	5155.0	5645.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	4730.0	4963.0	4650.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1348.0	1429.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3841.0	3689.0	3921.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2577.9	2475.8	2631.5		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.123	2.082	2.145		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.021	1.986	2.046		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081		
Degree of Compaction at Field*	(%)	97.1	95.5	98.3		
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 4-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة على مساحة 200 متر مربع الروماني / باليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	10-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+400 To 5+640
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0 - 0.75
Sample No	AA/SC/073-075
Sampled by	Abdelrahman Gaber

	Can Ref.		1	2	1		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	977.0	1074.0		
	Weight of Water	(g)	21.0	21.0	20.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	479.0	479.0	480.0		
	In-Place Water Content	(%)	4.4	4.4	4.2		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

	Station		5+550	5+590	5+630		
Field Density	Cone Ref.		2	2	1		
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6400.0	4475.0	4748.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	6373.0	4448.0	4721.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	9000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	3932.0	5358.0	4174.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1515.0	1436.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4553.0	3127.0	3390.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	3055.7	2098.7	2275.2		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.086	2.119	2.075		
	In-Place Dry density	(g/cc)	1.998	2.030	1.992		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	96.0	97.6	95.7		
	Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab: Eng. Abdullah Hussein

Signature:

Stamp:

Date of Report: 11-Sep-23

Form Number: QLab/SC/073/01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	10-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+400 To 5+640
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0
Sample No	AA/SC/070-072
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0	977.0	1075.0	
	Weight of Water	(g)	19.0	21.0	19.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	481.0	479.0	481.0	
	In-Place Water Content	(%)	4.0	4.4	4.0	
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	

Station		5+470	5+430	5+510		
Cone Ref.		1	2	1		
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4758.0	4190.0	4437.0	
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	
	Weight of Wet Soil	(g)	4731.0	4163.0	4410.0	
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	9500	
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5159.0	5485.0	4872.0	
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1436.0	
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3405.0	3000.0	3192.0	
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	
	Gross Volume of Hole	(cc)	2285.2	2013.4	2142.3	
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.070	2.068	2.059	
	In-Place Dry density	(g/cc)	1.992	1.981	1.980	
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	
	Degree of Compaction at Field*	(%)	95.7	95.2	95.2	
	Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report: 11-Sep-23

Form Number: Q Lab/Soil/07/ver.01

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة للطريق الحدودي / بابوس
Client	شركة أحمد عبدالرحمن
Testing Date	11-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+700 To 5+820
Layer	Upper Embankment
Level	-2.0
Sample No	AA/SC/076-078
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2	1		
Weight of Container (g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil (g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil (g)	1070.0	974.0	1068.0		
Weight of Water (g)	24.0	24.0	26.0		
Weight of Dry Soil (g)	476.0	476.0	474.0		
In-Place Water Content (%)	5.0	5.0	5.5		
Optimum Moisture Content (%)	7.9	7.9	7.9		

Station	5+720	5+760	5+800		
Cone Ref.	2	5	2		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	3980.0	3865.0	4284.0		
Weight of Plastic Bag (g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil (g)	3953.0	3838.0	4257.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	9700	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone (g)	5370.0	5927.0	5580.0		
Weight of Sand to Fill Cone (g)	1515.0	1348.0	1515.0		
Weight of Sand to Fill Hole (g)	2815.0	2725.0	2905.0		
Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole (cc)	1889.3	1828.9	1949.7		
In-Place Wet density (g/cc)	2.092	2.099	2.183		
In-Place Dry density (g/cc)	1.992	1.998	2.070		
Max. Dry Density (g/cc)	2.081	2.081	2.081		
Degree of Compaction at Field* (%)	95.7	96.0	99.5		
Acceptance Criterion (%)	95.0				

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report: 12-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	انشاء الجسر الثرابي و طرق الخدمة لطح حديد الروبياني / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	7-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	استبدال ارض طبيعية
Location	From 5+800 To 5+880
Layer	Upper Embankment
Level	-2.0
Sample No	AA/SC/068-069
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0			
Weight of Water	(g)	24.0	23.0			
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0			
In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		5+820	5+870			
Cone Ref.		1	2			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	6630.0	5250.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	6603.0	5223.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	3850.0	4750.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4714.0	3735.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	3163.8	2506.7			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.087	2.084			
In-Place Dry density	(g/cc)	1.987	1.988			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081			
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.5	95.5			
Acceptance Criterion	(%)					95.0

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 8-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / باهيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	11-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+680 To 4+700
Layer	Upper Embankment
Level	-0.5
Sample No	AA/SC/081-082
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	974.0			
Weight of Water	(g)	21.0	24.0			
Weight of Dry Soil	(g)	479.0	476.0			
In-Place Water Content	(%)	4.4	5.0			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		4+700	4+750			
Cone Ref.						
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	3722.0	4502.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	3695.0	4475.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5820.0	5490.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1436.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2665.0	3074.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	1788.6	2063.1			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.066	2.169			
In-Place Dry density	(g/cc)	1.979	2.065			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081			
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.1	99.2			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab

Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report:

12-Sep-23

Form Number:

Q Lab/Soil/07/ver.01



كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة للطريق حديد الروبياني / باريس	
Client	شركة احمد عبدالرحمن	
Testing Date	13-Sep-23	
Sample Description	Crushed stones	
Source	By client	
Location	From 4+200 To 4+340	
Layer	Sub Ballast	
Level	0.15	
Sample No	AA/SC/088-090	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Moisture Content	Can Ref.		1	2	3		
	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	976.0	1070.0		
	Weight of Water	(g)	21.0	22.0	24.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	479.0	478.0	476.0		
	In-Place Water Content	(%)	4.4	4.6	5.0		
	Optimum Moisture Content	(%)	5.5	5.5	5.5		

Field Density	Station		4+190	4+250	4+220		
	Cone Ref.		1	2	3		
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5760.0	5774.0	5487.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	5733.0	5747.0	5460.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4923.0	4792.0	5135.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1429.0	1470.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3648.0	3779.0	3395.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2448.3	2536.2	2278.5		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.342	2.266	2.396		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.243	2.166	2.281		
	Max Dry Density	(g/cc)	2.273	2.273	2.273		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	98.7	95.3	100.4		
	Acceptance Criterion	(%)	98.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature: Stamp:

Date of Report : 14-Sep-23

Form Number: Q1 Lab/Soil/07/ver.01

2023
14
Signature



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لطبقة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	6-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 6+480 To 6+680
Layer	Upper Embankment
Level	-
Sample No	AA/SC/062-065
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.			1	2	1	2
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	975.0	1072.0	971.0
	Weight of Water	(g)	24.0	23.0	22.0	27.0
	Weight of Dry Soil	(g)	476.0	477.0	478.0	473.0
	In-Place Water Content	(%)	5.0	4.8	4.6	5.7
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9
Level			2.5	2.5	2.5	2
Station			6+510	6+560	6+610	6+660
Cone Ref.			4	5	4	5
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5105.0	4860.0	4890.0	5205.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	5078.0	4833.0	4863.0	5178.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4955.0	5273.0	5088.0	5045.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1348.0	1429.0	1348.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3616.0	3379.0	3483.0	3607.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2426.8	2267.8	2337.6	2420.8
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.092	2.131	2.080	2.139
	In-Place Dry density	(g/cc)	1.992	2.033	1.989	2.023
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081
	Degree of Compaction at Field*	(%)	95.7	97.7	95.6	97.2
	Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report : 7-Sep-23

Form Number : QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة للطبقة حديد الروبالي / بليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	7-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+680 To 4+780
Layer	Upper Embankment
Level	-0.75
Sample No	AA/SC/066-067
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1068.0	971.0	
	Weight of Water	(g)	26.0	27.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	474.0	473.0	
	In-Place Water Content	(%)	5.5	5.7	
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	

Station		4+700	4+750		
Cone Ref.		1	2		
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5180.0	5010.0	
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	
	Weight of Wet Soil	(g)	5153.0	4983.0	
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4930.0	5045.0	
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3634.0	3440.0	
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	
	Gross Volume of Hole	(cc)	2438.9	2308.7	
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.113	2.158	
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.003	2.042	
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	
	Degree of Compaction at Field*	(%)	96.2	98.1	
	Acceptance Criterion	(%)	95.0		

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report: 8-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إتمام الجسر الترابي و طرق الخدمة للطبقة حديد الروبياني / باريس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	7-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	استبدال ارض طبيعية
Location	From 5+800 To 5+880
Layer	Upper Embankment
Level	-2.0
Sample No	AA/SC/068-069
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Moisture Content	Can Ref.	1	2		
	Weight of Container (g)	594.0	498.0		
	Weight of Container + Wet Soil (g)	1094.0	998.0		
	Weight of Container + Dry Soil (g)	1070.0	975.0		
	Weight of Water (g)	24.0	23.0		
	Weight of Dry Soil (g)	476.0	477.0		
	In-Place Water Content (%)	5.0	4.8		
	Optimum Moisture Content (%)	7.9	7.9		

Field Density	Station	5+820	5+870		
	Cone Ref.	1	2		
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	6630.0	5250.0		
	Weight of Plastic Bag (g)	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil (g)	6603.0	5223.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	10000	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone (g)	3850.0	4750.0		
	Weight of Sand to Fill Cone (g)	1436.0	1515.0		
	Weight of Sand to Fill Hole (g)	4714.0	3735.0		
	Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole (cc)	3163.8	2506.7		
	In-Place Wet density (g/cc)	2.087	2.084		
	In-Place Dry density (g/cc)	1.987	1.988		
	Max. Dry Density (g/cc)	2.081	2.081		
	Degree of Compaction at Field* (%)	95.5	95.5		
	Acceptance Criterion (%)	95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 8-Sep-23

Form Number : QLab/Soil/07/ver.01

Stamp:

[Signature]



كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طريق الخدمة للطريق حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	13-Sep-23
Sample Description	Crushed stones
Source	By client
Location	From 4+340 To 4+560
Layer	Sub Ballast
Level	0.15
Sample No	AA/SC/083-087
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2	1	2	1
Weight of Container	(g) 594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
Weight of Container + Wet Soil	(g) 1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
Weight of Container + Dry Soil	(g) 1072.0	975.0	1070.0	975.0	1073.0
Weight of Water	(g) 22.0	23.0	24.0	23.0	21.0
Weight of Dry Soil	(g) 478.0	477.0	476.0	477.0	479.0
In-Place Water Content	(%) 4.6	4.8	5.0	4.8	4.4
Optimum Moisture Content	(%) 5.5	5.5	5.5	5.5	5.5

Station	4+550	4+510	4+470	4+420	4+370
Cone Ref.	3	1	3	4	3
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g) 5468.0	5069.0	5460.0	5315.0	4339.0
Weight of Plastic Bag	(g) 27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g) 5441.0	5042.0	5433.0	5288.0	4312.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g) 10000	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g) 5112.0	5381.0	5166.0	5267.0	5781.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g) 1470.0	1429.0	1470.0	1429.0	1470.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g) 3418.0	3190.0	3364.0	3304.0	2749.0
Bulk Density of Sand	(g/cc) 1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc) 2294.0	2140.9	2257.7	2217.4	1845.0
In-Place Wet density	(g/cc) 2.372	2.355	2.406	2.385	2.337
In-Place Dry density	(g/cc) 2.268	2.247	2.291	2.275	2.239
Max. Dry Density	(g/cc) 2.273	2.273	2.273	2.273	2.273
Degree of Compaction at Field*	(%) 99.8	98.8	100.8	100.1	98.5
Acceptance Criterion	(%)	98.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 14-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:

2023
14
في 14
2023
2023



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	16-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الامال
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Upper Embankment
Level	-0.75
Sample No	AA/SC/091-094
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	970.0	1069.0	971.0
Weight of Water	(g)	24.0	28.0	25.0	27.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	472.0	475.0	473.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.9	5.3	5.7
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+125	5+175	5+225	5+275
Cone Ref.		2	3	2	3
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4550.0	4595.0	4207.0	3903.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4523.0	4568.0	4180.0	3876.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5365.0	5412.0	5603.0	5823.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0	1515.0	1470.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3120.0	3118.0	2882.0	2707.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2094.0	2092.6	1934.2	1816.8
In-Place Wet density	(g/cc)	2.160	2.183	2.161	2.133
In-Place Dry density	(g/cc)	2.056	2.061	2.053	2.018
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	2.082
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.8	99.0	98.6	96.9
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report: 17-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



كـه لضبط الجودة
كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخلطة للسطح مدمد الروبيلس / باهيس	
Client	شركة احمد عبدالرحمن	
Testing Date	16-Sep-23	
Sample Description	Reddish Soil	
Source	مشون الآمال	
Location	From 5+100 To 5+400	
Layer	Upper Embankment	
Level	-0.75	
Sample No	AA/SC/095-096	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	970.0			
Weight of Water	(g)	24.0	28.0			
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	472.0			
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.9			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		5+325	5+375			
Cone Ref.		2	3			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4174.0	4092.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	4147.0	4065.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5637.0	5724.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2848.0	2806.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	1911.4	1883.2			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.170	2.159			
In-Place Dry density	(g/cc)	2.065	2.038			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082			
Degree of Compaction at Field*	(%)	99.2	97.9			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report : 17-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Luc



كيو لضبط الجودة
كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الرويشي / بابوين
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	7-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+680 To 4+780
Layer	Upper Embankment
Level	-0.75
Sample No	AA/SC/066-067
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Moisture Content	Can Ref.	1	2			
	Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1068.0	971.0		
	Weight of Water	(g)	26.0	27.0		
	Weight of Dry Soil	(g)	474.0	473.0		
	In-Place Water Content	(%)	5.5	5.7		
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9		
Field Density	Station	4+700	4+750			
	Cone Ref.	1	2			
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5180.0	5010.0		
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
	Weight of Wet Soil	(g)	5153.0	4983.0		
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000		
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4930.0	5045.0		
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0		
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3634.0	3440.0		
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490		
	Gross Volume of Hole	(cc)	2438.9	2308.7		
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.113	2.158		
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.003	2.042		
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081		
	Degree of Compaction at Field*	(%)	96.2	98.1		
	Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 8-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	4-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشتون المحمود
Location	From 5+200 To 5+400
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0
Sample No	AA/SC/056-059
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	970.0	1072.0	971.0
Weight of Water	(g)	24.0	28.0	22.0	27.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	472.0	478.0	473.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.9	4.6	5.7
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+390	5+340	5+290	5+240
Cone Ref.		3	2	5	3
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4075.0	4680.0	4570.0	3420.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4048.0	4653.0	4543.0	3393.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5680.0	5335.0	5410.0	6175.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1515.0	1348.0	1470.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2850.0	3150.0	3242.0	2355.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	1912.8	2114.1	2175.8	1580.5
In-Place Wet density	(g/cc)	2.116	2.201	2.088	2.147
In-Place Dry density	(g/cc)	2.015	2.078	1.996	2.031
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081
Degree of Compaction at Field*	(%)	96.8	99.8	95.9	97.6
Acceptance Criterion	(%)	95.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 5-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





كيو لضبط الجودة
كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / باليس
Client	شركة احمد عبد الرحمن
Testing Date	4-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 4+680 To 4+780
Layer	Upper Embankment
Level	-1.0
Sample No	AA/SC/054-055
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2			
Weight of Container	(g)	594.0	498.0			
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0			
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1072.0	970.0			
Weight of Water	(g)	22.0	28.0			
Weight of Dry Soil	(g)	478.0	472.0			
In-Place Water Content	(%)	4.6	5.9			
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9			

Station		4+700	4+750			
Cone Ref.		2	3			
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4150.0	4940.0			
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0			
Weight of Wet Soil	(g)	4123.0	4913.0			
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000			
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5530.0	5145.0			
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1515.0	1470.0			
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2955.0	3385.0			
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490			
Gross Volume of Hole	(cc)	1983.2	2271.8			
In-Place Wet density	(g/cc)	2.079	2.163			
In-Place Dry density	(g/cc)	1.987	2.041			
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081			
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.5	98.1			
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 5-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرباني و طرق الخدمة للطسقة حديد الروبيكي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	2-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون المحمود
Location	From 5+600 To 5+800
Layer	Lower Embankment
Level	-2.5
Sample No	Trust/SC/047-050
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1071.0	971.0	1072.0
	Weight of Water	(g)	23.0	27.0	22.0
	Weight of Dry Soil	(g)	477.0	473.0	478.0
	In-Place Water Content	(%)	4.8	5.7	4.6
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9
Level			-1.25	-2	-2.5
Station			5+620	5+670	5+720
Cone Ref.			3	4	3
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4870.0	5185.0	5365.0
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil	(g)	4843.0	5158.0	5338.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	9500
	Weight of Residual Sand + Bottle +Cone	(g)	5105.0	4950.0	4260.0
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1470.0	1429.0	1470.0
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3425.0	3621.0	3770.0
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole	(cc)	2298.7	2430.2	2530.2
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.107	2.122	2.110
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.010	2.008	2.017
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081
	Degree of Compaction at Field*	(%)	96.6	96.5	96.9
Acceptance Criterion		(%)	95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 3-Sep-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01

Signature:





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة للطريق حديد الروميلي / بلبيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	29-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	ارض طبيعية
Location	From 5+600 To 5+800
Layer	Upper Embankment
Level	-2.5
Sample No	AA/SC/37-41
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.	1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1075.0	971.0	1070.0	979.0
Weight of Water	(g)	19.0	27.0	24.0	19.0
Weight of Dry Soil	(g)	481.0	473.0	476.0	481.0
In-Place Water Content	(%)	4.0	5.7	5.0	4.0
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+610	5+660	5+710	5+760	5+800
Cone Ref.		1	2	3	4	5
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag (g)	5082.0	5920.0	6438.0	5567.0	5216.0
	Weight of Plastic Bag (g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
	Weight of Wet Soil (g)	5055.0	5893.0	6411.0	5540.0	5189.0
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone (g)	10000	10000	10000	10000	10000
	Weight of Residual Sand + Bottle +Cone (g)	4920.0	4290.0	3965.0	4569.0	4809.0
	Weight of Sand to Fill Cone (g)	1436.0	1515.0	1470.0	1429.0	1470.0
	Weight of Sand to Fill Hole (g)	3644.0	4195.0	4565.0	4002.0	3721.0
	Bulk Density of Sand (g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Gross Volume of Hole (cc)	2445.6	2815.4	3063.8	2685.9	2497.3
	In-Place Wet density (g/cc)	2.067	2.093	2.093	2.063	2.078
	In-Place Dry density (g/cc)	1.988	1.980	1.992	1.984	1.986
	Max. Dry Density (g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.6	95.2	95.7	95.4	95.5
Acceptance Criterion (%)		95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 30-Aug-23

Form Number : QLab/Soil/07/ver.01

Signature:

Stamp:





Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / باليس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	12-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	ارض طبيعية
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Lower Embankment
Level	-1.5
Sample No	AA/SC/009-011
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1076.0	985.0	1073.0		
Weight of Water	(g)	18.0	13.0	21.0		
Weight of Dry Soil	(g)	482.0	487.0	479.0		
In-Place Water Content	(%)	3.7	2.7	4.4		
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9		

Station		5+335	5+375	5+395		
Cone Ref.		1	1	2		
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4890.0	5135.0	4700.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4863.0	5108.0	4673.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5115.0	4740.0	5235.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1436.0	1515.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3456.0	3824.0	3250.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490		
Gross Volume of Hole	(cc)	2319.5	2566.4	2181.2		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.097	1.990	2.142		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.021	1.939	2.052		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081		
Degree of Compaction at Field*	(%)	97.1	93.2	98.6		
Acceptance Criterion	(%)			95.0		

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 13-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة للطبقة حديد الروبيدي / بابيس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	12-Aug-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	ارض طبيعية
Location	From 5+100 To 5+400
Layer	Lower Embankment
Level	-1.5
Sample No	AA/SC/004 - 008
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1	2	1
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0	594.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0	1094.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1076.0	965.0	1079.0	980.0	1075.0
Weight of Water	(g)	18.0	33.0	15.0	18.0	19.0
Weight of Dry Soil	(g)	482.0	467.0	485.0	482.0	481.0
In-Place Water Content	(%)	3.7	7.1	3.1	3.7	4.0
Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9

Station		5+125	5+175	5+225	5+275	5+305
Cone Ref.		1	2	4	1	2
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5753.0	4860.0	5415.0	4820.0	4210.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	5726.0	4833.0	5388.0	4793.0	4183.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	10000	10000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	4420.0	5235.0	4720.0	5080.0	5502.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0	1515.0	1429.0	1436.0	1515.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	4144.0	3250.0	3851.0	3484.0	2983.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Gross Volume of Hole	(cc)	2781.2	2181.2	2584.6	2338.3	2002.0
In-Place Wet density	(g/cc)	2.059	2.216	2.085	2.050	2.089
In-Place Dry density	(g/cc)	1.985	2.070	2.022	1.976	2.010
Max. Dry Density	(g/cc)	2.081	2.081	2.081	2.081	2.081
Degree of Compaction at Field*	(%)	95.4	99.4	97.2	95.0	96.6
Acceptance Criterion	(%)	95.0				

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Date of Report : 13-Aug-23

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الثرابي و طرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / باييس
Client	شركة احمد عبدالرحمن
Testing Date	13-Sep-23
Sample Description	Reddish Soil
Source	مشون الاعمال
Location	From 7+560 To 7+720
Layer	Natural Ground
Level	ارض طبيعية
Sample No	AA/SC/031-033
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Can Ref.		1	2	1		
Moisture Content	Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	
	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1069.0	975.0	1070.0	
	Weight of Water	(g)	25.0	23.0	24.0	
	Weight of Dry Soil	(g)	475.0	477.0	476.0	
	In-Place Water Content	(%)	5.3	4.8	5.0	
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9	7.9	7.9	

Station		7+600	7+650	7+700		
Cone Ref.		4	3	3		
Field Density	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4305.0	4665.0	4380.0	
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	
	Weight of Wet Soil	(g)	4278.0	4638.0	4353.0	
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000	10000	10000	
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5600.0	5265.0	5535.0	
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1429.0	1470.0	1470.0	
	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2971.0	3265.0	2995.0	
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490	1.490	1.490	
	Gross Volume of Hole	(cc)	1994.0	2191.3	2010.1	
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.145	2.117	2.166	
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.038	2.019	2.062	
	Max. Dry Density	(g/cc)	2.082	2.082	2.082	
	Degree of Compaction at Field*	(%)	97.9	97.0	99.0	
Acceptance Criterion		(%)	95.0			

For Q Lab

Eng. Abdallahi Hussien

Signature:

Date of Report

14-Sep-23

Form Number

QLab/Soil/07/ver.01



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر الثرابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبياني / بلبيس	
Client	شركة احمد عبدالرحمن	
Testing Date	29-Aug-23	
Sample Description	Redish Soil	
Source	مشتون المحمود	
Location	From 4+600 To 4+640	
Layer	Ferma	استبدال
Level	-	
Sample No	AA/SC/229	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

	Can Ref.					
	Weight of Container	(g)	594.0			
Moistur e	Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0			
	Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0			
Content	Weight of Water	(g)	24.0			
	Weight of Dry Soil	(g)	476.0			
	In-Place Water Content	(%)	5.0			
	Optimum Moisture Content	(%)	7.9			

	Station					
	4+620					
	Cone Ref.					
	Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	5030.0			
	Weight of Plastic Bag	(g)	27.0			
	Weight of Wet Soil	(g)	5003.0			
	Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	10000			
	Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	5080.0			
	Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1436.0			
Field Density	Weight of Sand to Fill Hole	(g)	3484.0			
	Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.490			
	Gross Volume of Hole	(cc)	2338.3			
	In-Place Wet density	(g/cc)	2.140			
	In-Place Dry density	(g/cc)	2.037			
	Max Dry Density	(g/cc)	2.081			
	Degree of Compaction at Field*	(%)	97.9			
	Acceptance Criterion	(%)			95.0	

For Q Lab: Eng. Abdallah Hussein

Signature:

Date of Report: 30 Aug 23


Form Number: Q Lab/Soil/07/ver.01



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/016
 Location: from 4+200 to 4+400 (4+220)
 Level: 0
 Soil Type: Ferma
 Plate Diameter: 300 mm

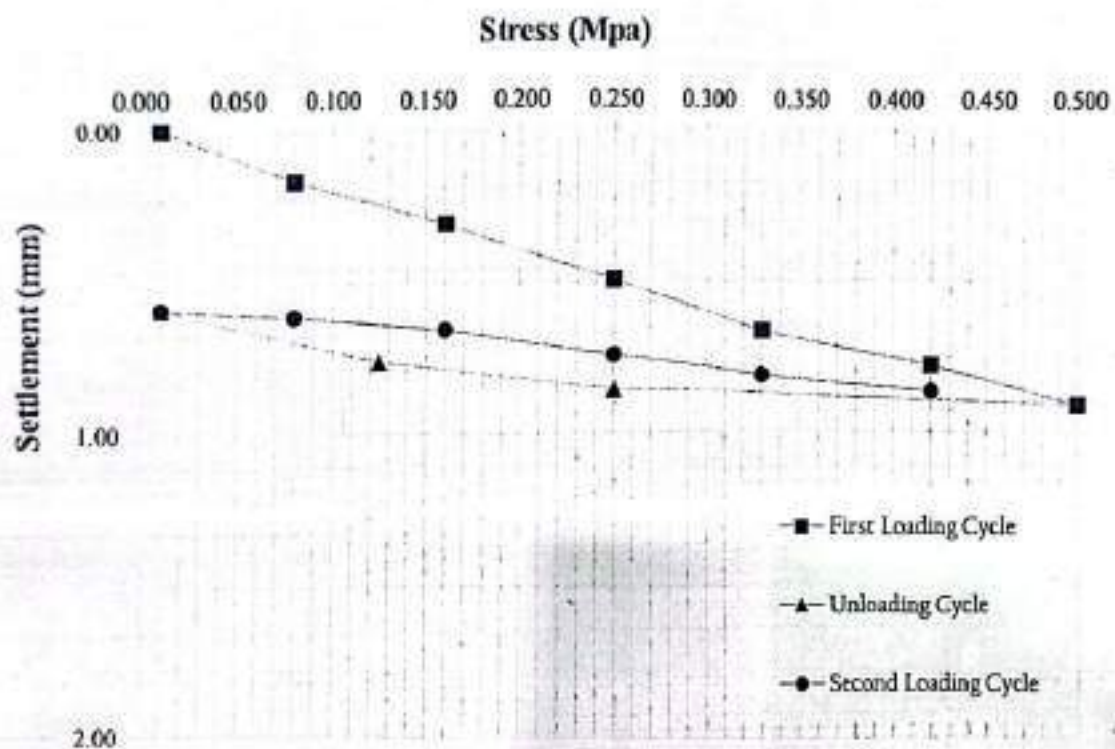

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.995	2.376	-0.030
Second Cycle	0.399	0.561	0.571

Strain Modulus		
Ev1	119.8	Mpa
Ev2	296.0	Mpa
Ev2 / Ev1	2.5	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 2 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST / EV/016
Location: from 4+200 to 4+400 (4+220)
Level: 0
Soil Type: Ferra
Plate Diameter: 300 mm

Unpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3258	4207	4272	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3240	4190	4258	0.18	0.17	0.14	0.16
86	11.31	0.160	3222	4178	4245	0.36	0.29	0.27	0.31
135	17.67	0.250	3201	4161	4226	0.57	0.46	0.46	0.50
178	23.33	0.330	3180	4146	4210	0.78	0.61	0.62	0.67
226	29.69	0.420	3169	4135	4199	0.89	0.72	0.73	0.78
269	35.34	0.500	3156	4122	4186	1.02	0.85	0.86	0.91
135	17.67	0.250	3161	4128	4191	0.97	0.79	0.81	0.86
67	8.84	0.125	3170	4138	4201	0.88	0.69	0.71	0.76
5	0.71	0.010	3186	4160	4215	0.72	0.47	0.57	0.59
43	5.65	0.080	3184	4157	4213	0.74	0.50	0.59	0.61
86	11.31	0.160	3180	4152	4208	0.78	0.55	0.64	0.66
135	17.67	0.250	3170	4144	4200	0.88	0.63	0.72	0.74
178	23.33	0.330	3163	4135	4194	0.95	0.72	0.78	0.82
226	29.69	0.420	3159	4128	4190	0.99	0.79	0.82	0.87

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





Project: إنشاء الجسر النرابى و طرق
الخدمة لحظ سكة حديد
Contractor: شركة أحمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/017
Location: (nom 4*200 to 4*400 (4*270)
Level: 0
Soil Type: Ferra
Plate Diameter: 300 mm

Encirpuck Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
5	0.71	0.010	3809	3582	4531	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3796	3558	4503	0.13	0.24	0.28	0.22
86	11.31	0.160	3776	3543	4482	0.33	0.39	0.49	0.40
135	17.67	0.250	3743	3519	4449	0.66	0.63	0.82	0.70
178	23.33	0.330	3731	3499	4431	0.78	0.83	1.00	0.87
226	29.69	0.420	3675	3475	4495	1.34	1.07	0.36	0.92
269	35.34	0.500	3648	3457	4473	1.61	1.25	0.58	1.15
135	17.67	0.250	3657	3468	4483	1.52	1.14	0.48	1.05
67	8.84	0.125	3667	3480	4494	1.42	1.02	0.37	0.94
5	0.71	0.010	3687	3505	4513	1.22	0.77	0.18	0.72
43	5.65	0.080	3686	3504	4512	1.23	0.78	0.19	0.73
86	11.31	0.160	3680	3498	4506	1.29	0.84	0.25	0.79
135	17.67	0.250	3670	3488	4497	1.39	0.94	0.34	0.89
178	23.33	0.330	3662	3478	4487	1.47	1.04	0.44	0.98
226	29.69	0.420	3649	3465	4475	1.60	1.17	0.56	1.11

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien




Page 1 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/017
 Location: from 4+200 to 4+400 (4+270)
 Level: 0
 Soil Type: Ferma
 Plate Diameter: 300 mm

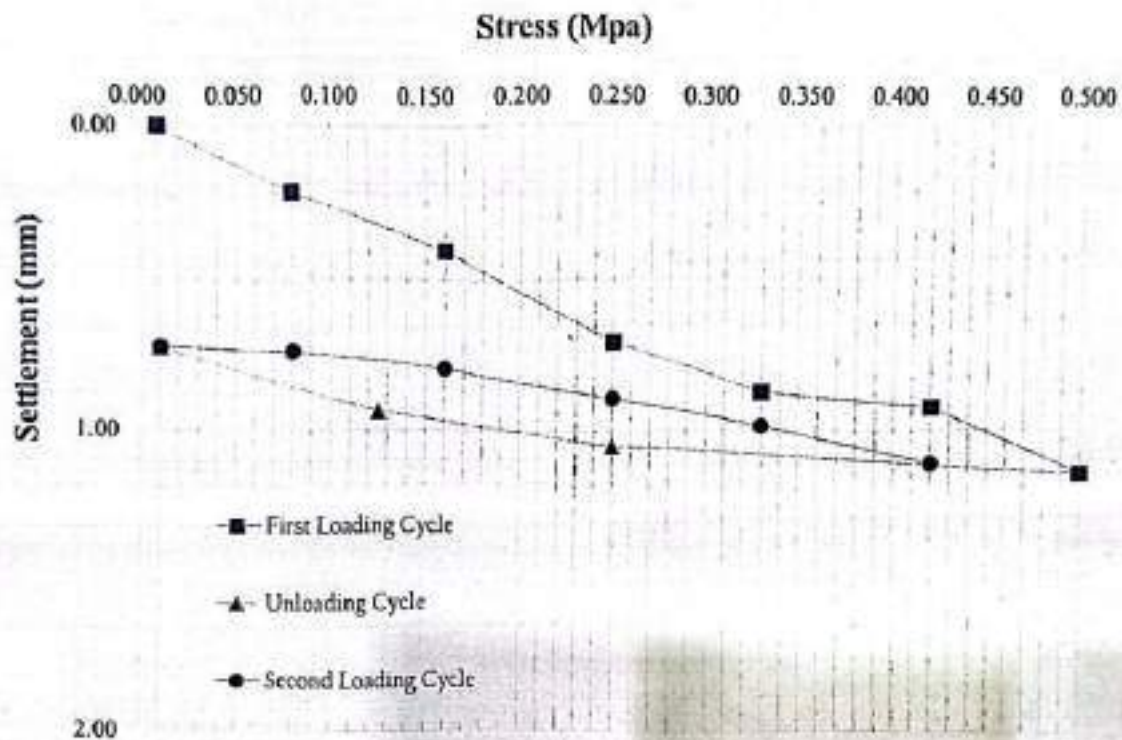

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-2.101	3.371	-0.047
Second Cycle	1.634	0.270	0.713

Strain Modulus		
Ev1	96.9	Mpa
Ev2	207.1	Mpa
Ev2 / Ev1	2.1	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/018
Location: from 4+200 to 4+400 (4+320)
Level: 0
Soil Type: Fenna
Plate Diameter: 300 mm

Energy Reading, Jou	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3835	4082	3870	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3810	4059	3845	0.25	0.23	0.25	0.24
86	11.31	0.160	3794	4040	3830	0.41	0.42	0.40	0.41
135	17.67	0.250	3760	4008	3800	0.75	0.74	0.70	0.73
178	23.33	0.330	3743	3989	3785	0.92	0.93	0.85	0.90
226	29.69	0.420	3726	3968	3770	1.09	1.14	1.00	1.08
269	35.34	0.500	3705	3944	3748	1.30	1.38	1.22	1.30
135	17.67	0.250	3711	3951	3754	1.24	1.31	1.16	1.24
67	8.84	0.125	3716	3958	3760	1.19	1.24	1.10	1.18
5	0.71	0.010	3729	3973	3772	1.06	1.09	0.98	1.04
43	5.65	0.080	3727	3971	3770	1.08	1.11	1.00	1.06
86	11.31	0.160	3724	3967	3767	1.11	1.15	1.03	1.10
135	17.67	0.250	3720	3962	3762	1.15	1.20	1.08	1.14
178	23.33	0.330	3710	3951	3751	1.25	1.31	1.19	1.25
226	29.69	0.420	3700	3940	3741	1.35	1.42	1.29	1.35

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien




Page 1 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: TRUST /EV/018
 Location: from 4+200 to 4+400 (4+320)
 Level: 0
 Soil Type: Femi
 Plate Diameter: 300 mm

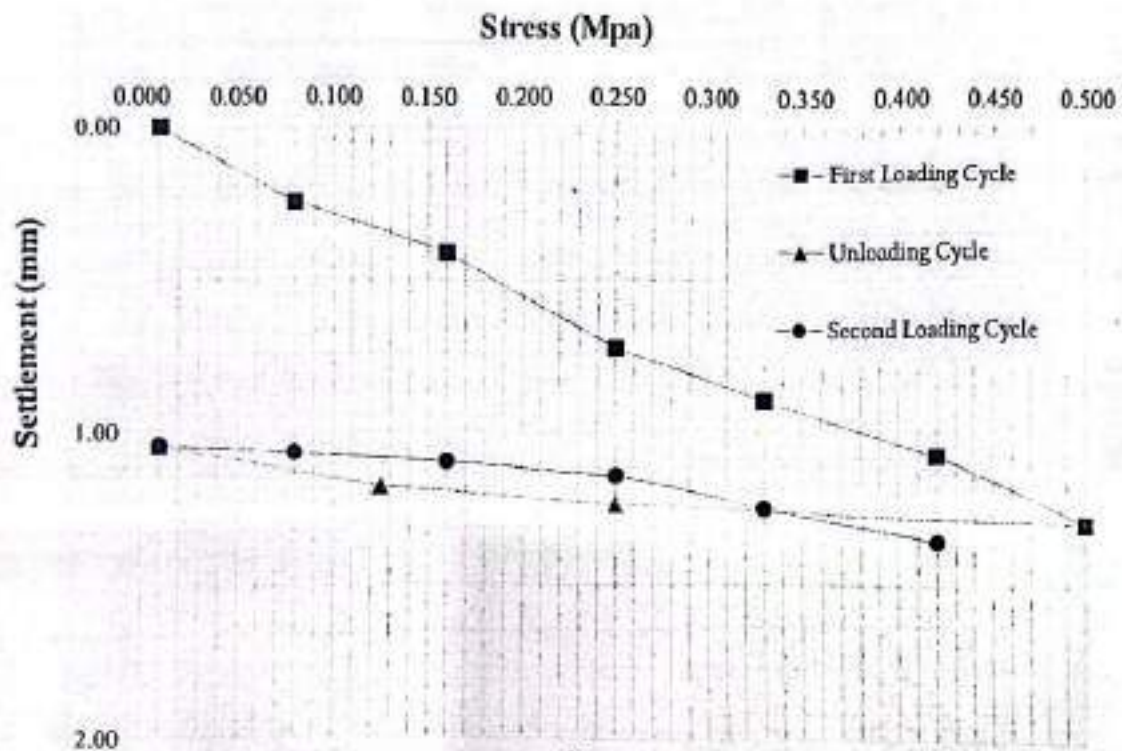

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.775	2.968	-0.003
Second Cycle	1.709	0.020	1.046

Strain Modulus		
Ev1	87.2	Mpa
Ev2	257.2	Mpa
Ev2 / Ev1	3.0	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





Date:

19/09/2023

Project:

إنشاء الجسر الناري و طريق الخدمة لحد

مسكة حديد المروسيك / باديس

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/012

Location: from 4+600 To 4+780 4+620

Level: 0

Soil Type: Fcma

Plate Diameter: 300 mm


Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3240	2983	3615	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3224	2960	3595	0.16	0.23	0.20	0.20
86	11.31	0.160	3203	2935	3573	0.37	0.48	0.42	0.42
135	17.67	0.250	3185	2913	3554	0.55	0.70	0.61	0.62
178	23.33	0.330	3170	2895	3535	0.70	0.88	0.80	0.79
226	29.69	0.420	3149	2875	3514	0.91	1.08	1.01	1.00
269	35.34	0.500	3130	2853	3495	1.10	1.30	1.20	1.20
135	17.67	0.250	3135	2857	3499	1.05	1.26	1.16	1.16
67	8.84	0.125	3141	2862	3504	0.99	1.21	1.11	1.10
5	0.71	0.010	3164	2884	3525	0.76	0.99	0.90	0.88
43	5.65	0.080	3162	2883	3523	0.78	1.00	0.92	0.90
86	11.31	0.160	3155	2875	3516	0.85	1.08	0.99	0.97
135	17.67	0.250	3148	2868	3510	0.92	1.15	1.05	1.04
178	23.33	0.330	3138	2858	3500	1.02	1.25	1.15	1.14
226	29.69	0.420	3130	2848	3491	1.10	1.35	1.24	1.23

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien





Date:

Project:

Contractor:

إشادة الحضر الترابي و طريق الخدمة لعمد

سكة حديد الروبيكن / بلعيس

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No: AA /EV/012

Location: from 4+600 To 4+780 4+620

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

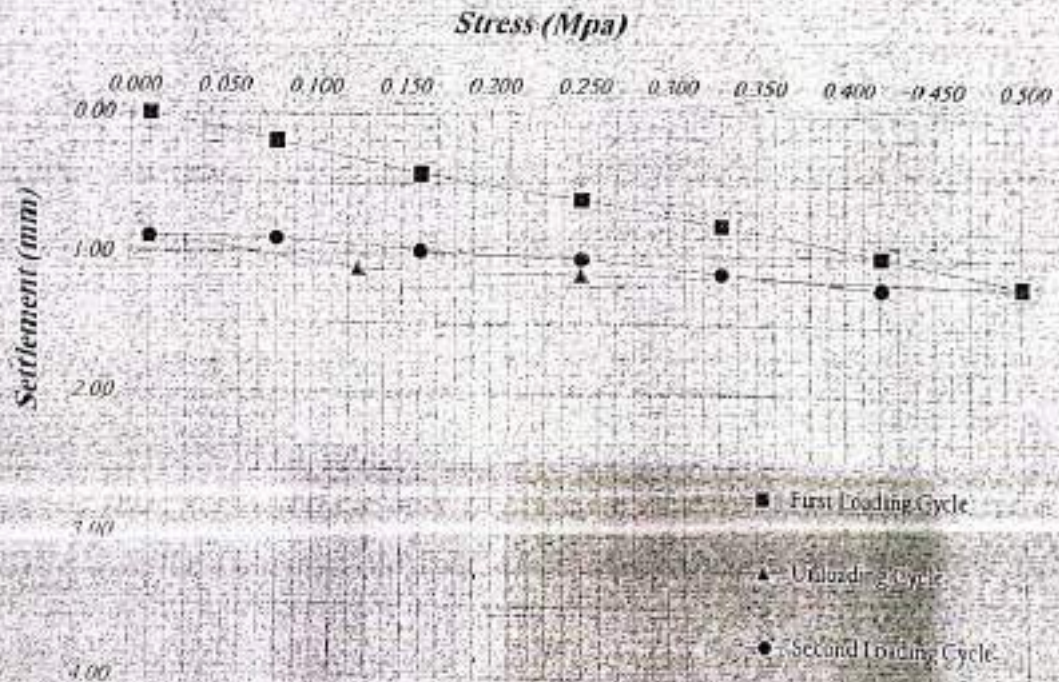

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.227	2.468	0.014
Second Cycle	1.003	0.447	-0.871

Strain Modulus		
Ev1	95.5	Mpa
Ev2	237.3	Mpa
Ev2 / Ev1	2.5	

For Q Lab

Tested by: Tech / Abdelahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: A.1 / EV/013

Location: from 4+600 To 4+780 4+670

Level: 0

Soil Type: Terra

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3960	2251	4066	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3942	2234	4052	0.18	0.17	0.14	0.16
86	11.31	0.160	3928	2221	4042	0.32	0.30	0.24	0.29
135	17.67	0.250	3908	2201	4027	0.52	0.50	0.39	0.47
178	23.33	0.330	3887	2184	4013	0.73	0.67	0.53	0.64
226	29.69	0.420	3865	2169	4003	0.95	0.82	0.63	0.80
269	35.34	0.500	3844	2151	3989	1.16	1.00	0.77	0.98
135	17.67	0.250	3848	2156	3993	1.12	0.95	0.73	0.93
67	8.84	0.125	3857	2168	4003	1.03	0.83	0.63	0.83
5	0.71	0.010	3873	2190	4023	0.87	0.61	0.43	0.64
43	5.65	0.080	3871	2188	4020	0.89	0.63	0.46	0.66
86	11.31	0.160	3866	2183	4015	0.94	0.68	0.51	0.71
135	17.67	0.250	3857	2173	4005	1.03	0.78	0.61	0.81
178	23.33	0.330	3852	2164	3999	1.08	0.87	0.67	0.87
226	29.69	0.420	3845	2155	3990	1.15	0.96	0.76	0.96

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/013

Location: from 4+600 To 4+780 4+670

Level: 0

Soil Type: Fenna

Plate Diameter: 300 mm

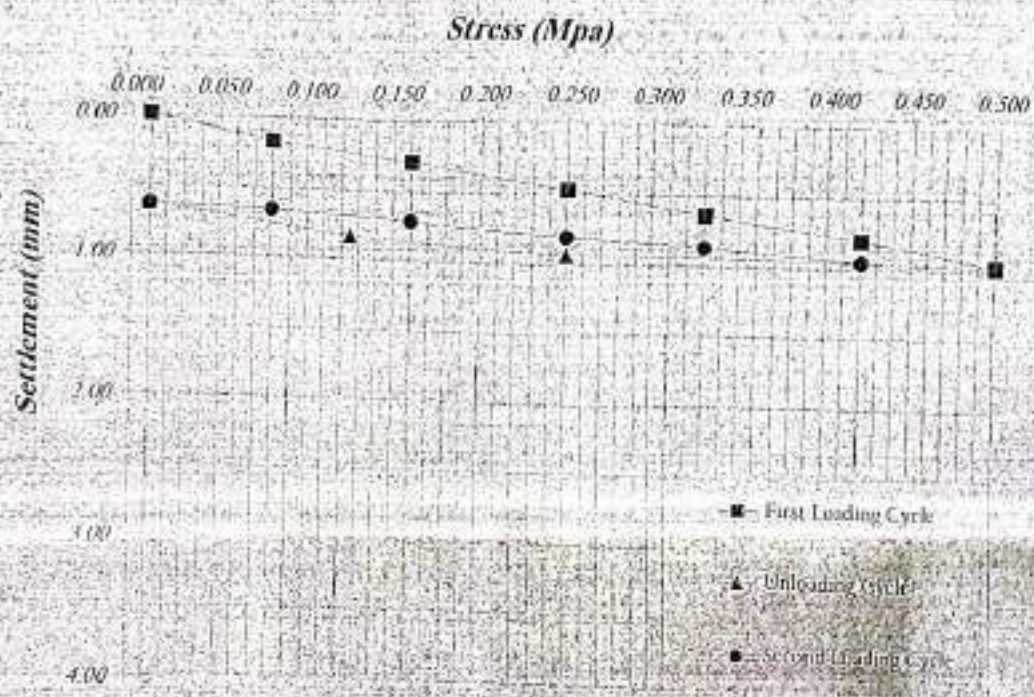

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.395	1.723	0.015
Second Cycle	0.732	0.499	0.624

Strain Modulus		
Ev1	1171	Mpa
Ev2	2601	Mpa
Ev2 / Ev1	2.2	

For Q Lab

Tested by: Tech/ Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

(Signature)



Date:

المشاة العسمة القراى و طرق الخدمة العدا

Project:

سكة حديد الرومى / بالىس

Contractor:

أبركة أحمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**

Test No: AA / EV/014

Location: from 4+600 To 4+780 4+720

Level: 0

Soil Type: Fenna

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, kN	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3478	1803	3370	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3453	1786	3353	0.25	0.17	0.17	0.20
86	11.31	0.160	3439	1775	3344	0.39	0.28	0.26	0.31
135	17.67	0.250	3415	1754	3327	0.63	0.49	0.43	0.52
178	23.33	0.330	3401	1737	3315	0.77	0.66	0.55	0.66
226	29.69	0.420	3388	1720	3305	0.90	0.83	0.65	0.79
269	35.34	0.500	3362	1698	3286	1.16	1.05	0.84	1.02
135	17.67	0.250	3366	1701	3289	1.12	1.02	0.81	0.98
67	8.84	0.125	3376	1712	3300	1.02	0.91	0.70	0.88
5	0.71	0.010	3401	1741	3325	0.77	0.62	0.45	0.61
43	5.65	0.080	3399	1739	3323	0.79	0.64	0.47	0.63
86	11.31	0.160	3395	1734	3318	0.83	0.69	0.52	0.68
135	17.67	0.250	3384	1722	3308	0.94	0.81	0.62	0.79
178	23.33	0.330	3376	1714	3300	1.02	0.89	0.70	0.87
226	29.69	0.420	3366	1705	3291	1.12	0.98	0.79	0.96

Note:

For Q Lab

Tested by: Tech-Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 1 of 2



Date:

المشاة الجسر النرابى و مارى الخدمة لىة

Project:

سكة حديد الروابى / بابىس

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**


Test No.: A1 / TV / 014

Location: from 4+600 To 4+780 4+720

Level: 0

Soil Type: Ferra

Plate Diameter: 300 mm

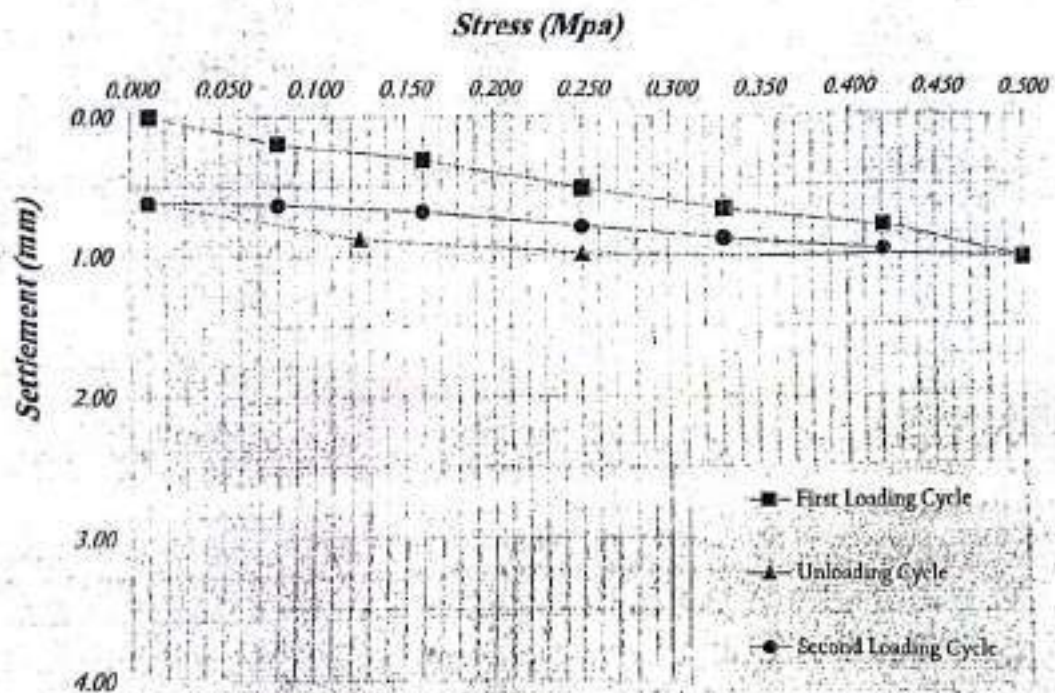


Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.620	1.563	0.064
Second Cycle	1.059	0.441	0.599

Strain Modulus		
Ev1	120.1	Mpa
Ev2	231.7	Mpa
Ev2 / Ev1	1.9	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/015

Location: from 4+600 To 4+700 4+760

Level: 0

Soil Type: F-7ma

Plate Diameter: 300 mm


Emerson Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3706	3260	3910	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3690	3241	3895	0.16	0.19	0.15	0.17
86	11.31	0.160	3676	3229	3882	0.30	0.31	0.28	0.30
135	17.67	0.250	3660	3212	3870	0.46	0.48	0.40	0.45
178	23.33	0.330	3648	3200	3857	0.58	0.60	0.53	0.57
226	29.69	0.420	3630	3184	3841	0.76	0.76	0.69	0.74
269	35.34	0.500	3611	3166	3823	0.95	0.94	0.87	0.92
135	17.67	0.250	3612	3169	3826	0.94	0.91	0.84	0.90
67	8.84	0.125	3621	3178	3834	0.85	0.82	0.76	0.81
5	0.71	0.010	3642	3198	3853	0.64	0.62	0.57	0.61
43	5.65	0.080	3640	3195	3851	0.66	0.65	0.59	0.63
86	11.31	0.160	3635	3190	3847	0.71	0.70	0.63	0.68
135	17.67	0.250	3628	3182	3840	0.78	0.78	0.70	0.75
178	23.33	0.330	3620	3173	3832	0.86	0.87	0.78	0.84
226	29.69	0.420	3610	3165	3823	0.90	0.93	0.87	0.93

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech: Abdelrahman Galier

Engineer: Abdallah Hussein

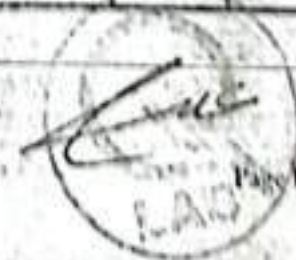

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**


Test No.: AA /EV/015

Location: from +600 To +780 +700

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

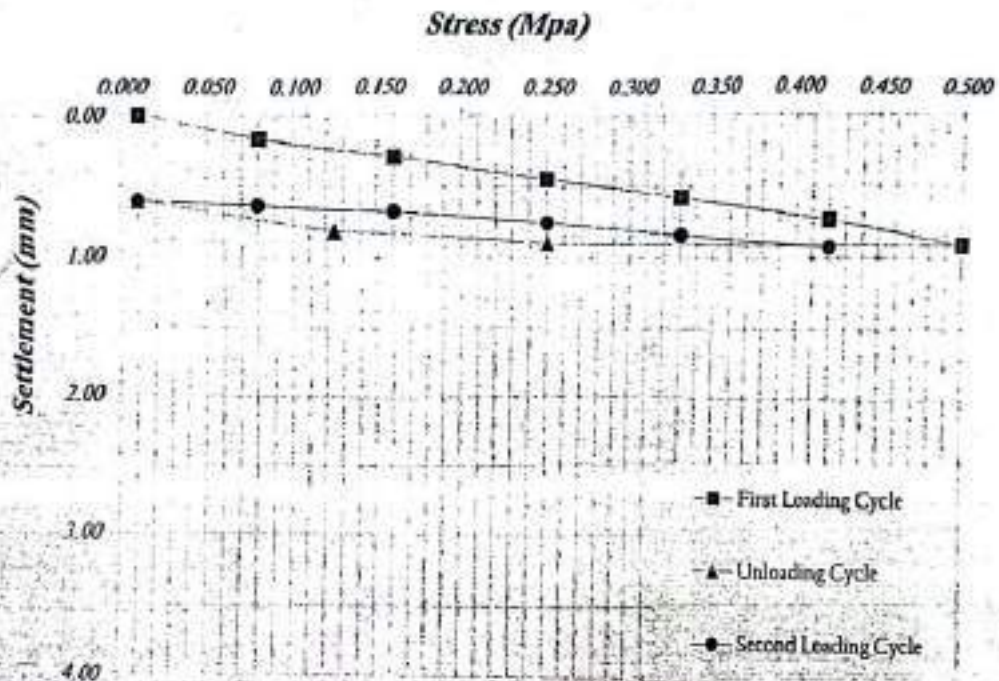

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.845	1.270	0.066
Second Cycle	1.060	0.335	0.603

Strain Modulus		
Ev1	133.0	Mpa
Ev2	260.2	Mpa
Ev2 / Ev1	2.0	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 2 of 2



Date:

Project:

Contractor:

البناء الجسر الناري و مارول الخدمة لخط

سكة حديد الروميك / باديس

شركة احمد عبد الرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**

Test No.: AA-EV/016

Location: from 4+400 To 4+600 4+420

Level: 0

Soil Type: f r m a

Plate Diameter: 300 mm

Energy Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
5	0.71	0.010	3653	3992	4085	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3640	3968	4065	0.13	0.24	0.20	0.19
86	11.31	0.160	3628	3951	4050	0.25	0.41	0.35	0.34
135	17.67	0.250	3613	3930	4032	0.40	0.62	0.53	0.52
178	23.33	0.330	3585	3904	4009	0.68	0.88	0.76	0.77
226	29.69	0.420	3563	3882	3988	0.90	1.10	0.97	0.99
269	35.34	0.500	3543	3861	3969	1.10	1.31	1.16	1.19
135	17.67	0.250	3551	3871	3977	1.02	1.21	1.08	1.10
67	8.84	0.125	3562	3883	3988	0.91	1.09	0.97	0.99
5	0.71	0.010	3582	3905	4008	0.71	0.87	0.77	0.78
43	5.65	0.080	3580	3903	4006	0.73	0.89	0.79	0.80
86	11.31	0.160	3573	3897	4000	0.80	0.95	0.85	0.87
135	17.67	0.250	3563	3887	3991	0.90	1.05	0.94	0.96
178	23.33	0.330	3552	3876	3981	1.01	1.16	1.04	1.07
226	29.69	0.420	3542	3865	3970	1.11	1.27	1.15	1.18

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: A1-EV/016

Location: from 4+400 To 4+600 4+420

Level: 0

Soil Type: Ferra

Plate Diameter: 300 mm

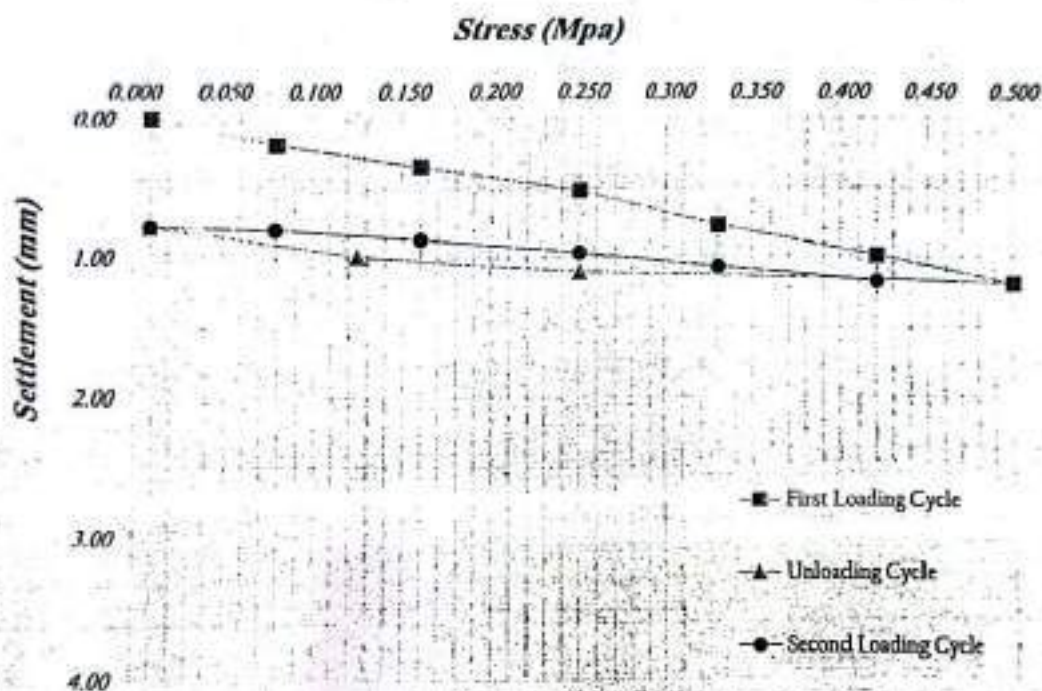

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	1.054	1.826	0.026
Second Cycle	1.322	0.431	0.770

Strain Modulus		
Ev1	95.6	Mpa
Ev2	206.1	Mpa
Ev2 / Ev1	2.2	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 2 of 2

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: AA / EV/019

Location: from 4+400 To 4+600 4+470

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Emerypack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, MPa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3030	2570	4004	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3021	2557	3997	0.09	0.13	0.07	0.10
86	11.31	0.160	3000	2538	3982	0.30	0.32	0.22	0.28
135	17.67	0.250	2974	2515	3967	0.56	0.55	0.37	0.49
178	23.33	0.330	2957	2499	3954	0.73	0.71	0.50	0.65
226	29.69	0.420	2942	2484	3941	0.88	0.86	0.63	0.79
269	35.34	0.500	2927	2470	3930	1.03	1.00	0.74	0.92
135	17.67	0.250	2935	2480	3937	0.95	0.90	0.67	0.84
67	8.84	0.125	2940	2486	3942	0.90	0.84	0.62	0.79
5	0.71	0.010	2949	2500	3950	0.81	0.70	0.54	0.68
43	5.65	0.080	2948	2499	3948	0.82	0.71	0.56	0.70
86	11.31	0.160	2946	2497	3946	0.84	0.73	0.58	0.72
135	17.67	0.250	2940	2491	3941	0.90	0.79	0.63	0.77
178	23.33	0.330	2933	2484	3935	0.97	0.86	0.69	0.84
226	29.69	0.420	2925	2476	3927	1.05	0.94	0.77	0.92

Notes:

For Q-Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussein





Date:

إشياء العصر العربي و طرق الخدمة لهذا

Project:

سكة حديد الرومي / باديس

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**


Test No.: AA / EV / 019

Location: from 4+400 To 4+600 4+470

Level: 0

Soil Type: Fcnpa

Plate Diameter: 300 mm

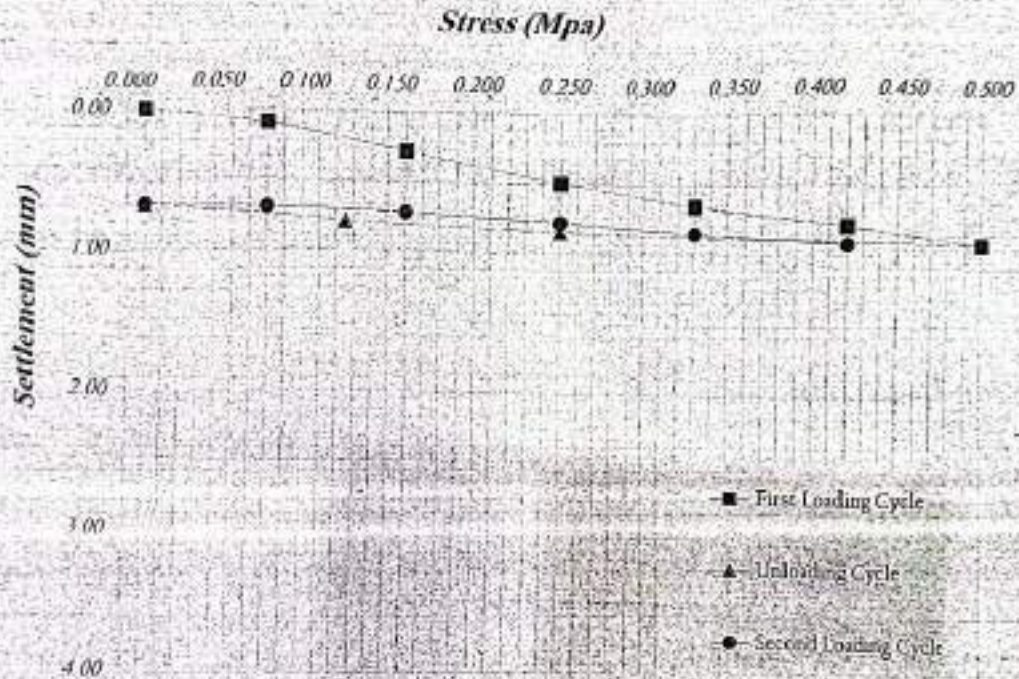

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.351	2.748	-0.117
Second Cycle	1.234	0.054	0.682

Strain Modulus		
Ev1	108.5	Mpa
Ev2	335.1	Mpa
Ev2/Ev1	3.1	

For Q-Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 2 of 2



Project:

البناء الجسر الترابي و طرق الخدمة لخط

سكة حديد الروبيكي / باديس

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/017
 Location: from 4+400 To 4+600 4+520
 Level: 0
 Soil Type: Ferma
 Plate Diameter: 300 mm

Energy pack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3589	3920	4009	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3567	3899	3987	0.22	0.21	0.22	0.22
86	11.31	0.160	3550	3880	3970	0.39	0.40	0.39	0.39
135	17.67	0.250	3528	3858	3950	0.61	0.62	0.59	0.61
178	23.33	0.330	3503	3834	3925	0.86	0.86	0.84	0.85
226	29.69	0.420	3485	3817	3909	1.04	1.03	1.00	1.02
269	35.34	0.500	3464	3795	3888	1.25	1.25	1.21	1.24
135	17.67	0.250	3474	3806	3897	1.15	1.14	1.12	1.14
67	8.84	0.125	3483	3817	3907	1.06	1.03	1.02	1.04
5	0.71	0.010	3498	3834	3921	0.91	0.86	0.88	0.88
43	5.65	0.080	3496	3832	3920	0.93	0.88	0.89	0.90
86	11.31	0.160	3490	3827	3915	0.99	0.93	0.94	0.95
135	17.67	0.250	3483	3820	3909	1.06	1.00	1.00	1.02
178	23.33	0.330	3473	3810	3900	1.16	1.10	1.09	1.12
226	29.69	0.420	3462	3798	3890	1.27	1.22	1.19	1.23

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien




Page 1 of 2



PLATELOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: A1-EV1/017
 Location: from +400 To +600 +520
 Level: 0
 Soil Type: Fines
 Plate Diameter: 300 mm

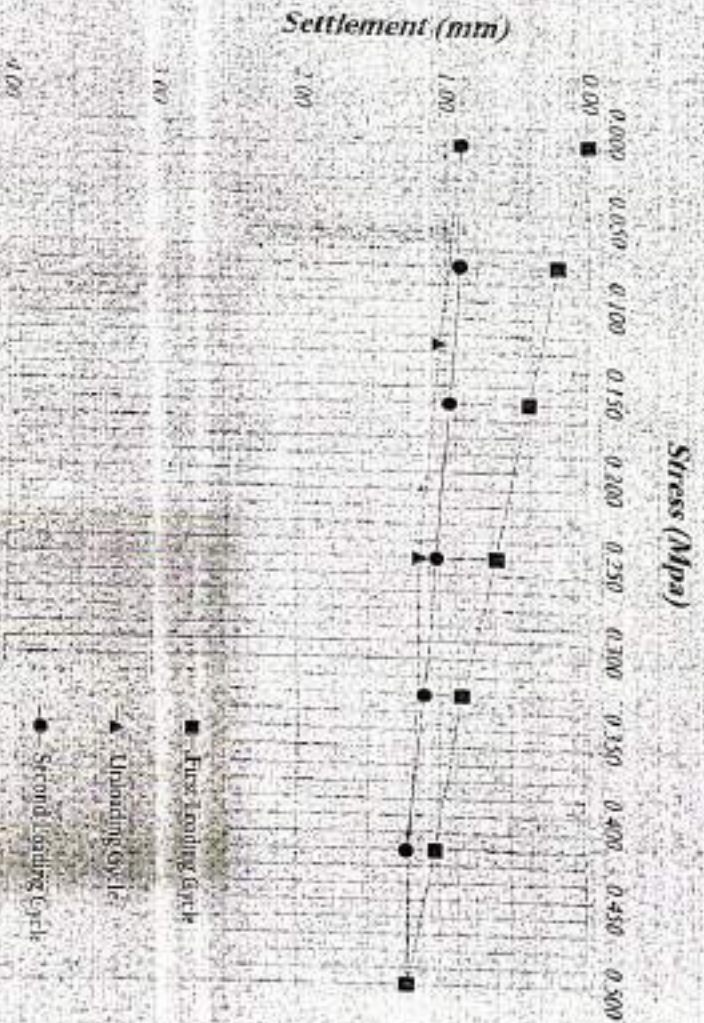

Regression Analysis

Coefficients	a ₁	a ₂	a ₀
First Cycle	0.014	2.436	0.014
Second Cycle	1.479	0.215	0.878

Strain Modulus

EV1	92.1	Mpa
EV2	235.9	Mpa
EV2/EV1	2.6	

Tested by: Tech. Abdelhameed Gaber

Engineer: Abdallah Hussien





Date:

إهداء الجسر النجاشي و طريق الخدمة لحد

Project:

سكة حديد البرونيك / باديس

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**

Test No.: AA-EV018

Location: from 4+400 To 4+600 4+570

Level: 0

Soil Type: Ferra

Plate Diameter: 300 mm

Encirpuck Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No (1)	Gauge No (2)	Gauge No (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3950	4151	3626	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3931	4128	3592	0.19	0.23	0.34	0.25
86	11.31	0.160	3918	4118	3582	0.32	0.33	0.44	0.36
135	17.67	0.250	3895	4096	3560	0.55	0.55	0.66	0.59
178	23.33	0.330	3873	4076	3540	0.77	0.75	0.86	0.79
226	29.69	0.420	3853	4055	3518	0.97	0.96	1.08	1.00
269	35.34	0.500	3832	4034	3495	1.18	1.17	1.31	1.22
135	17.67	0.250	3840	4043	3503	1.10	1.08	1.23	1.14
67	8.84	0.125	3850	4053	3513	1.00	0.98	1.13	1.04
5	0.71	0.010	3871	4078	3533	0.79	0.73	0.93	0.82
43	5.65	0.080	3870	4076	3531	0.80	0.75	0.95	0.83
86	11.31	0.160	3866	4072	3527	0.84	0.79	0.99	0.87
135	17.67	0.250	3857	4067	3517	0.93	0.89	1.09	0.97
178	23.33	0.330	3850	4053	3509	1.00	0.98	1.17	1.05
226	29.69	0.420	3839	4041	3498	1.11	1.10	1.28	1.16

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech/Abdellahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 1 of 2



Date:

11/01/2018

Project:

إنشاء الجسر الترابي و طرق الخدمة لهبط

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**


Test No.: AA / EV/018

Location: from 4+400 To 4+600 4+570

Level: 0

Soil Type: Fenna

Plate Diameter: 300 mm

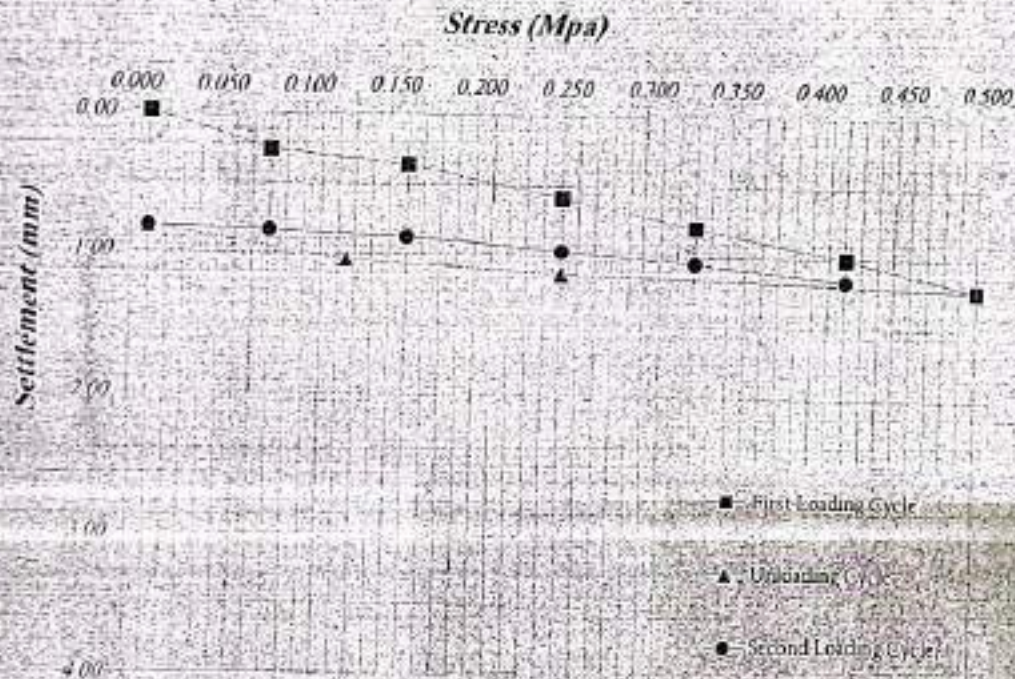

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	1.203	1.654	0.097
Second Cycle	1.474	0.234	0.809

Strain Modulus		
Ev1	99.8	Mpa
Ev2	231.8	Mpa
Ev2/Ev1	2.3	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: A.A/EV/001
 Location: From 5+100 to 5+400 5+150
 Level: -1.5
 Layer: Upper Embankment
 Plate Diameter: 600 mm

Emirpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
11	1.42	0.005	3714	2455	1133	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	3694	2436	1107	0.20	0.19	0.26	0.22
172	22.62	0.080	3665	2406	1068	0.49	0.49	0.65	0.54
269	35.34	0.125	3635	2376	1035	0.79	0.79	0.98	0.85
355	46.66	0.165	3610	2350	1012	1.04	1.05	1.21	1.10
452	59.38	0.210	3585	2323	979	1.29	1.32	1.54	1.38
538	70.68	0.250	3566	2302	954	1.48	1.53	1.79	1.60
269	35.34	0.125	3571	2310	960	1.43	1.45	1.73	1.54
135	17.68	0.063	3577	2316	966	1.37	1.39	1.67	1.48
11	1.42	0.005	3588	2348	975	1.26	1.07	1.58	1.30
86	11.30	0.040	3585	2344	971	1.29	1.11	1.62	1.34
172	22.62	0.080	3580	2336	965	1.34	1.19	1.68	1.40
269	35.34	0.125	3574	2324	960	1.40	1.31	1.73	1.48
355	46.66	0.165	3570	2316	954	1.44	1.39	1.79	1.54
452	59.38	0.210	3561	2303	940	1.53	1.52	1.93	1.66

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

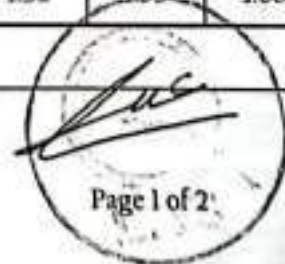


PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04


Test No.: AA/EV/001

Location: From 5+100 to 5+400 5+150

Level: -1.5

Layer: Upper Embankment

Plate Diameter: 600 mm

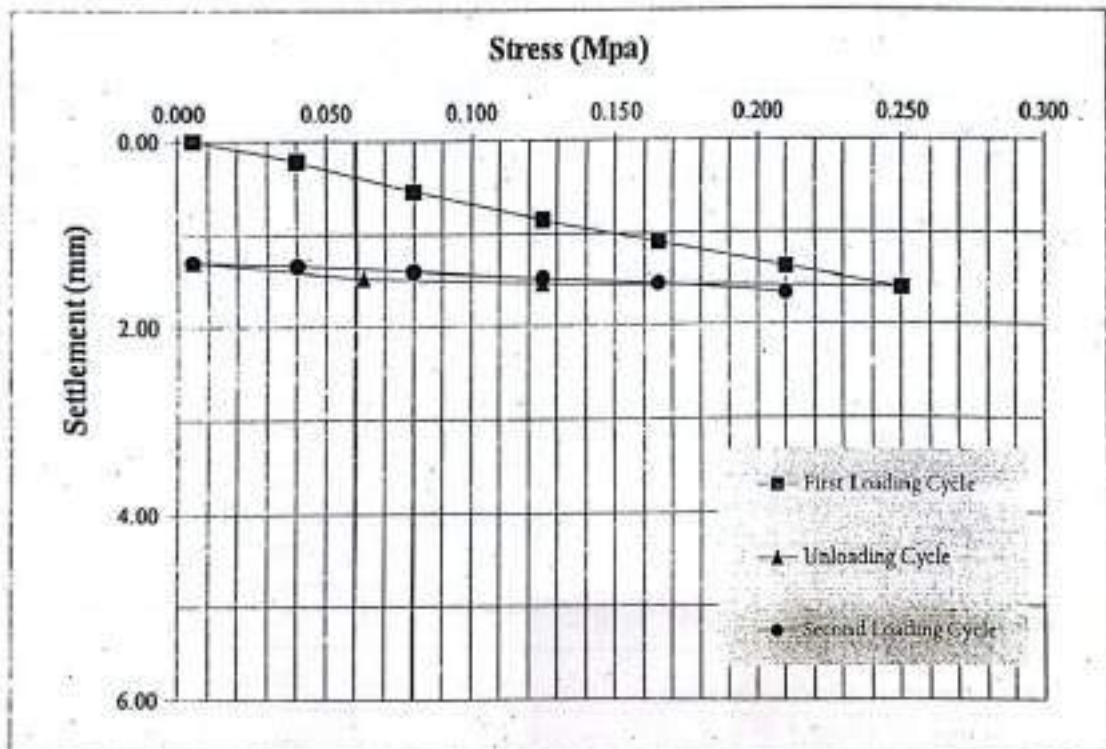

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-6.601	8.456	-0.103
Second Cycle	3.460	0.969	1.299

Strain Modulus		
Ev1	66.1	Mpa
Ev2	245.4	Mpa
Ev2 / Ev1	3.7	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: A.A/EV/002
 Location: From 5+100 to 5+400 5+250
 Level: -1.5
 Layer: Upper Embankment
 Plate Diameter: 600 mm

Energpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
11	1.42	0.005	1619	2406	2344	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	1600	2388	2330	0.19	0.18	0.14	0.17
172	22.62	0.080	1582	2369	2312	0.37	0.37	0.32	0.35
269	35.34	0.125	1568	2350	2291	0.51	0.56	0.53	0.53
355	46.66	0.165	1554	2337	2275	0.65	0.69	0.69	0.68
452	59.38	0.210	1535	2320	2255	0.84	0.86	0.89	0.86
538	70.68	0.250	1524	2308	2243	0.95	0.98	1.01	0.98
269	35.34	0.125	1529	2315	2250	0.90	0.91	0.94	0.92
135	17.68	0.063	1535	2326	2256	0.84	0.80	0.88	0.84
11	1.42	0.005	1556	2348	2276	0.63	0.58	0.68	0.63
86	11.30	0.040	1553	2345	2274	0.66	0.61	0.70	0.66
172	22.62	0.080	1550	2338	2270	0.69	0.68	0.74	0.70
269	35.34	0.125	1546	2330	2265	0.73	0.76	0.79	0.76
355	46.66	0.165	1540	2323	2258	0.79	0.83	0.86	0.83
452	59.38	0.210	1530	2314	2250	0.89	0.92	0.94	0.92

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: A.A/EV/002
 Location: From 5+100 to 5+400 5+250
 Level: -1.5
 Layer: Upper Embankement
 Plate Diameter: 600 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
11	1.42	0.005	1619	2406	2344	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	1600	2388	2330	0.19	0.18	0.14	0.17
172	22.62	0.080	1582	2369	2312	0.37	0.37	0.32	0.35
269	35.34	0.125	1568	2350	2291	0.51	0.56	0.53	0.53
355	46.66	0.165	1554	2337	2275	0.65	0.69	0.69	0.68
452	59.38	0.210	1535	2320	2255	0.84	0.86	0.89	0.86
538	70.68	0.250	1524	2308	2243	0.95	0.98	1.01	0.98
269	35.34	0.125	1529	2315	2250	0.90	0.91	0.94	0.92
135	17.68	0.063	1535	2326	2256	0.84	0.80	0.88	0.84
11	1.42	0.005	1556	2348	2276	0.63	0.58	0.68	0.63
86	11.30	0.040	1553	2345	2274	0.66	0.61	0.70	0.66
172	22.62	0.080	1550	2338	2270	0.69	0.68	0.74	0.70
269	35.34	0.125	1546	2330	2265	0.73	0.76	0.79	0.76
355	46.66	0.165	1540	2323	2258	0.79	0.83	0.86	0.83
452	59.38	0.210	1530	2314	2250	0.89	0.92	0.94	0.92

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04


Test No.: A.A/EV/002

Location: From 5+100 to 5+400 5+250

Level: -1.5

Layer: Upper Embankment

Plate Diameter: 600 mm

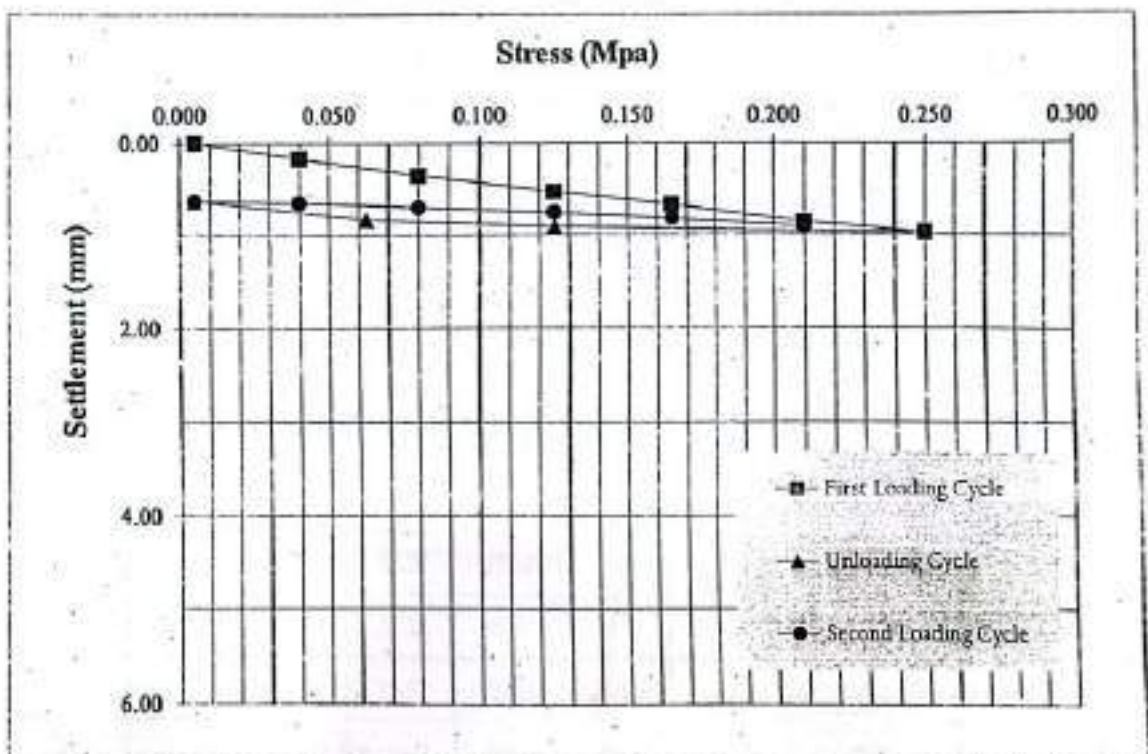

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-3.051	4.752	-0.013
Second Cycle	3.522	0.637	0.627

Strain Modulus		
Ev1	112.8	Mpa
Ev2	296.6	Mpa
Ev2 / Ev1	2.6	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: A.A/EV/003

Location: From 5+100 to 5+400 5+350

Level: -1.5

Layer: Upper Embankment

Plate Diameter: 600 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
11	1.42	0.005	1700	2026	2790	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	1670	1998	2763	0.30	0.28	0.27	0.28
172	22.62	0.080	1638	1970	2738	0.62	0.56	0.52	0.57
269	35.34	0.125	1600	1936	2707	1.00	0.90	0.83	0.91
355	46.66	0.165	1571	1910	2694	1.29	1.16	0.96	1.14
452	59.38	0.210	1534	1876	2665	1.66	1.50	1.25	1.47
538	70.68	0.250	1512	1854	2642	1.88	1.72	1.48	1.69
269	35.34	0.125	1518	1862	2651	1.82	1.64	1.39	1.62
135	17.68	0.063	1531	1880	2670	1.69	1.46	1.20	1.45
11	1.42	0.005	1562	1910	2693	1.38	1.16	0.97	1.17
86	11.30	0.040	1560	1908	2690	1.40	1.18	1.00	1.19
172	22.62	0.080	1556	1898	2681	1.44	1.28	1.09	1.27
269	35.34	0.125	1542	1883	2675	1.58	1.43	1.15	1.39
355	46.66	0.165	1531	1873	2664	1.69	1.53	1.26	1.49
452	59.38	0.210	1516	1859	2655	1.84	1.67	1.35	1.62

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04


Test No.: A.A/EV/003

Location: From 5+100 to 5+400 5+350

Level: -1.5

Layer: Upper Embankment

Plate Diameter: 600 mm

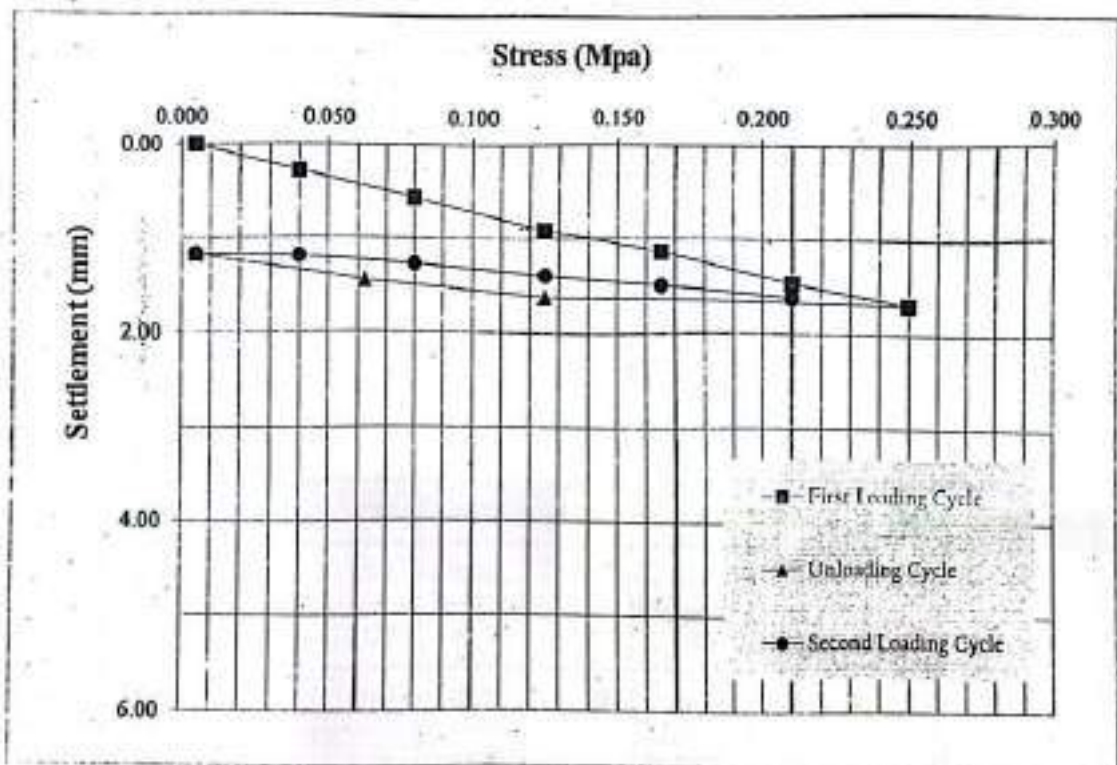

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-3.400	7.736	-0.022
Second Cycle	5.445	1.108	1.154

Strain Modulus		
Ev1	65.3	Mpa
Ev2	182.2	Mpa
Ev2/Ev1	2.8	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 2 of 2

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: AA /EV/004

Location: from 5+600 To 5+800 5+750

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Encrpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3404	4530	4538	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3338	4459	4483	0.66	0.71	0.55	0.64
86	11.31	0.160	3307	4425	4460	0.97	1.05	0.78	0.93
135	17.67	0.250	3265	4375	4431	1.39	1.55	1.07	1.34
178	23.33	0.330	3234	4338	4405	1.70	1.92	1.33	1.65
226	29.69	0.420	3210	4303	4380	1.94	2.27	1.58	1.93
269	35.34	0.500	3182	4270	4358	2.22	2.60	1.80	2.21
135	17.67	0.250	3185	4272	4360	2.19	2.58	1.78	2.18
67	8.84	0.125	3194	4281	4370	2.10	2.49	1.68	2.09
5	0.71	0.010	3223	4312	4398	1.81	2.18	1.40	1.80
43	5.65	0.080	3220	4310	4396	1.84	2.20	1.42	1.82
86	11.31	0.160	3214	4303	4390	1.90	2.27	1.48	1.88
135	17.67	0.250	3204	4293	4380	2.00	2.37	1.58	1.98
178	23.33	0.330	3194	4281	4369	2.10	2.49	1.69	2.09
226	29.69	0.420	3195	4271	4359	2.09	2.59	1.79	2.16

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 1 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/004

Location: from 5+600 To 5+800 S+750

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

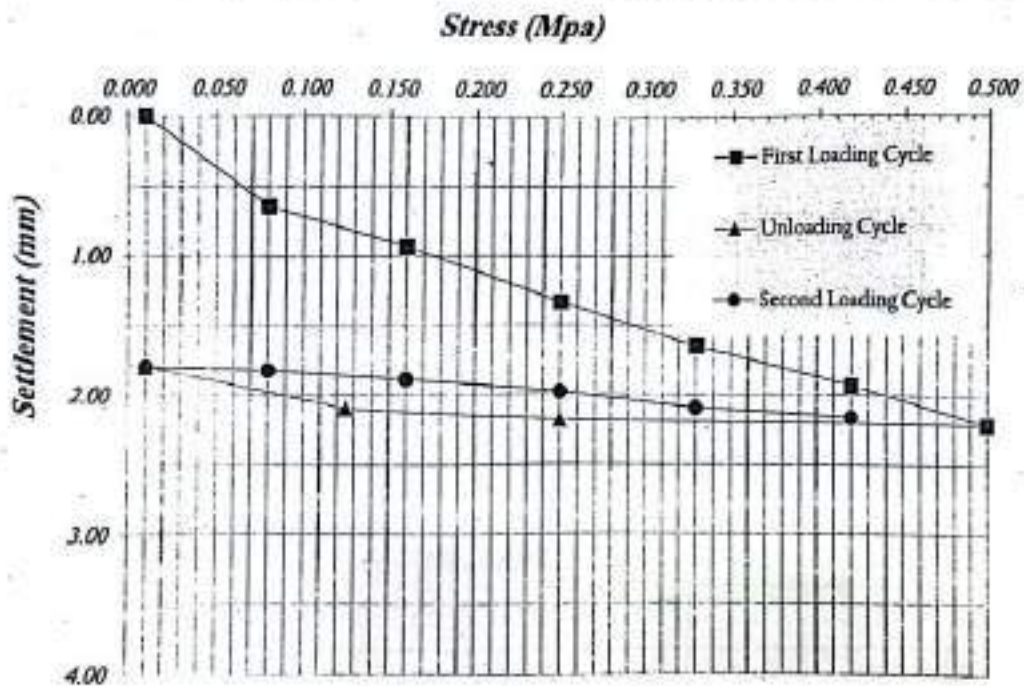

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.484	4.623	0.265
Second Cycle	0.717	0.638	1.777

Strain Modulus		
Ev1	58.0	Mpa
Ev2	225.8	Mpa
Ev2 / Ev1	3.9	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien



Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/005

Location: from 5+600 To 5+800 5+650

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Emcapack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3590	4068	4393	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3525	4002	4324	0.65	0.66	0.69	0.67
86	11.31	0.160	3493	3970	4290	0.97	0.98	1.03	0.99
135	17.67	0.250	3456	3932	4255	1.34	1.36	1.38	1.36
178	23.33	0.330	3428	3895	4230	1.62	1.73	1.63	1.66
226	29.69	0.420	3404	3865	4209	1.86	2.03	1.84	1.91
269	35.34	0.500	3375	3832	4184	2.15	2.36	2.09	2.20
135	17.67	0.250	3378	3835	4188	2.12	2.33	2.05	2.17
67	8.84	0.125	3388	3846	4197	2.02	2.22	1.96	2.07
5	0.71	0.010	3412	3877	4222	1.78	1.91	1.71	1.80
43	5.65	0.080	3410	3875	4220	1.80	1.93	1.73	1.82
86	11.31	0.160	3405	3869	4214	1.85	1.99	1.79	1.88
135	17.67	0.250	3395	3859	4204	1.95	2.09	1.89	1.98
178	23.33	0.330	3386	3848	4195	2.04	2.20	1.98	2.07
226	29.69	0.420	3375	3837	4186	2.15	2.31	2.07	2.18

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/005

Location: from 5+600 To 5+800 5+650

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

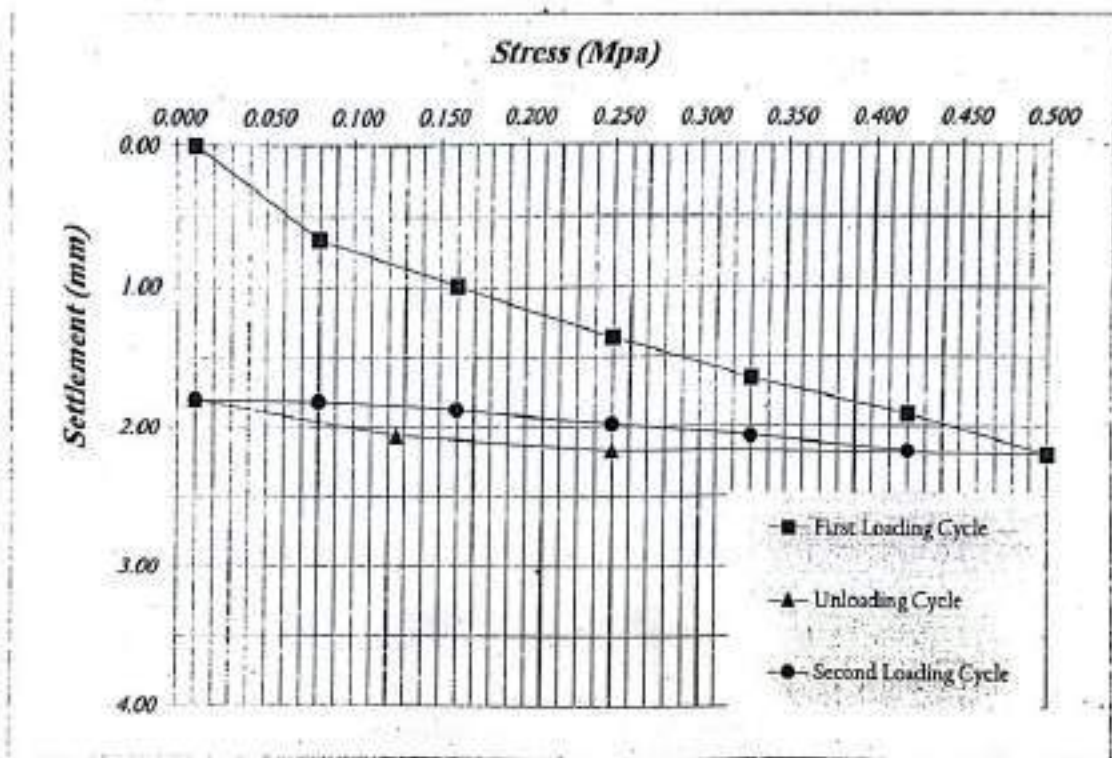

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.666	4.585	0.310
Second Cycle	1.254	0.418	1.787

Strain Modulus		
Ev1	60.0	Mpa
Ev2	215.3	Mpa
Ev2 / Ev1	3.6	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/010

Location: from 5+400 To 5+600 5+450

Level:

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3030	2570	4004	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3021	2557	3997	0.09	0.13	0.07	0.10
86	11.31	0.160	3000	2538	3982	0.30	0.32	0.22	0.28
135	17.67	0.250	2974	2515	3967	0.56	0.55	0.37	0.49
178	23.33	0.330	2957	2499	3954	0.73	0.71	0.50	0.65
226	29.69	0.420	2942	2484	3941	0.88	0.86	0.63	0.79
269	35.34	0.500	2927	2470	3930	1.03	1.00	0.74	0.92
135	17.67	0.250	2935	2480	3937	0.95	0.90	0.67	0.84
86	8.84	0.125	2940	2486	3942	0.90	0.84	0.62	0.79
5	0.71	0.010	2949	2500	3950	0.81	0.70	0.54	0.68
43	5.65	0.080	2948	2499	3948	0.82	0.71	0.56	0.70
86	11.31	0.160	2946	2497	3946	0.84	0.73	0.58	0.72
135	17.67	0.250	2940	2491	3941	0.90	0.79	0.63	0.77
178	23.33	0.330	2933	2484	3935	0.97	0.86	0.69	0.84
226	29.69	0.420	2925	2476	3927	1.05	0.94	0.77	0.92

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page: 01 of 1



Date:

23/08/2023

Project:

إنشاء الجسر الترابي و طرق القدمة لخط

سكة حديد الروبيكي / بالعبس

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**


Test No.: AA /EV/010

Location: from 5+400 To 5+600 5+450

Level:

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

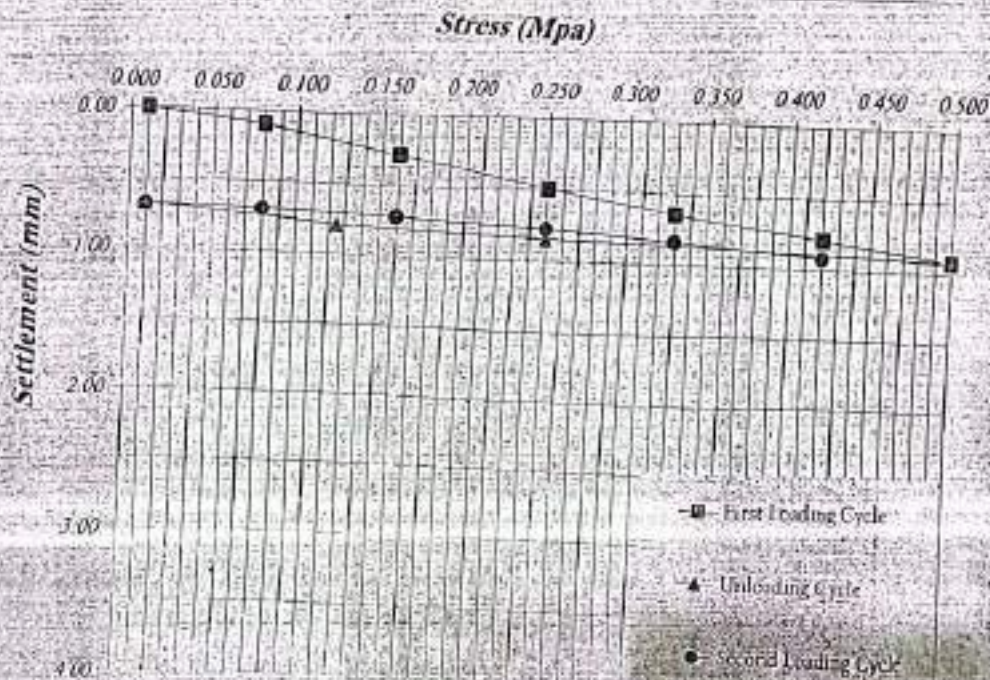

Regression Analysis			
Coefficients	a_1	a_2	a_0
First Cycle	-1.351	2.748	-0.117
Second Cycle	1.234	0.054	0.682

Strain Modulus		
Ev1	108.5	Mpa
Ev2	335.1	Mpa
Ev2/Ev1	3.1	

For Q Lab

Tested by: Elieh Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdelhadi Hussein

Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA/EV/011

Location: from 5+400 To 5+600 5+550

Level:

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Emestack Reading bar	Applied Load, kN	Stress Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement mm
5	0.71	0.010	3912	3650	4109	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3841	3596	4081	0.71	0.54	0.28	0.51
86	11.31	0.160	3814	3575	4069	0.98	0.75	0.40	0.71
135	17.67	0.250	3782	3547	4044	1.30	1.03	0.65	0.99
178	23.33	0.330	3762	3527	4022	1.50	1.23	0.87	1.20
226	29.69	0.420	3744	3509	4004	1.68	1.41	1.05	1.38
269	35.34	0.500	3729	3492	3985	1.83	1.58	1.24	1.55
135	17.67	0.250	3737	3502	3992	1.75	1.48	1.17	1.47
67	8.84	0.125	3747	3513	4001	1.65	1.37	1.08	1.37
5	0.71	0.010	3761	3531	4016	1.51	1.19	0.93	1.21
43	5.65	0.080	3759	3528	4014	1.53	1.22	0.95	1.23
86	11.31	0.160	3756	3524	4010	1.55	1.26	0.99	1.27
135	17.67	0.250	3748	3515	4002	1.64	1.35	1.07	1.35
178	23.33	0.330	3740	3506	3994	1.72	1.44	1.15	1.44
226	29.69	0.420	3732	3498	3987	1.80	1.52	1.22	1.51

Notes:

For Q Lab

Tested by: Techr Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2




Date: إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لخط
Project: سكة حديد الروبيكي / بابوس
Contractor: شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/011
Location: from 5+400 To 5+600 5+550
Level: --
Soil Type: Natural Ground
Plate Diameter: 300. mm

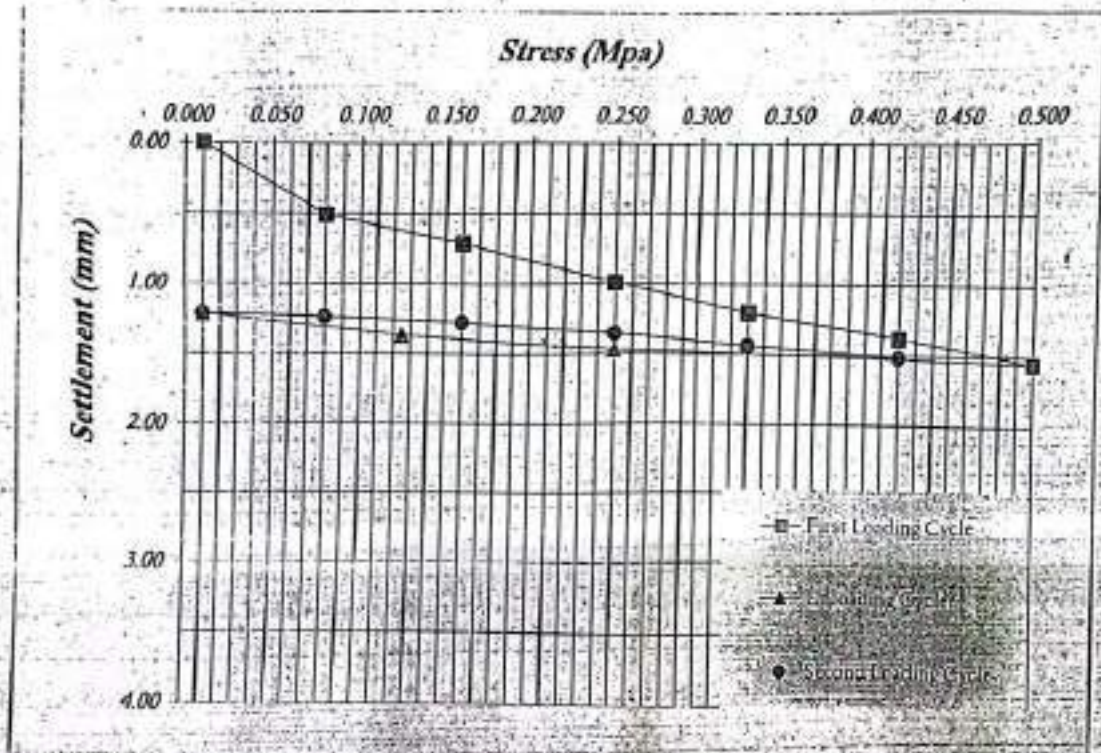

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	1.445	3.344	0.239
Second Cycle	0.981	0.349	1.201

Strain Modulus		
Ev1	85.8	Mpa
Ev2	268.0	Mpa
Ev2/Ev1	3.1	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

(Signature)
Page 2 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/005

Location: from 5+600 To 5+800 5+650

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Emirpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3590	4068	4393	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3525	4002	4324	0.65	0.66	0.69	0.67
86	11.31	0.160	3493	3970	4290	0.97	0.98	1.03	0.99
135	17.67	0.250	3456	3932	4255	1.34	1.36	1.38	1.36
178	23.33	0.330	3428	3895	4230	1.62	1.73	1.63	1.66
226	29.69	0.420	3404	3865	4209	1.86	2.03	1.84	1.91
269	35.34	0.500	3375	3832	4184	2.15	2.36	2.09	2.20
135	17.67	0.250	3378	3835	4188	2.12	2.33	2.05	2.17
67	8.84	0.125	3388	3846	4197	2.02	2.22	1.96	2.07
5	0.71	0.010	3412	3877	4222	1.78	1.91	1.71	1.80
43	5.65	0.080	3410	3875	4220	1.80	1.93	1.73	1.82
86	11.31	0.160	3405	3869	4214	1.85	1.99	1.79	1.88
135	17.67	0.250	3395	3859	4204	1.95	2.09	1.89	1.98
178	23.33	0.330	3386	3848	4195	2.04	2.20	1.98	2.07
226	29.69	0.420	3375	3837	4186	2.15	2.31	2.07	2.18

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/005

Location: from 5+600 To 5+800 5+650

Level: ---

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

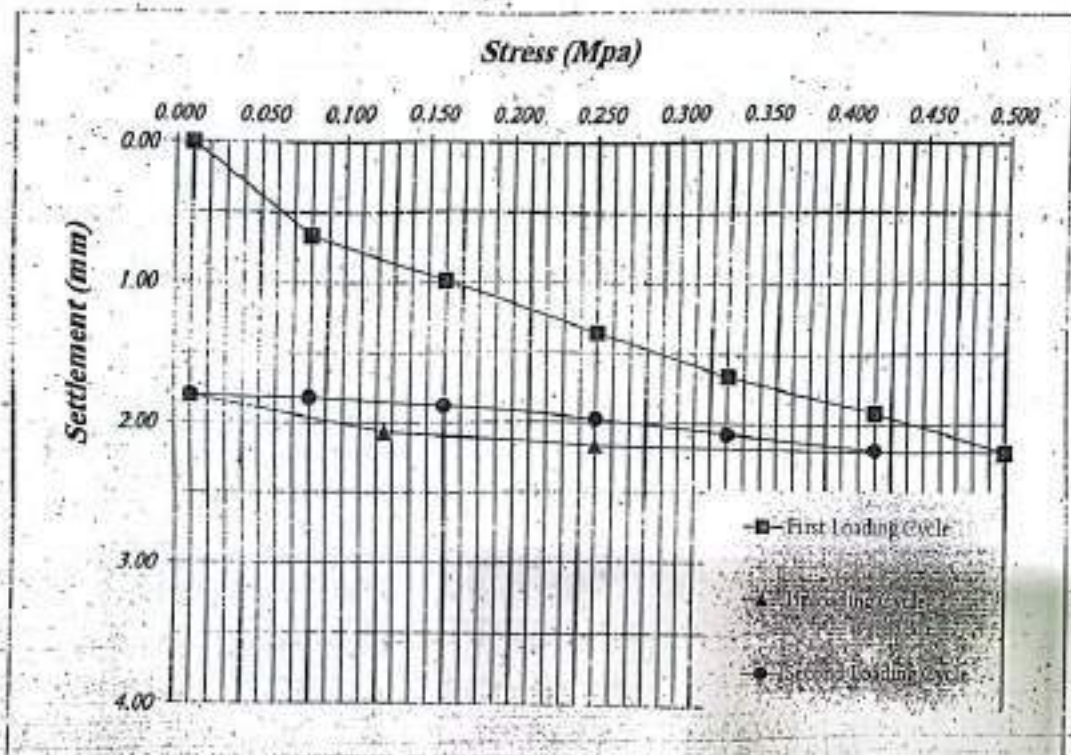

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.666	4.585	0.310
Second Cycle	1.254	0.418	1.787

Strain Modulus		
Ev1	60.0	Mpa
Ev2	215.3	Mpa
Ev2 / Ev1	3.6	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Signature

Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/004

Location: from 5+600 To 5+800 5+750

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3404	4530	4538	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3338	4459	4483	0.66	0.71	0.55	0.64
86	11.31	0.160	3307	4425	4460	0.97	1.05	0.78	0.93
135	17.67	0.250	3265	4375	4431	1.39	1.55	1.07	1.34
178	23.33	0.330	3234	4338	4405	1.70	1.92	1.33	1.65
226	29.69	0.420	3210	4303	4380	1.94	2.27	1.58	1.93
269	35.34	0.500	3182	4270	4358	2.22	2.60	1.80	2.21
135	17.67	0.250	3185	4272	4360	2.19	2.58	1.78	2.18
67	8.84	0.125	3194	4281	4370	2.10	2.49	1.68	2.09
5	0.71	0.010	3223	4312	4398	1.81	2.18	1.40	1.80
43	5.65	0.080	3220	4310	4396	1.84	2.20	1.42	1.82
86	11.31	0.160	3214	4303	4390	1.90	2.27	1.48	1.88
135	17.67	0.250	3204	4293	4380	2.00	2.37	1.58	1.98
178	23.33	0.330	3194	4281	4369	2.10	2.49	1.69	2.09
226	29.69	0.420	3195	4271	4359	2.09	2.59	1.79	2.16

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

[Signature]
Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/004

Location: from 5+600 To 5+800 5+750

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

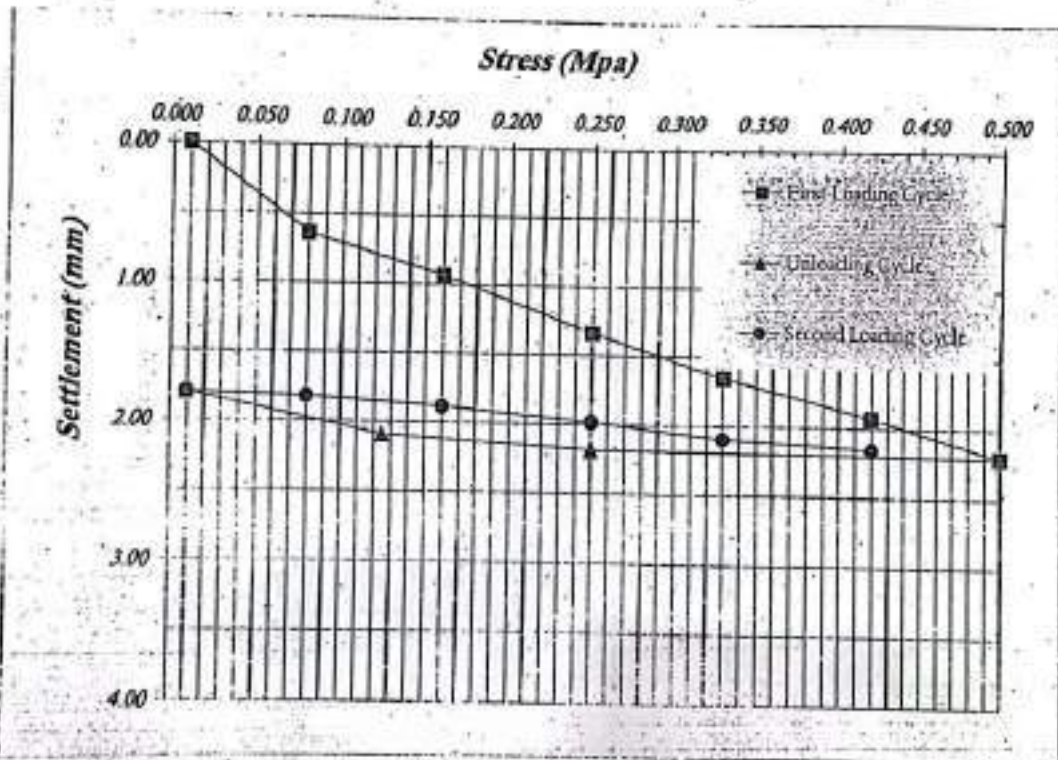

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.484	4.623	0.265
Second Cycle	0.717	0.638	1.777

Strain Modulus		
Ev1	58.0	Mpa
Ev2	225.8	Mpa
Ev2/Ev1	3.9	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Euc

Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/005
 Location: from 5+600 To 5+800 5+650
 Level: --
 Soil Type: Natural Ground
 Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3590	4068	4393	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3525	4002	4324	0.65	0.66	0.69	0.67
86	11.31	0.160	3493	3970	4290	0.97	0.98	1.03	0.99
135	17.67	0.250	3456	3932	4255	1.34	1.36	1.38	1.36
178	23.33	0.330	3428	3895	4230	1.62	1.73	1.63	1.66
226	29.69	0.420	3404	3865	4209	1.86	2.03	1.84	1.91
269	35.34	0.500	3375	3832	4184	2.15	2.36	2.09	2.20
135	17.67	0.250	3378	3835	4188	2.12	2.33	2.05	2.17
67	8.84	0.125	3388	3846	4197	2.02	2.22	1.96	2.07
5	0.71	0.010	3412	3877	4222	1.78	1.91	1.71	1.80
43	5.65	0.080	3410	3875	4220	1.80	1.93	1.73	1.82
86	11.31	0.160	3405	3869	4214	1.85	1.99	1.79	1.88
135	17.67	0.250	3395	3859	4204	1.95	2.09	1.89	1.98
178	23.33	0.330	3386	3848	4195	2.04	2.20	1.98	2.07
226	29.69	0.420	3375	3837	4186	2.15	2.31	2.07	2.18

Notes:

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/005

Location: from 5+600 To 5+800 5+650

Level: --

Soil Type : Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

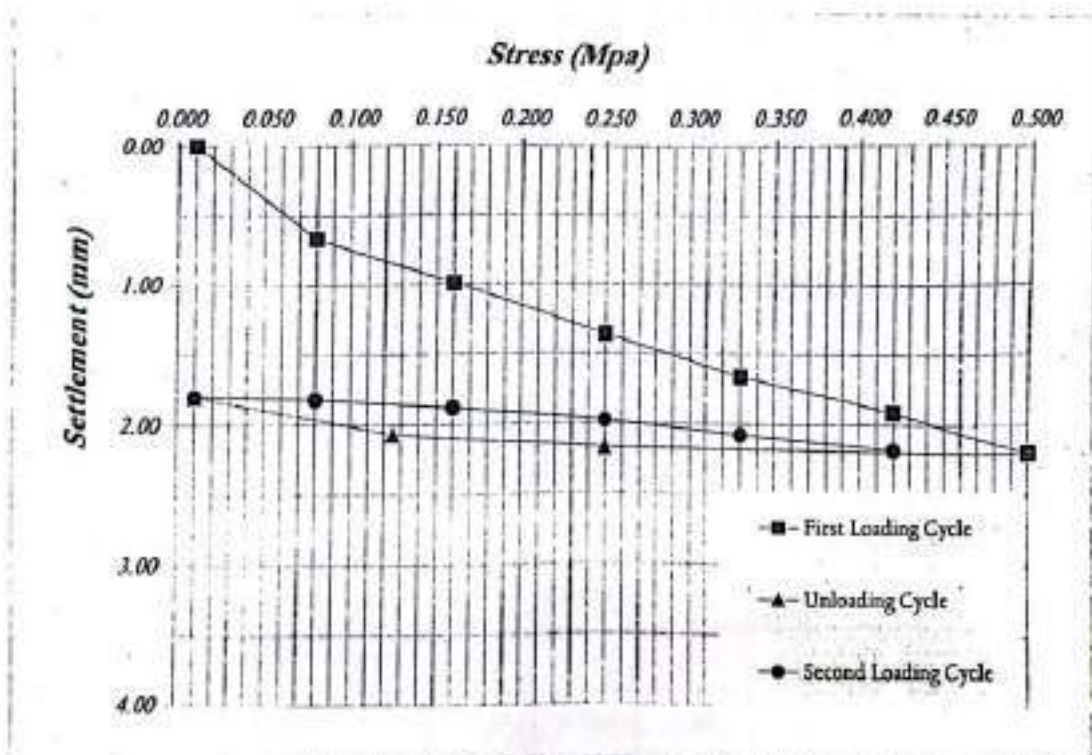

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.666	4.585	0.310
Second Cycle	1.254	0.418	1.787

Strain Modulus		
Ev1	60.0	Mpa
Ev2	215.3	Mpa
Ev2 / Ev1	3.6	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Signature



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EVI & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/004

Location: from 5+600 To 5+800 5+750

Level: ..

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3404	4530	4538	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3338	4459	4483	0.66	0.71	0.55	0.64
86	11.31	0.160	3307	4425	4460	0.97	1.05	0.78	0.93
135	17.67	0.250	3265	4375	4431	1.39	1.55	1.07	1.34
178	23.33	0.330	3234	4338	4405	1.70	1.92	1.33	1.65
226	29.69	0.420	3210	4303	4380	1.94	2.27	1.58	1.93
269	35.34	0.500	3182	4270	4358	2.22	2.60	1.80	2.21
135	17.67	0.250	3185	4272	4360	2.19	2.58	1.78	2.18
67	8.84	0.125	3194	4281	4370	2.10	2.49	1.68	2.09
5	0.71	0.010	3223	4312	4398	1.81	2.18	1.40	1.80
43	5.65	0.080	3220	4310	4396	1.84	2.20	1.42	1.82
86	11.31	0.160	3214	4303	4390	1.90	2.27	1.48	1.88
135	17.67	0.250	3204	4293	4380	2.00	2.37	1.58	1.98
178	23.33	0.330	3194	4281	4369	2.10	2.49	1.69	2.09
226	29.69	0.420	3195	4271	4359	2.09	2.59	1.79	2.16

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/004

Location: From 5+600 To 5+800 5+750

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

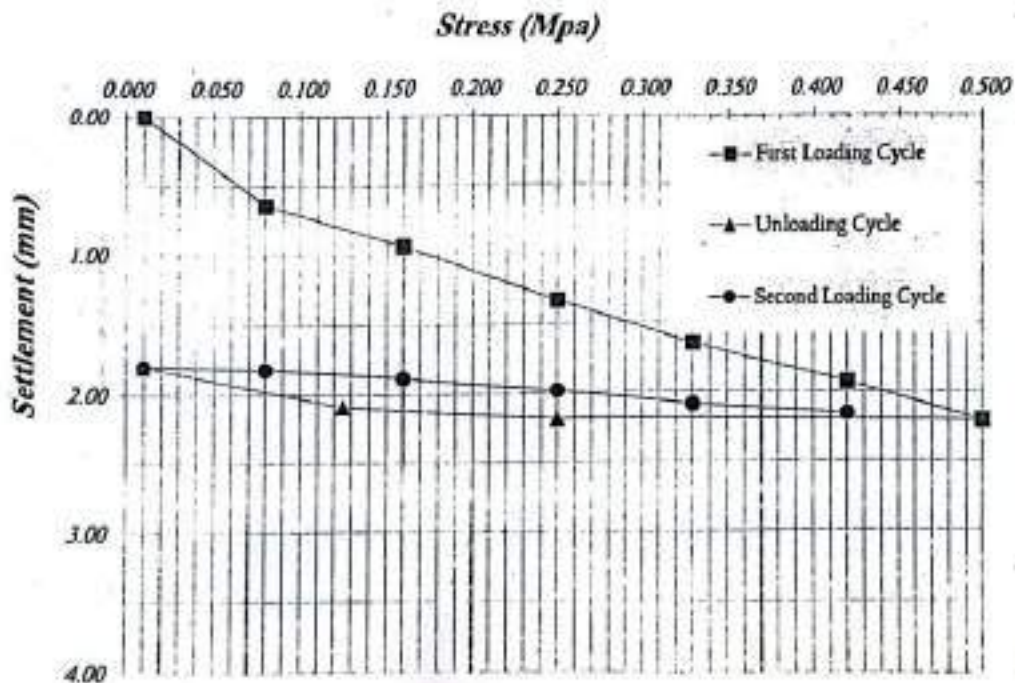

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.484	4.623	0.265
Second Cycle	0.717	0.638	1.777

Strain Modulus		
Ev1	58.0	Mpa
Ev2	225.8	Mpa
Ev2 / Ev1	3.9	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Luc

Page 2 of 2



Project:

إنشاء الجسر القرائي و طارء الخدمة الخط

سكة حديد الرويني / بابوس

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN 18134-2012-04**

Test No.: AA/EV/011

Location: from 5+800 To 5+880 5+840

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3266	4025	2880	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3234	3996	2850	0.32	0.29	0.30	0.30
86	11.31	0.160	3213	3976	2832	0.53	0.49	0.48	0.50
135	17.67	0.250	3190	3951	2804	0.76	0.74	0.76	0.75
178	23.33	0.330	3172	3932	2789	0.94	0.93	0.91	0.93
226	29.69	0.420	3152	3913	2768	1.14	1.12	1.12	1.13
269	35.34	0.500	3131	3891	2743	1.35	1.34	1.37	1.35
135	17.67	0.250	3135	3895	2748	1.31	1.30	1.32	1.31
67	8.84	0.125	3143	3901	2756	1.23	1.24	1.24	1.24
5	0.71	0.010	3159	3918	2775	1.07	1.07	1.05	1.06
43	5.65	0.080	3157	3916	2772	1.09	1.09	1.08	1.09
86	11.31	0.160	3151	3910	2765	1.15	1.15	1.15	1.15
135	17.67	0.250	3147	3903	2759	1.19	1.22	1.21	1.21
178	23.33	0.330	3140	3896	2750	1.26	1.29	1.30	1.28
226	29.69	0.420	3130	3890	2740	1.36	1.35	1.40	1.37

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA / EV / 011

Location: from 5+800 To 5+880 5+840

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

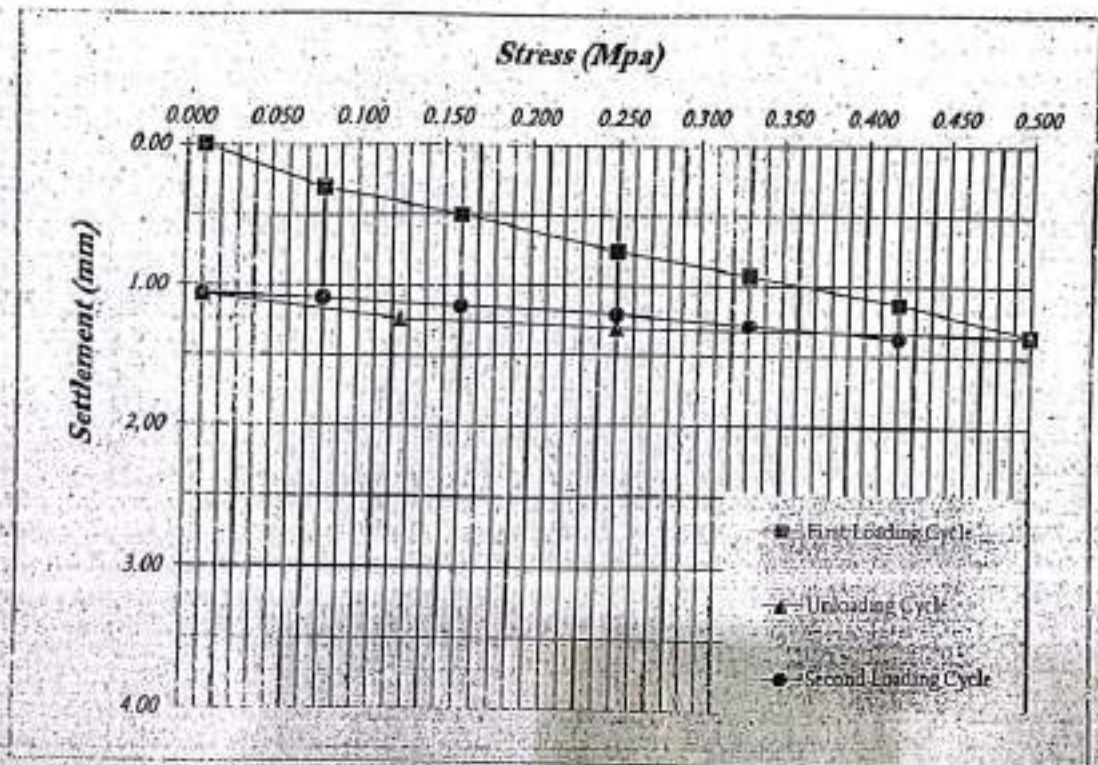

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.174	2.568	0.101
Second Cycle	-0.778	0.424	1.056

Strain Modulus		
Ev1	90.7	Mpa
Ev2	276.7	Mpa
Ev2/Ev1	3.1	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 2 of 2

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/007

Location: from 6+480 To 6+680 6+510

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	4107	3510	3876	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	4082	3464	3853	0.25	0.46	0.23	0.31
86	11.31	0.160	4061	3436	3837	0.46	0.74	0.39	0.53
135	17.67	0.250	4036	3405	3810	0.71	1.05	0.66	0.81
178	23.33	0.330	4010	3378	3785	0.97	1.32	0.91	1.07
226	29.69	0.420	3983	3350	3760	1.24	1.60	1.16	1.33
269	35.34	0.500	3968	3332	3748	1.39	1.78	1.28	1.48
135	17.67	0.250	3972	3335	3752	1.35	1.75	1.24	1.45
67	8.84	0.125	3982	3345	3761	1.25	1.65	1.15	1.35
5	0.71	0.010	4000	3364	3779	1.07	1.46	0.97	1.17
43	5.65	0.080	3998	3361	3776	1.09	1.49	1.00	1.19
86	11.31	0.160	3995	3357	3772	1.12	1.53	1.04	1.23
135	17.67	0.250	3990	3351	3767	1.17	1.59	1.09	1.28
178	23.33	0.330	3982	3343	3760	1.25	1.67	1.16	1.36
226	29.69	0.420	3973	3333	3750	1.34	1.77	1.26	1.46

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA/EV/007

Location: from 6+480 To 6+680 6+510

Level: ~

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

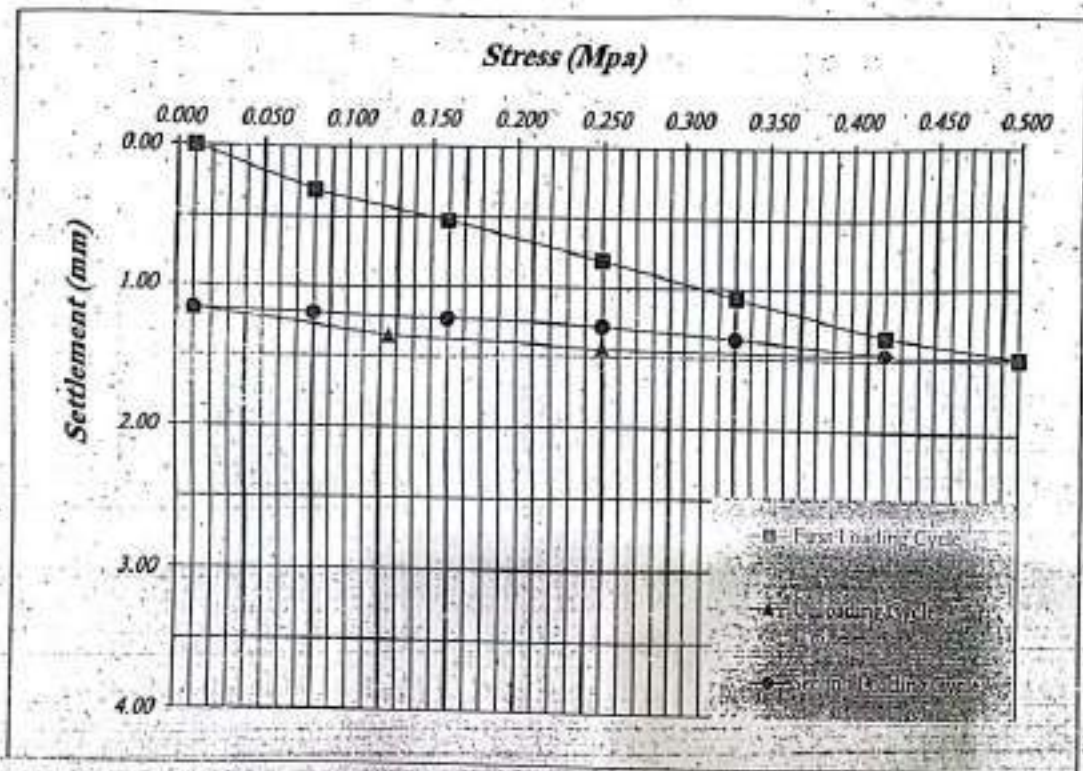

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.934	3.421	0.028
Second Cycle	1.191	0.187	1.167

Strain Modulus		
Ev1	76.2	Mpa
Ev2	287.4	Mpa
Ev2/Ev1	3.8	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien





Date:

Project:

إنشاء الجسر الكباري و طرق الخدمة لخط
سكة حديد الروميكي / بلديس

Contractor:

شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)**DIN18134-2012-04**

Test No.: AA /EV/008

Location: from 6+480 To 6+680 6+630

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	2858	4409	3727	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	2840	4387	3703	0.18	0.22	0.24	0.21
86	11.31	0.160	2830	4375	3688	0.28	0.34	0.39	0.34
135	17.67	0.250	2806	4349	3656	0.52	0.60	0.71	0.61
178	23.33	0.330	2793	4334	3641	0.65	0.75	0.86	0.75
226	29.69	0.420	2783	4314	3627	0.75	0.95	1.00	0.90
269	35.34	0.500	2770	4300	3613	0.88	1.09	1.14	1.04
135	17.67	0.250	2774	4305	3618	0.84	1.04	1.09	0.99
67	8.84	0.125	2787	4317	3630	0.71	0.92	0.97	0.87
5	0.71	0.010	2805	4336	3648	0.53	0.73	0.79	0.68
43	5.65	0.080	2803	4334	3646	0.55	0.75	0.81	0.70
86	11.31	0.160	2800	4330	3642	0.58	0.79	0.85	0.74
135	17.67	0.250	2792	4322	3633	0.66	0.87	0.94	0.82
178	23.33	0.330	2784	4315	3624	0.74	0.94	1.03	0.90
226	29.69	0.420	2774	4306	3617	0.84	1.03	1.10	0.99

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 1 of 2

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**


Test No.: AA /EV/008

Location: from 6+480 To 6+680 6+630

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

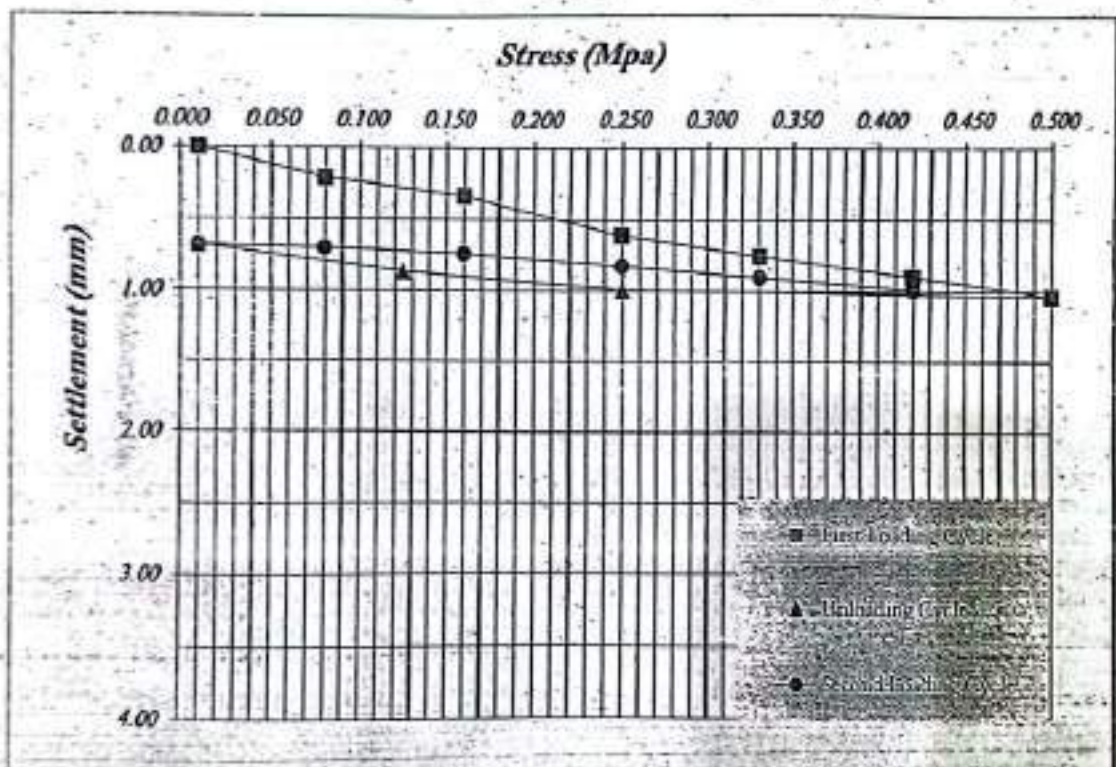

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-1.146	2.676	-0.014
Second Cycle	1.128	0.289	0.676

Strain Modulus		
Ev1	107.0	Mpa
Ev2	263.8	Mpa
Ev2/Ev1	2.5	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 2 of 2



PLATELOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA/EV/017

Location: from 6+680 To 6+760 6+710

Level:

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Embedment Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3187	1803	2935	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3151	1786	2909	0.36	0.17	0.26	0.26
86	11.31	0.160	3131	1775	2891	0.56	0.28	0.44	0.43
135	17.67	0.250	3098	1754	2861	0.89	0.49	0.74	0.71
178	23.33	0.330	3074	1737	2844	1.13	0.66	0.91	0.90
226	29.69	0.420	3053	1720	2831	1.34	0.83	1.04	1.07
269	35.34	0.500	3034	1698	2817	1.53	1.05	1.18	1.25
135	17.67	0.250	3039	1701	2822	1.48	1.02	1.13	1.21
67	8.84	0.125	3049	1712	2833	1.38	0.91	1.02	1.10
5	0.71	0.010	3077	1741	2865	1.10	0.62	0.70	0.81
43	5.65	0.080	3072	1739	2856	1.15	0.64	0.79	0.86
86	11.31	0.160	3065	1734	2851	1.22	0.69	0.84	0.92
135	17.67	0.250	3053	1722	2841	1.34	0.81	0.94	1.03
178	23.33	0.330	3044	1714	2833	1.43	0.89	1.02	1.11
226	29.69	0.420	3034	1705	2825	1.53	0.98	1.10	1.20

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/017

Location: from 6+680 To 6+760 6+710

Level: ---

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

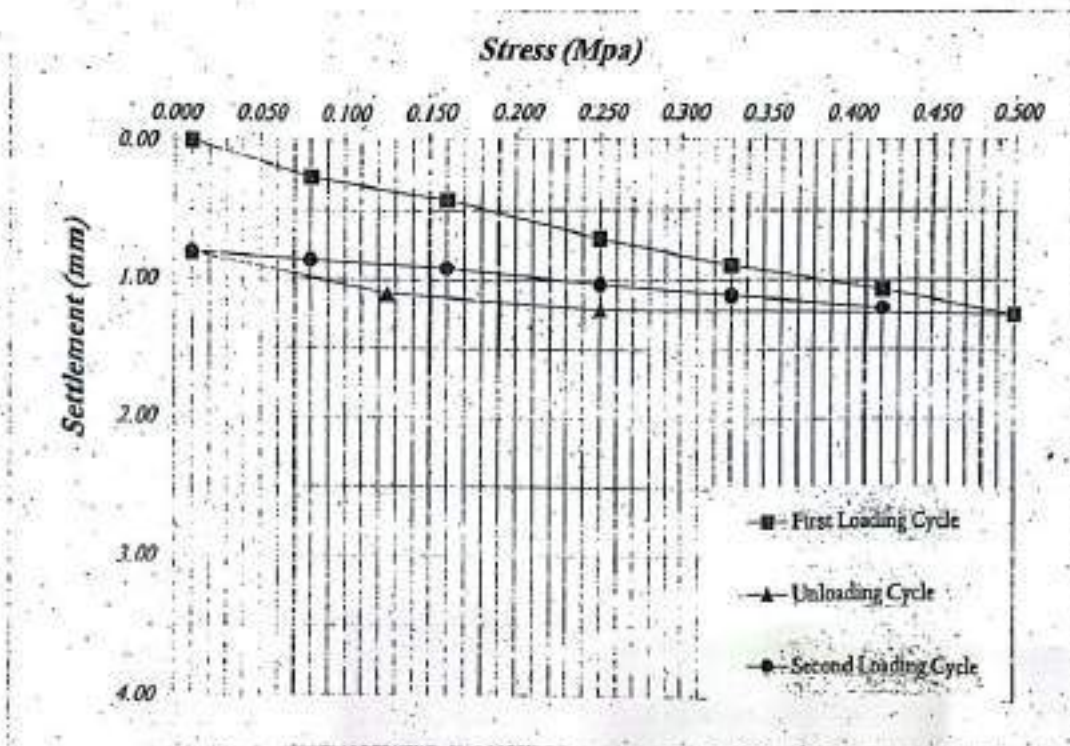

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.888	2.905	0.021
Second Cycle	0.488	0.782	0.794

Strain Modulus		
Ev1	91.4	Mpa
Ev2	219.3	Mpa
Ev2/Ev1	2.4	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/006

Location: from 7+440 To 7+560 7+500

Level:

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

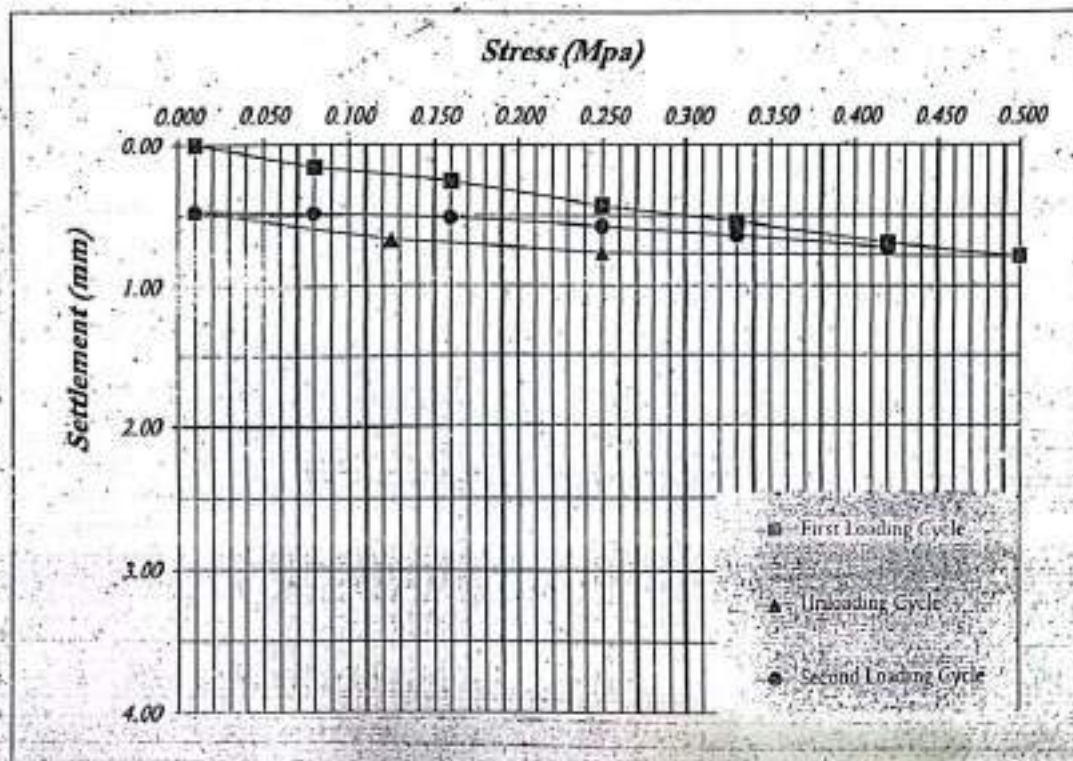

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.281	1.722	0.009
Second Cycle	1.152	0.155	0.464

Strain Modulus		
Ev1	142.3	Mpa
Ev2	307.8	Mpa
Ev2/Ev1	2.2	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/006

Location: from 7+440 To 7+560 7+500

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3279	4095	4027	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3261	4077	4016	0.18	0.18	0.11	0.16
86	11.31	0.160	3252	4066	4007	0.27	0.29	0.20	0.25
135	17.67	0.250	3238	4045	3989	0.41	0.50	0.38	0.43
178	23.33	0.330	3227	4033	3978	0.52	0.62	0.49	0.54
226	29.69	0.420	3212	4015	3965	0.67	0.80	0.62	0.70
269	35.34	0.500	3204	4004	3956	0.75	0.91	0.71	0.79
135	17.67	0.250	3206	4007	3959	0.73	0.88	0.68	0.76
67	8.84	0.125	3216	4016	3968	0.63	0.79	0.59	0.67
5	0.71	0.010	3237	4040	3984	0.42	0.55	0.43	0.47
43	5.65	0.080	3236	4038	3982	0.43	0.57	0.45	0.48
86	11.31	0.160	3233	4035	3979	0.46	0.60	0.48	0.51
135	17.67	0.250	3227	4028	3973	0.52	0.67	0.54	0.58
178	23.33	0.330	3220	4021	3967	0.59	0.74	0.60	0.64
226	29.69	0.420	3211	4012	3959	0.68	0.83	0.68	0.73

Notes:

For Q-Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/009

Location: from 7+560 To 7+720 7+600

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

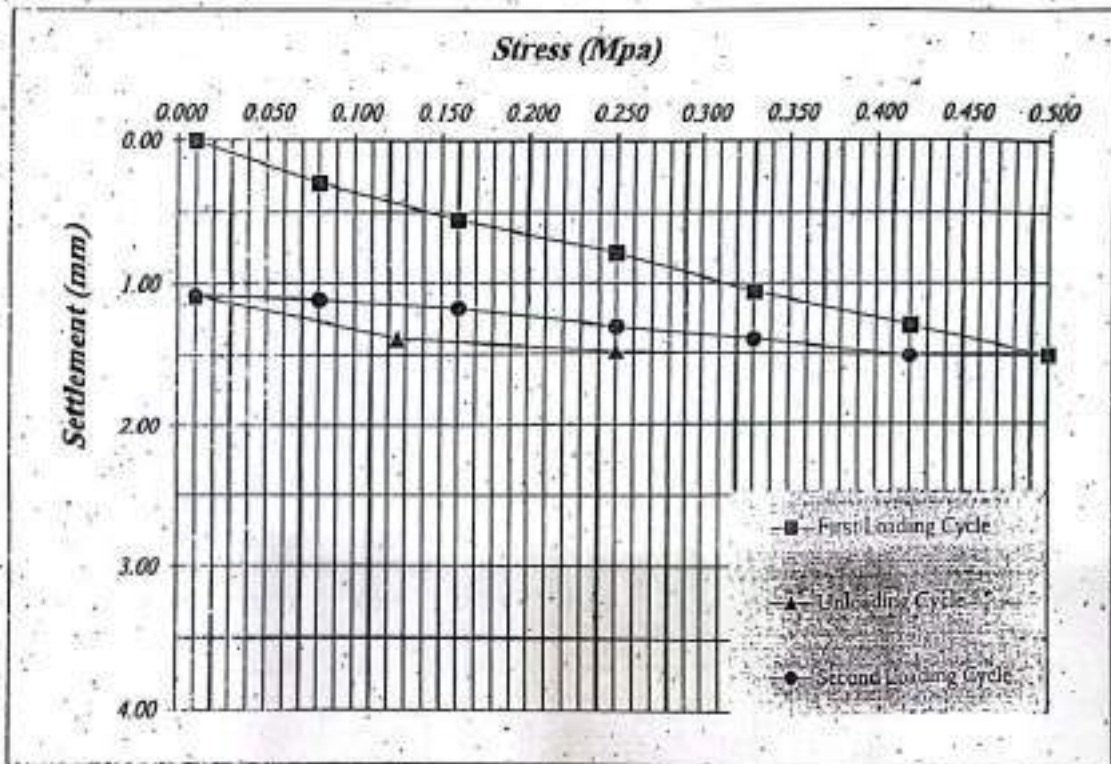

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-0.350	3.108	0.056
Second Cycle	1.018	0.652	1.068

Strain Modulus		
Ev1	76.7	Mpa
Ev2	193.9	Mpa
Ev2 / Ev1	2.5	

For Q Lab

Tested by : Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer : Abdallah Hussien

Page 2 of 2

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: AA /EV/009

Location: from 7+560 To 7+720 7+600

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300. mm


Energpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3922	3109	4272	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3900	3073	4240	0.22	0.36	0.32	0.30
86	11.31	0.160	3867	3055	4214	0.55	0.54	0.58	0.56
135	17.67	0.250	3847	3030	4190	0.75	0.79	0.82	0.79
178	23.33	0.330	3821	3002	4162	1.01	1.07	1.10	1.06
226	29.69	0.420	3797	2977	4139	1.25	1.32	1.33	1.30
269	35.34	0.500	3774	2954	4119	1.48	1.55	1.53	1.52
135	17.67	0.250	3778	2957	4122	1.44	1.52	1.50	1.49
67	8.84	0.125	3788	2968	4130	1.34	1.41	1.42	1.39
5	0.71	0.010	3816	3002	4160	1.06	1.07	1.12	1.08
43	5.65	0.080	3813	2997	4157	1.09	1.12	1.15	1.12
86	11.31	0.160	3807	2991	4152	1.15	1.18	1.20	1.18
135	17.67	0.250	3793	2976	4140	1.29	1.33	1.32	1.31
178	23.33	0.330	3785	2967	4131	1.37	1.42	1.41	1.40
226	29.69	0.420	3774	2955	4120	1.48	1.54	1.52	1.51

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**


Test No.: AA /EV/010

Location: from 7+560 To 7+720 7+660

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

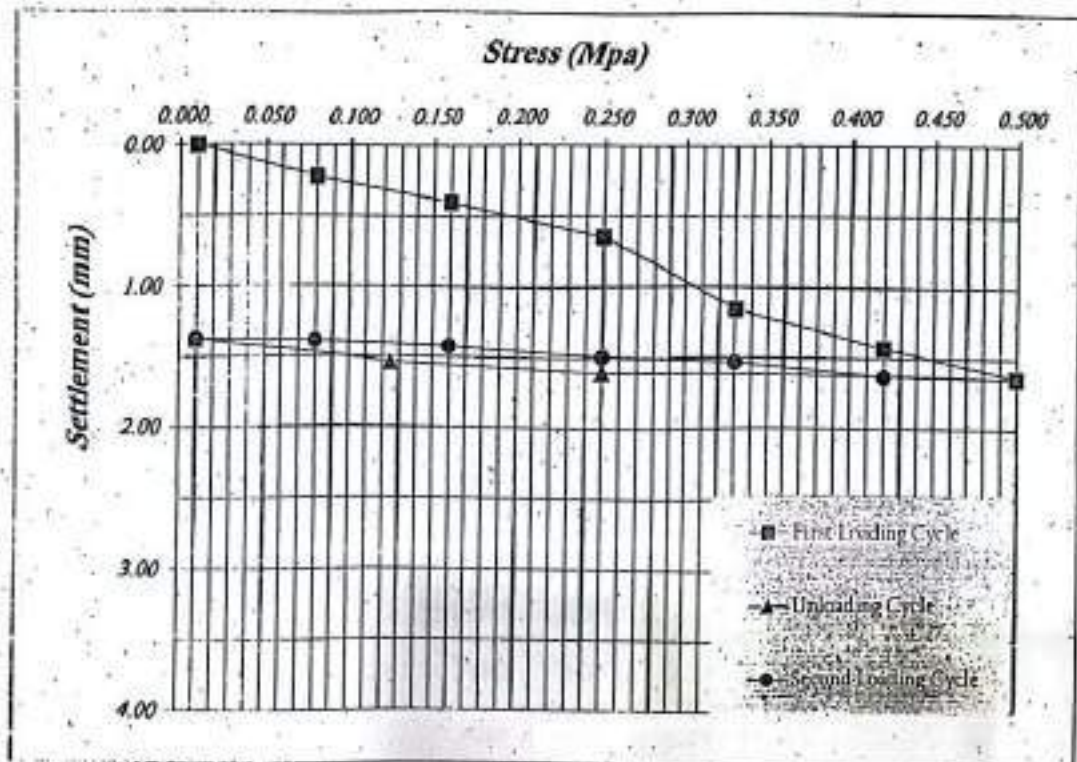

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.661	3.230	-0.091
Second Cycle	1.019	0.195	1.368

Strain Modulus		
Ev1	63.2	Mpa
Ev2	319.1	Mpa
Ev2/Ev1	5.1	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA /EV/010

Location: from 7+560 To 7+720 7+660

Level: ..

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3586	3882	3424	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3559	3867	3400	0.27	0.15	0.24	0.22
86	11.31	0.160	3540	3850	3382	0.46	0.32	0.42	0.40
135	17.67	0.250	3518	3822	3358	0.68	0.60	0.66	0.65
178	23.33	0.330	3402	3803	3340	1.84	0.79	0.84	1.16
226	29.69	0.420	3377	3774	3312	2.09	1.08	1.12	1.43
269	35.34	0.500	3356	3754	3290	2.30	1.28	1.34	1.64
135	17.67	0.250	3360	3758	3293	2.26	1.24	1.31	1.60
67	8.84	0.125	3367	3764	3299	2.19	1.18	1.25	1.54
5	0.71	0.010	3384	3782	3315	2.02	1.00	1.09	1.37
43	5.65	0.080	3382	3780	3313	2.04	1.02	1.11	1.39
86	11.31	0.160	3379	3776	3310	2.07	1.06	1.14	1.42
135	17.67	0.250	3372	3770	3303	2.14	1.12	1.21	1.49
178	23.33	0.330	3368	3766	3298	2.18	1.16	1.26	1.53
226	29.69	0.420	3358	3756	3288	2.28	1.26	1.36	1.63

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 1 of 2

**PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)****DIN 18134-2012-04**

Test No.: AA /EV/016

Location: from 7+760 To 7+860 7+800

Level: --

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3069	3260	3885	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3027	3241	3836	0.42	0.19	0.49	0.37
86	11.31	0.160	2990	3229	3803	0.79	0.31	0.82	0.64
135	17.67	0.250	2932	3212	3750	1.37	0.48	1.35	1.07
178	23.33	0.330	2897	3200	3718	1.72	0.60	1.67	1.33
226	29.69	0.420	2864	3184	3690	2.05	0.76	1.95	1.59
269	35.34	0.500	2840	3166	3668	2.29	0.94	2.17	1.80
135	17.67	0.250	2843	3169	3671	2.26	0.91	2.14	1.77
67	8.84	0.125	2850	3178	3683	2.19	0.82	2.02	1.68
5	0.71	0.010	2888	3198	3726	1.81	0.62	1.59	1.34
43	5.65	0.080	2885	3195	3718	1.84	0.65	1.67	1.39
86	11.31	0.160	2880	3190	3711	1.89	0.70	1.74	1.44
135	17.67	0.250	2865	3182	3696	2.04	0.78	1.89	1.57
178	23.33	0.330	2854	3173	3685	2.15	0.87	2.00	1.67
226	29.69	0.420	2841	3165	3674	2.28	0.95	2.11	1.78

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien





PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA /EV/016

Location: from 7+760 To 7+860 7+800

Level: --

Soil Type : Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

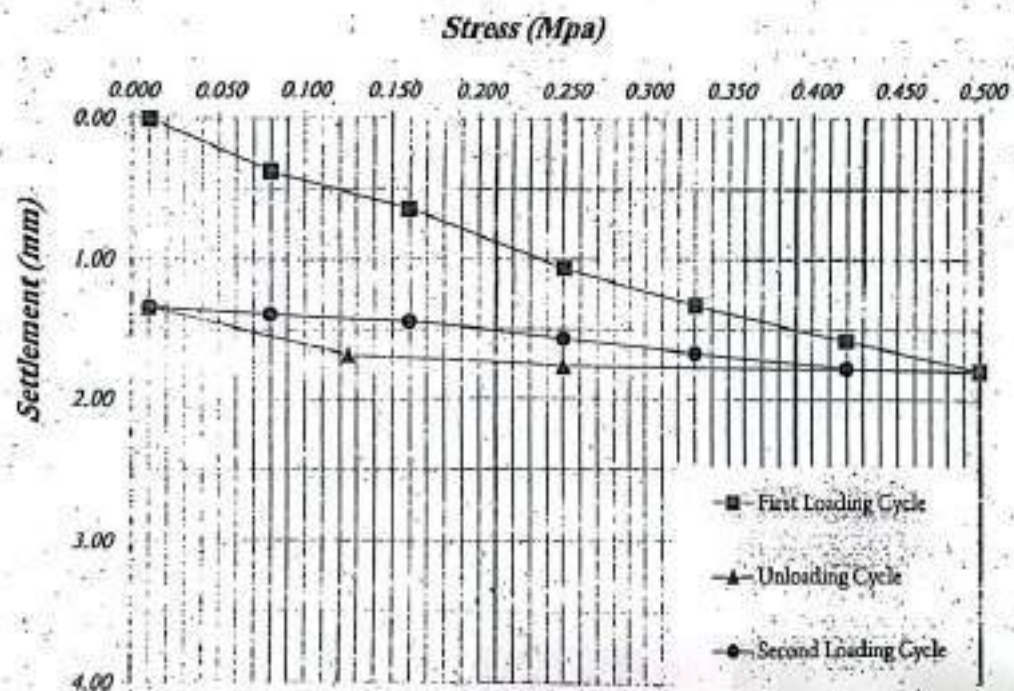

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-2.513	4.928	-0.034
Second Cycle	0.974	0.690	1.327

Strain Modulus		
Ev1	61.3	Mpa
Ev2	191.1	Mpa
Ev2 / Ev1	3.1	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien





Date: 17/09/2018
Project: إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لخط
سكة حديد الروبيكي / باريس
Contractor: شركة احمد عبدالرحمن

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: AA / EV / 018

Location: from 8+020 To 8+140 8+090

Level:

Soil Type : Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

Encirpck Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3468	1803	3732	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3436	1786	3704	0.32	0.17	0.28	0.26
86	11.31	0.160	3410	1775	3680	0.58	0.28	0.52	0.46
135	17.67	0.250	3379	1754	3655	0.89	0.49	0.77	0.72
178	23.33	0.330	3356	1737	3634	1.12	0.66	0.98	0.92
226	29.69	0.420	3332	1720	3615	1.36	0.83	1.17	1.12
269	35.34	0.500	3312	1698	3598	1.56	1.05	1.34	1.32
135	17.67	0.250	3316	1701	3603	1.52	1.02	1.29	1.28
67	8.84	0.125	3322	1712	3610	1.46	0.91	1.22	1.20
5	0.71	0.010	3346	1741	3636	1.22	0.62	0.96	0.93
43	5.65	0.080	3344	1739	3632	1.24	0.64	1.00	0.96
86	11.31	0.160	3340	1734	3626	1.28	0.69	1.06	1.01
135	17.67	0.250	3331	1722	3617	1.37	0.81	1.15	1.11
178	23.33	0.330	3322	1714	3609	1.46	0.89	1.23	1.19
226	29.69	0.420	3311	1705	3599	1.57	0.98	1.33	1.29

Notes:

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien



Page 1 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: AA / EV / 018

Location: from 8+020 To 8+140 8+090

Level:

Soil Type: Natural Ground

Plate Diameter: 300 mm

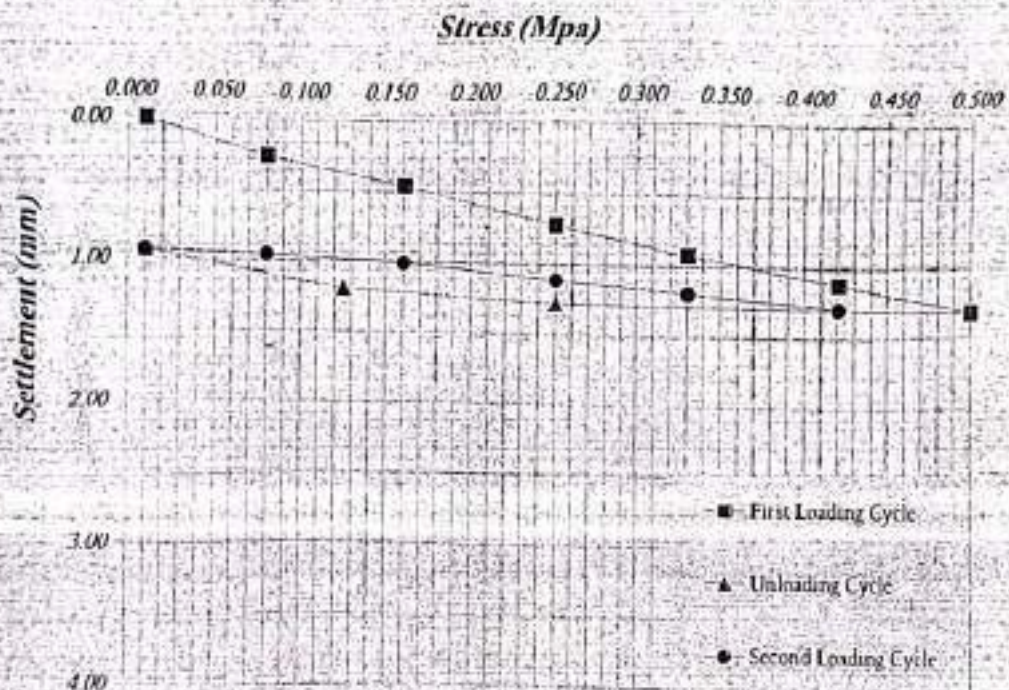

Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	0.668	2.915	0.023
Second Cycle	1.071	0.446	0.923

Strain Modulus		
Ev1	87.2	Mpa
Ev2	229.2	Mpa
Ev2 / Ev1	2.6	

For Q Lab

Tested by: Tech. Abdelrahman Gaber

Engineer: Abdallah Hussien

Page 2 of 2

طلب عمل اختبار
مختبر

صورة التسجيل الضريبي (شركات):

صورة الرقم القومي (افراد):

اسم المشروع: إنشاء جسر الكهـ العـديـد (الرويلـيـن العاشر - بلـيس)

اسم العميل: شركة احمد بن محمد

عنوان العميل:

رقم التليفون: ٠١٠١٨٧٤٢٩٩

التجارب المطلوبة:

العينات المرفقة:

ملاحظة: تأخذ - عتري - قنطرة - راتنجات
CBR - Los Angeles - سيولة - بروكفا

(١) عينات

(٢)

(٣)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

التاريخ
١٣ ١٦ ١٢٠٢٣

امضاء العميل
محمد علي

ARDAMAN Split
MATERIALS & CONSTRUCTION TESTING
S.A.E.

35 Ashgar Baraa Compound Maadi - Cairo
Tel.: (+2) 0233448413 - (+2) 01006030248
Tel.: 0227468647 - 01006030248

شركة أردمان سبليت

للمختبرات المواد والبناء
شركة مساهمة مصرية
25 شوبنك لشجار دارلا بالمعادى - القاهرة
تليفون: 01006030248 - 0227468647
بريد إلكتروني: ardamaniinternational@gmail.com

File No.: 4988/S

Invoice No.: 683/2023

PROJECT: خط سكة حديد - الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس

CLIENT: شركة أحمد عبد الرحمن

Item	Description	Tax Code	Quantity	Unit	Unit Price	Total
1	C.B.R. Test for Soil Sample	EG-602150515-D1001	1	Test	660	660
2	Compaction of Soil (Using Proctor Test)	EG-602150515-D1003	1	Test	330	330
3	Complete Sieve Analysis of Soil Sample	EG-602150515-D1004	1	Test	165	165
4	Plastic Limit of Soil Sample	EG-602150515-D1005	1	Test	165	165
5	Liquid Limit of Soil Sample	EG-602150515-D1006	1	Test	165	165
6	Los Angeles Abrasion	EG-602150515-D0101	1	Test	265	265
7	Clay Lumps & Friable Particles	EG-602150515-D0105	1	Test	110	110
8	Specific Gravity and Absorption of Fine, or Coarse Aggregates	EG-602150515-D0111	1	Test	135	135
Total						1995.00
Value Added Tax 10%						199.50
Total						2194.50

شركة أردمان - سبليت

للمختبرات المواد والبناء

رقم الترخيص الضريبي ١٥٠ - ١٥٠ - ٢٠٢
مأمورية ضرائب الشركات المساهمة

* Please reimburse by a cheque.

Signature: Rada El Rahab

Date: June 2023

التسجيل الضريبي رقم 602-150-515 سجل تجاري رقم 156221 مأمورية ضرائب الشركات المساهمة

برجاء التكرم

المرفقات

- ١

- ٢

- ٣

ملاحظ

التاريخ

File No.: 4988/S

Date:25-06-2023


Standard Test Method Of Particle size analysis
Of Soil According to ASTM D - 422

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Sieve No.	2"	1.5"	1.0"	3/4"	1/2"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 40	No. 200
Opening Size (mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.50	4.75	2.000	0.425	0.075
Sample Passing %	100.0	99.1	94.3	78.0	56.2	49.4	41.8	28.7	13.1	6.2
Project Specs (Min)	100.0	70.0	55.0	50.0	-	40.0	30.0	20.0	10.0	5.0
Project Specs (Max)	100.0	100.0	100.0	100.0	-	80.0	65.0	50.0	30.0	15.0

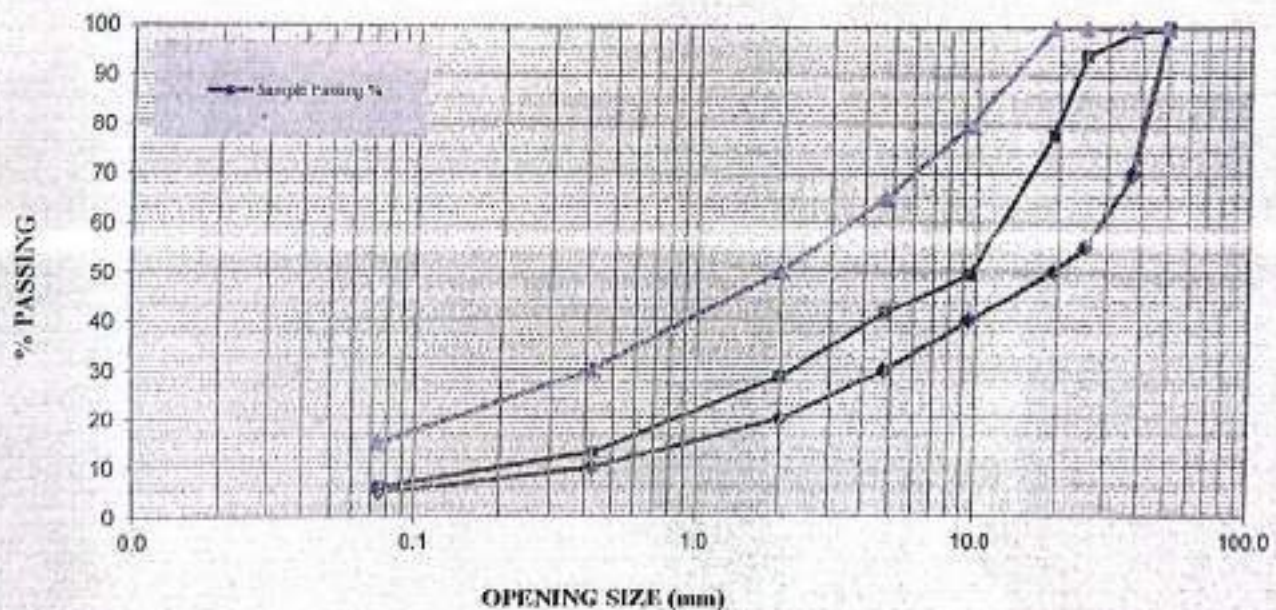

Note(s)

- 1- The sample was provided by the client .
2- These results are related only to the received samples

Prepared by : Eng. Peter Sakhay

Reviewed by : Eng.Hanan Younree

ARDAMAN-Split

شركة اردمان - سابلوت
(الإدارة) Com

General Manager : Eng. Rada El-Rahab

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING
S.A.E

25 Ashgar Dama Compound Maadi - Cairo

Tel : 33448413 - 01006030748

Email: ardamaninternational@gmail.com

Project: خط سكة حديد - البرويكي - العائش من رمضان - بلبيس

File No.: 4988/S

Client: شركة أحمد عبد الرحمن

Date: 25-06-2023

LIQUID LIMIT, PLASTIC LIMIT, AND PLASTICITY INDEX OF SOILS**ACCORDING TO ASTM D4318**

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Sample Identification No.	Liquid Limit (%)	Plastic Limit (%)	Plasticity Index (%)
Soil sample	N.P	N.P	N.P
Project Specs	25.0 Max	-	6.0 Max

Note (s):

- 1- The sample was provided by the client .
- 2- These results are related only to the received samples.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy

Reviewed by : Eng. Hanan Yousree

ARDAMAN-Split

شركة اردمان - سبلات

(General Manager: Eng. Reda El-Raheb

Project: خط سكة حديد - الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس

File No.: 4988/S

Client: شركة أحمد عبد الرحمن

Date: 25-06-2023


MOISTURE DENSITY RELATIONSHIP OF SOIL**ACCORDING TO ASTM D 1557**

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Wet Unit Weight, gm/cm ³	2.241	2.283	2.390	2.389	2.314
Water Content, %	2.0	3.0	5.0	7.0	8.0
Dry Unit Weight, gm/cm ³	2.197	2.217	2.276	2.233	2.143

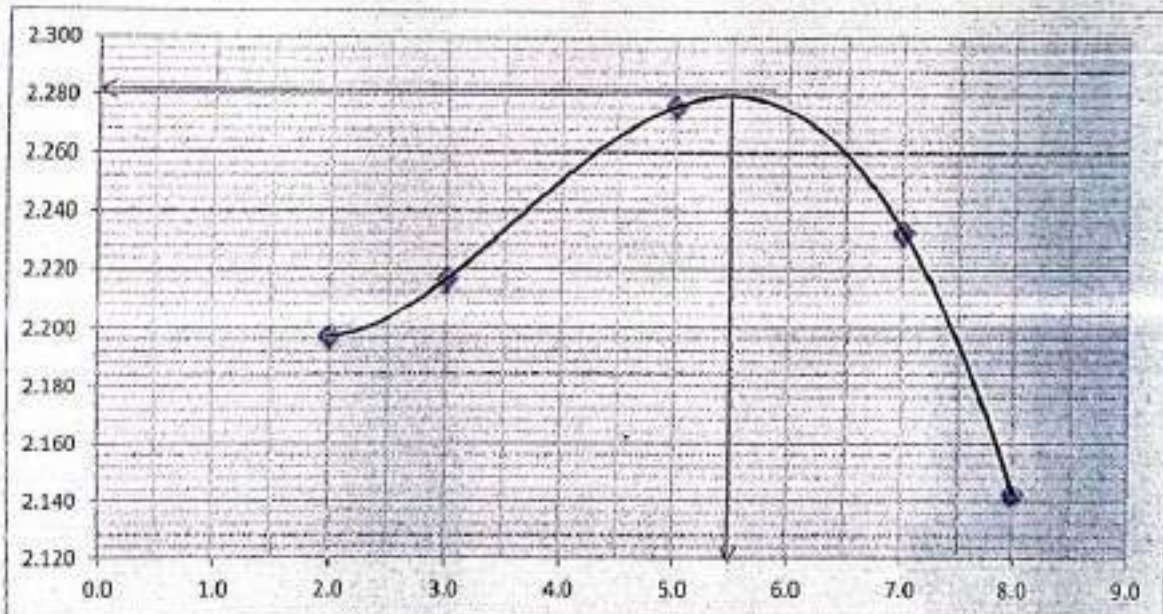**Result (s):**

- Maximum dry density = 2.280 t/m³
- Optimum moisture content = 5.50 %

Note (s):

*The sample was provided by the client.

*These results are related only to the received sample.

Prepared by : Eng. Peter Sohly

Reviewed by : Eng. Hanan Youssef

ARDAMAN-Split
 شركة اردمان - بلبيس
 (الإدارة)

General Manager: Eng. Reda El-Raheb

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING

S.A.E

25 Ashgar Darna Compound Maadi - Cairo

Tel. : 02- 27468647 - 01006030248

Email: ardamaninternational@gmail.com

Project: خط سكة حديد - الروبيكي - العائدر من رمضان - بلهيس

File No.: 4988/S

Client: شركة أحمد عبد الرحمن

Date: 25-06-2023

SPECIFIC GRAVITY AND ABSORPTION OF COARSE AGGREGATES

ACCORDING TO ASTM C 127

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Sample No.	Absorption (%)	Bulk Specific Gravity	Bulk Specific Gravity (Saturated - Surface - Dry)	Apparent Specific Gravity
Soil sample	1.95	2.594	2.645	2.733
Project Specification	10.0 % Max			

Note (s):

*The sample was provided by the client .

*These results are related only to the received sample.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy

Reviewed by : Eng. Hanan Yousry

ARDAMAN-Split

شركة اردمان - مبلهت
(الإدارة)

General Manager: Eng. Reda El-Raheb

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING

S.A.E

25 Ashgar Darun Compound Maadi - Cairo

Tel : 02- 27468647 - 01006030248

Email: ardamaninternational@gmail.com

Project: خط مسكة حديد - الدويكي - العاشر من رمضان - بلبيس

File No.: 4988/S

Client: شركة احمد عبد الرحمن

Date: 25-06-2023

CLAY LUMPS AND FRIABLE PARTICLES

According To ASTM C 142

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

Sample No.	Result (%)
Soil sample	0.65
Project Specification	5.0 % Max

Note (s):

*The sample was provided by the client .

*These results are related only to the received sample.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy

Reviewed by : Eng. Hanan Yousry

ARDAMAN-Split

شركة اردمان - سبليت
(الإدارة)

General Manager: Eng. Reda El-Raheb

ARDAMAN Split

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING

S.A.E

3 ABD EL KAWY AHMED St. , MOHAMED SEEN - GIZA

Tel: 33448413 - 01006030248

Email: ardamaninternational@gmail.com

Project: خط سكة حديد - الدويكي - العاشر من رمضان - بلبيس

File No.: 4988/S

Client: شركة احمد عبد الرحمن

Date: 25-06-2023

LOS ANGELES TEST

ACCORDING TO ASTM C - 131

Sample Description: Soil sample for Base layer

Source / Zone of sample: By client

Delivery Date : 15-06-2023

% of WEAR 22.9%

Project Specification % of WEAR < 50.0 %

* After 500 Revolutions.

Note (s):

*The sample was provided by the client.

*These results are related only to the received sample.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy

Reviewed by : Eng. Hanan Yousry

ARDAMAN-Split

شركة اردمان - سبليت

(الإدارة)

General Manager: Eng. Reda El-Raheb

Project: إنشاء جسر خط سكة حديد
(الروبيكي - العائدين من رمضان - بلبيس)
Client: شركة أحمد عبد الرحمن

File No.: 4988/S

Date: 10/07/2023

CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO)
OF LABORATORY - COMPACTED SOILS
ASTM D - 1883

Sample No. : 1

Sample delivery date:


15/06/2023

Description of sample:

طبقة اساس

Source / Zone of sample:

by client

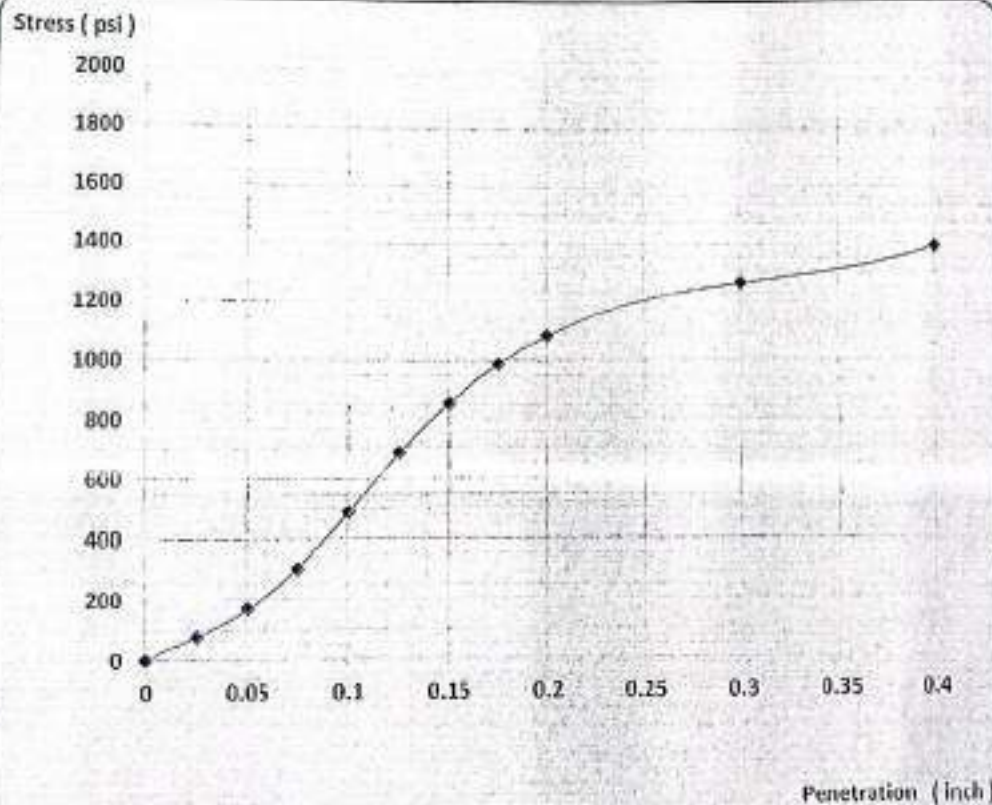

CBR VALUE (at 0.1 in) = $487 \times 100 / 1000 = 48.7 \%$

CBR VALUE (at 0.2 in) = $1080 \times 100 / 1500 = 72 \%$

Swelling after 96 hours = 0.018 %

After soaking for 96 hrs

*The sample was provided by the client.

Prepared by : Eng. Peter Sobhy

Reviewed by : Eng. Hanan Yousef

ARDAMAN Split
شركة اردمان - بلبيس
(15/06/2023)

General Manager: Eng. Reda El-Rahab

١٩-٢-٢ طبقة أساس السكة (Subballast):

يتم التنفيذ على طبقات و تتكون طبقة أساس السكة من كسر أحجار مندرجة طبقا لما ورد بالملحق رقم (١) بالاضافة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
أساس السكة (Subballast - Blanket)	سمك الطبقة	لا تقل عن ٣٠ سم
	تصنيف التربة	كسر حجر
	أكبر قطر للحبيبات (D_{max})	يتراوح بين (٢١,٥ ~ ٥٠) مم
	نسبة المواد الناعمة (مار من منخل ٢٠٠)	أقل من ٥ %
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E_v)	أكبر من ١٢٠ ميجا باسكال
	حد السيولة	أقل من ٢٥ %
	امتصاص المياه	أقل من ١٠ %
	نسبة التآكل (طبقا لإختبار لوس انجلوس)	أقل من ٣٠ %
	إختبار المخروط الرملى	الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ١٥ سم، وبحيث تحقق الكثافة الجافة ٩٨ % من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة
	إختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	أكبر من ٨٠ %

- يجب ألا تزيد نسبة المواد القابلة للتفتت في المياه والمحموزة على منخل رقم (٤) عن ٥ % من وزن العينة، ويجب اتباع التدرج المنصوص عليه في المواصفة هـ ٦٠٣ لسنة ١٩٨٦.

١٩-٣-٢ طبقة الفرمة (Prepared subgrade):

يتم تنفيذها على طبقات ويجب أن تكون طبقة الفرمة من مواد ردم جيدة طبقا لما ورد بالملحق رقم (١) بالاضافة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
الفرمة (Form - Prepared subgrade - layer)	سمك الطبقة	لا تقل عن ٥٠ سم
	تصنيف التربة	(متغير حسب نوعية المواد أسفل الطبقة*)
	نسبة المواد الناعمة (مار من منخل ٢٠٠)	AASHTO (A1-a) and (A1-b) Or UIC (QS3 - 3.1 or QS2 - 2.1 & 2.2)
	معامل اللدونة (إن أمكن حسابه)	أقل من ١٢ %
	الانتفاش الحر	أقل من ٦ %
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E_v)	أقل من ٣ %
	إختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	أكبر من ٨٠ ميجا باسكال
	إختبار المخروط الرملى	أكبر من ٢٥ %
		الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم، وبحيث تكون الكثافة الجافة أكبر من ٩٥ % من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة

RB - RSCCE - ACE - MAT - (8)

المرفقات :

- ١- أصل تقرير صلاحية المواد من المعمل .
- ٢- صورة من محضر العينات .
- ٣- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات

آیتا ۲ میں مذکور اہل بیت علیہم السلام

نتيجة هذه الأعمال :

مرفوض وبعاد تخميمه

موالقی مع عمل الملاحظات بعاليه

سوالی

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري /

مهندس الاستشاري العام /

الإسم /
التوقيع /

الإسم /
التوقيع /

محضر عينات

السيد المهندس / مدير معمل كيو لآب

تحية طيبة وبعد

بالإحالة لصدور أمر إسناد لتكليف شركة أحمد عبد الرحمن بأعمال إنشاء جسر سكة حديد
(الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس) بطول (٤) كم في المسافة من كم ٤+٢٠٠ إلى كم ٨+٢٠٠ ,
(وصلة الميناء الجاف) ,

نتشرف أن نرفق لسيادتكم عينات التربة من محجر العمار لعمل اختبارات الصلابة اللازمة للتربة وإمكانية استخدامها
كترية تأسيس حل صلاحيتها .

القائم بإحضار العينات مهندس الشركة المنفذة م/ محمد علاء

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل الآزم
وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

التاريخ :

مهندس الاستشاري العام

محمد المشايخ
٢٠١٧/٧/٨

مهندس الاستشاري
المهندسون الاستشاريون العرب

مكتب محرم - باخوم

٨-٧-٢٠١٧

مهندس المعمل

عبد الرحمن جابر

مقدمة لسيادتكم

شركة أحمد عبد الرحمن
للإستشارات والهندسة المعمارية ش.م.م
شارع أحمد عبد الرحمن
٦٧٧-٥٧٧-٩١٢
ت. ١٧٥٥٣٧



التاريخ	٢٠٢٣ / ١ / ٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة أحمد عبد الرحمن	نطاق العمل	من المحطة ١+٢٠٠ حتى المحطة ٨+٢٠٠

RB - RSCCE - ACE - MAT - (0006)

برجاء التكرم بإستلام الآتي : عينة صلاحية من محجر العمار

نوع العمل	أعمال جودة	وصف العمل	عينة صلاحية
مكان العمل	محجر العمار	توقيع مهندس الشركة	شركة أحمد عبد الرحمن المقاولات والتوريدات المعمارية ش.م.م ب.ض: 677-577-912 ت.ف: 178537
ترقيم سكة حديد			
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐	الثاني ☐ الثالث ☐

موقف الأعمال :

١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقيمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري :

مهندس الاستشاري العام :


الاسم / محمد أحمد عبد الله
التوقيع /

الاسم / محمد حماد
التوقيع /

Particle-Size Distribution of Soils Using Sieve Analysis - ASTM D6913

Project	إعداد الجسر الثاني و طرق الخدمة للطريق الجديد الرويني / باريس	Sample weight (gm): 9876
Client	شركة أحمد عبد الرحمن	
Sampling Date	8-Jul-23	
Sample Description	Reddis Gravelly Sand Soil	
Source	تربة طبيعية	
Location	Stockpile Al Amaar	
Level		
Sample No	1	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Sieve	Opening (mm)	% Retained	% Passing
3 in	75	0.0	100.0
2 in.	50	0.0	100.0
1.5 in.	37.5	6.0	94.0
1 in.	25	10.8	89.2
3/4 in.	19	18.4	81.6
1/2 in.	12.5	24.0	76.0
3/8 in.	9.5	30.2	69.8
No.4	4.75	41.6	58.4
No.10	2	52.1	47.9
No.40	0.425	69.3	30.7
No.200	0.075	90.3	9.7

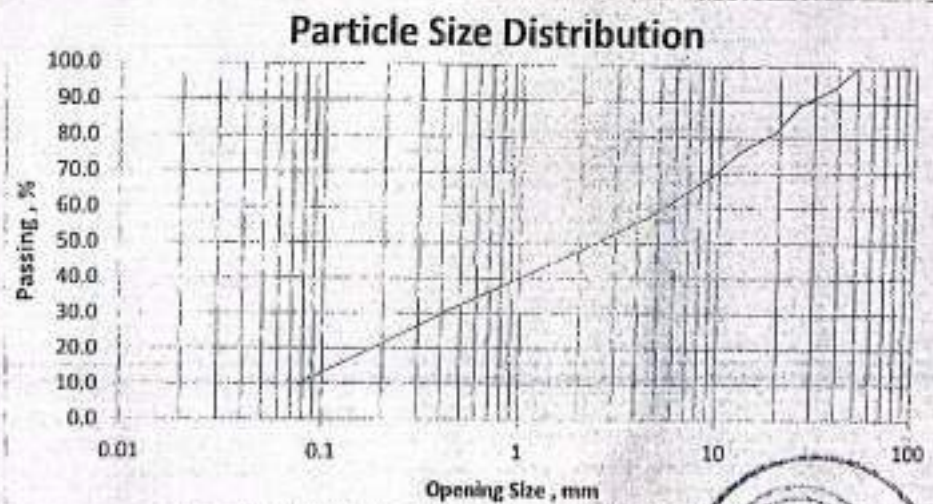

For Qlap : Eng. Abdallah Hussien
 Date of Report : 11-Jul-23
 Form Number: Qlab/Soil/01/ver.01

Signature:


Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils - ASTM D4318


Project	إنشاء الجسر الثاني وطرق الخدمة لخط حديد الرويني / بلبيس
Client	شركة أحمد عبد الرحمن
Sampling Date	8-Jul-23
Sample Description	Reddis Gravelly Sand Soil
Source	ترية طبيعية
Location	Stockpile Al Amaar
Level	-
Sample No	1
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Plastic Limit :

Container No.	QL-PL/01	QL-PL/02	QL-PL/03	Average
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	25.37	25.31	25.89	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	23.81	23.64	24.07	
Mass of Container , M_3 (g)	16.76	15.32	16.20	
Water Content, w. (%)	22.1	20.1	23.1	21.8

Liquid Limit :

Container No.	QL-LL/01	QL-LL/02	QL-LL/03	LL
Mass Moist Soil + Container , M_1 (g)	34.99	35.81	36.27	
Mass Dry Soil + Container , M_2 (g)	31.98	31.87	31.98	
Mass of Container , M_3 (g)	17.55	17.19	16.75	
Water Content, w. (%)	20.9	26.8	28.2	24.5
Number of Blows, N	30	23	18	23.7

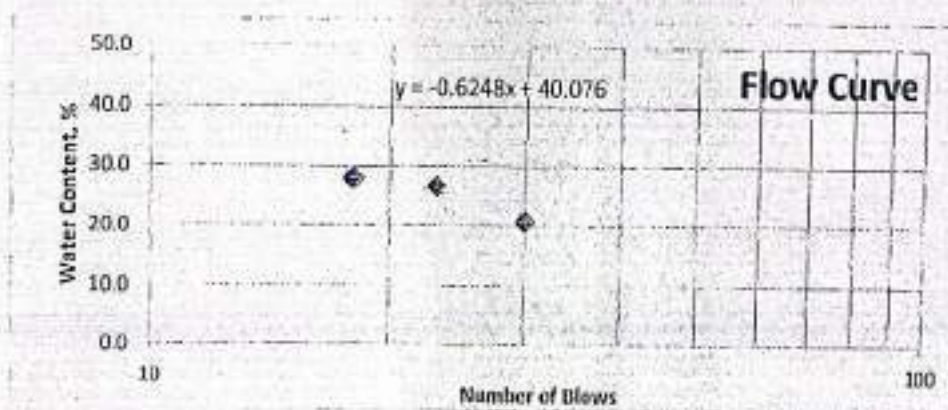

Plasticity Index = L.L - P.L = 2.7 %

For QLab : Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 11-Jul-23

Form Number: QLab/Soil/02/ver.01





كيو لضبط الجودة

Tel.: 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail: info@qlabeg.com

AASHTO Classification - M 145

Project	إنشاء الجسر البراني و طرق الخدمة لخط سكة حديد الزويتكي / باديس
Client	شركة أحمد عبد الرحمن
Sampling Date	8-Jul-23
Sample Description	Reddis Gravelly Sand Soil
Source	تربة طبيعية
Location	Stockpile Al Amaar
Level	-
Sample No	1
Sampled by	Abdelrahman Gaber

General Classification	Granular Materials							Silty Clay Materials				
Group Classification	A - 1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	
	A-1-a	A-1-b		A-2-4	A-2-5	A-2-6	A-2-7					
Percent Passing, %												
2 mm	50 max	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
0.425 mm	30 max	50 max	51 min	---	---	---	---	---	---	---	---	
0.075 mm	15 max	25 max	10 max	35 max	35 max	35 max	35 max	36 min	36 min	36 min	36 min	
Atterberg Limits												
Liquid Limit, %	---	---	---	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	40 max	41 min	
Plasticity Index, %	6 max	6 max	N.P.	10 max	10 max	11 min	11 min	10 max	10 max	11 min	11 min	
Usual Types	Stone fragments gravel and sand		Fine Sand	Silty or Clayey Gravel Sand				Silty Soils		Clayey Soils		
Rating as Subgrade	Excellent to Good							Fair to Poor				

Test	Result	AASHTO Classification
2 mm	47.9	
0.425 mm	30.7	
0.075 mm	9.7	
Liquid Limit, %	24.5	
Plasticity Index, %	2.7	
		A-1-b

For QLab: Eng. Abdallah Hussien

Date of Report : 11-Jul-23

Form Number: QLab/Soil/03a/ver.01



Moisture Density Relationship Of Soil ASTM D 1557

Project	إنشاء الجسر النرابي و طريق الخدمة لخط سكة حديد الرويني / باليس
Client	شركة أحمد عبد الرحمن
Sampling Date	8-Jul-23
Sample Description	Reddis Gravelly Sand Soil
Source	تربة طبيعية
Location	مشون الممار
Level	-
Sample No	Ahmed Abdel Rahman-Pr-001
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Wet Unit Weight, gm/cm ³	2.062	2.164	2.285	2.246	2.231
Water Content, %	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
Dry Unit Weight, gm/cm ³	2.022	2.081	2.156	2.080	2.028






Fig. 1. Relationship between water content and dry unit weight

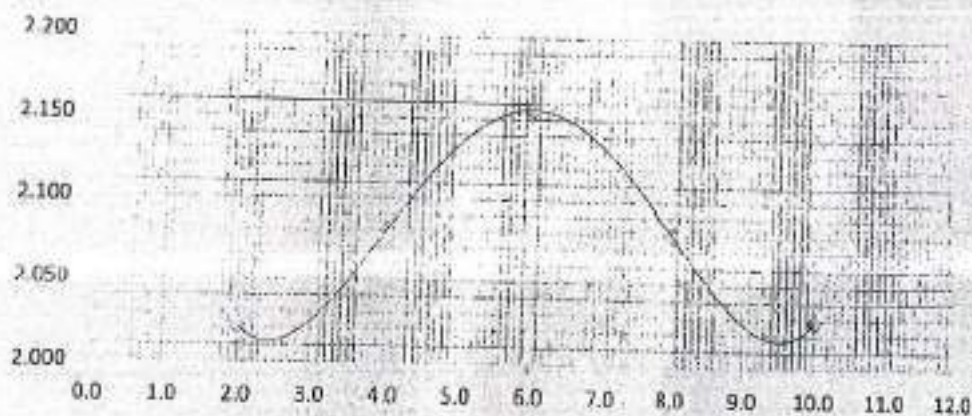

b




Fig. 2. Relationship between water content and dry unit weight

Optimum Water Content (Mod- w_{opt}) %	6
Optimum Dry Unit Weight (Mod- γ_{dmax}) gm/cm ³	2.156

For QLab: Eng. Abdallah Hussien
 Date of Report: 11-Jul-23
 Form Number: QLab/Soil/01/ver.01



٢-٣-١٩ طبقة أساس السكة (Subballast):

يتم التنفيذ على طبقات و تتكون طبقة أساس السكة من كسر أحجار متدرجة طبقا لما ورد بالملاحق رقم (١) بالاضافة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
أساس السكة (Subballast - Blanket)	سمك الطبقة	لا تقل عن ٣٠ سم
	تصنيف التربة	كسر حجر
	أكبر قطر للحبيبات (D_{max})	يتراوح بين (٣١,٥ - ٥٠) مم
	نسبة المواد الناعمة (مار من منخل ٢٠٠)	أقل من ٥ %
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E_{v2})	أكبر من ١٢٠ ميجا باسكال
	حد السيولة	أقل من ٢٥ %
	امتصاص المياه	أقل من ١٠ %
	نسبة التآكل (طبقا لاختبار لوس انجلوس)	أقل من ٣٠ %
	اختبار المخروط الرملي	الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ١٥ سم، وبحيث تحقق الكثافة الجافة ٩٨ % من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة
	اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	أكبر من ٨٠ %

يجب ألا تزيد نسبة المواد القليلة للتفتت في المياه والمحمولة على منخل رقم (٤) عن ٥ % من وزن العينة،

ويجب اتباع التدرج المنصوص عليه في المواصفة هرس ٦٠٣ لسنة ١٩٨٦.

٢-٣-٢٠ طبقة الفرمة (Prepared subgrade):

يتم تنفيذها على طبقات ويجب أن تكون طبقة الفرمة من مواد ردم جيدة طبقا لما ورد بالملاحق رقم (١) بالاضافة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
الفرمة (Form - Prepared subgrade layer)	سمك الطبقة	لا تقل عن ٥٠ سم
	تصنيف التربة	(متغير حسب نوعية المواد أسفل الطبقة*)
	نسبة المواد الناعمة (مار من منخل ٢٠٠)	AASHTO (A1-a) and (A1-b) Or UIC (QS3 - 3.1 or QS2 - 2.1 & 2.2)
	معامل اللدونة (إن أمكن حسابه)	أقل من ١٢ %
	الانتفاش الحر	أقل من ٦ %
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E_{v2})	أقل من ٣ %
	اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	أكبر من ٨٠ ميجا باسكال
	اختبار المخروط الرملي	أكبر من ٢٥ %
		الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم، وبحيث تكون الكثافة الجافة أكبر من ٩٥ % من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة

* يتحدد سمك طبقة الفرمة طبقاً لنوعية المواد (الردم أو الحفر) أسفلها طبقاً للتالي:

أ. إذا كانت المواد أسفل طبقة الفرمة (A-1-a, A-1-b) طبقاً لتصنيف الـ AASHTO فليس هناك حاجة لتنفيذ طبقة الفرمة.

ب. إذا كانت المواد أسفل طبقة الفرمة (A-2-4) طبقاً لتصنيف الـ AASHTO فيتم تنفيذ طبقة الفرمة بسمك أكبر من ٥٠ سم بعد إجراء الاختبارات والجسات اللازمة والرجوع للاستشاري.

١٩-٣-٤: الردم (Embankment):

يتم تنفيذ طبقات الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم لجميع المواد الصالحة للردم ويجب أن تكون طبقات الردم من مواد جيدة طبقاً لما ورد بالملحق رقم (١) بالامانة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
الردم (Embankment)	الجزء العلوي و الجزء السفلي من الجسر	الجزء العلوي من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر، والجزء السفلي باقي الارتفاع حسب القطاع وإذا قل ارتفاع الجسر عن ١,٥٠ متر يعامل بالكامل معاملة الجزء العلوي
	تصنيف التربة	(بشروط) AASHTO (A1-a) and (A1-b) and A3 Or UIC (QS3 - 3.1 or QS2 - 2.1 & 2.2)
	نسبة المواد الناعمة (مار من مغل ٢٠٠)	أقل من ١٥%
	معامل اللدونة (إن أمكن حسابه)	أقل من ١٠%
	حد السيولة	لا يزيد عن ٤٠%
	الانتفاش الحر	أقل من ٣%
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E _{v2})	أكبر من ٦٠ ميجا باسكال لتربة الردم العلوية، وأكبر من ٤٥ ميجا باسكال للسفلية
	اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	طبقة الردم العلوية أكبر من ٢٠ % طبقة الردم السفلية أكبر من ١٠ %
	اختبار المخروط الرملي	الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم، وبحيث تكون الكثافة الجافة أكبر من ٩٥% من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة

ملاحظات:

- يجب عدم استخدام أي تربة نقل كثافتها الجافة بعد الدمك عن ١,٨٥ طن للمتر المكعب في الردم بأي حال، وكذلك التربة الطينية التي يزيد حد السيولة لها عن ٤٠%. وأيضاً يجب ألا تزيد نسبة نواتج حفر الصخور في أعمال الردم عن ٢٠%.

- يجب عمل اختبارات تحميل لوح استاتيكي لاستنتاج قيمة معايير المرونة (E) حيث تعبر هذه القيمة بصورة غير مباشرة عن قيمة الهبوط القصوى المسموح بها. كما يمكن استنتاج قيمة معايير المرونة (E) مباشرة من اختبار اللوح الديناميكي. ويتم حساب قيمة (E) للأحمال بين ٠,٣ - ٠,٧ من الحمل الأقصى للاختبار (الحمل الأقصى للاختبار يعتمد على قطر اللوح المستخدم حيث تكون القيمة ٠,٥ ميجانيوتن/م^٢ للالواح بقطر ٣٠ سم بينما تكون القيمة ٠,٢٥ ميجانيوتن/م^٢ للالواح بقطر ٦٠ سم).



التاريخ	2023 / 7 / 13	الإنتاج	وصلة
الشركة المنفذة	شركة احمد عبد الرحمن	لطاق العمل	من المحطة 19+800 الى المحطة 21+800

RB-RSCCE-ACE-MAT-(10)

برجاء التكرم بإستلام الأتي : تقرير صلاحية المواد الخاصة بمشون شركة المحمود

المرفقات :

1- أصل تقرير صلاحية المواد من المعمل .

2- صورة من محضر العينات .

3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

أولاً : لا يمكن إستلام المواد إلا بعد إستلامها

نتيجة هذه الأعمال :

موافق مع عمل الملاحظات بهاليه

موافق

مرفوض ويعاد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري العام /

الإسم /
التوقيع /

مهندس الاستشاري /

الإسم /
التوقيع /

محضر عينات

السيد المهندس / مدير معمل كيو لاب

تحية طيبة وبعد

بالإحالة لصدور أمر إسناد لتكليف شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات بأعمال إنشاء جسر سكة حديد
(الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول (2) كم في المسافة من كم 19+800 إلى كم 21+800 ،
(وصلة الميناء الرئيسي) ،

نتشرف أن نرفق لميادنتكم عينات التربة المحسنة بنسبة (2 تربة - 1 رمل) من محجر شركة المحمود لعمل
اختبارات الصلابة اللازمة للتربة وإمكانية
إستخدامها كتربة تأسيس حال صلاحيتها

القام بأحضار العينات مهندس الشركة المنفذة م/ محمد علام

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل الأتم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري
المهندسون الاستشاريون العرب

مكتب مدرم - باخوم

م. باخوم

مهندس المعمل

عبدالرحمن

شركة أحمد عبد الرحمن
للحفظ والتوثيق والتوريدات المعمارية
ب.ق. 677-577-912
ت. 178537
