



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص: مشروع أعمال ازدواج أسسيوط / ديروط القطاع الأول في المسافة من كم ١٨ الى ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم مركز ديروط محافظه أسسيوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٠٣

تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة الختامية لأعمال المشروع عالية طبقا لأسعار
المفاوضة (مرفق).

يرجي التكرم من سيادتكم بالإحاطة والعلم والتوجيه بما يلزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ١١ / ٢٠

رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا"

مهندس /
مصطفى علي أحمد مسعود



مرفقات:
مقايسة ختامية

مقاييس ختامية

مشروع ازدواج أسسوط / ديروط القطاع الأول في المسافة من كم ١٨ الى ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم
مركز ديروط محافظة أسسوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

م	البنود	الوحدة	الكمية	الفئة التعاقدية	الاجمالى
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمّل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة.	م³	٢٢٤٩٦,٢٥	٢٠,٠٠	٤٤٩٩٢٥,٠٠
	علاوة مسافة نقل ٣٠ كم		٢٢٤٩٦,٢٥	٣٠,٠٠	٦٧٤٨٨٧,٥٠
٢	بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية بسمك ٥ سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة حتى ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل مايلزم لنهوه العمل.	م²	٠,٠٠	١٦,٥٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م²	٤١٧٠١,٧٠	٥,٢٥	٢١٨٩٣٣,٩٣
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسلحة أو ارسفة أو دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى ٣٠ كم.	م³	١٣٥٦,٣٨	٨٠,٠٠	١٠٨٥١٠,٤٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) للتربة الموردة عن ١٠%) ورشها بالمياه الأضوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وتكون مسافة النقل ٤٠ كم. - ويتم احتساب علاوة ١,٤ كم/كم بالزيادة او النقصان.	م³	٦١٢٥,١٩	٨٦,٠٠	٥٢٦٧٦٦,٣٤
	علاوة مسافة نقل ٤٢ كم		٨٠٨٩,٧٨	٨٨,٨٠	٧١٨٣٧٢,٤٦
	علاوة مسافة نقل ٤٣ كم		٢٢٢٠٩,١٢	٩٠,٢٠	٢٠٠٣٢٦٢,٦٢
	علاوة مسافة نقل ٤٤ كم		١٧٨٣٩,٢٥	٩١,٦٠	١٦٣٤٠٧٥,٣٠
	علاوة مسافة نقل ٤٥ كم		٢٢٠٣٧,٣٠	٩٣,٠٠	٢٠٤٩٤٦٨,٩٠
	علاوة مسافة نقل ٤٦ كم		٣٧٢٥٨,٧٥	٩٤,٤٠	٣٥١٧٢٢٦,٠٠
	قيمة المواد المحجّرة للأترية بالإضافة ال ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات		٧٦٢٩٦,٠٠	٣٣,٦٠	٢٥٦٣٥٤٥,٦٠
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث الوزن النوعي عن ٢,٦ والا يزيد الامتصاص عن ٦% والايّزيد التآكل عن ٤٥% ويتم استبدال الوجه الخارجي اجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / م³ من الرمل الحرش النظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم يتم احتساب علاوة ١ كم/كم بالزيادة او النقصان.	م³	٠,٠٠	٣٥٢,٠٠	٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / م³ اسمنت بورتلاند مع الدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم / م³ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	٠,٠٠



مقاييس ختامية

مشروع ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الأول فى المسافة من كم ١٨ الى ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم
مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

م	البنـد	الوحدة	الكمية	الفئة التعاقدية	الإجمالى
٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (براىخ) (box.section) طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / ٣م اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم مع اجراء الاختبارات اللازمة والسعر لاي شمل توريد وتشغيل حديد التسليح ومحمل العزل الحوائط والسقف بالبيتومين النموذجية و الرسومات اوجه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات سن ٦ والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بحيث لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا لها هن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والاي يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بما تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٣ م	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
	مسافة النقل ٢٠ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ كم/كم بالزيادة او النقصان .				
	علاوة مسافه نقل ٩١ كم				٣٦٠١٣٦٣,٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية حماية سمك ١٥ سم تتكون من ٣٠,٨ م دلو مبيت متدرج + ٣٠,٤ م رمل حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى و البند يشمل تجهيز و تسوية السطح اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ و تشطيب السطح والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٢م	٠,٠٠٠	٢٢٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٠,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	٠,٠٠٠
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها و تنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٠,٠٠٠	٩,٢٠٠	٠,٠٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٠,٠٠٠	١٤٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠

مقايضة ختامية

مشروع ازدواج أسبوط / ديروط القطاع الأول فى المسافة من كم ١٨ الى ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم
مركز ديروط محافظه أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

م	البنـد	الوحدة	الكمية	الفئة التعاقدية	الإجمالى
١٥	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (١٦Ø10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠٠٠	٦٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٦	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (Fair Face) بمحتوي اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشواير (١٦Ø10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٨٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠,٠٠٠
١٧	بالعدد ازالة نخيل و اشجار و ازاله المخلفات خارج نهر الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢٢٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٢٦٤٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٢ م مع الجلب اللازمة والفئة شاملة أعمال الحفر حتي المنسوب التصميمي أسفل قواعد المواسير ونزع المياه وعمل السدود والفرشة العادية والتغليف بالخرسانة المسلحة طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٠,٠٠٠	٤٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الاقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ويشمل البند حديد تسليح وصلات المواسير (الجلب) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٠,٠٠٠	٢٢٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة اساس مثبت (FDR) وذلك بإعادة تدوير طبقات الاساس و الاسفلت القائمة معا بسمك متوسط ٢٥ سم والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي وإعادة التدوير والخلط وإضافة المياه وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل وتأمين سلامة المرور وطبقا لتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٠,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢١	بالطن أعمال توريد وإضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبضاف بالنسبة المقدرة للخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	بالطن	٠,٠٠٠	١٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
إجمالى قيمة الاعمال					١٩٤٩٢٧٣٧,٠٥

مدير عام الصيانة

مدير المشروع

الهيئة

الشركة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة - أسبوط والمنيا
مصطفى علي مسعود





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٢٠

شهادة معامل

نتشرف بالإحاطة بان شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق والمسند لها العملية مشروع أعمال ازدواج أسسيوط / ديروط القطاع الأول في المسافة من كم ١٨ الي ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم مركز ديروط محافظه أسسيوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قامت باستخدام معامل الهيئة المنطقة في اجراء التجارب المعملية.

مدير عام الصيانة

مهندس الهيئة

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
مصطفى علي أحمد مسعود



مذكرة للعرض علي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

بخصوص:

مشروع أعمال ازدواج أسسوط / ديروط القطاع الأول في المسافة من كم ١٨ الي ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم
مركز ديروط محافظة أسسوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
عقد رقم: ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٩٠٣

تنفيذ: شركة محمد رجب صبرة للمقاولات وإنشاء الطرق

إيماء الي الخطاب الوارد بخصوص طلب مد مده المشروع عالية (٦ أشهر) من
الشركة المنفذة (مرفق)

الموضوع:

نتشرف بعرض الاتي على سيادتكم

أولاً: - بيانات المشروع: -

١- تاريخ بدء الأعمال: ٢٠٢٢/١٢/١٤

٢- تاريخ نهو الأعمال: ٢٠٢٣/٠٦/١٣

٣- نسبة ما تم تنفيذه : ٩٥٪

ثانياً: - المعوقات المتواجدة بالمشروع نتشرف بعرض الاتي: -

١- وجود كبل خاص بالقوات المسلحة المنطقة الجنوبية والكابل الفاير الخاص بالمصرية للاتصالات في المسافة من الكم ١٨+٠٠٠ حتى الكم ١٨+٣٠٠ تم التنسيق مع القوات المسلحة لنقل الكابل منذ بدء العمل وحتى تاريخه لم يتم نقل الكابل بفترة توقف ٩ أشهر.

٢- وجود أعمدة كهرباء بكامل طول المسار تم ازالتها بمعرفة الوحدة المحلية بتاريخ ٢٠٢٣/١/١٠ (مرفق صورة محضر التنسيق مع دار الهندسة) بفترة توقف شهر.

٣- وجود أشجار كثيفة بمسار المشروع تم ازالتها بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى وتم نهو كافة الأعمال بالموقع بتاريخ ٢٠٢٣/١/٢٥ بفترة توقف شهر.

٤- وجود كابل كهرباء بمسار المشروع تم التنسيق على نقلة من خلال هندسة كهرباء منفلووط وتم نقلة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٥ بفترة توقف شهر.

٥- توقف الاعمال المجاورة لمحور منفلووط بسبب استكمال اعمال المحور وإزالة المنازل المجاورة من خلال الهيئة الهندسية منذ بدء العمل وحتى تاريخه بفترة توقف ٩ أشهر.

ثالثا: - رأي المنطقة: -

- ١- تري المنطقة إعطاء الشركة مدة قدرها أربعة أشهر ليكون تاريخ النهو ٢٠٢٣/١٠/١٣.
 - ٢- بالنسبة للمسافة المتوقفة نتيجة كابل الجيش بطول ٣٠٠ م.ط والمسافة المتوقفة بسبب اعمال محور منفوط بطول ٦٠٠ م.ط يتم تقدير المدة بعد نهو اعمال نقل الكابل والمحور.
- والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى: ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٩

رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا"


م/ مصطفى علي مسعود



المرفقات:

خطاب الشركة
محضر التنسيق مع دار الهندسة



السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة - أسيوط والمنيا

تحية طيبة وبعد,,,

بخصوص: مشروع أعمال ازدواج أسيوط / ديروط القطاع الأول في المسافة من كم ١٨ الي ٢٤,٥ بطول ٦,٥ كم مركز ديروط محافظة أسيوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

عقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٠٣).

نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على مد مده المشروع عالية (٦ أشهر) نظرا لتعطل الأعمال أكثر من مره بسبب المعوقات الآتية: -

- ١- وجود كبل خاص بالقوات المسلحة المنطقة الجنوبية وحتى تاريخه لم يتم إزالته.
- ٢- تأخر إزالة أعمده الإنارة على الطريق مع العلم انه تم التنسيق المسبق مع شركة الكهرباء.
- ٣- تأخر إزالة الأشجار من جانب الطريق من قبل مقول الهيئة.
- ٤- كابل كهرباء الخاص بتغذية قري مركز منفلوط.
- ٥- تعذر العمل في المنطقة المجاورة لمحور منفلوط وذلك بسبب أعمال الإزالة في هذه المنطقة.

والأمر مرفوع لسيادتكم لاتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,

يرافى: ٢٠٢٣/٠٦/١١

مقدمة لسيادتكم
مدير مشروع الشركة

محمد رجب

م/ محمد عناني

محضر تنسيق شبكات المرافق بمحافظة أسبوط

في إطار المتابعة المستمرة لنسب الانجاز الفعلي لآعمال شبكات المرافق المختلفة ومعيًا لدفع الانجاز وتنفيذًا للتوصيات والتوجيهات التي تم التوصل لها خلال اجتماعات المجالس الدولة والمتمثلة في الآتي :

- ١- بدء تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي ومياه الشرب في القرى المنفذ بها نسبة ٥٠% فأكثر من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
- ٢- بدء تنفيذ أعمال شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاليف الضوئية في القرى المخدومة أو المخدوم جزء منها بالصرف الصحي ومياه الشرب قبل المبادرة.
- ٣- بدء تنفيذ أعمال شبكات الغاز الطبيعي في القرى المنفذ بها ٥٠% فأكثر من الوصلات المنزلية للصرف الصحي ومياه الشرب .
- ٤- بدء تنفيذ أعمال الاليف الضوئية في القرى الجاري العمل بها شبكات الغاز الطبيعي بالتوازي وذلك بعد التنسيق المستمر بين جهتي التنفيذ لتحديد المناطق والقطاعات محل التنفيذ.

بناءً على ما سبق ، اجتمع الحاضرون الآتي اسمائهم يوم الثلاثاء الموافق بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٣م لبيان نسب الانجاز الفعلية لجميع قرى مركز منفلوط محافظة أسبوط وذلك للتنسيق وتحديد القرى المتاح العمل بها في الفترة القادمة لجميع المرافق .

الحاضرون

١	السيد / عماد محمد حسين	عضو	مستشار عام مجلس ومدينة منفلوط
٢	السيد م / محمد سيد فوزي	عضو	ممثل دار الهندسة
٣	السيد م / الزهراء محمد احمد	عضو	ممثل دار الهندسة
٤	السيد م / احمد مصطفى	عضو	ممثل شركة الغاز والطاقة
٥	السيد م / اسلام اشرف عباس	عضو	ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
٦	السيد م / محمود صلاح محمد	عضو	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي
٧	السيد م / سارة محمود	عضو	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي
٨	السيد م / اشرف علي جاد الرب	عضو	ممثل سنترال منفلوط
٩	السيد م / احمد محمد صالح	عضو	ممثل شركة بيجسكو
١٠	السيد م / عطا زايد عطا	عضو	ممثل عن هيئة الطرق والكباري
١١	السيد م / جابر سيد	عضو	ممثل عن مكتب الاستشارات والتصميمات الهندسية
١٢	السيد م / محمد سلامة	عضو	ممثل شركة الكهرباء
١٣	السيد م / راند احمد النجار	عضو	ممثل الإنتاج الحربي شركة حلوان لمحركات الديزل
١٤	السيد م / محمد عبد الرحمن محمد الصاوي	عضو	ممثل جهاز تعمير الوادي الجديد

dar

نسب تنفيذ الهيئة القومية طبقا للوحات المعتمدة.

رقم	محافظه	مركز	قرية	نسب تنفيذ الهيئة القومية طبقا للوحات المعتمدة
				شبكة الصرف الصحي
(١)	اسيوط	منفلوط	الحواشك	% ٩٨
(٢)	اسيوط	منفلوط	نزه قرار	% ١٠٠
(٣)	اسيوط	منفلوط	العنامله	% ٩٧
(٤)	اسيوط	منفلوط	بنى عديبات	% ٩٢
(٥)	اسيوط	منفلوط	بنى رافع	% ٩٩
(٦)	اسيوط	منفلوط	ام القصير	% ٧٣
(٧)	اسيوط	منفلوط	بنى شقير	% ٩٧
(٨)	اسيوط	منفلوط	سكرو	% ٩٩
(٩)	اسيوط	منفلوط	بنى سفدا	% ٩٤
(١٠)	اسيوط	منفلوط	الجوالى	% ٨٦
(١١)	اسيوط	منفلوط	العنفره قبلى	% ٩٩
(١٢)	اسيوط	منفلوط	نزلة رميح	% ٩١
(١٣)	اسيوط	منفلوط	بنى مجد	% ١٠٠
(١٤)	اسيوط	منفلوط	سراوه	% ١٠٠
(١٥)	اسيوط	منفلوط	عرب العمائم	% ٩٩
(١٦)	اسيوط	منفلوط	بنى شعراى	% ٨٤
(١٧)	اسيوط	منفلوط	العزبه	% ٩٧
(١٨)	اسيوط	منفلوط	جحدم	% ٩٧
(١٩)	اسيوط	منفلوط	كوم بوها قبلى	% ٩٧
(٢٠)	اسيوط	منفلوط	جزيره المعابه	% ٤٥
(٢١)	اسيوط	منفلوط	المدور	% ٩٩
(٢٢)	اسيوط	منفلوط	دمهور	% ٩٩
(٢٣)	اسيوط	منفلوط	كوم الشهيد	% ٩٠
(٢٤)	اسيوط	منفلوط	السمراوى	% ٩٩

dar

شبكة الكهرباء	شبكة لكراتال الضوئية	شبكة الغاز الطبيعى	شبكة الغاز الطبيعى داخلية	شبكة غازية	شبكة المياه	وصلات الصرف	شبكة مياه	شبكة الصرف الصحي	قرية	المركز	محافظة	م
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1257
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	نزة قبار	منشوط	اسيوط	1258
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحامدة	منشوط	اسيوط	1259
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	بني عديلى	منشوط	اسيوط	1270
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	بني زقير	منشوط	اسيوط	1271
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	لم القصور	منشوط	اسيوط	1272
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	بني مشير	منشوط	اسيوط	1273
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	سكدة	منشوط	اسيوط	1274
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	بني مند	منشوط	اسيوط	1275
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1276
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1277
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1278
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	بني مشير	منشوط	اسيوط	1279
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	سكدة	منشوط	اسيوط	1280
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	بني مند	منشوط	اسيوط	1281
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1282
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1283
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1284
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1285
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1286
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1287
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1288
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1289
1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	الحيوة	منشوط	اسيوط	1290

dar

معالجة موالف الشبكات من جميع الاطراف على الطبيعة بالموقع تم الاتفاق على مايلي
عدد (٧) قرية : متاح جزلي لأعمال الغاز الطبيعي حيث ان نسب تنفيذ الوصلات المنزلية تتراوح بين (٥٠ % - ٩٩ %) جاري العمل ٢٤٢

- ٢- عدد (٥) قرية : متاح كلي لأعمال الغاز الطبيعي حيث ان نسب تنفيذ الوصلات المنزلية (١٠٠ %) يشبكات الغاز
- ٣- عدد (١٩) قرية : متاح جزلي لأعمال الاتصالات خطرا لبدء اعمال الشبكات التي هي (١٠٠ %) يشبكات الغاز
- ٤- عدد (٥) قرية : متاح كلي لأعمال الاتصالات حيث تم انتهاء اعمال الغاز الطبيعي في هذه القرى
- ٥- عدد (١٩) قرية : متاح جزلي لأعمال الاتصالات للقرى التي تم ارجاء اعمال الغاز الطبيعي حيث ان نسبة الوصلات المنزلية للصرف الصحي تتراوح بين (٥٠ % - ٩٩ %)
- ٦- عدد (٥) قرية : متاح كلي لأعمال الاتصالات للقرى التي تم ارجاء اعمال الغاز الطبيعي حيث تم انتهاء اعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي في هذه القرى

الملاحظات

- تم وضع نسب لعدد ٢٤ قرية الياف ضوئية للخط الرئيسي (بنى مجد - نزة قرار - سراوة - بنى عديات - الحواتكة - العثامنة - بنى رافع - بنى شقير - المنطرة قبلي - عرب العمائم - بنى شعران - العزبة - سكرة - كوم بوها قبلي - السهرنج - دمنهور - جحدم - الجاولي - بنى سند - كوم الشهيد - المدور - نزة رميح - ام القصور - جزيرة المعادة)

- بالنسبة لقرية (ام القصور) تم اتاحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الياف ضوئية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م
- بالنسبة لقرية (الحواتكة) تم اتاحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الياف ضوئية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م
- بالنسبة لقرية (كوم بوها) تم اتاحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الياف ضوئية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م
- بالنسبة لقرية (نزة رميح) تم اتاحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الياف ضوئية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م
- بالنسبة لقرية (بنى عديات) تم اتاحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الياف ضوئية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م
- بالنسبة لقرية (بنى رافع) تم اتاحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الياف ضوئية من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م
- بالنسبة للقرى التالية (سكرة - سراوة - بنى مجد) تم اتاحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الياف ضوئية من يوم ٢٠٢٣-١-١ م
- بالنسبة للقرى التالية (العثامنة - بنى شقير - بنى سند - المنطرة قبلي - عرب العمائم - بنى شعران - جحدم - دمنهور - كوم الشهيد - السهرنج) تم اتاحتها لبدء اعمال شبكات داخلية الياف ضوئية من يوم ٢٠٢٣-٦-١ م
- بالنسبة لقرية (نزة رميح) تم اتاحتها لبدء اعمال الغاز (خط الرئيسي) من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م
- بالنسبة لقرية (الحواتكة) تم اتاحتها لبدء اعمال الغاز (خط الرئيسي) من يوم ٢٠٢٣-٢-٢٨ م

توقيعات الحاضرون

- | | |
|-----|--|
| عضو | سكرتير عام مجلس ومدينة منفلوط |
| عضو | ممثل دار الهندسة |
| عضو | ممثل دار الهندسة |
| عضو | ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي |
| عضو | ممثل شركة الغاز والطاقة |
| عضو | ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي |
| عضو | ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي |
| عضو | ممثل منتقل منفلوط |
| عضو | ممثل شركة بيجسكو |
| عضو | ممثل عن هيئة الطرق والكباري |
| عضو | ممثل عن مكتب الاستشارات والتصميمات الهندسية |
| عضو | ممثل شركة الكهرباء |

- ١
- ٢
- ٣
- ٤
- ٥
- ٦
- ٧
- ٨
- ٩
- ١٠
- ١١
- ١٢



وفيما يلي موقف شبكات المرافق المختلفة وتغاضيها مع الطرق

dar


١- طريق وصلة منقوطة باجمالي اطوال ١٠.٥ كم

ملاحظات بدء العمل بالهيئة التومية للطرق والكباري بالقطاع أو جزء منه / نسبة الجاري	شبكة الكوريات		شبكة الايات الشرفية		شبكة الدار الطيبي		شبكة مياه الشرب		شبكة الصرف الصحي		ملاحظات طريق وصلة منقوطة
	موجود الترقيم	موجود اصلا	موجود اصلا	موجود اصلا	موجود اصلا	موجود اصلا	موجود اصلا	موجود اصلا	موجود اصلا	موجود اصلا	
% ٩٥											القطاع الاول بطول ٢ كم
% ٩٥											القطاع الثاني بطول ٢ كم
% ٩٥											القطاع الثالث بطول ٢ كم
% ٩٥											القطاع الرابع بطول ٢ كم
% ٩٥											القطاع الخامس بطول ٢ كم

المسحوق الحاضرون

١	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصفي	٢	٣ / حرمه صالح	٦	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصفي	١٠	ممثل شركة الغاز والطاقة	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي
٢	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصفي	٣	٤ / عمار ايد	٧	٨ / عمار ايد	٩	١٠ / عمار ايد	١١ / عمار ايد	١٢ / عمار ايد	١٣ / عمار ايد	١٤ / عمار ايد
٣	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصفي	٤	٥ / عمار ايد	٨	٩ / عمار ايد	١١	١٢ / عمار ايد	١٣ / عمار ايد	١٤ / عمار ايد	١٥ / عمار ايد	١٦ / عمار ايد
٤	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصفي	٥	٦ / عمار ايد	٩	١٠ / عمار ايد	١٢	١٣ / عمار ايد	١٤ / عمار ايد	١٥ / عمار ايد	١٦ / عمار ايد	١٧ / عمار ايد
٥	ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصفي	٦	٧ / عمار ايد	١٠	١١ / عمار ايد	١٣	١٤ / عمار ايد	١٥ / عمار ايد	١٦ / عمار ايد	١٧ / عمار ايد	١٨ / عمار ايد

١٧
جلسة مجلس الوزراء
١٧

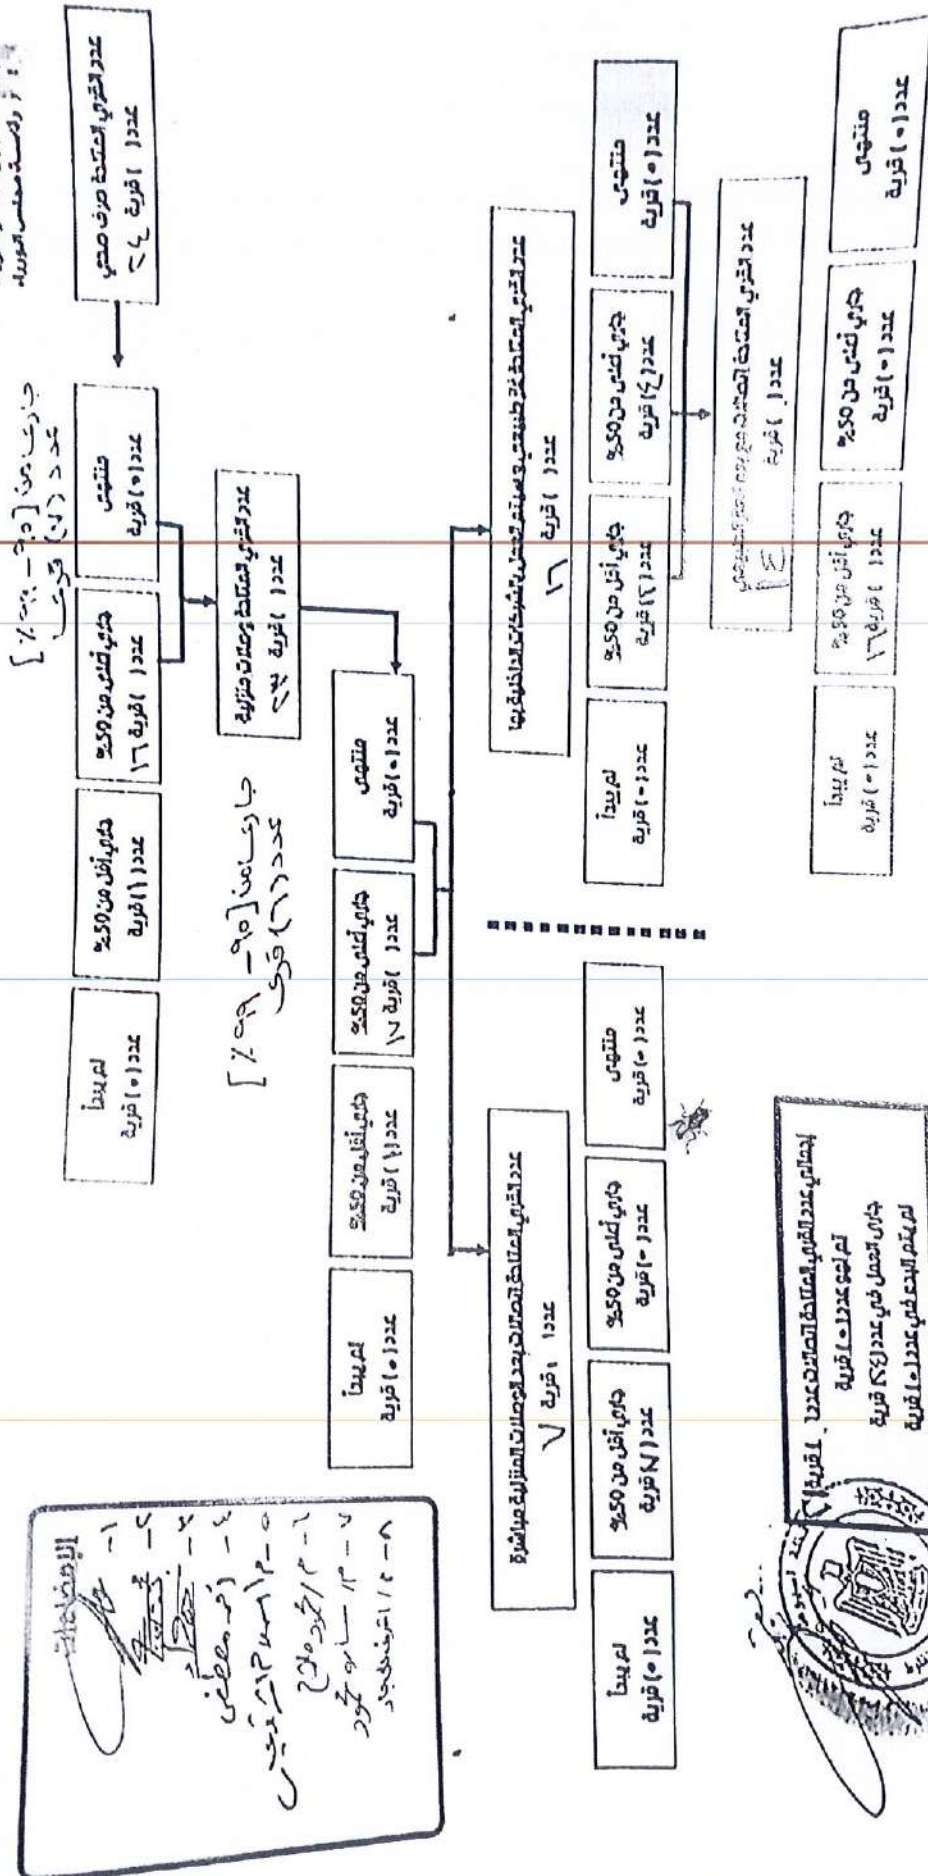

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

رقم القرار	الموضوع / الشواهد	جهة التنفيذ	حالة التنفيذ
	تنفيذ أعمال رفع القدرة الكهربائية لاستيعاب وخدمات جميع المباني والمحطات الجارية تنفيذها بالمبادرة، مع تخفيض مشروعات رفع كفاءة الشبكات الكهربائية طبقاً للتالي: - استكمال تنفيذ أعمال الجهد المتوسط للقرى فقط دون التوايح. - تقليل تنفيذ أعمال الربط الحلقى قد المستطاع. - إرجاء تنفيذ كافة أعمال الجهد المنخفض بالقرى والتوايح. - تخفيض تنفيذ أعمال الانارة بنسبة ٥٠% (إنارة عمود وعدم إنارة العمود الأخرى) - التوسع في اشتغال المحولات والموزعات الحالية من خلال أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وأمنها لاستغلالها بمناطق أخرى وتقليل الاحلال والاستبدال قد المستطاع. - التأكيد على قيام شركات الكهرباء باستلام الأعمال من جهتي التنفيذ بعد نهوها طبقاً لخطمة الترشيد التي تم الإلتحاق عليها. - إرجاء تنفيذ أعمال رصف الطرق (قرية مثبتة - اسطكت) لكافة الطرق والشوارع الداخلية لجميع القرى والاقتصاص على تنفيذ أعمال التسوية فقط لجميع الشوارع والطرق التي تم تنفيذ أعمال الحفر بها داخل القرية. بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الاسطكت بالطريق الرئيسي فقط داخل القرية وطريق دابر الناحية (إن وجد).		

قرارات الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (جاءة كريمة) ٢٠٢٣/٢/١٤

شكر
