

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم ٢٩٥+٠٠٠ حتي الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامة.

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ وبناء علي عقد العملية رقم ٣٧٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ اتجاه برج العرب اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مدير المشروع بالمنطقة الثالثة عشر
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/خالد قنديل)

١- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

٣- السيد المهندس / رشاد مرسي

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١- السيد المهندس / حسام ماهر

مدير المشروع للشركة المنفذه

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع .

وقفل المحضر علي ذلك .

الشركة المنفذه (طرف ثاني)

١- حسام ماهر

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٣- عمار

٢- السيد

١- محمد جويهي

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العامه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٩٥+٠٠٠ اي ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٢٩/١١/٢٠٢٣
بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثّل المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثّل شركة الحسام للمقاولات العامه

١- م/ أحمد السعيد
٢- م/ عبدالله جاسر
٣- م/ حسام ماهر

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة المرادم من محجر طيبة (A/ ٢١٤ ش) الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان مشون رقم ٢ يبعد مسافة (١٢٧) كم (مائه وسبعة وعشرون) كم عن مكان محجر طيبة .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

٣- م/ م. م. م.

٢- م/ م. م. م.

١- م/ م. م. م.

٢٠٢٣ / ١١ / ٢٩

يعتمد ،،،،،،،،،،

مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري
للمنطقة الثالثة عشر البحيره وكفر الشيخ

م / احمد ابودقيقة

٢٠٢٣ / ١١ / ٢٩

محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العامه بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم 295+000 اي 297+500 بطول 2.5 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق 2023 /11/26
بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل شركة الحسام للمقاولات العامه

1- م/ أحمد السعيد
2- م/ عبدالله جاسر
3- م/ حسام ماهر

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربه للردم من محجر الخير (5421/ش) الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (122) كم (مائه واثنان وعشرون) كم عن مكان محجر الخير .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

3- م/ حسام ماهر


2- م/ عبدالله جاسر

1- م/ أحمد السعيد

يعتمد ،،،،،،،،

مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري
للمنطقة الثالثة عشر البحيره وكفر الشيخ

م / احمد ابودقيقة



محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العالمين _ مرسى مطروح).

في مسافه من كم ٢٩٥+٠٠٠ الي ٢٩٧+٥٠٠ كم بطول (٢,٥ كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٣/١٩ م

بحضور كل من:-

- | | |
|----------------------|---|
| ١- م: احمد السعيد | مدير الجودة مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل إستشاري المشروع |
| ٢- م: محمد سعيد | مهندس مدنى مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل إستشاري المشروع |
| ٣- م: حسام ماهر قرنى | ممثل شركة الحسام للمقاولات |

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الصالحة من المحجر المعتمد علي الطبيعة (السيوى | 240 | ش) من خلال طريق وادى النظرون العلمين / مصر اسكندرية الصحراوى وجد أن القطاع يبعد مسافة (١٠٧) كم (فقط مائة وسبعة كيلومتراً) عن المحجر .
واقفل المحضر على ذلك

التوقيع :

٣- م: حسام ماهر قرنى

٢- م: محمد سعيد


١- م: احمد السعيد

٢٠٢٢ / ٣ / ١٩

يعتمد

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد ابودقيقة

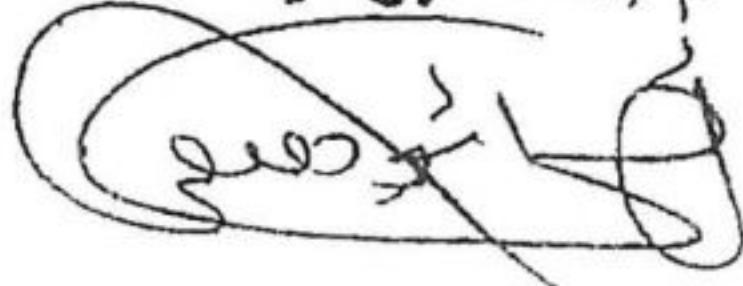

محضر معاينة مسافة نقل (توريد سن)

بالإشارة الي التكليف وامر الاسناد الصادر من الهيئة العامه للطرق والكباري لصالح شركه الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية _ العالمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم ٢٩٥+٠٠٠ الي ٢٩٧+٥٠٠ كم بطول (٢,٥ كم) للاتجاهين
فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٢ م

بحضور كل من:-


مدير الجودة مكتب ا.د خالد قنديل
مدير التنفيذ مكتب ا.د خالد قنديل
ممثّل شركة الحسام للمقاولات

١- م: أحمد سعيد
٢- م: عبد الله جاسر
٤- م: حسام ماهر قرني


وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن subgrade & subballst من الكسارة المعتمدة علي الطبيعة (كساره المدينه المنوره) وجدت ان القطاع يبعد مسافة (١١٢) كم (مئة واثنى عشر كيلومتراً) عن الكسارة (٣٣٣/ش)

واقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

١- 
٢- 
٣- 

يعتمد
مدير المشروع
م / أبو دقيقة



محضر معاينة مسافة نقل (توريد سن صالح)

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري
لصالح شركة الحسام للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال
الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ العاصمة الادارية
_ العالمين _ مرسى مطروح)

في مسافه من كم 295+000 الي 297+500 كم بطول (2.5 كم) للاتجاهين

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 2022/ 9 / 21 م

بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري الهندسي
ا.د.خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة الحسام للمقاولات

1-م: أحمد أبو دقيقة
2-م: أحمد عادل الشاعر
3-م: أحمد عبد الحكم
4-م: حسام ماهر قرني

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن الصالح من
الكسارة المعتمدة علي الطبيعة (كسارة العروبة 213T/ش) وجدت ان القطاع يبعد
مسافة (136) كم (فقط مائة وستة وثلاثون كيلومتراً) عن الكسارة وعليه تم تصحيح
مسافه النقل المعتمدة للقطاع لاعمال السن هي (136) كم (فقط مائة وستة وثلاثون
كيلومتراً).

واقفل المحضر على ذلك

محضر التوقيعات
أحمد أبو دقيقة

أحمد عادل الشاعر

أحمد عبد الحكم

حسام ماهر قرني

2022/ 9 / 21

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى
عملية: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع
اتجاه برج العرب

رقم البند وبيانه: (١)	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمة بسمك لايزيد عن ٢٥ سم أعلى منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الأقل نقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٢٠%) والأرض الطبيعية متغيرها ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - والبند لايشمل القيمة المحجرية.	
-----------------------	---	--

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العمومية

الكمية بالقياسية ٦٦٣٧٧,١٢٤ مقدار العمل السابق

بيان الاعمال بالمقاييس	الموقع الكيلو مترى		٣م	الاجمالى ٣م
	من	الى		
أعمال الردم	٢٩٥٠٠٠٠	٢٩٥٠٨٠٠	١٢٨٣٩,٨٩٠ ✓	١٢٨٣٩,٨٩٠ ✓
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			١٢٨٣٩,٨٩٠ ✓	١٢٨٣٩,٨٩٠ ✓
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٠,٠	٠,٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			١٢٤٥٤,٠٠ ✓	١٢٤٥٤,٠٠ ✓
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			١٢٤٥٤,٠٠ ✓	١٢٤٥٤,٠٠ ✓

يعتمد
عن الهيئة

عن الشركة

عن الاستشارى

XY 2

اسودو

٣١

عن الترتبة المنقذ



إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي
والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع
إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين
الجديدة - مطروح)



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل

الهيئة القومية للإنفاق

NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
(NAT)



بند رقم (١) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

station	FILL QUANTITY	layer	total
295+000	0.00	Ferma	
295+020	0.00		
295+040	0.00		
295+060	474.07		
295+080	137.97		
295+100	40.8285		
295+120	364.40		
295+140	364.40		
295+160	364.40		
295+180	364.40		
295+200	364.40		
295+220	364.40		
295+240	364.40		
295+260	364.40		
295+280	364.40		
295+300	364.40		
295+320	364.40		
295+340	491.13		
295+360	491.13		
295+380	491.13		
295+400	491.12		
295+420	219.38	-0.75	12839.8855
295+440	219.37		
295+460	219.37		
295+480	219.37		
295+500	219.37		
295+520	219.37		
295+540	349.84		
295+560	349.85		
295+580	349.85		
295+600	349.84		
295+620	349.85		
295+640	349.85		
295+660	349.85		
295+680	349.85		
295+700	349.85		
295+720	349.85		
295+740	349.85		
295+760	349.85		
295+780	349.85		
295+800	349.85		

عن الاستشاري

KK

XYZ

عن الشركة

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى اتجاه برج العرب
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع

رقم البند وبيانه: (١٥)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الامتصاص عن ١٥ % وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.
	-مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.
	- يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.
	- السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامه

الكمية بالقياسية	مقدار العمل السابق	٣م	الاجمالى ٣م
٨٠٠,٠٠	٠,٠٠		
بيان الأعمال بالمقاييس			
أعمال طبقة تأسيس (prepared subgrade)			٢٨٢٢,٩٠
		٨٠٣,٧٠	
		٦٤٢,٩٦	
		٩٦٤,٤٤	
		٤١١,٨٠	
الاجمالى			٢٨٢٢,٩٠
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			٠,٠٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			٢٨٢٢,٩٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة			٢٨٢٢,٩٠
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى			٢٨٢٢,٩٠

عن الشركة

عن الاستشارى

عن الهيئة

عن الشركة

عن (Kk)

عن (Kk)

عن الهيئة

بند رقم (١٥) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجةالخ											
Station	Area (m2)	Level	As Built vol.fill					Total.Qty			
			Layer	Qty(m3)	Layer	Qty(m3)	total vol of station				
295+000	8.04	0.5	SUBGRADE (1)	0	SUBGRADE (2)	0	803.700				
295+020	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+040	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+060	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+080	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+100	8.04	0.5	SUBGRADE (1)	82.36	SUBGRADE (2)	78.38	642.960				
295+120	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+140	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+160	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+180	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+200	8.04	0.5	SUBGRADE (1)	82.36	SUBGRADE (2)	78.38	964.440				
295+220	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+240	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+260	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+280	8.04	0.5		82.36		78.38		160.74			
295+300	8.04	0.5	SUBGRADE (1)	82.36	SUBGRADE (2)	78.38	411.800				
295+320	8.04	0.25		82.36		78.38		160.74			
295+340	8.04	0.25		82.36		78.38		160.74			
295+360	8.04	0.25		82.36		78.38		160.74			
295+380	8.04	0.25		82.36		78.38		160.74			
295+400	8.04	0.25	SUBGRADE (1)	82.36	SUBGRADE (2)	78.38	2822.90				
total volume											

عن الاستشاري KK



عن الاستشاري XYZ



عن الشركة المنفذه



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (١) جارى
عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٠% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصبولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً للصناعة و الروسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليقات المهندس المشرف.

-مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.

-يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.

-السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.

رقم البند وبيانه: (١٦)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق	٠,٠٠	٣م	الموقع الكيلو مترى		الكمية بالقياسية
			الى	من	
الإجمالي ٣م		٢٩٩,١٠	٢٩٥+١٠٠	٢٩٥+٠٠٠	٦٠٠,٠٠
٨٩٧,٣٠		٢٣٩,٢٨	٢٩٥+١٨٠	٢٩٥+١٠٠	
		٣٥٨,٩٢	٢٩٥+٣٠٠	٢٩٥+١٨٠	
الإجمالي					
٨٩٧,٣٠			اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه		
٠,٠٠			اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		
٧٨٠,٠٠			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة		
٧٨٠,٠٠			اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى		

عن الشركة

عن (Kk) عن

عن (Kk) عن

عن الهيئة

عن الهيئة



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة -

العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)

تنفيذ شركة الحسام للمقاولات العامة للمقاولات

اجمالي كميات (subballast) (جاري ١) اتجاه برج العرب



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد فنديل

الهيئة القومية للإنتاج
SINUA AUTHORITY FOR TUNNELS
(SINUA)

بند رقم (١٦) : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Subballast) من الأحجار الصلبة المتدرجة.....الخ

Station	Area (m2)	Level	As Built vol.fill					Total.Qty
			Layer	Qty(m3)	Layer	Qty(m3)	total vol of station	
295+000	2.991	0.2	subballast (1)	0	subballast (2)	0.0	0	299.100
295+020	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+040	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+060	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+080	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+100	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+120	2.991	0.2	subballast (1)	59.82	subballast (2)	0.0	59.82	239.280
295+140	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+160	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+180	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+200	2.991	0.2	subballast (1)	59.82	subballast (2)	0.0	59.82	358.920
295+220	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+240	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+260	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+280	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
295+300	2.991	0.2		59.82		0.0	59.82	
total volume								897.30

عن الاستشاري KK

حسام

عن الاستشاري XYZ

عن الشركة المنفذه

عن الشركة المنفذه

حسام ماهر فكري

مراجعة بونات توريد

عقد رقم ٢٠٢٣/٣٧٠/٢٠٢٤ اتجاه برج العرب جاري ١

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣ قامت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|---------------------------|---|
| ١- المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٢- المهندس / احمد السعيد | مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٣- المهندس / أحمد نجاح | مدير المكتب الفني - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٤- المهندس / عبدالله جاسر | مدير التنفيذ - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري) |
| ٥- المهندس / حسام ماهر | مدير المشروع - شركة الحسام للمقاولات العمومية (المقاول) |

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ ووجدت كالتالي:

- الكمية الاجمالية الموردة من محجر طيبة هي (١٠٣٠٥,٥ م٣) (عشرة الاف وثلاثمائة وخمسة امتار ونصف المتر لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من محجر السيوي هي (٢٧٨١ م٣) (الفان وسبعمائة وواحد وثمانون متر لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من محجر الخير هي (١٩٧٥ م٣) (الف وتسعمائة وخمسة وسبعون متر لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من محجر السهم الذهبي هي (١٤٦٦ م٣) (الف وربعمائة وستة وستون متر لا غير)
- وقامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد سن طبقة التأسيس وطبقة الأساس الموردة لأعمال الردم بمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع من كم ٢٩٥+٠٠٠ الى الكم ٢٩٧+٥٠٠ ووجدت كالتالي:
- الكمية الاجمالية الموردة من كسارة العروبه هي (١٣١٨,٥ م٣) (الف وثلاثمائة وثمانية عشر مترا ونصف المتر لا غير)
- الكمية الاجمالية الموردة من كسارة المدينة المنوره هي (٤٩٦٢ م٣) (اربعة الاف وتسعمائة واثنان وستون مترا لا غير)
- علي ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لديه وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة.
- ❖ وعلي هذا وقع الجميع: -

مدير المشروع - شركة الحسام للمقاولات العمومية

مدير التنفيذ - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م / أحمد أبو دقيقة



٥- حسام ماهر
٤- احمد السعيد
٣- أحمد نجاح
٢- عبدالله جاسر
١- رشاد مرسى



اجمالي بونات التربه عقد اتجاه برج العرب شركة الحسام

المحجر	طبيه	الخير	السهم الذهبي	السيوي
الكميه	10305.5	1975	1466	2781
الإجمالي			4247	
	16527.5			

عن الاستشاري

حاله

5/12/2023

عن الشركة

حاله

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية البونات المائية سن طبقة التأسيس وطبقة الأساس اتجاه برج العرب							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ³)	رقم البون المائي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنية)	اسم الكساره
1	02/08/2023	4837/5819	65	11897204	010303121263050	730	العروبه
2	02/08/2023	8654/7835	57	11897207	010303141248049	730	العروبه
3	02/08/2023	8654/8735	57	11897201	010303141247832	730	العروبه
4	02/08/2023	4837/5819	66	11897215	010303121263287	730	العروبه
5	02/08/2023	7915/7863	65.5	11897206	010303121263218	730	العروبه
6	02/08/2023	2367/2953	58.5	11897208	010303121263230	730	العروبه
7	02/08/2023	3927/1847	65.5	11897203	010303141247961	730	العروبه
8	03/08/2023	8654/8735	57	11897222	010303141248209	730	العروبه
9	03/08/2023	2495/8364	58	11897241	010303141248483	730	العروبه
10	03/08/2023	8654/8735	57	11897234	010303121263990	730	العروبه
11	03/08/2023	4835/1569	56.5	11897243	010303121264108	730	العروبه
12	03/08/2023	3519/3948	57	11897228	010303121263603	630	العروبه
13	03/08/2023	3519/3948	57	11897237	010303131245794	630	العروبه
14	03/08/2023	4837/5819	66	11897221	010303121263461	730	العروبه
15	04/08/2023	4837/5819	66	11897258	010303121264742	730	العروبه
16	04/08/2023	8654/8735	57	11897267	010303131246806	730	العروبه
17	04/08/2023	5819/4837	66	11897245	010303121264217	730	العروبه
18	04/08/2023	8654/8735	57	11897260	010303141248896	730	العروبه
19	04/08/2023	8654/8735	57	11897246	010303131246045	730	العروبه
20	04/08/2023	8654/8735	57	11897254	010303131246248	730	العروبه
21	04/08/2023	3519/3948	57	11897266	010303121265058	630	العروبه
22	05/08/2023	2367/2953	58.5	11897270	010303131246887	730	العروبه
اجمالي الكمية (م ³)		1318.5		اجمالي الرسوم (الجنية)		15760	

عن الاستشارى مكتب فنى

عن الاستشارى مدنى

عن الشركة المنفذة

عن الشركة المنفذة



مشروع القطار الكهربائي السريع
شركة الحسام للمقاولات العمومية
البونات المائية سن طبقة التأسيس وطبقة الأساس اتجاه برج العرب

م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم البون المائي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنية)	اسم الكساره
			1318.5		اجمالي ما سبق (الجنية)	15760	
23	04/09/2023	2187/6578	65.5	10905294	010303131270266	730	المدينة المنوره
24	11/09/2023	3519/3948	65.5	18159464	010303131276107	630	المدينة المنوره
25	11/09/2023	4786/1483	57.5	18159477	010303121296817	830	المدينة المنوره
26	11/09/2023	4953/6589	57	18159476	010303141273640	730	المدينة المنوره
27	12/09/2023	3519/3948	65.5	18160809	010303131276634	630	المدينة المنوره
28	12/09/2023	4953/6589	54	10781773	010303131276983	730	المدينة المنوره
29	12/09/2023	3658/8732	62	10781774	010303141274362	630	المدينة المنوره
30	12/09/2023	1956/6318	61.5	10905702	010303131277103	730	المدينة المنوره
31	12/09/2023	6589/4953	57	10905638	010303141273818	730	المدينة المنوره
32	12/09/2023	2917/2634	58	10905703	010303121207683	730	المدينة المنوره
33	13/09/2023	4723/6279	67	18160885	010303121298220	730	المدينة المنوره
34	13/09/2023	1956/6318	62	18160863	010303121297930	730	المدينة المنوره
35	13/09/2023	4723/6279	67	18160865	010303131277375	730	المدينة المنوره
36	13/09/2023	3784/8461	64	18160869	010303131277376	730	المدينة المنوره
37	13/09/2023	2187/6578	65	18160870	010303141274645	730	المدينة المنوره
38	13/09/2023	3784/8461	64	18160887	010303121298223	730	المدينة المنوره
39	13/09/2023	3519/3948	65.5	18160890	010303121298334	630	المدينة المنوره
40	14/09/2023	2917/2634	58	18161817	010303121298831	730	المدينة المنوره
41	14/09/2023	4723/6279	67	18161802	010303121298529	730	المدينة المنوره
42	14/09/2023	1956/6318	62	18161816	010303131278228	730	المدينة المنوره
43	14/09/2023	3519/3948	65.5	18161818	010303121298809	630	المدينة المنوره
44	14/09/2023	3784/8461	64	18161821	103031141275466	730	المدينة المنوره
45	14/09/2023	3784/8461	64	18160900	010303131277913	730	المدينة المنوره
46	15/09/2023	2917/2634	58	18161843	010303141275774	730	المدينة المنوره
47	15/09/2023	3519/3948	65.5	18161862	010303141275919	630	المدينة المنوره
48	15/09/2023	3784/8461	64	18161844	010303131278692	730	المدينة المنوره
49	15/09/2023	1956/6318	62	18161864	010303141275960	730	المدينة المنوره
50	15/09/2023	1956/6318	62	18161842	010303131278644	730	المدينة المنوره
51	15/09/2023	2917/2634	58	18161865	010303131278923	730	المدينة المنوره
52	28/09/2023	3519/3948	65.5	12271703	010303121309186	630	المدينة المنوره
53	29/09/2023	3519/3948	65.5	12271712	010303131289327	630	المدينة المنوره
54	29/09/2023	3519/3948	65.5	12271724	010303121309896	630	المدينة المنوره
55	29/09/2023	3519/3948	65.5	12271710	010303121309415	630	المدينة المنوره
56	30/09/2023	3519/3948	65.5	12241755	010303121310492	630	المدينة المنوره
57	30/09/2023	3519/3948	65.5	12271736	010303121310107	630	المدينة المنوره
58	19/10/2023	1786/5698	60	0187949	010303121324643	730	المدينة المنوره
59	19/10/2023	1978/7491	56	0187819	010303141295965	730	المدينة المنوره
60	19/10/2023	1682/4637	62	12271922	010303131303627	730	المدينة المنوره
61	19/10/2023	5149/2834	66	12271923	010303121324152	730	المدينة المنوره
			3763.5		اجمالي الرسوم (الجنية)	43130	

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية البونات المائية سن طبقة التأسيس وطبقة الأساس اتجاه برج العرب							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م³)	رقم البون المائي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنية)	اسم الكساره
			3763.5		اجمالي ما سبق (الجنية)	43130	
62	26/09/2023	3519/3948	65.5	9246447	010303121307784	630	المدينه المنوره
63	26/09/2023	2869/4732	61.5	9246444	010303131287199	730	المدينه المنوره
64	26/09/2023	3519/3948	65.5	9246442	010303121307469	630	المدينه المنوره
65	27/09/2023	3519/3948	65.5	9246463	010303121308033	630	المدينه المنوره
66	27/09/2023	3519/3948	65.5	9246480	010303131287968	630	المدينه المنوره
67	28/09/2023	3519/3948	65.5	9246495	010303121308892	630	المدينه المنوره
68	28/09/2023	3519/3948	65.5	9246485	010303121308775	630	المدينه المنوره
69	03/10/2023	1978/7491	56	9246856	010303141286312	730	المدينه المنوره
70	04/10/2023	2135/5139	57	9246861	010303121312974	730	المدينه المنوره
71	04/10/2023	9723/6792	65.5	9246563	010303121312996	730	المدينه المنوره
72	04/10/2023	1572/9173	52	9246862	010303131292630	730	المدينه المنوره
73	04/10/2023	1978/7491	56	9246879	000000003149713	730	المدينه المنوره
74	05/10/2023	1978/7491	56	9246888	010303121313542	730	المدينه المنوره
75	05/10/2023	2135/5139	57	20589103	010303131293274	730	المدينه المنوره
76	05/10/2023	1572/9173	52	20589102	010303131293266	730	المدينه المنوره
77	07/10/2023	1978/7491	56	20589160	010303131295295	730	المدينه المنوره
78	08/10/2023	2135/5139	57	20589168	010303131295385	730	المدينه المنوره
79	08/10/2023	1978/7491	56	20589187	010303121316207	730	المدينه المنوره
80	08/10/2023	9723/6792	55	20589161	010303131295340	730	المدينه المنوره
81	08/10/2023	1572/9173	52	20589167	010303131295383	730	المدينه المنوره
82	08/10/2023	9723/6792	55	20589188	010303121316238	730	المدينه المنوره
83	08/10/2023	1786/5698	60	20589184	010303131295865	730	المدينه المنوره
84	13/10/2023	1572/9173	52	20587776	010303141291868	730	المدينه المنوره
85	13/10/2023	1978/7491	56	20587774	010303141291869	730	المدينه المنوره
86	13/10/2023	1786/5698	60	20587775	0428142792-202328521-2	730	المدينه المنوره
87	16/10/2023	1978/7491	56	20587851	010303131301157	730	المدينه المنوره
88	18/10/2023	5149/2834	66	9246900	010303141295146	730	المدينه المنوره
89	18/10/2023	5149/2834	66	9246898	010303121323976	730	المدينه المنوره
90	18/10/2023	1682/4637	62	9246899	010303141925147	730	المدينه المنوره
91	18/10/2023	1682/4637	62	9246897	010303131303395	730	المدينه المنوره
92	19/10/2023	1682/4637	62	20587996	010303141295950	730	المدينه المنوره
93	19/10/2023	5149/2834	66	20587995	010303141295951	730	المدينه المنوره
94	20/10/2023	5149/2834	66	20588016	010303121325010	730	المدينه المنوره
95	20/10/2023	5149/2834	66	20588003	010303121324782	730	المدينه المنوره
96	20/10/2023	1682/4637	62	20588015	010303131304583	730	المدينه المنوره
97	20/10/2023	1682/4637	62	20588002	010303141296104	730	المدينه المنوره
98	20/10/2023	1682/4637	62	20588022	010303131304808	730	المدينه المنوره
99	20/10/2023	5149/2834	66	20588023	010303131304812	730	المدينه المنوره
100	21/10/2023	1978/7491	56	20588043	010303121326135	730	المدينه المنوره
101	22/10/2023	1786/5698	60	20588071	010303131306044	730	المدينه المنوره
102	22/10/2023	1978/7491	56	20588079	010303121326547	730	المدينه المنوره
103	22/10/2023	1978/7491	56	20588056	010303121325981	730	المدينه المنوره
		اجمالي الكميه (م³) =	6280.5		اجمالي الرسوم بالجنيه =	73190	

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية البونات المائية للتربة عقد برج العرب							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ^٣)	رقم البون المائي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنينة)	اسم الكساره
1	22/06/2023	3552/2719	56	16323548	010303131216772	330	محجر طيبه
2	22/06/2023	2183/1628	65.5	16323587	010303121225767	330	محجر طيبه
3	22/06/2023	4732/2869	65.5	16323586	010303121225766	330	محجر طيبه
4	22/06/2023	3552/2719	56.5	16323589	010303121225699	330	محجر طيبه
5	22/06/2023	2769/1795	65.5	16323588	010303141231544	330	محجر طيبه
6	22/06/2023	3948/3519	59.5	16323507	010303131216505	280	محجر طيبه
7	22/06/2023	8364/2495	59.5	16323579	010303141231523	330	محجر طيبه
8	22/06/2023	2945/9567	64	8994246	010808123501950	330	محجر طيبه
9	22/06/2023	3948/3519	59.5	16323528	010303131216711	280	محجر طيبه
10	22/06/2023	2845/2751	52.5	16323553	010303141231400	330	محجر طيبه
11	23/06/2023	8364/2495	59.5	16323645	010303121226579	330	محجر طيبه
12	23/06/2023	39483519	59.5	16323615	010303121226073	280	محجر طيبه
13	23/06/2023	3552/2719	56.5	16323637	010303121226386	330	محجر طيبه
14	23/06/2023	2845/2751	52.5	16323642	010303131217446	330	محجر طيبه
15	23/06/2023	3552/2719	56.5	16323658	010303121226924	330	محجر طيبه
16	23/06/2023	4732/2869	62.5	16323661	010303121226978	330	محجر طيبه
17	23/06/2023	2769/1795	65.5	16323638	010303131217415	330	محجر طيبه
18	23/06/2023	8364/2495	59.5	16323662	010303121226981	330	محجر طيبه
19	23/06/2023	3948/3519	59.5	16323636	010303131217397	280	محجر طيبه
20	23/06/2023	8364/2495	59.5	16323604	010303121226067	330	محجر طيبه
21	223/6/2023	2769/1795	65.5	16323659	010303141231932	330	محجر طيبه
22	23/06/2023	3948/3519	59.5	16323660	010303141231931	280	محجر طيبه
23	23/06/2023	2845/2751	52.5	16323663	010303121227044	330	محجر طيبه
24	23/06/2023	9567/2945	64	2892057	010808112274994	330	محجر طيبه
25	23/06/2023	5819/4837	65.5	16323612	010303141231754	330	محجر طيبه
26	24/06/2023	3948/3519	59.5	16323680	010303141232189	280	محجر طيبه
27	24/06/2023	3948/3519	59.5	16323666	010303141232047	280	محجر طيبه
28	24/06/2023	8364/2495	59.5	16323668	010303141232048	330	محجر طيبه
29	24/06/2023	2845/2751	52.5	16323671	010303121227233	330	محجر طيبه
30	24/06/2023	3552/2719	56.5	16323687	010303131218095	330	محجر طيبه
31	24/06/2023	2769/1795	65.5	16323669	010303141232086	330	محجر طيبه
32	24/06/2023	3552/2719	56	16323670	010303131217906	330	محجر طيبه
33	24/6/203	8364/2495	59.5	16323679	010303131218120	330	محجر طيبه
34	24/06/2023	2769/1795	65.5	16323688	010303131218091	330	محجر طيبه
35	10/07/2023	3948/3519	59.5	16323913	010303121242173	280	محجر طيبه
36	11/07/2023	4739/6872	65.5	16323967	010303131227830	330	محجر طيبه
37	11/07/2023	4172/6549	64	16324015	010303131228182	330	محجر طيبه
38	11/07/2023	3948/3519	59.5	16323966	010303131227831	280	محجر طيبه
39	11/07/2023	3948/3519	59.5	16323954	010303121242333	280	محجر طيبه
40	11/07/2023	5819/4837	66	16324045	010603121243069	330	محجر طيبه
اجمالي الكمية (م ^٣)		2410		اجمالي الرسوم (الجنينة)		12090	

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية البونات المائية للتربة عقد برج العرب							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ^٣)	رقم البون المالي	رقم الكارثة	الرسوم (الجنبة)	اسم الكساره
			2410		اجمالي ما سبق (الجنبة)	12090	
41	12/07/2023	3948/3519	59.5	16324124	010303141236302	280	محجر طيبه
42	12/07/2023	4739/6872	65.5	16324095	010303131228557	330	محجر طيبه
43	12/07/2023	4739/6872	65.5	163224152	010303121243803	330	محجر طيبه
44	12/07/2023	4172/6549	62	16324164	010303121243865	330	محجر طيبه
45	12/07/2023	2653/6719	52.5	16324096	010303121243320	330	محجر طيبه
46	12/07/2023	4739/6872	65.5	16324216	010303121244098	330	محجر طيبه
47	12/07/2023	3948/3519	59.5	16324076	010603141236219	280	محجر طيبه
48	12/07/2023	2653/6719	52.5	16324165	010303121243866	330	محجر طيبه
49	12/07/2023	3948/3519	59.5	16324175	010303141236510	280	محجر طيبه
50	12/07/2023	6575/3612	62	2892049	010303131228520	330	محجر طيبه
51	13/07/2023	2653/6719	52.5	16324232	010303131229114	330	محجر طيبه
52	13/07/2023	9682/1234	65.5	16329130	010303131229511	330	محجر طيبه
53	13/07/2023	4718/6714	53.5	16324264	010303131229279	330	محجر طيبه
54	13/07/2023	1569/4835	57.5	16329114	010303121244712	330	محجر طيبه
55	13/7/203	4172/6549	62.5	16324292	010303121244654	330	محجر طيبه
56	13/07/2023	1569/4835	57.5	16324227	010303131229110	330	محجر طيبه
57	13/07/2023	4739/6872	65.5	16329112	010303121244759	330	محجر طيبه
58	13/07/2023	5819/4837	66	163229137	010303121244867	330	محجر طيبه
59	13/07/2023	4718/6714	53.5	16329115	010303141236953	330	محجر طيبه
60	13/07/2023	9682/1234	65.5	16324275	010303131229333	330	محجر طيبه
61	13/07/2023	2845/2751	52.5	16324285	010303121244590	330	محجر طيبه
62	13/07/2023	5819/4837	66	16329104	010303121244643	330	محجر طيبه
63	13/07/2023	9682/1234	65.5	16324247	010303121244193	330	محجر طيبه
64	13/07/2023	2845/2751	52.5	16324243	010303121244247	330	محجر طيبه
65	13/07/2023	7159/50448	63.5	16324274	010303121244510	330	محجر طيبه
66	13/07/2023	4172/6549	64	16329154	010303121244978	330	محجر طيبه
67	13/07/2023	6583/6543	58.5	16329107	010303121244655	330	محجر طيبه
68	13/07/2023	7563/6542	65.5	16324236	010303121244157	330	محجر طيبه
69	13/07/2023	7563/6542	65.5	16324294	010303121244657	330	محجر طيبه
70	13/07/2023	4739/6872	65.5	16324255	010303131229238	330	محجر طيبه
71	13/07/2023	4172/6549	62.5	16324231	010303121244156	330	محجر طيبه
72	13/07/2023	2653/6719	53.5	16329149	010303131229652	330	محجر طيبه
73	13/07/2023	3948/3519	59.5	16324230	010303141236668	280	محجر طيبه
74	13/07/2023	7159/50448	63.5	16329131	010303121244824	330	محجر طيبه
75	13/07/2023	7159/50448	63.5	16324246	010303131229152	330	محجر طيبه
76	13/07/2023	5819/4837	66	16324271	010303121244378	330	محجر طيبه
77	14/07/2023	4768/6721	67	16329201	010303141237285	330	محجر طيبه
78	14/07/2023	6583/6543	58.5	16329158	010303121244991	330	محجر طيبه
79	14/07/2023	7159/50448	63.5	16329202	010303121245292	330	محجر طيبه
80	14/07/2023	7159/50448	63.5	16329202	010303121245292	330	محجر طيبه
81	14/07/2023	7563/6542	65.5	16329157	010303131229653	330	محجر طيبه
82	14/07/2023	2653/6719	53.5	16329183	010303131229810	330	محجر طيبه
		اجمالي الكمية (م ^٣)	4972.5		اجمالي الرسوم (الجنبة)	21840	

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية البيانات المالية للتربة عقد برج العرب							
رقم	التاريخ	رقم الفاتورة	رقم الفاتورة	الكمية (م ³)	رقم الفاتورة	التاريخ	اسم الكسائر
اجمالي ما سبق (م ³)	4972.5	اجمالي ما سبق (الجنبة)	21840				
83	14/07/2023	4739/6872	65.5	16329187	010303131229829	330	محجر طيبه
84	14/07/2023	2653/6719	53.5	19329239	010303131230190	330	محجر طيبه
85	14/07/2023	5819/4837	63.5	16329200	010303121245264	330	محجر طيبه
86	14/07/2023	6583/6543	58.5	16329229	010303121245695	330	محجر طيبه
87	14/07/2023	5819/4837	66	16329164	010303121245017	330	محجر طيبه
88	14/07/2023	7563/6542	65.5	16329184	010303131229871	330	محجر طيبه
89	14/07/2023	4172/6549	64	16329243	010303131230193	330	محجر طيبه
90	14/07/2023	4172/6549	64	16329182	010303121245201	330	محجر طيبه
91	14/07/2023	7563/6542	65.5	16329246	010303121245763	330	محجر طيبه
92	14/07/2023	6583/6543	58.5	16329165	010303131229818	330	محجر طيبه
93	14/07/2023	4768/6721	67	16329228	010303141237469	330	محجر طيبه
94	14/07/2023	9682/1234	65.5	16329203	010303131229901	330	محجر طيبه
95	14/07/2023	7159/50448	63.5	16329232	010303121245713	330	محجر طيبه
96	14/07/2023	9682/1234	65.5	16329233	010303131230150	330	محجر طيبه
97	14/07/2023	7159/40488	63.5	16329166	010303121245077	330	محجر طيبه
98	14/07/2023	4718/6714	53.5	16329214	010303131230022	330	محجر طيبه
99	14/07/2023	5819/4837	63.5	16329222	010303131230051	330	محجر طيبه
100	14/07/2023	4739/6872	65.5	16329217	010303131230045	330	محجر طيبه
101	12/07/2023	1569/4835	57.5	16324167	010303131228834	330	محجر طيبه
102	12/07/2023	2845/2751	52.5	16324191	010303131228916	330	محجر طيبه
103	12/07/2023	9682/1234	65.5	16324196	010303131228935	330	محجر طيبه
104	12/07/2023	7159/50448	63.5	16324195	010303141236588	330	محجر طيبه
105	15/07/2023	4768/6721	67	26329308	010303131230466	330	محجر طيبه
106	15/07/2023	9682/1234	65.5	16329266	010303121245906	330	محجر طيبه
107	15/07/2023	7159/50448	63.5	16329265	010303141237584	330	محجر طيبه
108	15/07/2023	7159/50448	63.5	16329307	010303141237722	330	محجر طيبه
109	15/07/2023	5819/4837	67	16329250	010303141237527	330	محجر طيبه
110	15/07/2023	7563/6542	65.5	16329269	010303131230379	330	محجر طيبه
111	15/07/2023	4172/6549	64	16329270	010303121246007	330	محجر طيبه
112	15/07/2023	2653/6719	53.5	16329271	010303131230378	330	محجر طيبه
113	15/07/2023	4739/6872	65.5	16329260	010303121245861	330	محجر طيبه
114	15/07/2023	4718/6714	53.5	16329261	010303131230269	330	محجر طيبه
115	15/07/2023	6583/6543	58.5	16329331	010303121246591	330	محجر طيبه
116	15/07/2023	6583/6543	58.5	16329264	010303121245909	330	محجر طيبه
117	15/07/2023	9682/1234	65.5	16329355	010303131230453	330	محجر طيبه
118	15/07/2023	9682/1234	65.5	16329310	010303141237950	330	محجر طيبه
119	15/07/2023	7159/50448	63.5	16329354	010303141237949	330	محجر طيبه
120	15/07/2032	4739/6872	65.5	16329304	010303121246353	330	محجر طيبه
121	15/08/2023	4718/6714	53.5	16329309	010303131229817	330	محجر طيبه
122	15/07/2023	4718/6714	53.5	16329305	010303131230467	330	محجر طيبه
123	15/07/2023	6721/4768	67	16329262	010303131230311	330	محجر طيبه
124	16/07/2023	6549/4172	64	16324326	010303121247888	330	محجر طيبه
125	16/07/2023	6542/7563	65.5	16329439	010303131231038	330	محجر طيبه
اجمالي الكليه (م ³) =	7652.5	اجمالي الرسوم بالجنبة =	28440				

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية البونات المائية للتربة عقد برج العرب							
رقم	التاريخ	رقم الفريضة	الكمية (م ³)	رقم البون الثاني	رقم الفريضة	اسم الخسارة	الرسوم (الجنينة)
			10278.5			اجمالي الرسوم بالجنينة =	56380
168	18/02/2023	9726/7264	55	0461869	010303131891191	السيوي	330
169	18/02/2023	1569/5987	59	0461868	010303131891185	السيوي	330
170	18/02/2023	1784/7913	59	0461874	010303141393573	السيوي	330
171	05/03/2023	1849/5738	58	0461435	010303141401582	السيوي	330
172	04/03/2023	9832/8763	55	0461283	010303121643383	السيوي	330
173	28/02/2023	4612/1869	60	2892002	010303141398802	السيوي	330
174	05/03/2023	7213/1254	57	0461346	010303121643691	السيوي	330
175	04/03/2023	6924/3465	59.5	2892019	010303131901268	السيوي	330
176	05/03/2023	5738/1849	58	0461351	010303131901823	السيوي	330
177	05/03/2023	8763/9832	55	0461415	010303141401594	السيوي	330
178	05/03/2023	1465/1673	55	0461350	010303141401689	السيوي	330
179	05/03/2023	1673/1465	55	0461382	010303121643689	السيوي	330
180	05/03/2023	9327/1285	53	0461436	010303131901605	السيوي	330
181	05/03/2023	3465/6924	59	0461371	010303141401783	السيوي	330
182	05/03/2023	1285/9327	53	0461357	0420342372-2022642-15	السيوي	330
183	05/03/2023	3465/6924	58	0461406	010303141401633	السيوي	330
184	05/03/2023	7863/9832	55	0461355	010303131901998	السيوي	330
185	6/3/0/2023	3465/6924	58	0461461	010303141402037	السيوي	330
186	04/03/2023	8763/9832	57	0461225	0420342372-2022632750	السيوي	330
187	06/03/2023	9327/1285	53	0461456	010303131902088	السيوي	330
188	05/03/2023	1254/7213	57	0461390	010303141401718	السيوي	330
189	11/03/2023	3136/3976	63	0457082	010303141404910	السيوي	330
190	11/03/2023	7528/9351	66	0457067	010303131906492	السيوي	330
191	03/08/2023	50448/7159	63.5	6266721	103031212632559	السيوي	330
192	02/08/2023	1234/8934	65	6267012	010303131245039	السيوي	330
193	03/08/2023	1234/8934	65	6266716	010303121263558	السيوي	330
194	03/08/2023	1234/8934	65	6267079	010303131245245	السيوي	330
195	03/08/2023	1234/8934	65	6266963	010303131245969	السيوي	330
196	03/08/2023	5218/8259	58.5	6266951	010303141248522	السيوي	330
197	04/08/2023	1234/8934	65	6267423	010303141248666	السيوي	330
198	04/08/2023	2896/6874	64	6266996	010303121264282	السيوي	330
199	04/08/2023	4739/6872	56.5	6266997	010303121264281	السيوي	330
200	04/08/2023	50448/7159	63.5	6267422	010303141248929	السيوي	330
201	04/08/2023	1234/8934	65	6267305	010303131246670	السيوي	330
202	04/08/2023	50448/7159	65.5	6267304	010303141248665	السيوي	330
203	04/08/2023	2367/2953	56.5	6267393	010303121264900	السيوي	330
204	05/08/2023	50448/7159	63.5	6267549	010303141249043	السيوي	330
205	05/08/2023	1234/8934	65	6267550	010303141249045	السيوي	330
206	11/09/2023	2187/6587	63.5	8838036	010303141273350	السيوي	330
207	11/09/2023	4723/6279	64	8838039	010303121296527	السيوي	330
208	11/09/2023	8732/3658	66	8838038	010303131276025	السيوي	330
209	11/09/2023	3784/8461	66	8838037	010303121296523	السيوي	330
210	12/09/2023	8461/3784	63.5	8838179	010303131276622	السيوي	330
211	12/09/2023	6279/4723	67	8838181	010303121297113	السيوي	330
212	12/09/2023	3658/8732	63.5	8838178	010303141273886	السيوي	330
213	12/09/2023	6578/2187	63.5	8838177	010303141273885	السيوي	330
			13059.5			اجمالي الرسوم (الجنينة)	71180

عن الاستشاري مدني

عن الاستشاري مكتب فني

عن الشركة المنفذة

12/11/2023

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية البونات المائية للتربة عقد برج العرب							
م	التاريخ	رقم العربية	الكمية (م ³)	رقم بين المالي	رقم الباتنة	الرسوم (الجنيه)	اسم الباتنة
			13059.5		اجمالي الرسوم السابقة (الجنيه)	71180	
214	16/07/2023	50448/7159	63.5	15426650	010303141238257	330	محجر الخير
215	16/07/2023	9682/1234	65.5	15426649	010303121246991	330	محجر الخير
216	16/07/2023	5819/4837	66	15426656	010303141238320	330	محجر الخير
217	17/07/2023	6714/4718	53.5	1542671	010303131231715	330	محجر الخير
218	17/07/2023	6549/4172	64	5426715	010303121248579	330	محجر الخير
219	17/07/2023	7563/6542	56.5	5426716	010303131231682	330	محجر الخير
220	17/07/2023	6719/2653	52.5	5426714	010303141239072	330	محجر الخير
221	18/07/2023	6719/2653	52.5	5426757	000000003149884	330	محجر الخير
222	18/07/2023	4718/7614	59.5	5426755	000000003149068	330	محجر الخير
223	18/07/2023	6721/4768	66	5426760	010303141239470	330	محجر الخير
224	18/06/2023	6529/8372	59.5	5426761	010303121249324	330	محجر الخير
225	18/07/2023	4739/6872	56.5	5426746	010303131232118	330	محجر الخير
226	18/07/2023	2653/6719	52.5	5426738	010303131231981	330	محجر الخير
227	18/07/2023	6549/4172	64	5426735	010303131231948	330	محجر الخير
228	18/07/2023	6721/4768	66	5426744	010303131232110	330	محجر الخير
229	18/07/2023	8372/6529	59.5	5426743	010303121249168	330	محجر الخير
230	15/07/2023	6543/6583	58.5	5426745	010303121249169	330	محجر الخير
231	18/07/2023	6714/4718	59.5	5426739	010303131231980	330	محجر الخير
232	18/07/2023	6542/7563	56.5	5426736	010303121248954	330	محجر الخير
233	18/07/2023	6549/4172	64	5426750	010303141239337	330	محجر الخير
234	18/07/2023	6542/7563	56.5	5426752	010303131232178	330	محجر الخير
235	18/07/2023	3519/3948	56.5	5426731	010303121248948	280	محجر الخير
236	18/07/2023	6543/6583	58.5	5426769	010303121249567	330	محجر الخير
237	19/07/2023	6542/7563	56.5	5426822	010303131233443	330	محجر الخير
238	19/07/2023	5427/7563	56.5	5426796	010303121250272	330	محجر الخير
239	19/07/2023	6543/6583	58.5	5426778	010303121249818	330	محجر الخير
240	20/07/2023	6872/4739	56.5	5426836	010303131233546	330	محجر الخير
241	04/09/2023	3658/8732	63.5	5427767	010303131270880	330	محجر الخير
242	04/09/2023	2917/2634	58.5	5427763	010303121291039	330	محجر الخير
243	04/09/2023	2187/6578	65.5	5427772	010303131270645	330	محجر الخير
244	04/09/2023	2187/6578	65.5	5427770	010303141268901	330	محجر الخير
245	04/09/2023	2917/2634	58.5	5427777	010303121291310	330	محجر الخير
246	05/09/2023	1956/6318	68	5427778	010303121291309	330	محجر الخير
			15034.5		اجمالي الرسوم (الجنيه)	71180	

عن الاستشاري مدني

عن الاستشاري مكتب فني

عن الشركة المنفذة

2023/11/17

 مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الحسام للمقاولات العمومية اليونات المائية للتربة عقد برج العرب							
رقم	التاريخ	رقم العربية	الخصية (م.م)	رقم اليونان المائي	رقم الكارتة	الرسوم (الجنينة)	اسم المستفيد
أجمالي الكمية السابقة (م.م)		15034.5		أجمالي الرسوم السابقة (الجنينة)		71180	
247	01/07/2023	2945/9567	64	2892053	010808112285254	330	السهم الذهبي
248	05/07/2023	2945/9567	64	8994235	010808123511490	330	السهم الذهبي
249	10/07/2023	6575/3612	62	2892006	010303131227277	330	السهم الذهبي
250	11/07/2023	6575/3612	62	2892009	010303131228076	330	السهم الذهبي
251	11/07/2023	6575/3612	62	2892007	010303121242308	330	السهم الذهبي
252	14/07/2023	6575/3612	62	8994238	010303121245512	330	السهم الذهبي
253	11/07/2023	6191/5211	63	2891297	010303121242538	330	السهم الذهبي
254	11/07/2023	6575/3612	62	2892008	010303131227852	330	السهم الذهبي
255	21/06/2023	9567/2945	64	2892055	010808123504836	330	السهم الذهبي
256	12/06/2023	9567/2945	64	2892056	010808123501312	330	السهم الذهبي
257	30/05/2023	9567/2945	64	8994231	010303131200642	330	السهم الذهبي
258	03/05/2023	2945/9567	67	8994247	010303131182465	330	السهم الذهبي
259	12/07/2023	6191/5211	63	2891344	010303131228830	330	السهم الذهبي
260	12/07/2023	6191/5211	63	2891343	010303131228651	330	السهم الذهبي
261	12/07/2023	6575/3612	62	2892048	010303121243457	330	السهم الذهبي
262	17/05/2023	8695/7625	66	8994206	010303141199004	330	السهم الذهبي
263	07/02/2023	4683/2613	64	2892018	010303131883077	330	السهم الذهبي
264	05/06/2023	8695/7625	66	2892051	0449445202 20231564 66	330	السهم الذهبي
265	07/06/2023	8695/7625	66	8994243	010303121212245	330	السهم الذهبي
266	21/06/2023	2945/9567	64	2892054	010808123504282	330	السهم الذهبي
267	04/07/2023	2945/9567	64	2892052	010808112284865	330	السهم الذهبي
268	07/07/2023	2945/9567	64	8994248	010808143512478	330	السهم الذهبي
269	14/07/2023	4961/4791	64	2891314	010303131229994	330	السهم الذهبي
أجمالي الكمية الكلية (م.م)		16500.5		أجمالي الرسوم (الجنينة)		88010	

عن الشركة المنفذة

عن الاستشاري مكتب فني

عن الاستشاري مدني

2023/11/14

الشيكات

5.9/9/14

[Handwritten signature]

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - مشروع استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السبخة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٥+٠٠٠ إلى الكم ٢٩٧+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم (اتجاه برج العرب) .

عقد رقم: ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٧٠

- تنفيذ شركة / الحسام للمقاولات العمومية .

بخصوص المستخلص جاري (١): -

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:


- ١- تجهيزات المقاول الموقعية متواجدة .
- ٢- معمل الموقع متواجدة ..
- ٣- الأجهزة المساحية متواجدة .
- ٤- لوحات المشروع عدد (٢) متواجدة .
- ٥- البرنامج الزمني متواجد .
- ٦- السجلات متواجدة .
- ٧- توثيق الموقع متواجد .
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة .
- ٩- صور فوتوغرافية + فيديو متواجدة .
- ١٠- معدات ومهندسين المشروع متواجدة .
- ١١- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
- ١٢- العلامات الارشادية متواجدة .
- ١٣- لا يوجد سيارات بالعقد .
- ١٤- لا يوجد عمالة بالعقد .
- ١٥- لا توجد اجهزة بالعقد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دقيقة



مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر



المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الشركة المنفذة: الحسام للمقاولات العمومية

مرفقات: عدد ()

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / أحمد محمود أبو دقيقة

20/01/2020

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر
