

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،


نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم 1 اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A - A902) عقد 525 تنفيذ :- شركة ابناء ياسين للمقاولات (سامى محمد ياسين وهدان).


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار





السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جاري اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A902-A) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / ابناء ياسين للمقاولات / سامي محمد ياسين وهذان

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحرير أفي : ٢٠٢٤/١١/٢٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر أعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس /



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العندين - مطروح) منطقة A902 .
بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٧ (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥٢٥)

منطقة E1 & A902

شركة : ابناء ياسين للمقاولات

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

العدد	نوع المعدة	م
1	سيارة ملاكي	1
2	سيارة نصف نقل	2
3	لودر كاتربيلر ٩٧٢	3
4	لودر كاتربيلر ٩٨٠	4
1	جرير	5
3	تاك مياة	6
25	عربية نقل ٢٠ م	7
1	بلدوزر D10	8
1	هريس	9

المستشار المشرف

مكتب إشراف كونسولتينج

EnTrans
CONSULTING
مستشار المقاولات والبناء - الخط الأول

الهيئة العامة للطرق و المواصلات

١٤٤٣/١٠/٢٠

شركة ابناء ياسين للمقاولات
٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٥٢٥



المخطط القومية للتخطيط
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق الكتوبر ضمن أعمال مشروع الخط الأول (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة A902 .
المعد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٢٥) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٧

شركة : ابناء ياسين للمقاولات

منطقة A902

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	10
2	مهندس تنفيذ	1	6
3	مهندس مكتب فني	1	6
4	مساح	2	4
5	مساعد مساح	4	1
6	مشرف	3	4
7	ميكانيكي	2	10
8	سائق حفر	30	5
9	سائق	47	3

الإشراف المشرف
مكتب إشراف كونسلتنج

10

لجنة دعمه الطرق و القمارى

١٤٤٤/١١/١٤

ENPRAINS
CONSULTING
مشروع القطار السويح - الخط الأول

شركة ابناء ياسين للمقاولات
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

مشروع القطار الكهربائي السريع - القطاع الثالث

Green Line (GL) MAIN DEPOT منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر
(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة والمعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

محضر فصل كميات بين شركة أبناء سامى يس قطاع الردم E01 شركة المتحدة قطاع الردم D03

أنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- 1- م / إسلام البهادي - مهندس هيئة الطرق والكباري
- 2- م / مصطفى على - مهندس الإستشارى سيسترا (إستشارى الأنفاق)
- 3- م / تامر شرف الدين - مكتب انترانس (استشاري الهيئه).
- 4- م / زكريا - استشاري المساحه (XYZ).
- 5- م / أحمد يس - مهندس شركة أبناء سامى يس .
- 6- م / عبد الرحمن - مهندس شركة المتحدة .


- حيث أن القطاعات اعلاه في مناطق ردم الورشة بينها حد مشترك و ارتفاعات الردم تصل إلى 20 متر مما يستحيل معه تحقيق ذلك الحد بشكل راسى عند التشغيل
- وبالتالي أدى ذلك إلى تداخل أعمال الردم لزوم تحقيق العروض المطلوبة و لزوم التشغيل
- و كانت التوجيهات بأن يتم عمل مثلث مقلوب بحيث يقوم كل مقاول بالردم فى قطاع المقاول الآخر و سيكون لكل مقاول كمية بنون تداخل
- و لكن لم يتحقق ذلك المثلث المطلوب نظراً لأن شركة أبناء سامى يس كانت متقدمة فى العمل و قامت بإنهاءه قبل شركة المتحدة و نتج عن ذلك أنه تم ردم ذلك المثلث بالكامل فى كلا الجانبين من قبل شركة أبناء سامى يس

- تم حصر تلك الكمية و كانت 9000 م3
- بناء على توجيهات السادة الهيئة العامة للطرق والكباري يتم خصم تلك الكمية من شركة المتحدة لصالح

المقررة والمصادقة من قبل السيد

ب.ف.ب : ٦٢٢ - ٦٢٢
س.و.و : ٣٤٧٥

المفترض تنفيذه

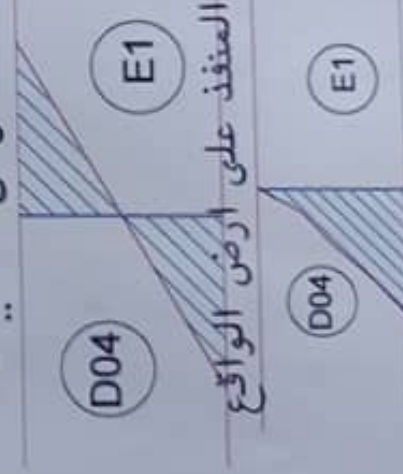

6- علي
5- سامى محمد ياسين وشادان
4- رامي محمد ياسين للمقاولات
3- س.و.و : ٣٤٧٥
2- ب.ف.ب : ٦٢٢ - ٦٢٢
1- س.و.و : ٣٤٧٥

محضر اعتماد نسب التنفيذ

بناء على محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات المنفذة لأعمال حفر وتحويل نواتج العطر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حذائي الكويز ضمن أعمال مشروع القطر السريع الخط الأول (العين المنقطة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بخصوص منطقة E01 & A902 القطاع الأول والثاني عقود القطاع الأول 40 / 2023 / 2024 والقطاع الثاني 525 / 2023 / 2024

الشرايف: - المنطقة الأولى المركزية - الاستشاري - العلم سينسترا - استشاري الهيئة الترتيب

أله في يوم الأربعاء الموافق 2024/5/1 اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1- م / اسلام محمد البهدي | (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| 2- م / مصطفى السيد | (ممثل مكتب سينسترا - الاستشاري العام). |
| 3- م / عبد المنعم علي | (ممثل مكتب الترانس - استشاري الهيئة). |
| 4- م / احمد سامي | (شركة أبناء ياسين للمقاولات). |

تم إعداد المحضر لاعتماد نسب التنفيذ طبقاً للمداولات الفعلية في تلك الفترة والتي جاءت كالآتي: -

نسب تنفيذ أعمال القطع في جميع أنواع التربة عدا الصخرية قبل مايو 2023 على النحو التالي: -

- 86 % من الكمية الإجمالية المنقذة وذلك لشهر يناير 2023 (ZONE A902&E01)
- 1 % من الكمية الإجمالية المنقذة وذلك لشهر فبراير 2023 (ZONE A902&E01)
- 3 % من الكمية الإجمالية المنقذة وذلك لشهر مارس 2023 (ZONE A902&E01)

نسب تنفيذ أعمال القطع في التربة المتمسكة (باستخدام البلوذر) قبل مايو 2023 على النحو التالي: -

- 24 % من الكمية الإجمالية المنقذة وذلك لشهر يناير 2023 (ZONE A902&E01)
- 48 % من الكمية الإجمالية المنقذة وذلك لشهر فبراير 2023 (ZONE A902&E01)
- 24 % من الكمية الإجمالية المنقذة وذلك لشهر مارس 2023 (ZONE A902&E01)

أما بالنسبة لكميات المنقذة بعد شهر مايو 2023 يتم حسابها على آخر شهر في المفاوضة (مايو 2023) وأقل المحضر على ذلك..

التوقيع

اللجنة

-	م / احمد سامي
-	م / مصطفى السيد
-	م / عبد المنعم علي
-	م / اسلام محمد البهدي

شركة: أبناء ياسين للمقاولات
