

محضر استلام موقع

عملية: إسناد اعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العلمين) قطاع (فوكة - مطروح) تشكيل الجسور وطبقات
التأسيس والاساس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٥٤٥+٥٠٠ الى الكم
٥٤٥+٧٢٠ بطول ٠,٢٢ كم

تنفيذ: شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات
إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٤) بتاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٨

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٠ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / طارق محمد زكى مطر مدير مشروع - الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٠ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- طارق محمد زكى مطر

٢- 

١- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد. مهندس //

هاني محمد محمود طه



وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

الفرع عماد الدين

رقم الوثيقة 1520 هـ / 2

اسم المؤمن له مكتب الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات

العنوان لتل الكبير عزبة ابو عاشور بملك / احمد رجب عبدالعال - الاسماعيلية

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المقاوله مشروع اعمال الجسر الترابى للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة- العلمين) قطاع (فوكة - مطروح) تشكيل الجسور

وطبقات التأسيس والاساس

موقع العمل وخرسانات الميول المسافة من الكم 545.500 الى الكم 545.720 بطول 0.22 كم (بالامر المباشر) عقد رقم (2024 / 2023 / 534)

وصف المشروع

مدة التأمين

أ - بالنسبة للاعمال يبدأ التأمين فى ٢٠٢٣/١٠/١٨ الساعة الثانية عشره ظهرا وينتهى فى ٢٠٢٤/١٠/١٨ الساعة الثانية عشره ظهرا

ب - بالنسبة لاعمال الصيانه وتبدأ فى وتنتهى فى الساعة الثانية عشره ظهرا الساعة الثانية عشره ظهرا

مبلغ التأمين

القسم الاول الاضرار الماديه ١٠٧٨٦١٢٤,٠٠ جنيه مصرى

القسم الثانى المسئوليه المدنيه قبل الغير ١٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار الماديه

البنود المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- اعمال المقاوله الاعمال الدائمه والمؤقته متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد 1/1- قيمه العقد	10786124 جم	ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 25000 جم
2/1 الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع 2- ادوات ومهمات التشييد	لا يوجد	
3- الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق	لا يوجد	
4- ازاله الانقاض	لا يوجد	
5- المنشآت المؤقته	لا يوجد	

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٦

محمد زكى أحمد على

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza

P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT

Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٦١٣٦٥ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية



وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين

الفرع عماد الدين

رقم الوثيقة 1520 هـ / 2

اسم المؤمن له مكتب الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات

العنوان لتل الكبير عزبة ابو عاشور بملك / احمد رجب عبدالعال - الاسماعيلية

لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم المقاوله مشروع اعمال الجسر الترابى للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة- العلمين) قطاع (فوكة - مطروح) تشكيل الجسور وطبقات التأسيس والاساس

موقع العمل وخرسانات الميول المسافة من الكم 545.500 الى الكم 545.720 بطول 0.22 كم (بالامر المباشر)

وصف المشروع عقد رقم (٥٢٤ / ٢٤٢ / ٢٠٢٤)
مدة التامين

أ - بالنسبة للاعمال يبدأ التامين فى ٢٠٢٣/١٠/١٨ الساعة الثانية عشره ظهرا وينتهى فى ٢٠٢٤/١٠/١٨ الساعة الثانية عشره ظهرا

ب - بالنسبة لاعمال الصيانه وتبدأ فى وتنتهى فى
الساعة الثانية عشره ظهرا الساعة الثانية عشره ظهرا

القسم الاول الاضرار الماديه ١٠٧٨٦١٢٤,٠٠ جنيه مصرى

القسم الثانى المسئوليه المدنيه قبل الغير ١٠٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار الماديه

التحمل عن كل حادث	مبلغ التامين	البند المؤمن عليها
ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 25000 جم	10786124 جم	1- اعمال المقاوله الاعمال الدائمه والمؤقته متضمنه جميع المواد المبينه فيما بعد 1/1- قيمه العقد 2/1 الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع 2- ادوات ومهمات التشييد 3- الات ومعدات التشييد طبقا لقائمه المرفق 4- ازاله الانقاض 5- المنشآت المؤقته
	لا يوجد	
	لا يوجد	
	لا يوجد	
	لا يوجد	
	لا يوجد	

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية

فرع عماد الدين ٢/٢٤٢
مهندس ذكى أحمد على
التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

هذه الوثيقة مؤهلة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية



الاحطار الطبيعى	حدود التعويض	التحملات
1 - الزلازل / البراكين / الاعاصير	غير مغطى	
2 - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / انزلاق وانهيال التربه	غير مغطى	
	غير مغطى	

(1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد

التحملات	حدود التعويض	البنود المؤمن عليها
ال 10% الاولى من قيمة كل حادث بحد ادنى 10000 ج.م	100000 ج.م (مائة الف جنيها لا غير)	1 - الاصابات الجسمانية
		للشخص الواحد 1/1
	300000 ج.م (ثلاثمائة الف جنيها لا غير)	2/1 مهما كان عدد الاشخاص
	300000 ج.م (ثلاثمائة الف جنيها لا غير)	2 - الاضرار المادية للممتلكات
1000000.00		(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحده

يعتبر متمماً لهذه الوثيقة طلب التامين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التالية والمرفقه جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة

ملحق وسائل مكافحة الحريق

مرفق شرط سقوط الحق

٢/٢٤٢
عبد الله الدين
أحمد علي
التوقيع

من المعلوم والمتفق عليه مايلي :-
 - ان الوثيقة لا تغطي اى خسائر او اضرار او تلفيات ناتجة عن عمليات الارهاب او التخريب
 - انه من ضمن تغطيات الوثيقة تغطية خطرى الحريق والسطو المسلح
 - يستثنى من التغطية التامينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة اى اعمال تتم داخل المياه
 - ان الشركة غير مسئولى عن اية حوادث تكون قد وقعت قبل تاريخ
 اصدار هذه الوثيقة
 من المعلوم والمتفق عليه ايضا"
 - انه فى حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات التى تستحق
 بموجبها الى الهيئة العامة للطرق والكبارى
 - لايجوز اجراء اى تعديلات الا بعد اخذ موافقة كتابية من
 الهيئة العامة للطرق والكبارى



1 295.00	القسط الصافى
72.00	نصف الدمغة النسبية
8.00	رسم الاشراف والرقابة
5.00	نصف الدمغة النوعية
51.00	مصاريف الاصدار
5.00	رسم تنمية موارد
4.00	مصاريف الهيئة
1 440.00	القسط الاجمالى

فقط ألف وأربعمائة وأربعون جنية مصرى لاغير

تحريرا فى 2023/11/06

اسم المنتج شروق فريد فايز حافظ

صفحة 3 من 3

2022/11/28

32581

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع همام الدين ٢/٢٤٢
مهندسين/أحمد على
التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7

Fax : 33352697 - 33361365 www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة

تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١

بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر

فاكس : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد

نوع التأمين : ج. أ. مقولين

وثيقة رقم : ١٥٢٠ / ٢/هـ

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك. فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-
١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الأوقات مع تقدم العمل.

ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق بأغطية مؤقتة يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .

٢- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة فى الانشاء .

٣- أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات .

٤- أن يتم ازاله النفايات بانتظام - ازاله النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .

٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أى نوع مثل :-

- عمليات الجلف، التقطيع، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
- استعمال النتومين الساخن - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
- يتم تنفيذ (العمل الحرارى) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحرارى) بعد انتهاء هذا العمل بساعة .
- ٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
- كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحوائط غير قابله للحريق.

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين
٢/٢٤٢
مستوى ١
التوقيع / أحمد على

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٦٨٩٧ - ٣٣٣٦٨٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة .

تقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية .

يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أي عمل حرارى.

٧- تعيين منسق أمان بالموقع.

- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .

- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام .-

- ان يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية أسبوعيا .

- ان يكون اقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فورية مجهزة له فى جميع الأوقات .

٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين : ٥٠٠٠٠٠ جم (خمسمائة الف جنيها لاغير)

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين ٢/٢٤٢
التوقيع / د. كى أحمد علي

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٦١٣٦٥ - ٣٣٣٥٢٦٩٧
info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

شروط سقوط الحق

- تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-
أ) إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين ، أو إذا أخفي عمدا عن الشركة بيانات كان من المتعين عليه أعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.
ب) مخالفة القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة النشاط التأميني إذا انطوت على جناية أو جنحة عمديه.
ويسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في التعويض عن الحادث المؤمن منه إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا .

MIC
MOHANDER INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسية
فرع عماد الدين
٢/٢٤٢
محمّد ذكي أحمد على
التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المساحة - الدقي - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ / ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقي - مصر
فاكس : ٣٣٣٦١٣٦٥ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

• هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

• تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	عماد الدين	رقم الوثيقة	١٥٩٧٢	و /	٢	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/١١/٠٦
العملة	جنية مصرية	مدة التأمين من	٢٠٢٣/١٠/١٨	ظهرا الى	٢٠٢٤/١٠/١٨	ظهرا	٢٠٢٣/١١/٠٦
اسم المتعاقد	شركة الدنيا للمقاولات العمومية والتوريدات						
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق						
العنوان	الهيئة العامة للطرق والكبارى						
لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى						
تاريخ الميلاد	اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة						
وظيفة	كما بالكشف المرفق						

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

:- من المعلوم والمتفق عليه صراحة انة المستفيدون : الورثة الشرعيون
السن اكبر من (١٦) سنة واقل من (٦٥) سنة
أن التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد (٤) مهندس - وعدد (٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى - عدد (٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم - عدد (٤) عامل ويدون ذكر أسم اثناء وبسبب العمل فقط داخل نطاق العمل المؤمن له عن (اسناد اعمال الجسر الترابى للخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع (فوكا - مطروح) تشكيل الجسور وطبقات التأسيس والاساس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٥٤٥,٥٠٠ الى الكم ٥٤٥,٧٢٠ بطول ٠,٢٢ كم) (بالأمر المباشر) وكذا اثناء الذهاب والعودة لموقع العمل وبشرط سلوكه الطريق المعتاد دون أى تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط الأيزيد العدوقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه موقع العمل والأسقط حقه فى التعويض عقد رقم ٢٠٢٣/١٠/١٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٢٠/٢٣/٥٣٤

القسط الصافى	نصف الدفعة النسبية	نصف الدفعة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالى
٩١٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٩٨١,٠٠٠

فقط تسعائة و احدى و ثمانون جنية مصرية لا غير

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢٠١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq. Dokki - Giza
P.O. BOX 32 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365
www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٥٢٦٩٧

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

صفحة ١

وثيقة تأمين حوادث شخصية



الفرع المصدر عماد الدين رقم الوثيقة ١٥٩٧٢ / ٢ تاريخ طلب التأمين ٢٠٢٣/١١/٠٦
العملة جنية مصرى مدة التأمين من ٢٠٢٣/١٠/١٨ ظهور الى ظهور ٢٠٢٤/١٠/١٨

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

- اولا : اذا توفى المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا وقدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- انظر الكشف المرفق
- ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا وقدره وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- انظر الكشف المرفق
- ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبند الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- انظر الكشف المرفق
- رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا وقدره اسبوعيا بواقع (خمسة فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبند الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- (لا شىء)
- خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- (لا شىء)
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- (لا شىء)
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- (لا شىء)

٣٢٥٨١

شروق فريد فايز حافظ

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها

٢٠٢٣/١١/٠٦

تحريرا فى

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O. BOX 52 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365
www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٥٢٦٩٧
info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

صفحة ٢



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٥٩٧٢ و ٢

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
عدد(٤) مهندس بدون ذكر اسم	الوفاة	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	١,٤٠	٤٢٠,٠٠
عدد(٤) مهندس بدون ذكر اسم	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	١,٤٠	٤٢٠,٠٠
عدد(٤) مهندس بدون ذكر اسم	العجز الكلى المؤقت	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	١,٤٠	٤٢٠,٠٠
عدد(٤) مهندس بدون ذكر اسم	العلاج	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	١,٤٠	٤٢٠,٠٠
عدد(٤) مهندس بدون ذكر اسم	اسعاف	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	١,٤٠	٤٢٠,٠٠
عدد(٤) مهندس بدون ذكر اسم	جنازة	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	١,٤٠	٤٢٠,٠٠
عدد(٤) مهندس بدون ذكر اسم	المبالغ الموضحة لكل شخص	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	١,٤٠	٤٢٠,٠٠
عدد(٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى	الوفاة	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١,٤٠	١٦٨,٠٠
عدد(٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١,٤٠	١٦٨,٠٠
عدد(٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى	العجز الكلى المؤقت	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١,٤٠	١٦٨,٠٠
عدد(٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى	العلاج	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١,٤٠	١٦٨,٠٠
عدد(٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى	اسعاف	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١,٤٠	١٦٨,٠٠
عدد(٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى	جنازة	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١,٤٠	١٦٨,٠٠
عدد(٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى	المبالغ الموضحة لكل شخص	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١,٤٠	١٦٨,٠٠
عدد(٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم	الوفاة	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١,٤٠	٨٤,٠٠
عدد(٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١,٤٠	٨٤,٠٠
عدد(٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم	العجز الكلى المؤقت	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١,٤٠	٨٤,٠٠
عدد(٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم	العلاج	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١,٤٠	٨٤,٠٠
عدد(٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم	اسعاف	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١,٤٠	٨٤,٠٠
عدد(٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم	جنازة	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١,٤٠	٨٤,٠٠
عدد(٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم	المبالغ الموضحة لكل شخص	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١,٤٠	٨٤,٠٠
عدد(٤) عامل بدون ذكر اسم	الوفاة	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١,٤٠	٥٦,٠٠
عدد(٤) عامل بدون ذكر اسم	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١,٤٠	٥٦,٠٠
عدد(٤) عامل بدون ذكر اسم	العجز الكلى المؤقت	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١,٤٠	٥٦,٠٠
عدد(٤) عامل بدون ذكر اسم	العلاج	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١,٤٠	٥٦,٠٠
عدد(٤) عامل بدون ذكر اسم	اسعاف	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١,٤٠	٥٦,٠٠
عدد(٤) عامل بدون ذكر اسم	جنازة	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١,٤٠	٥٦,٠٠
عدد(٤) عامل بدون ذكر اسم	المبالغ الموضحة لكل شخص	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١,٤٠	٥٦,٠٠
اجمالى مبلغ التأمين	جنية مصرى	٥٢٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠	١,٤٠	١٨٢,٠٠

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥,٠٠

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢/١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع

للحصول و الاطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

١٥٩٧٢ و ٢ /

كشف متمم للوثيقة

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
	الوفاة	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف
					جائزة

أسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

- من المعلوم والمتفق عليه صراحة أنه المستفيدون : الورثة الشرعيون السن أكبر من (١٦) سنة وأقل من (٦٥) سنة أن التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد (٤) مهندس - وعدد (٤) مساعد مهندس او ملاحظ فنى - عدد (٤) سائق معدة او سيارة او من فى حكمهم - عدد (٤) عامل وبدون ذكر أسم اثناء وبسبب العمل فقط داخل نطاق العمل المؤمن له عن اسناد اعمال الجسر الترابى للخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) قطاع (فوكة - مطروح) تشكيل الجسور وطبقات التأسيس والاساس وخرسانات الميول المسافة من الكم ٥٤٥,٥٠٠ الى الكم ٥٤٥,٧٢٠ بطول ٠,٢٢ كم) (بالأمر المباشر) وكذا اثناء الذهاب والعودة لموقع العمل وبشرط سلوكه الطريق المعتاد دون أى تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط الأيزيد العدوقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه موقع العمل والأسقط حقه فى التعويض عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨

٩١٠,٠٠

صافى القسط

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
فرع عماد الدين ٢٠١٨٦
صلاح محمد أحمد مختار
التوقيع

للحصول و الاطلاع علي دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الالكتروني www.mohins.com

Head office : 3 El-Mesaha Sq.Dokki - Giza
P.O BOX : 62 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352697 - 33361365

www.mohins.com

19 318

المركز الرئيسى : ٣ ميدان المساحة - الدقى - الجيزة
تليفون : ٣٣٣٦٨١٠٧ - ٣٣٣٦٨١٠١
بريد : ٦٢ الأورمان - الدقى - مصر
فاكس : ٣٣٣٥٢٦٩٧ - ٣٣٣٦٨١٣٦٥
info@mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بحاسبة مصلحة الضرائب على ضريبة الدمغة النسبية والنوعية

MATERIAL INSPECTION REQUEST



Contractor Company	AL-DONYAA CO.		Designer Company	KK CONSULT.																
Issued by Contractor	Name Eng/Mohamed Galal	Sign <i>Mohamed Galal</i>	Date 11/3/2023	Time																
Cotractor reference	DIN-1 11/3/2023																			
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td>3</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				11	3	2023			
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			11	3	2023															

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	FILL MATERIAL RESULTS																
Location to be Used	<table border="1"> <tr> <th>From</th> <th>To</th> <th></th> </tr> <tr> <td>545+500</td> <td>545+520</td> <td>(-3)</td> </tr> <tr> <td>545+900</td> <td>546+000</td> <td>(-3.5)</td> </tr> <tr> <td>545+740</td> <td>545+900</td> <td>(-3.5)</td> </tr> </table>					From	To		545+500	545+520	(-3)	545+900	546+000	(-3.5)	545+740	545+900	(-3.5)
From	To																
545+500	545+520	(-3)															
545+900	546+000	(-3.5)															
545+740	545+900	(-3.5)															
MAR Approval No			Date														
Supplier Name																	
Test Requirement			Specification	Clause													
Reference Photos	Yes attached / No	Other															
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note												
1	Sive analysis	M ³	5000	9-3-2023													
2	Classification	M ³	5000	9-3-2023													
3	Proctor & O.M.C	M ³	5000	9-3-2023													
4	C.B.R	M ³	5000	11-3-2023													
Comments by:			Comments by:														
A Sample has been taken from fill material by K.K office to (Mansour laboratory) and the results founded meet the specifications and accepted																	
APPROVAL STATUS																	
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R													
Contractor	Mohamed Galal	<i>Mohamed Galal</i>															
QA/QC *	Hassan	<i>Hassan</i>															
GARB**																	
Employers Representative																	

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

MATERIAL APPROVAL REQUEST



Contractor Company	AL-DONYAA CO.		Designer Company	KK CONSULT.																
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time																
	Eng/ Mohamed Galal	<i>mohamed Galal</i>	11/3/2023																	
Contractor Reference	DIN-1 11/3/2023																			
Received by ER			MAR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td>3</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM				11	3	2023		
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
			11	3	2023															

THE FOLLOWING TEST RESULT ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Materials		Soil (A-1-b)		
Location to be Used		From	To	
		545+500	545+520	(-3)
		545+900	546+000	(-3.5)
		545+740	545+900	(-3.5)
Item	Specification	Test Requirement	Test result attachment	Remarks
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to Specification	
2	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to Specification	
3	ASTM D 1440	Passing Sieve # 200	14.5	
4	ASTM D 4318	Atterberg Limit	N.P	
5	ASTM D 2974	Moisture Content	7.1	
6	ASTM D 1557	Modified Proctor	2.13	
7	ASTM D 1883	C.B.R	29.70	
Comments by:			Comments by:	

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohamed Galal	<i>mohamed Galal</i>		
QA/QC *	<i>Hassan</i>	<i>11/3/2023</i>		
GARB**				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Opreating lab

Mansour Lab

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	9/3/2023	code		
LOCATION	K.P 545+500	DIN-1	Zone	545+500 TO 546+000
NAME COMPANY	EL DONIA			

-visual inspection test

-Gradient test

1-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		31790.00	gm		table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	soil classify
0.00	0.0	455.0	1675.0	2070.0	3826.0	2274.0	3620.0	A-1-b
Cumulative Retained (g)	0.0	455.0	2130.0	4200.0	8026.0	10300.0	13920.0	2.130
Cumulative Retained %	0.0	1.4	6.7	13.2	25.2	32.4	43.8	7.10
Cumulative Passing %	100.0	98.6	93.3	86.8	74.8	67.6	56.2	29.70

3-soft material gradation			WT.OF sample		500.00	gm
sieve size	10	40	200			
Cumulative Retained (g)	39.00	149.00	371.00			
Cumulative Retained %	7.80	29.80	74.20			
Cumulative Passing %	92.20	70.20	25.80			

C-General gradient										
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	98.6	93.3	86.8	74.8	67.6	56.2	51.8	39.5	14.5

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	NL	NP	NP

Contractor

Consultant



Khaled Zaki


 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي أحمد خالد قنديل	 SVSTRA SHAKER	Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	 الهيئة القومية للإنتاج (GARELT)
operating Lab	Mansour Lab	Proctor Test	

TESTING DATE:	9/3/2023	code	Zone	545+500 TO 546+000
LOCATION	545+500	DIN-1		
NAME COMPANY	EL DONIA			

Weight of empty mold :	5594.0	MAX Dry Density	2.13
Mold Volume:	2124.0	Water content %	7.1

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	9985.0	10230.0	10440.0	10365.0	
WT. WET SOIL	4391.0	4636.0	4846.0	4771.0	
Wt. Density	2.067	2.183	2.282	2.246	

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8		
Tare wt.	55.85	54.5	55.65	52.42	56.96	56.74	56.74	57.92		
Wt. Of wet soil & tare	149.2	149.0	149.5	151.0	149.3	149.4	148.9	151.7		
Wt. Of dry soil & tare	147.0	146.7	145.5	146.5	143.0	143	141.2	143.6		
Wt. Of water	2.2	2.3	4.0	4.5	6.3	6.0	7.7	8.1		
Wt. Of dry soil	91.2	92.2	89.8	94.1	86.1	86.6	84.5	85.7		
Water content %	2.4%	2.5%	4.5%	4.8%	7.3%	6.9%	9.1%	9.4%		
AV. Water content %	2.5%		4.6%		7.1%		9.2%			
Dry Density	2.018		2.086		2.130		2.056			

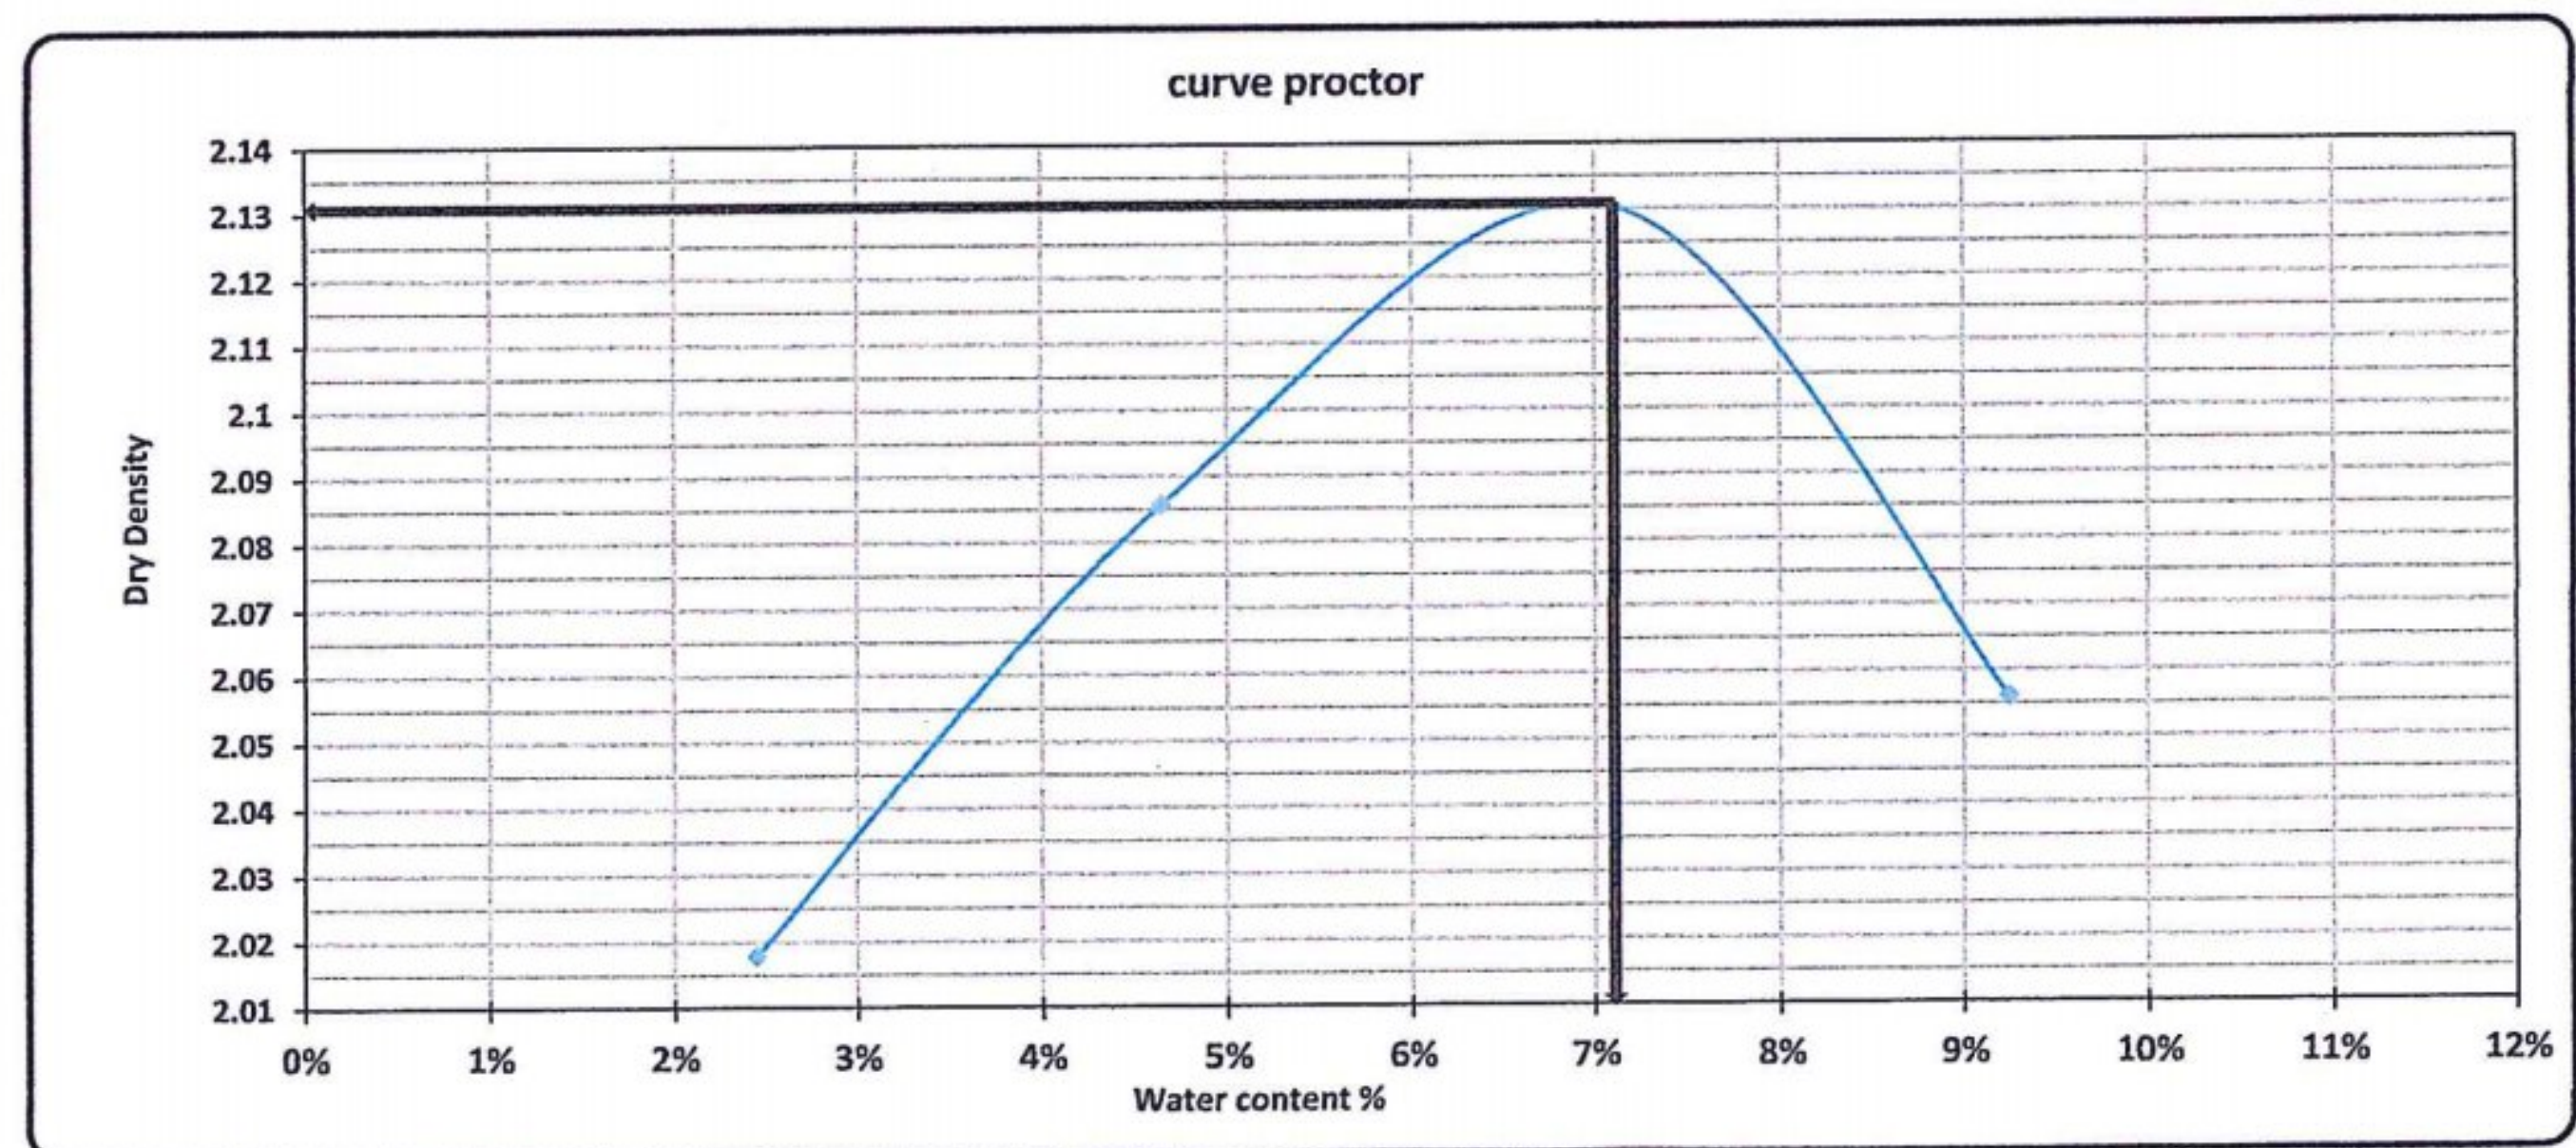

Consultant

khaled zakki

Electric Express Train - HSR

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	11/3/2023	Code	Zone	545+500	546+000
Location :	545+500	DIN-1			
Name of Company	EL DONIA				

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2104
Mold WT. (gm)	8077
Mold WT. + Wet WT. (gm)	12867
Wet WT. (gm)	4790
Wet Density (g/cm ³)	2.277
Dry Density (g/cm ³)	2.126
Proctor Density (g/cm ³)	2.130
Compaction %	100

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	13
Tare WT. (gm)	54.5
Tare WT. +Wet WT. (gm)	149.2
Tare WT. +Dry WT. (gm)	142.9
Water WT. (gm)	6.3
Dry WT. (gm)	88.4
Moisture Content %	7.1

Swelling	
Mold No.	1
Date	0
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11600.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

Pentration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (kg)	61.00	124.00	207.00	297.00	382.00	464.00	553.00	618.00	741.00
Load (KN)	0.6	1.2	2.0	2.9	3.7	4.5	5.4	6.1	7.3

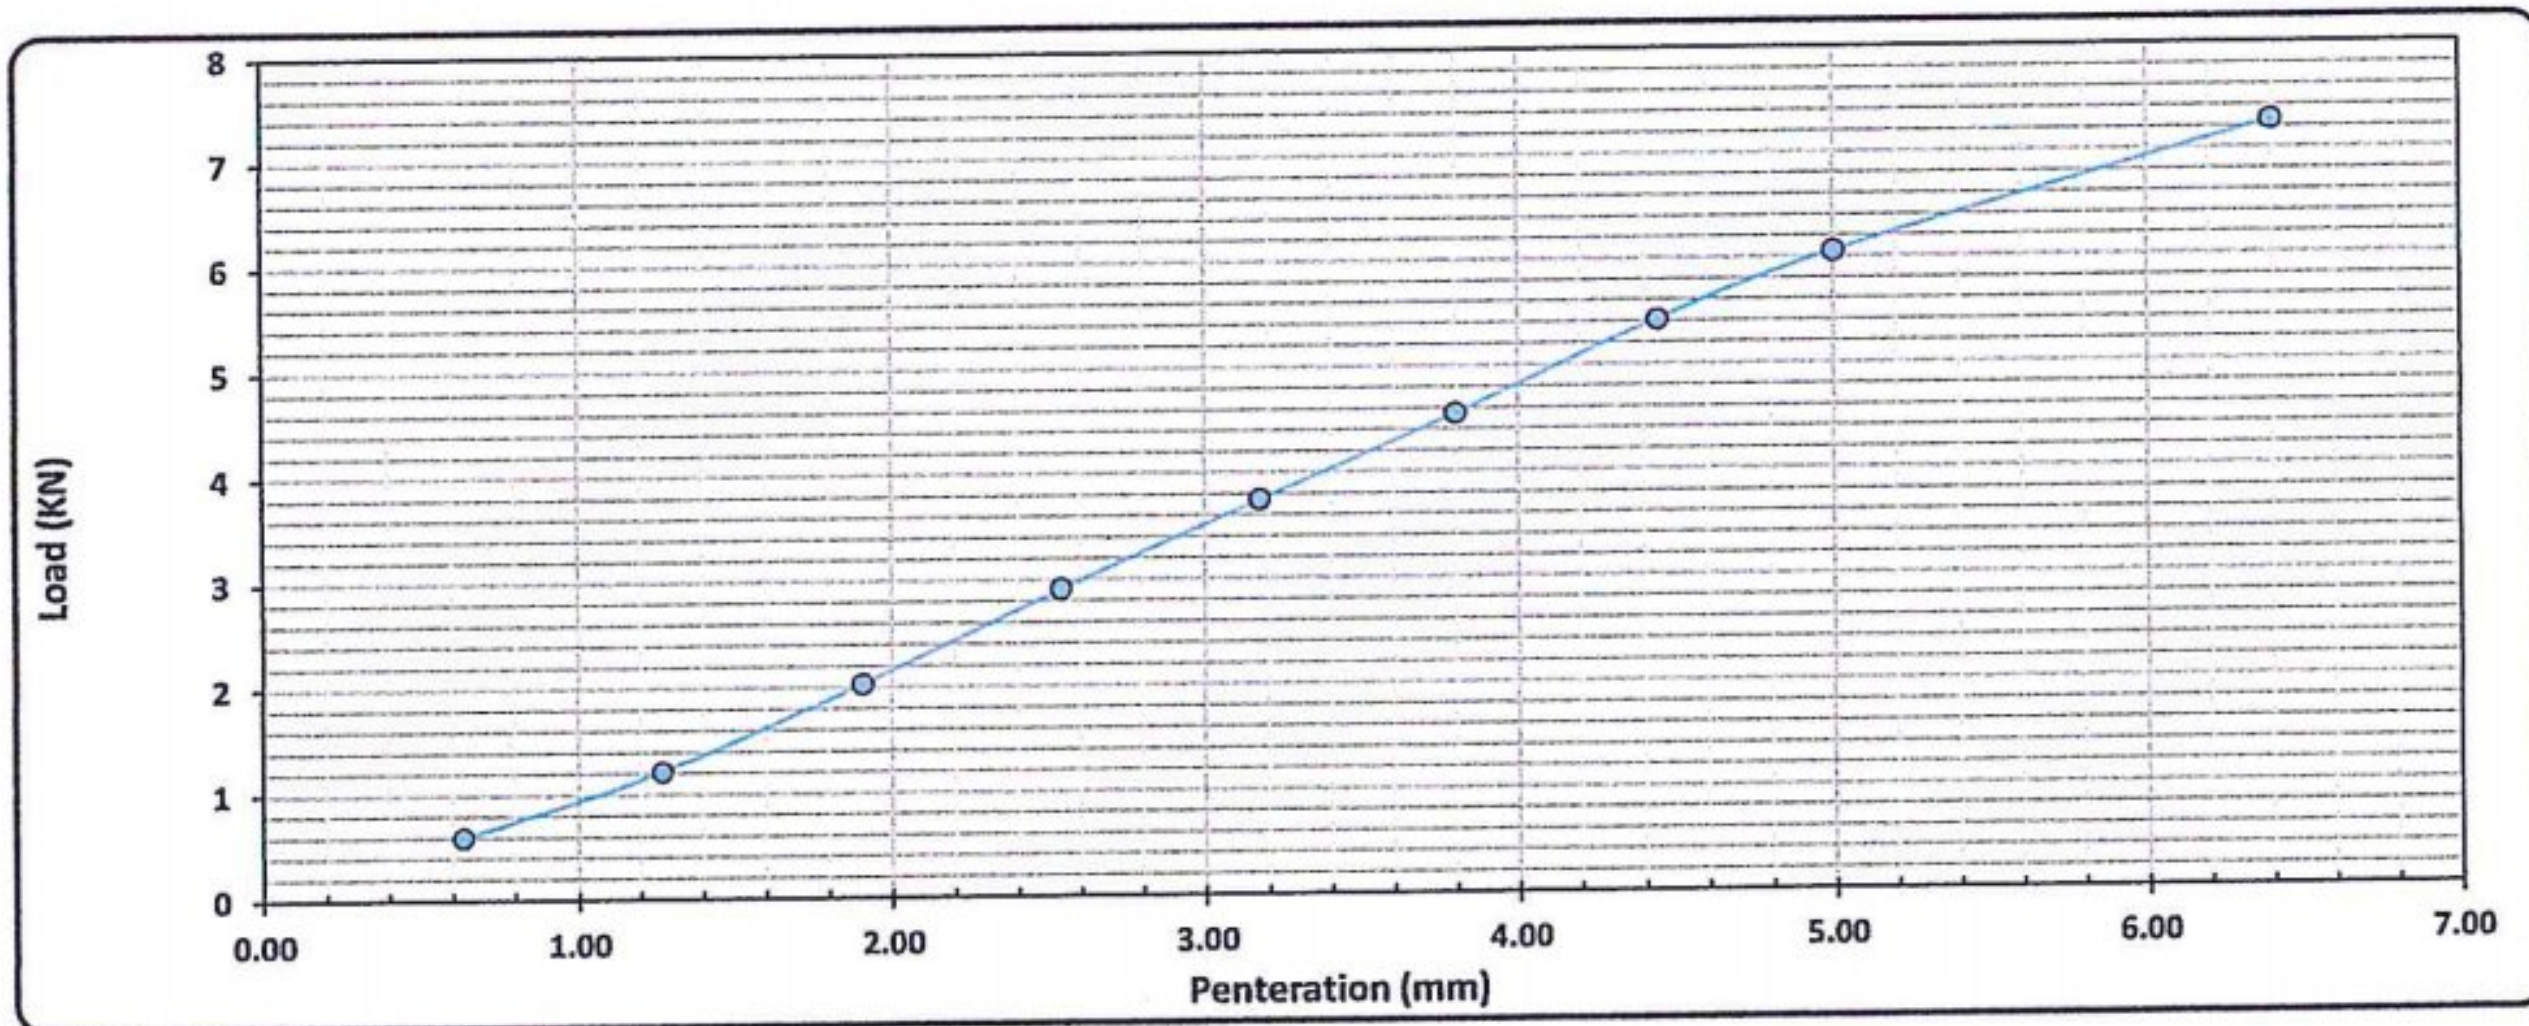

Calculations :-

Pentration (mm)	Load (Kn)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR عند نسبة 98 %
2.50	2.91	13.4	21.8%	100	98	21.4%
5.00	6.06	20.0	30.2%			29.7%

Lab. Engineer

Name :

Sign :



Consultant Engineer

Name :

Sign :

Khaled Zaki

* Designer
** Alignment / Bridges: Culvert Only

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohamed Galal			
QA/QC *				
GARB **				
Employers Representative				

APPROVAL STATUS				
Comments by:		Comments by:		
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date
1	Sieve analysis	M ³	5000	11-3-2023
2	Classification	M ³	5000	11-3-2023
3	Proctor & O.M.C	M ³	5000	11-3-2023
4	C.B.R	M ³	5000	13-3-2023
Reference Photos		Yes attached / No		
Test Requirement		Specification		
Supplier Name		Clause		
MAR Approval No		Date		
Location to be Used		From 545+700 To 545+740 (-3) 545+500 From 545+740 To 545+840 (-2.5) 545+560 To 545+560 (-1.75)		
Description of Materials		FILL MATERIAL RESULTS		


CODE - 1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
CODE - 2	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 3	Work Activity	Sub Element of Activity	

Contractor Company	AL-DONYAA CO.		Designer Company	KK CONSULT.
	Name	Sign		
Issued by Contractor	Eng/Mohamed Galal		13/3/2023	
	Contractor reference			
Received by ER	DIN-2 13/3/2023			

C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			13	3	2023		

MATERIAL INSPECTION REQUEST	

* Designer
** Alignment/Bridges: Culvert only

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Mohamed Galal			
QA/QC *	Mohamed Elsayid			
GARB **				
Employers Representative				

THE FOLLOWING TEST RESULT ARE ATTACHED FOR REVIEW									
Description of Materials		Soil (A-1-b)							
Location to be Used		545+700	545+740	(-3)	545+500	545+560	(-2)	545+680	
		545+500	545+540	(-2.5)	545+740	545+840	(-2.5)	545+680	
		545+500	545+540	(-2.5)	545+740	545+840	(-2.5)	545+680	
		545+500	545+540	(-2.5)	545+740	545+840	(-2.5)	545+680	
Item	Specification	Test Requirement		Test result attachment		Remarks			
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling		According to Specification					
2	ASTM C 136	Sieve Analysis		According to Specification					
3	ASTM D 1440	Passing Sieve # 200		13.6					
4	ASTM D 4318	Atterberg Limit		N.P					
5	ASTM D 2974	Moisture Content		6.4					
6	ASTM D 1557	Modified Proctor		2.147					
7	ASTM D 1883	C.B.R		31.3					
Comments by:		Comments by:							

Contractor Company	AL-DONYAA CO.	Designer Company	KK CONSULT.	Name		Sign	Date	Time	Issued by	Eng/ Mohamed Galal	Contractor	Reference	Contractor	Received by	ER
				13/3/2023											
13/3/2023 13/3/2023 13/3/2023 13/3/2023															



	Operating lab	Mansour Lab
	From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	11/3/2023	code	DIN-2	Zone	545+500 TO 546+000
LOCATION	K.P 545+500				
NAME COMPANY	EL DONIA				

1-visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials				SAMPLE WEIGHT [g]		27000.00		gm	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	
0.00	0.0	135.0	1498.0	1869.0	4001.0	2170.0	3427.0		A-1-b
Cumulative Retained (g)	0.0	135.0	1633.0	3502.0	7503.0	9673.0	13100.0		PRO
Cumulative Retained %	0.0	0.5	6.0	13.0	27.8	35.8	48.5		WC
Cumulative Passing %	100.0	99.5	94.0	87.0	72.2	64.2	51.5		CBR
									31.30

B-soft material gradation				WT.OF sample		500.00		gm	
sieve size	10	40	200						
Cumulative Retained (g)	58.00	172.00	368.00						
Cumulative Retained %	11.60	34.40	73.60						
Cumulative Passing %	88.40	65.60	26.40						

C-General gradient


sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	100.0	99.5	94.0	87.0	72.2	64.2	51.5	45.5	33.8	13.6

ATTERBERG LIMITS	NL		NP	
	LIQUID LIMIT (L.L.)		PLASTIC LIMIT (P.L.)	
			PLASTIC INDEX (P.I.)	

Contractor



Consultant

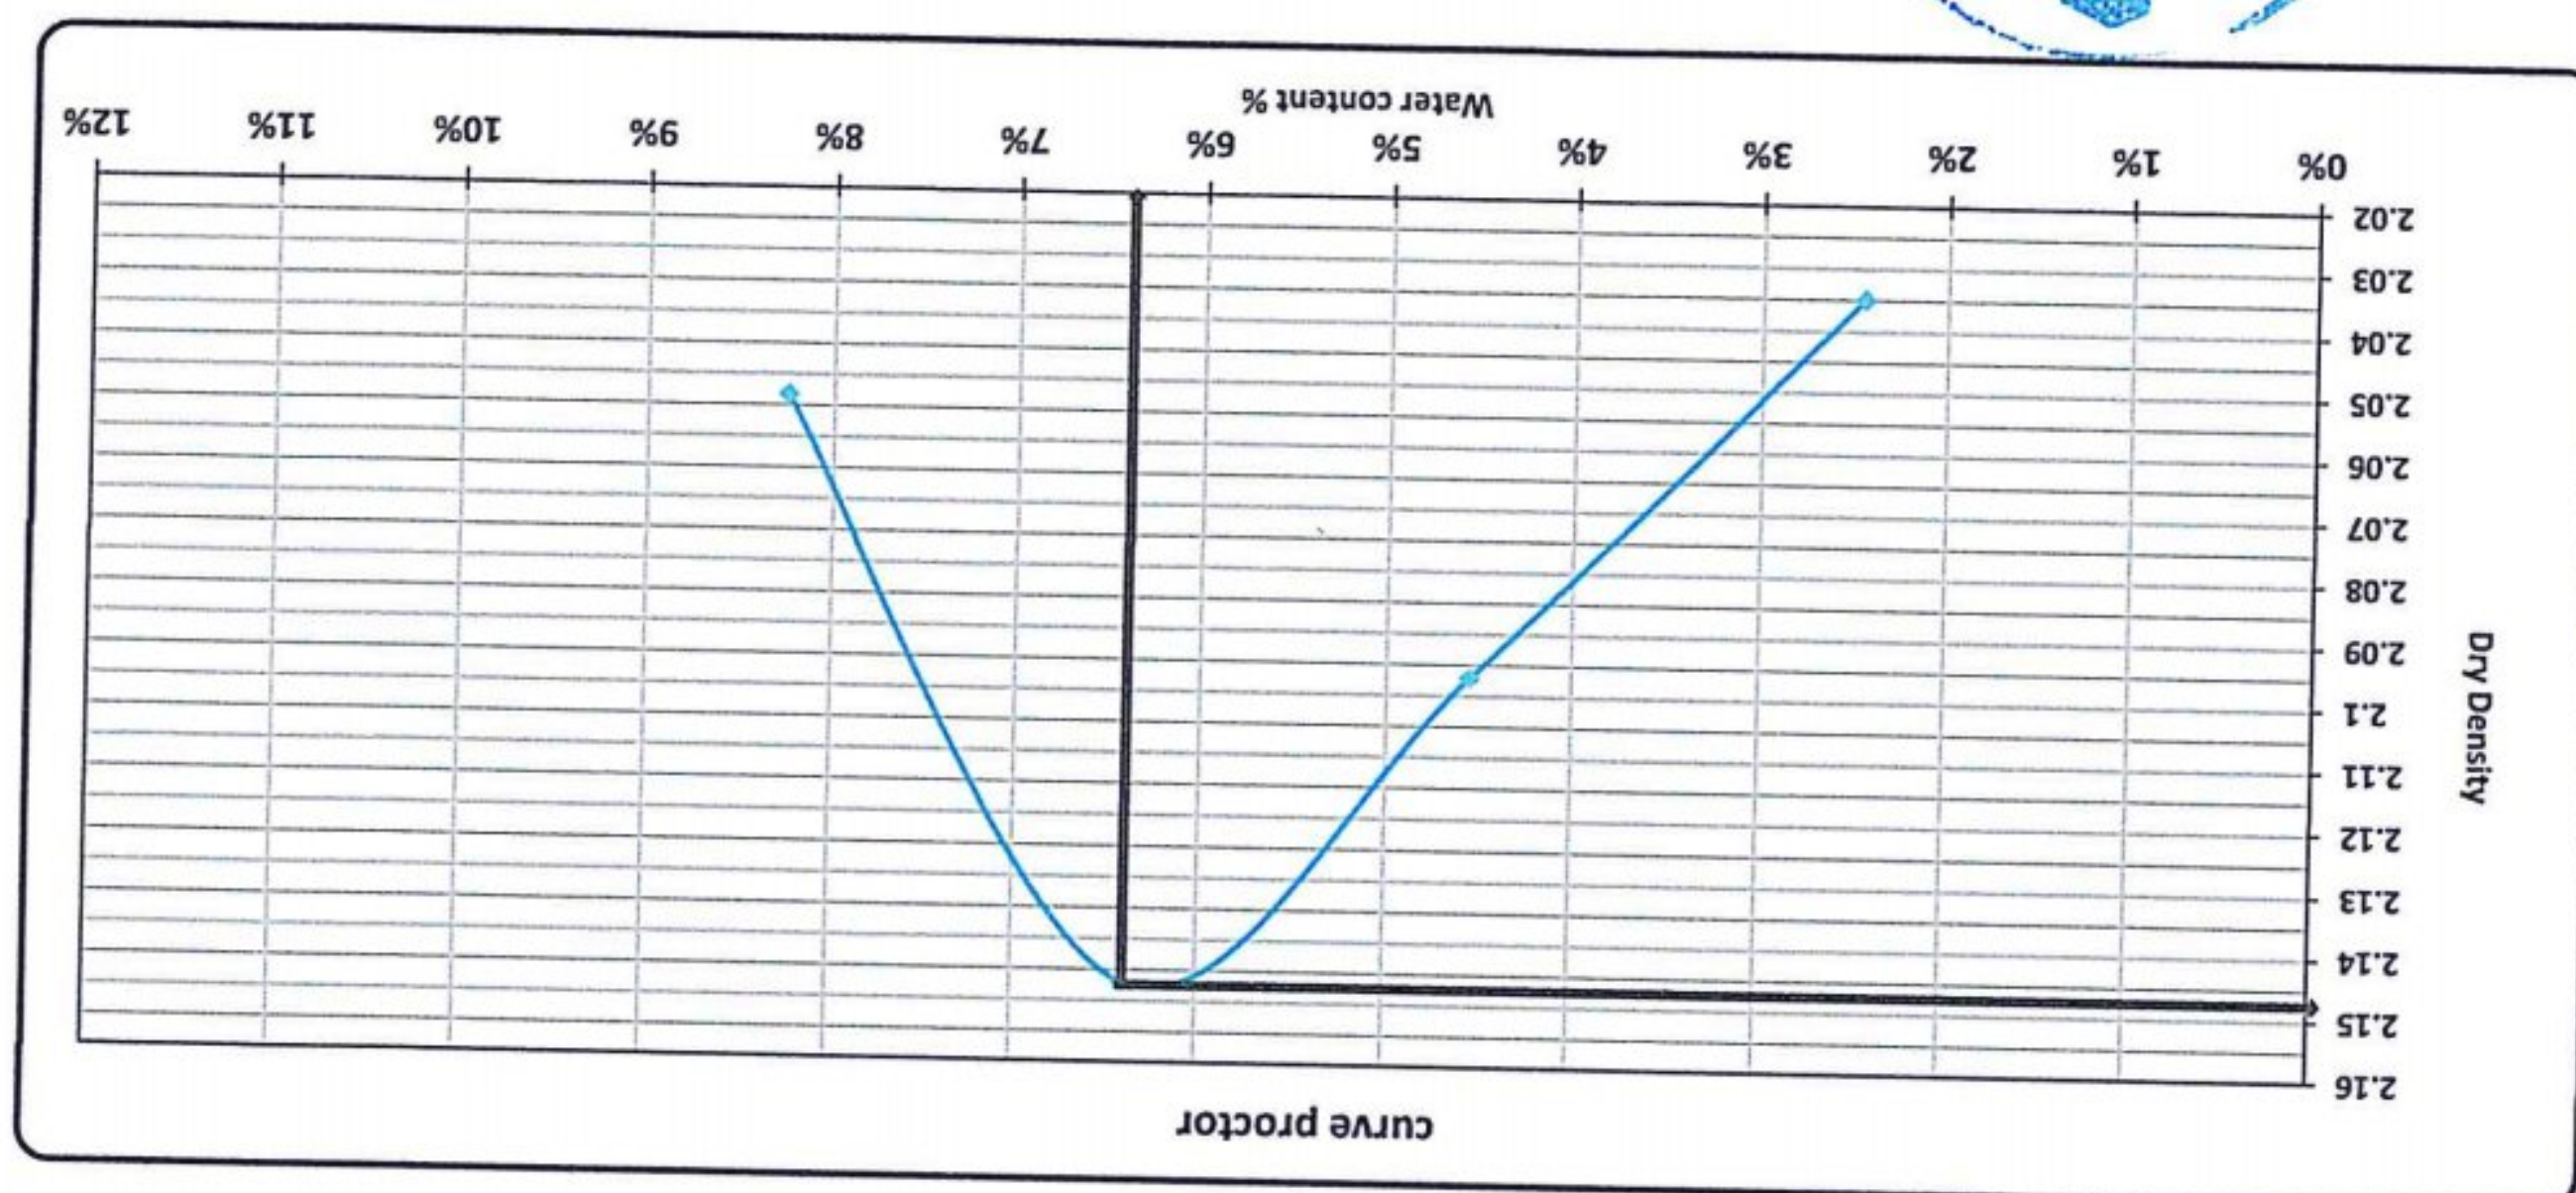

Tare No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Tare wt.	55.85	54.5	55.65	52.42	56.96	56.74	56.74	57.92
Wt. Of wet soil & tare	149.1	149.1	149.5	150.8	148.7	148.8	148.0	150.9
Wt. Of dry soil & tare	147.0	146.7	145.5	146.5	143.0	143	141.2	143.6
Wt. Of water	2.1	2.4	4.0	4.3	5.7	5.4	6.8	7.3
Wt. Of dry soil	91.2	92.2	89.8	94.1	86.1	86.6	84.5	85.7
Water content %	2.3%	2.6%	4.5%	4.6%	6.6%	6.2%	8.0%	8.5%
AV.Water content %	2.5%		4.5%		6.4%		8.2%	
Dry Density	2.035		2.097		2.147		2.053	

Trial no :	1	2	3	4
Wt. of Mold+ wet soil	10022.0	10251.0	10446.0	10315.0
WT. WET SOIL	4428.0	4657.0	4852.0	4721.0
Wt. Density	2.085	2.193	2.284	2.223

Weight of empty mold :	5594.0
Mold Volume:	2124.0

MAX Dry Density	2.147
Water content %	6.4

TESTING DATE:	11/3/2023	code	Zone	545+500 TO 546+000
LOCATION	045+263			
NAME COMPANY	K.P 545+500	DIN-2		

Proctor Test

Electric Express Train - HSR
From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH
Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH
From Station 504+000 To Station 568+177



	Operating Lab	
	Mansour Lab	

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	Location :	Name of Company
13/3/2023	S45+500	EL DONIA
Code	DIN-2	Zone
		S45+500
		S46+000

- : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	1
Mold Vol. (cm ³)	2158
Mold WT. (gm)	8077
Mold WT. + Wet WT. (gm)	12952.2
Wet WT. (gm)	4875
Wet Density (g/cm ³)	2.259
Dry Density (g/cm ³)	2.122
Proctor Density (g/cm ³)	2.147
Compaction %	99

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	13
Tare WT. (gm)	57.92
Tare WT. + Wet WT. (gm)	148.4
Tare WT. + Dry WT. (gm)	142.9
Water WT. (gm)	5.5
Dry WT. (gm)	85.0
Moisture Content %	6.4

Swelling	
Mold No.	1
Date	13/3/2023
Initial Height (mm)	0.00
Final Height (mm)	0.00
Difference	0
Sample Height (mm)	11600.00
Swelling Ratio %	0%

Loading Reading :

Penetration (mm)	Load Reading (kg)	Load (KN)
0.64	66.00	0.6
1.27	130.00	1.3
1.91	215.00	2.1
2.54	303.00	3.0
3.18	396.00	3.9
3.80	481.00	4.7
4.45	566.00	5.5
5.00	647.00	6.3
6.40	777.00	7.6

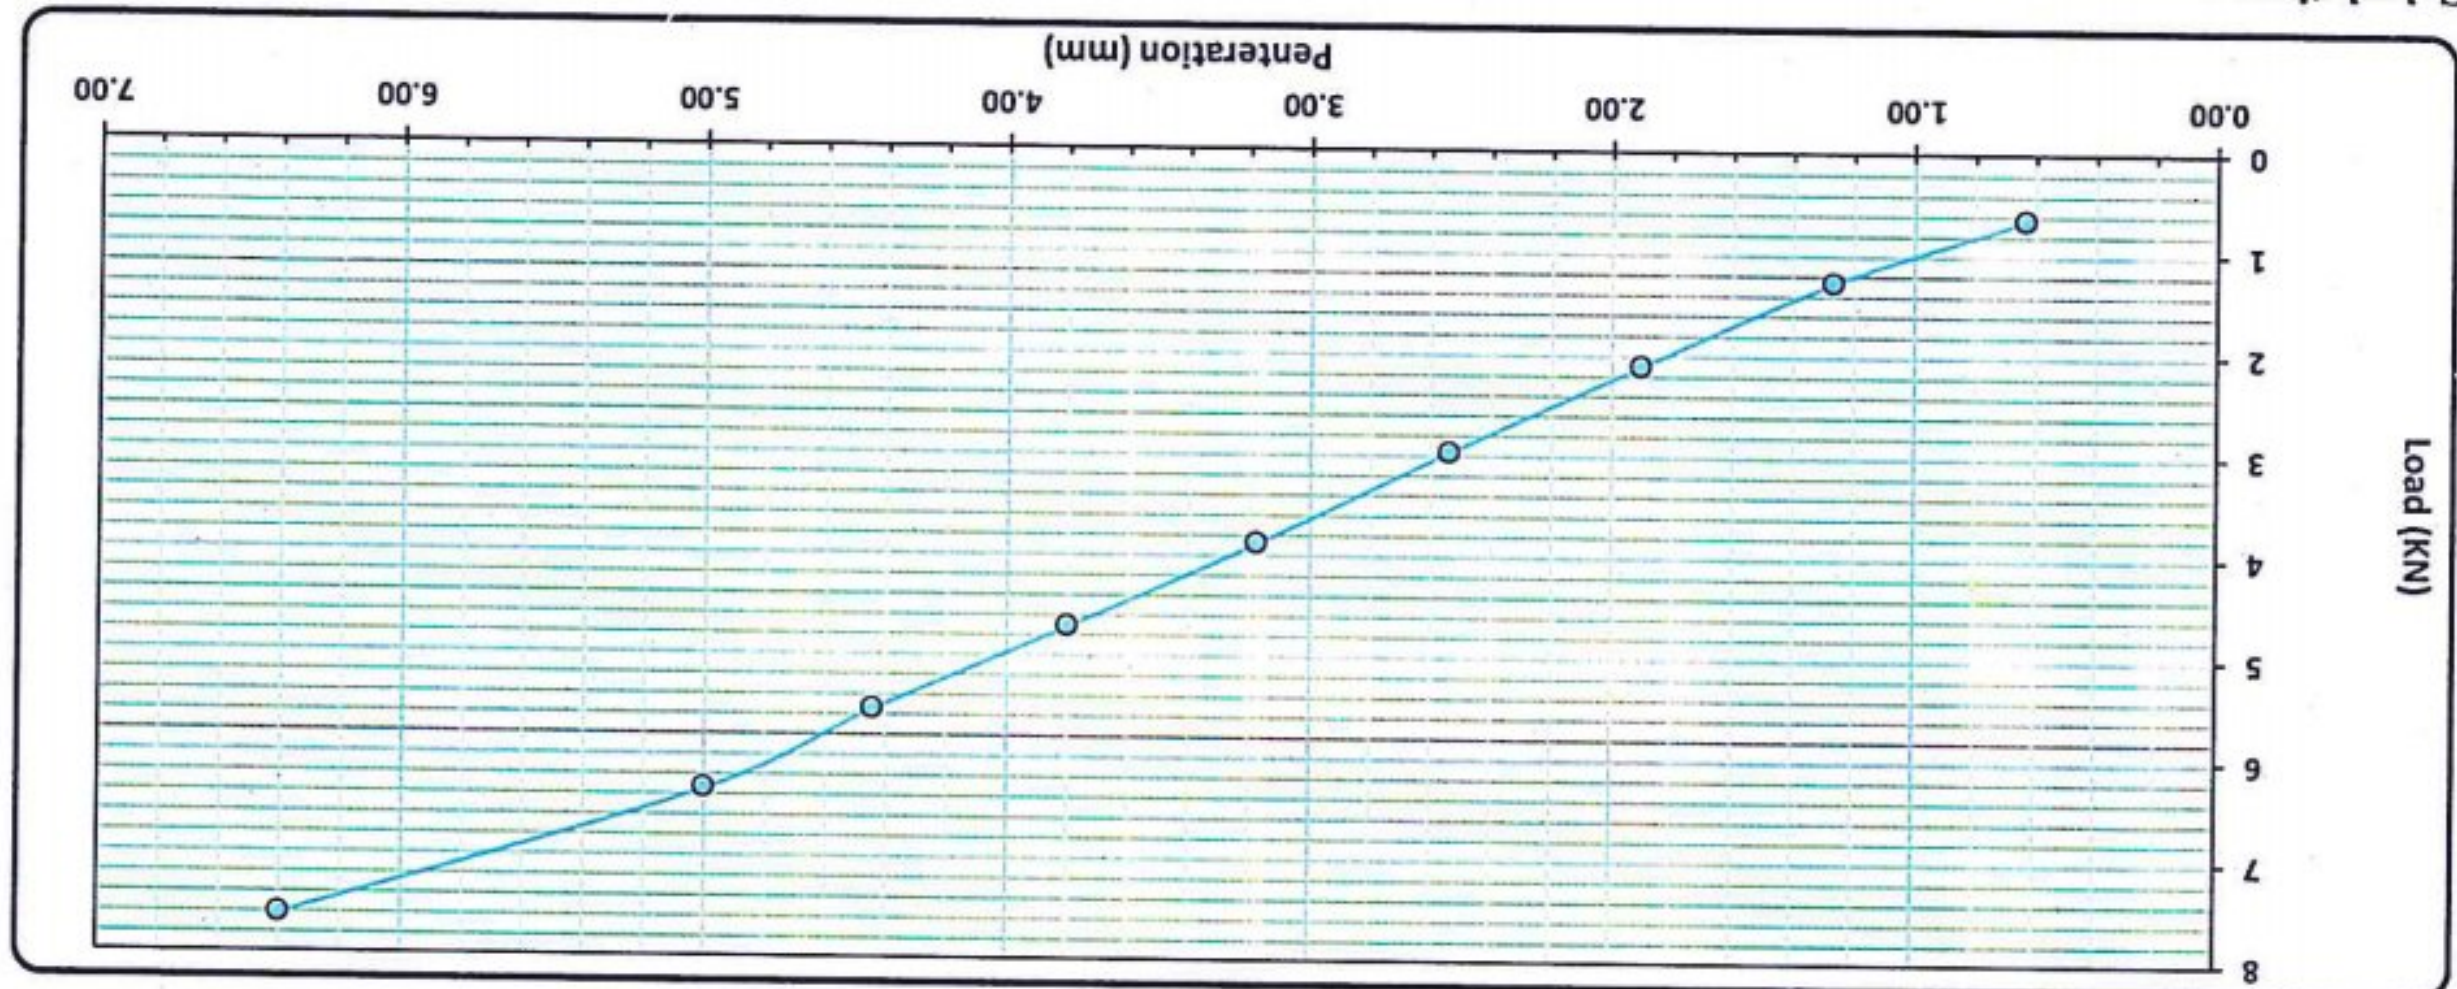

Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
5.00	6.34	20.0	31.7%	99	98	31.4%
2.50	2.97	13.4	22.2%			22.1%
						% 98 كسب

Lab. Engineer
Name :
Sign :

Consultant Engineer
Name :
Sign :

MATERIAL INSPECTION REQUEST

Contractor Company AL-DONYAA CO.	Issued by Eng/ Mohamed Galal		Contractor Mohamed Galal	Contractor reference DIN (P-1) 27/8/2023	Received by ER
	Name	Sign			
Designer Company KK CONSULT.	Date 27-8-2023		Time		

CODE-1 S1 to S21 Station Reference	CODE-2 Work Activity	CODE-3 Sub Element of Activity
D1 to S3 Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used	

Description of Materials		Location to be Used FROM 545+500 TO 545+700 (+0.25) FROM 545+700 TO 545+900 (+0.25) FROM 545+900 TO 546+000 (+0.25)			
MAR Approval No		Supplier Name			
Test Requirement		Reference Photos			
Yes attached / No		Other			
Description		Unit			
Sieve analysis		Quantity			
Classification		Arrival Date			
Proctor & O.M.C		Note			
C.B.R		Comments by:			
AASHTO – T85		(Mansour laboratory) and the results founded meet the specifications and accepted			
APPROVAL STATUS					
Organisation		Name		Sign	
Contractor		MOHAMED GALAL		Date	
QA/QC *		Ahmed Abo Zaid		27/8/2023	
GARB **					
Employers Representative					

* Designer
** Alignment / Bridges: Culvert Only



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي



SUSTIA
المكتب الاستشاري



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
Ministry of Transport and Infrastructure

MATERIAL APPROVAL REQUEST



Contractor Company	AL-DONYAA CO.		Designer Company	KK CONSULT.	
	Name	Sign		Date	Time
Issued by Contractor	Eng / Mohamed Galal		27/8/2023		
	Mohamed Galal				
Contractor Reference	DIN (P-1) 27/8/2023				
Received by ER					

C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			27	8	2023		

THE FOLLOWING TEST RESULT ARE ATTACHED FOR REVIEW			
Description of Materials		Soil (A-1-a)	
Location to be Used		FROM 545+500 TO 545+700 (+0.25)	
		FROM 545+700 TO 545+900 (+0.25)	
		FROM 545+900 TO 546+000 (+0.25)	
Item	Specification	Test Requirement	Test result attachment
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to Specification
2	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to Specification
3	ASTM D 1440	Passing Sieve # 200	9.1
4	ASTM D 4318	Atterberg Limit	N.P
5	ASTM D 2974	Moisture Content	7.5
6	ASTM D 1557	Modified Proctor	2.195
7	ASTM D 1883	C.B.R	75.10
8	AASHTO-T85	LOS Anglos abrasion	35.00
Comments by:			
Comments by:			

APPROVAL STATUS			
Organisation	Name	Sign	Date
MOHAMED GALAL		Mohamed Galal	
Contractor			
QA/QC *	Ahmed Abou'd		27/8/2023
GARB**			
Employers Representative			

* Designer
** Alignment/Bridges: Culvert only

Operating Lab		AL Nuby Central Lab		AL Nuby Central Lab	
  		  		  	
Electric Express Train - HSR		From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH		Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH	
From Station 504+000 To Station 568+177					

PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	23-08-2023	Code	Zone	545+500	546+000
LOCATION	K,P (545+500)	DIN (P-1)	Material	Prepared Subgrade	
NAME COMPANY	El Donia		Layer Thickness	25	

1-Visual inspection test

2-Gradient test

A-gradation of bulk materials		SAMPLE WEIGHT [g]		26395.00		gm		Table classify	
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS	Soil Classify
Mass retained (g)	0.0	712.0	1995.0	3995.0	1171.0	5496.0	6167.0	PRO	2.195
Cumulative Retained (g)	0.0	712.0	2707.0	6702.0	7873.0	13369.0	19536.0	WC	7.50
Cumulative Retained %	0.0	2.7	10.3	25.4	29.8	50.6	74.0	CBR	75.10
Cumulative Passing %	100.0	97.3	89.7	74.6	70.2	49.4	26.0	Los Angles	35.00

B-soft material gradation		WT. OF sample		500.00		gm	
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	77.00	177.00	326.00				
Cumulative Retained %	15.40	35.40	65.20				
Cumulative Passing %	84.60	64.60	34.80				

C-General gradent							
sieve size(in)	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75
Cumulative Passing %	100.0	97.3	89.7	74.6	70.2	49.4	26.0
Limits		97-100		70-75		15-60	0-35

ATTERBERG LIMITS	LIQUID LIMIT (L.L.)		N.P
	PLASTIC LIMIT (P.L.)		N.P
	PLASTIC INDEX (P.I.)		N.P

Contractor Engineer

Ibrahim Mohamed

Lab Engineer



Consultant Engineer

27/8/2023

 ENGINEERING CONSULTING OFFICE المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد فهد	TESTING DATE: 23-08-2023	Code	zone	545+500	546+000
	LOCATION K,P (545+500) EI Donia	DIN (P-1)			
Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA TO MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177					


PROCTOR TEST

Weight of empty mold :	6290.0
Mold Volume:	2142.0

MAX Dry Density	2.195
Water content %	7.5

trial no :	1	2	3	4
Wt. Of Mold+ wet soil	10499.0	10726.0	11086.0	11347
WT. WET SOIL	4209.0	4436.0	4796.0	5057.0
Wt. Density	1.965	2.071	2.239	2.361

Tare No.		10	25	8	47	15	7	22	11	34	36
Tare wt.		41.5	56.1	52.5	45.5	30	41	57.2	57.6	81.2	82.1
Wt. Of wet soil & tare		150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Wt. Of dry soil & tare		146.8	147.4	146.1	145.5	143.1	143.6	143.6	143.4	144.5	144.3
Wt. Of water		3.2	2.6	3.9	4.5	6.9	6.4	6.4	6.6	5.5	5.7
Wt. Of dry soil		105.3	91.3	93.6	100.0	113.1	102.6	86.4	85.8	63.3	62.2
Water content %		3.0%	2.8%	4.2%	4.5%	6.1%	6.2%	7.4%	7.7%	8.7%	9.2%
A.V. Water content %		2.9%		4.3%		6.2%		7.5%		8.9%	
Dry Density		1.909		1.985		2.109		2.195		2.005	

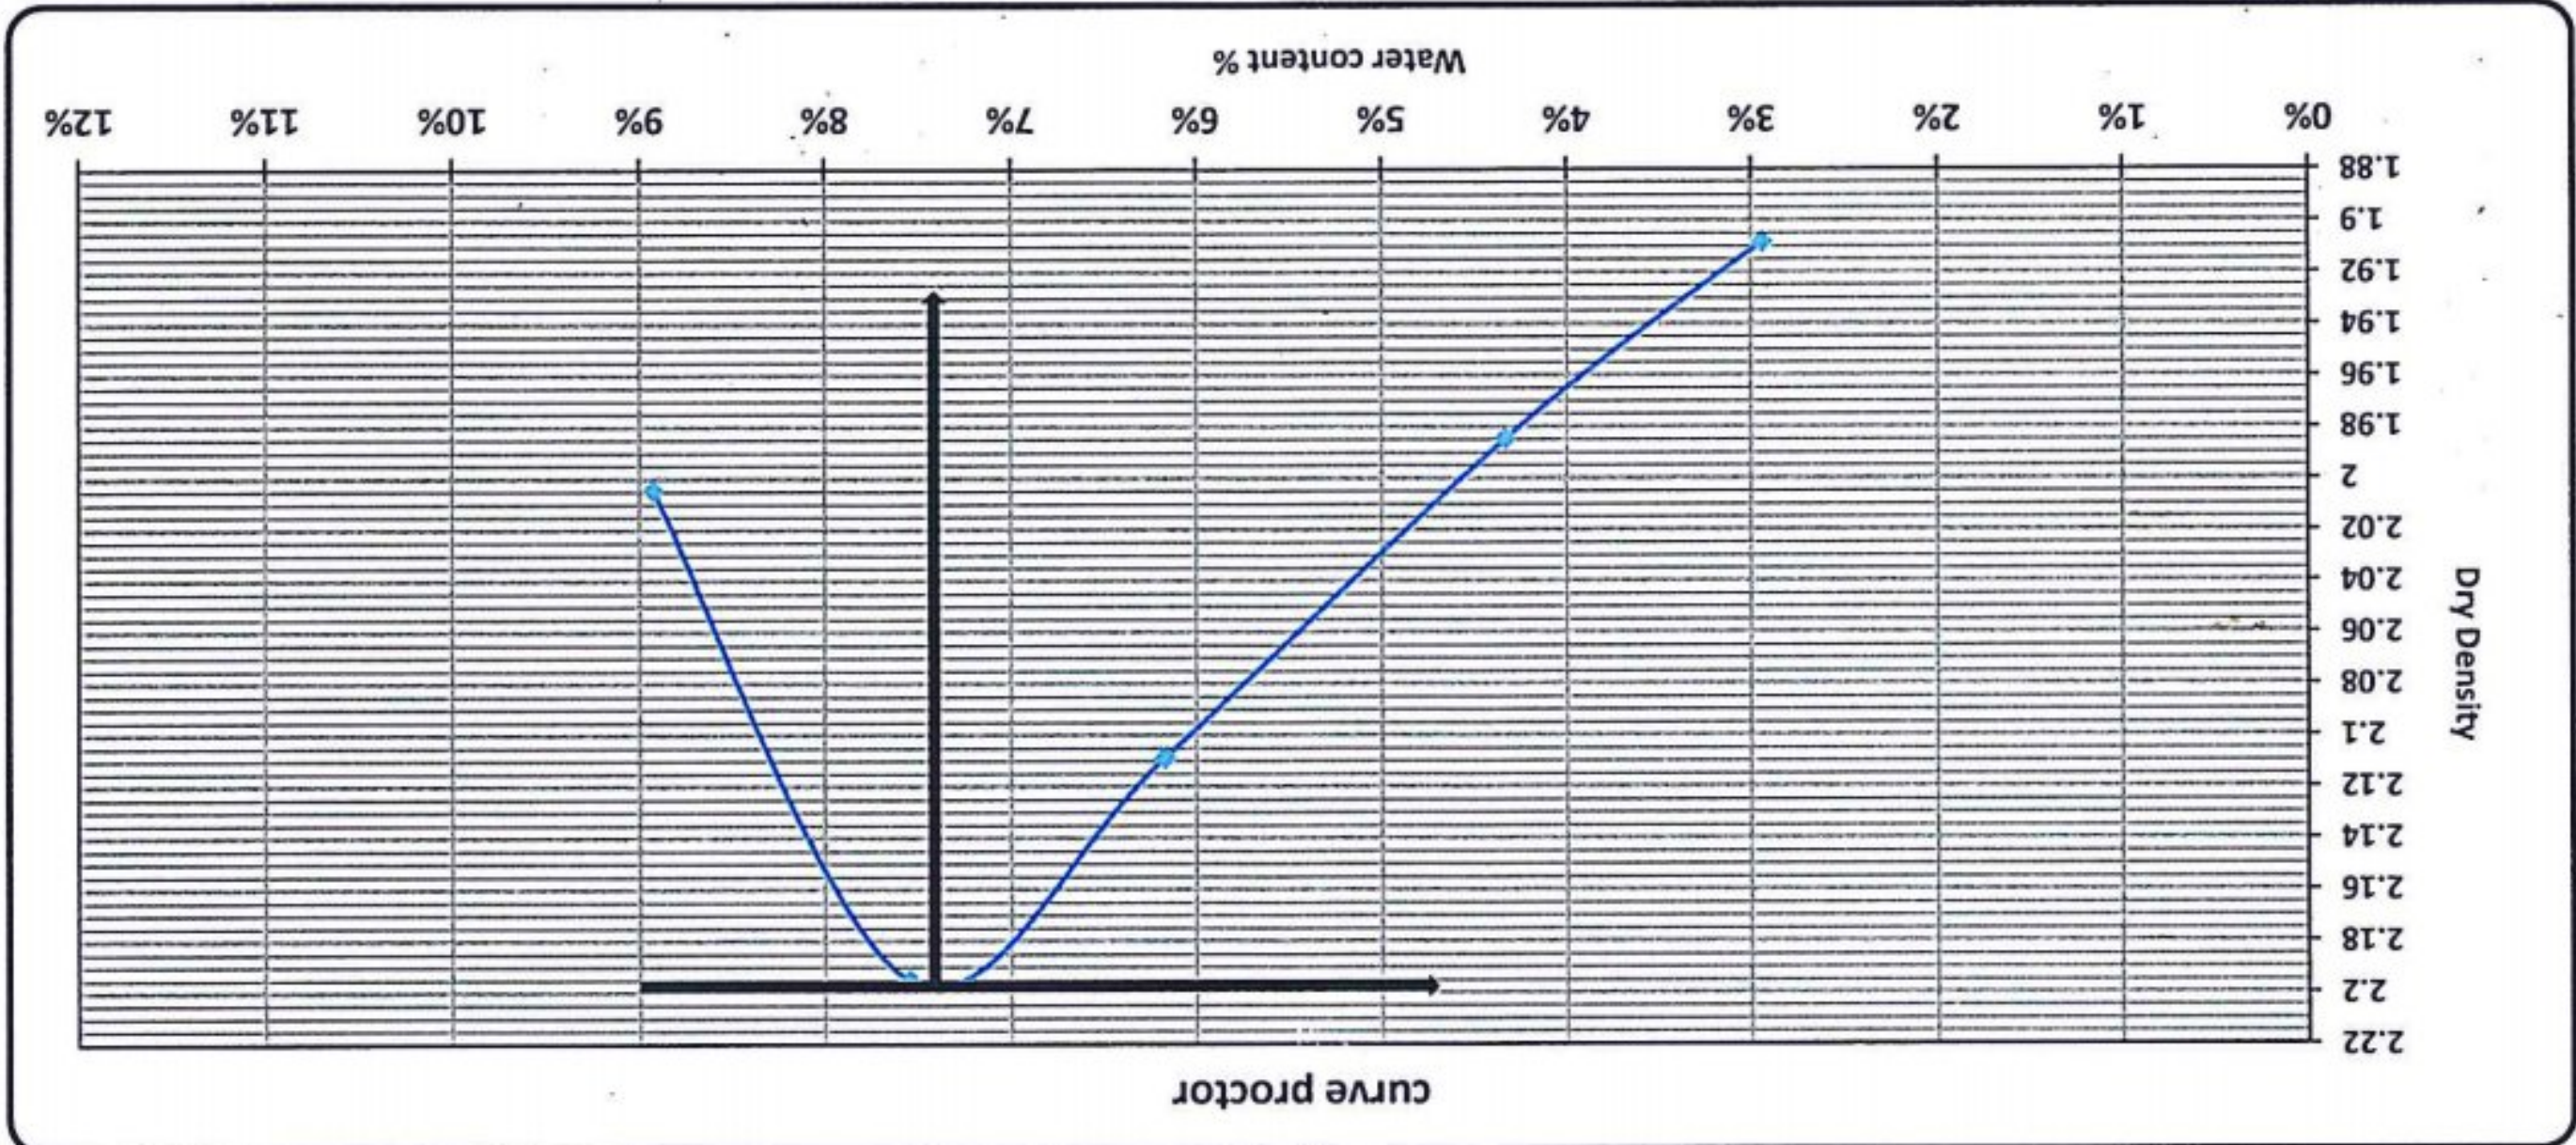

Contractor Engineer

Lab Engineer

Consultant Engineer



27/8/2023



ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
إ.د. جاد فريد

Electric Express Train - HSR

From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH

Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH

From Station 504+000 To Station 568+177



الهيئة العامة للنقل
م.د. محمد عبد الحليم
م.د. محمد عبد الحليم

Absorption & Aggregate specific gravity AASHTO-T85

TESTING DATE:	LOCATION		zone	545+500	546+000
	K,P (545+500)	El Donia			
	25-08-2023	DIN (P-1)			
	code				

Weight of sample	2500	gm
Weight of saturated -dry surface sample (B)	2569	gm
Weight of saturated sample in water (C)	1527	gm
Weight of dry sample after heating (A)	2564	gm

Results:-

Bulk Specific gravity = A / (B-C)	2.461	
Apparent specific gravity = A / (A-C)	2.473	
Absorption = (B-A)/A	0.195	%

Los Anglos abrasion AASHTO-T96

Weight of sample before test (gm)	5000
Weight of sample after test (gm)	3250
Abrasion ratio (%)	35.0

Contractor Engineer :-
Abraham Mohamed

Lab. Engineer :-

Consultant Engineer :-

27/8/2023



		Operating Lab	AL Nuby Central Lab

California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	27-08-2023	Code		FROM STA :	545+500	546+000
Location :	K,P (545+500)	DIN (P-1)				
Company Name	El Donia					

- : Test Results


Compaction % for Mold		Mold No.	6	Mold Vol. (cm ³)	2122	Mold WT. (gm)	5075	Mold WT. + Wet WT. (gm)	10055	Wet WT. (gm)	4980	Wet Density (g/cm ³)	2.347	Dry Density (g/cm ³)	2.187	Proctor Density (g/cm ³)	2.195	Compaction %	99.6
-----------------------	--	----------	---	------------------------------	------	---------------	------	-------------------------	-------	--------------	------	----------------------------------	-------	----------------------------------	-------	--------------------------------------	-------	--------------	------

Moisture Ratio After Compacted Mold		Tare No.	19	Tare WT. (gm)	44.1	Tare WT. + Wet WT. (gm)	150	Tare WT. + Dry WT. (gm)	142.8	Wt. Water	7.2	Dry WT. (gm)	98.7	Moisture Content %	7.3
-------------------------------------	--	----------	----	---------------	------	-------------------------	-----	-------------------------	-------	-----------	-----	--------------	------	--------------------	-----

Swelling		Mold No.	6	Date	27-08-2023	Initial Height (mm)	3.80	Final Height (mm)	3.80	Difference	0	Sample Height (mm)	119.00	Swelling Ratio %	0.0%
----------	--	----------	---	------	------------	---------------------	------	-------------------	------	------------	---	--------------------	--------	------------------	------

Loading Reading :

Penetration(mm)	Load Reading (mm)	Load (KN)
6.40	0.66	19.8
5.00	0.51	15.3
4.45	0.43	12.9
3.80	0.36	10.8
3.18	0.28	8.4
2.54	0.20	6.0
1.91	0.14	4.2
1.27	0.08	2.4
0.64	0.04	1.2

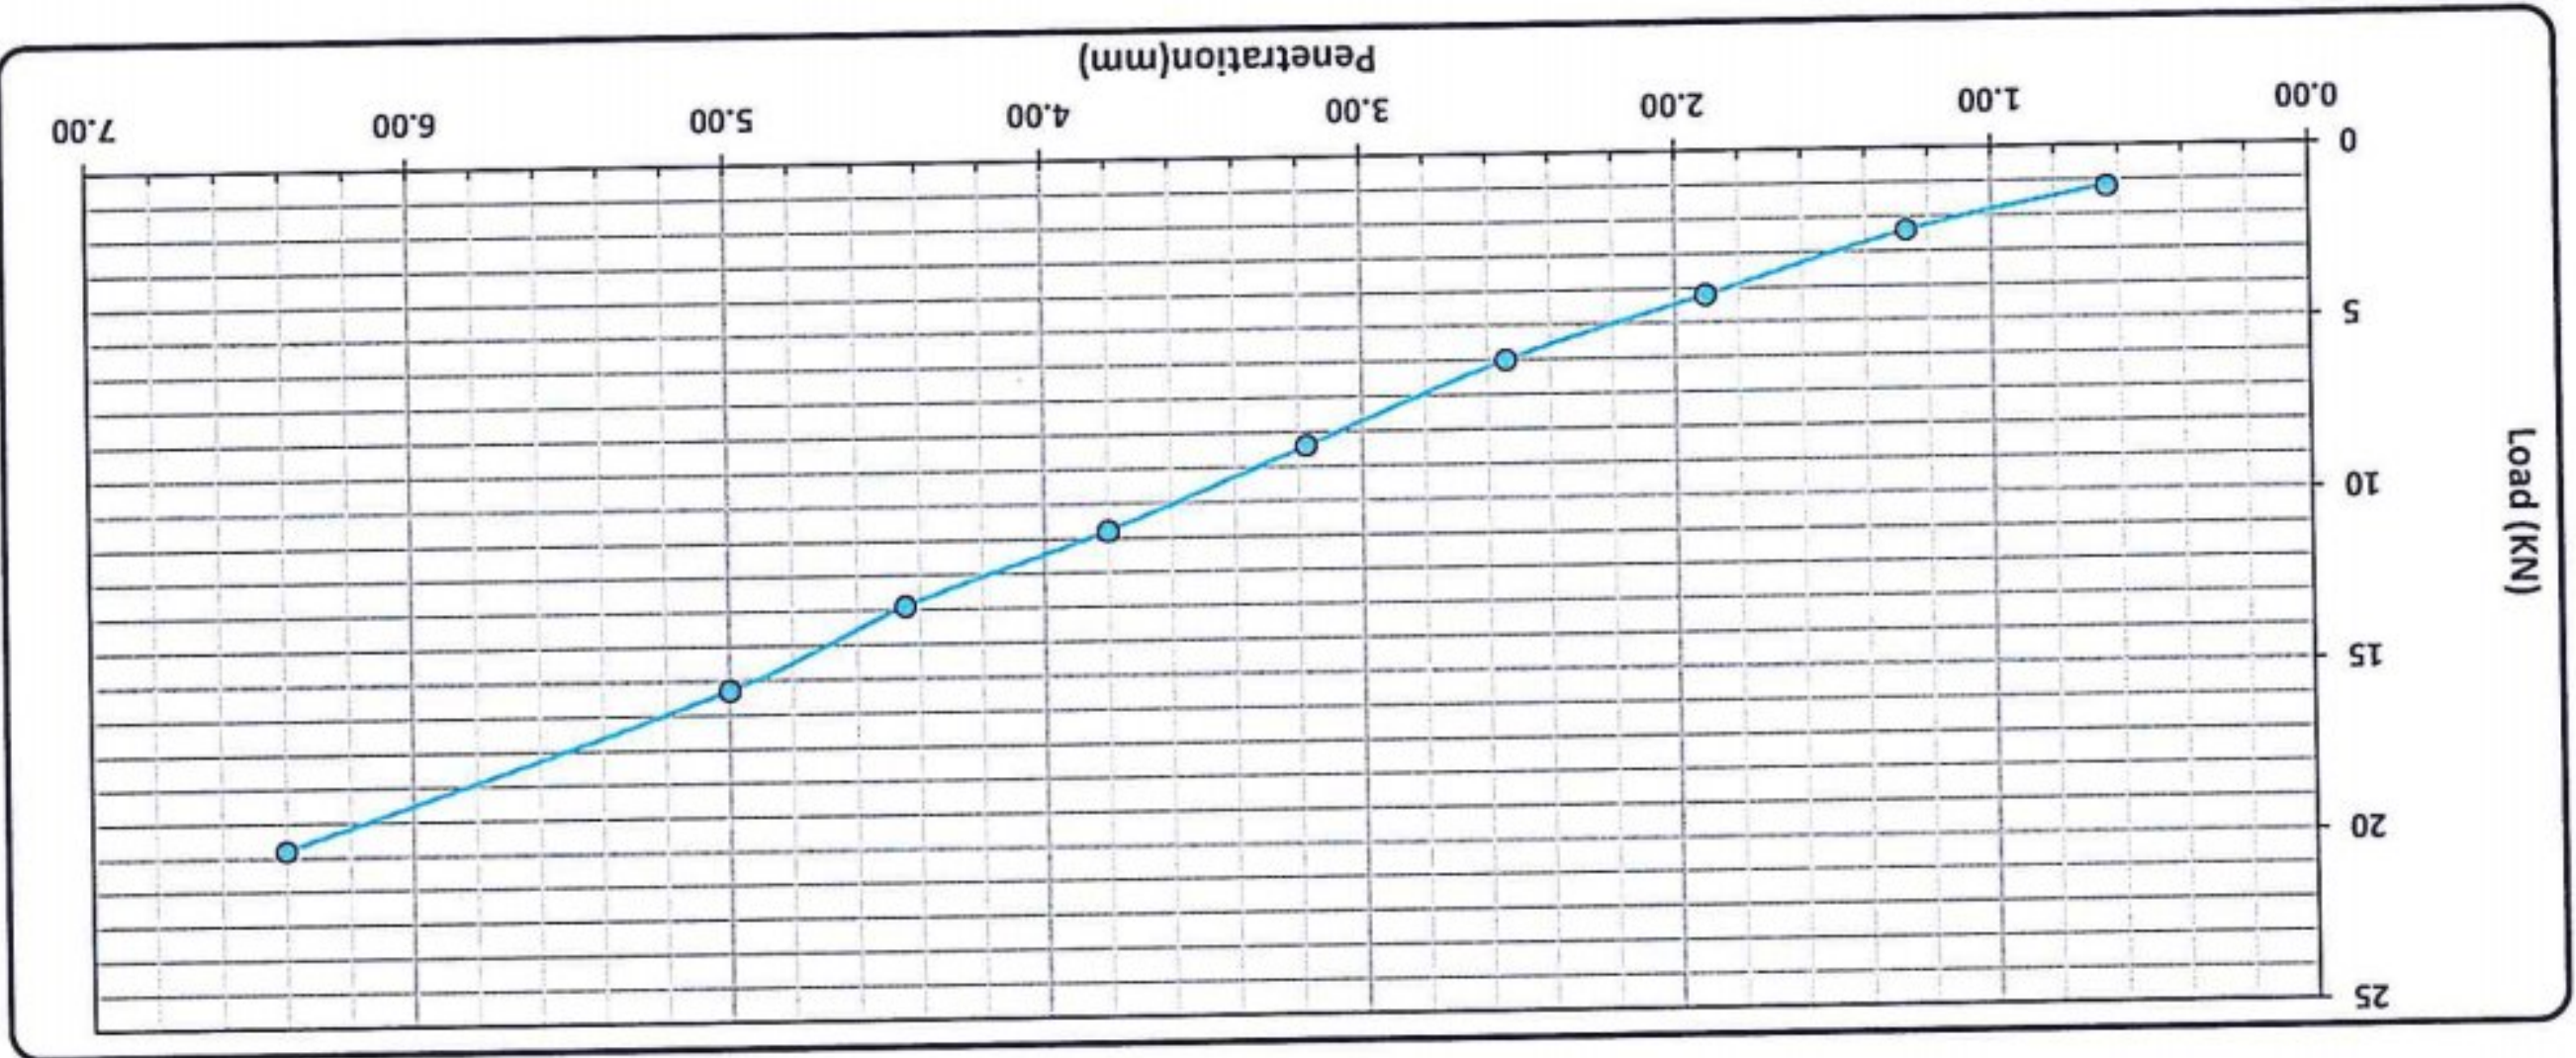

Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
5.00	15.30	20.0	76.4%	100	98	75.1%
2.50	6.00	13.4	44.9%			44.2%

Ibrahim Mohamed

Lab. Engineer

Consultant Engineer

27/8/2023



