



أعمال إنشاء منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة والمعتمدة بالإضافة إلى أعمال الردم)

شركة المتحدة للمقاولات العمومية

بيان الكميات						
المعدات	تنك مياه	هراس	جرير	عربات نقل	بلدوزر	لودر
العدد	2	2	1	12	1	5

عبد الحميد 'الحسن'
المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ض : ٦٣٣ . ٤٤٦ . ٢٨٨
س.ت : ٤٣٤٧٥

مكتب هندسي
JentTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الأول



التقرير الأسبوعي

أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العاصمة)

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة (A901)

القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات العمومية

(المنطقة الاولى المركزية)

من تاريخ 2023/08/1 حتى 2023/8/8

استشاري الهيئة

الشركة المنفذة



أ. محمد الرشد محمد صالح



تقرير أسبوعي

المتحدة للمقاولات العمومية

اسم الشركة :

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

أولا : الموقف التنفيذي

البيان	اجمالى الكميات	اجمالى الكمية المنفذة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	170047.45	135000	79.39%	
أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات	108895.6815	75000	68.87%	

ثانيا : بيان المعدات بالموقع

اسم المعدة	لودر	حفار	بلدوزر	جرير	هرايس
العدد	5	-	1	1	2
اسم المعدة	قلاب	دمبر	تانك مياه		
العدد	12	-	2		

ثالثا : بيان العاملين بالموقع

الوظيفة	مدير المشروع	م تنفيذى	م مكتب فنى	م مساحة	فنى مساحة
العدد	1	1	1	1	2
الوظيفة		سائق معدة و مساعد	محاسب		
العدد		23	1		

التوقيع عبد الرحمن احمد سام

مدير المشروع

المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ض : ٢٨٨ - ٤٤٦ - ٦٣٣
س.ت : ٣٤٧٥

شركة
الهندسة المعمارية
CONSULTING
مشروع التطوير العمراني - المنطقة الأولى



تقرير بالمصور

أصل الممر التراخيص لمشروع التطوير السريع (القطاع الخاص)

أصل حفر و ترحيل بوابع الحفر و أصل رسم تنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حداثق الكوبر ضمن أصل مشروع التطوير السريع الخط الأول (المنطقة - المنطقة الإدارية - المين - مطروح)

المنطقة (A901)

القطاع التقي (بلاط المين)

تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات المعمارية

(المنطقة الأولى المركزية)


من تاريخ 17/06/2023 حتى 17/09/2023

المستطري الهيئة




الشركة المنقذة

عبد الرحمن




منطقة ورش محطة حداثق أكتوبر للقطار السريع ... تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات العامة

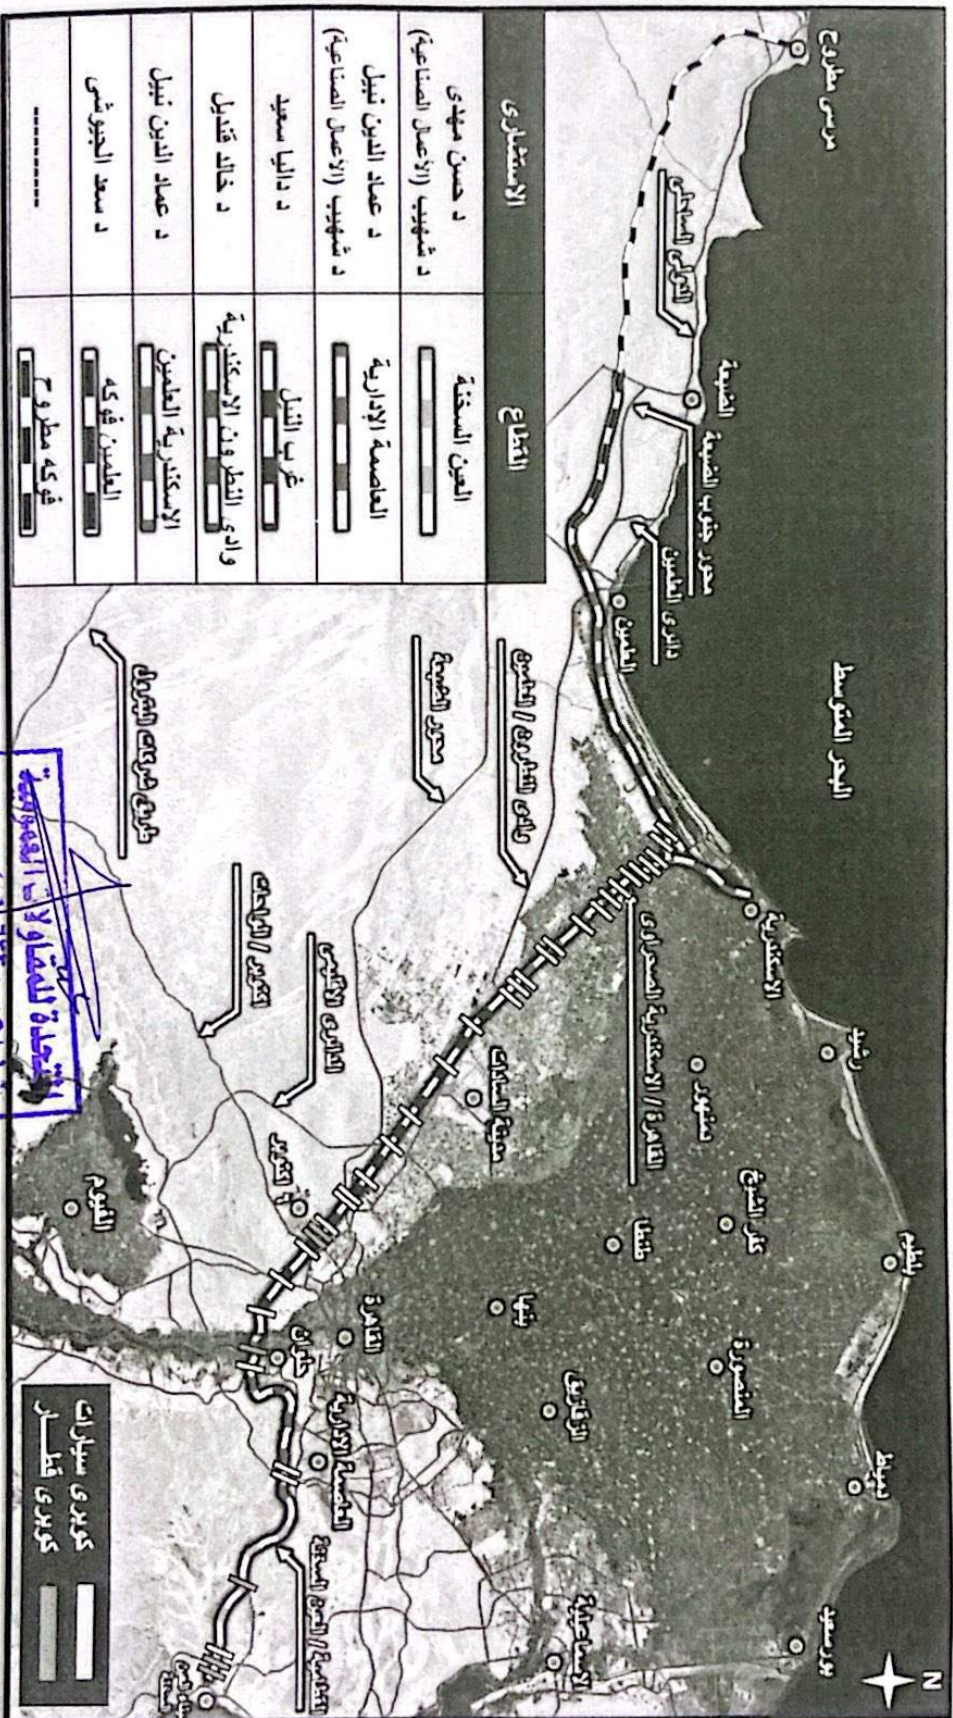


القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر للقطار السريع - المسحقة للمقاولات العامة

صور للموقع العام

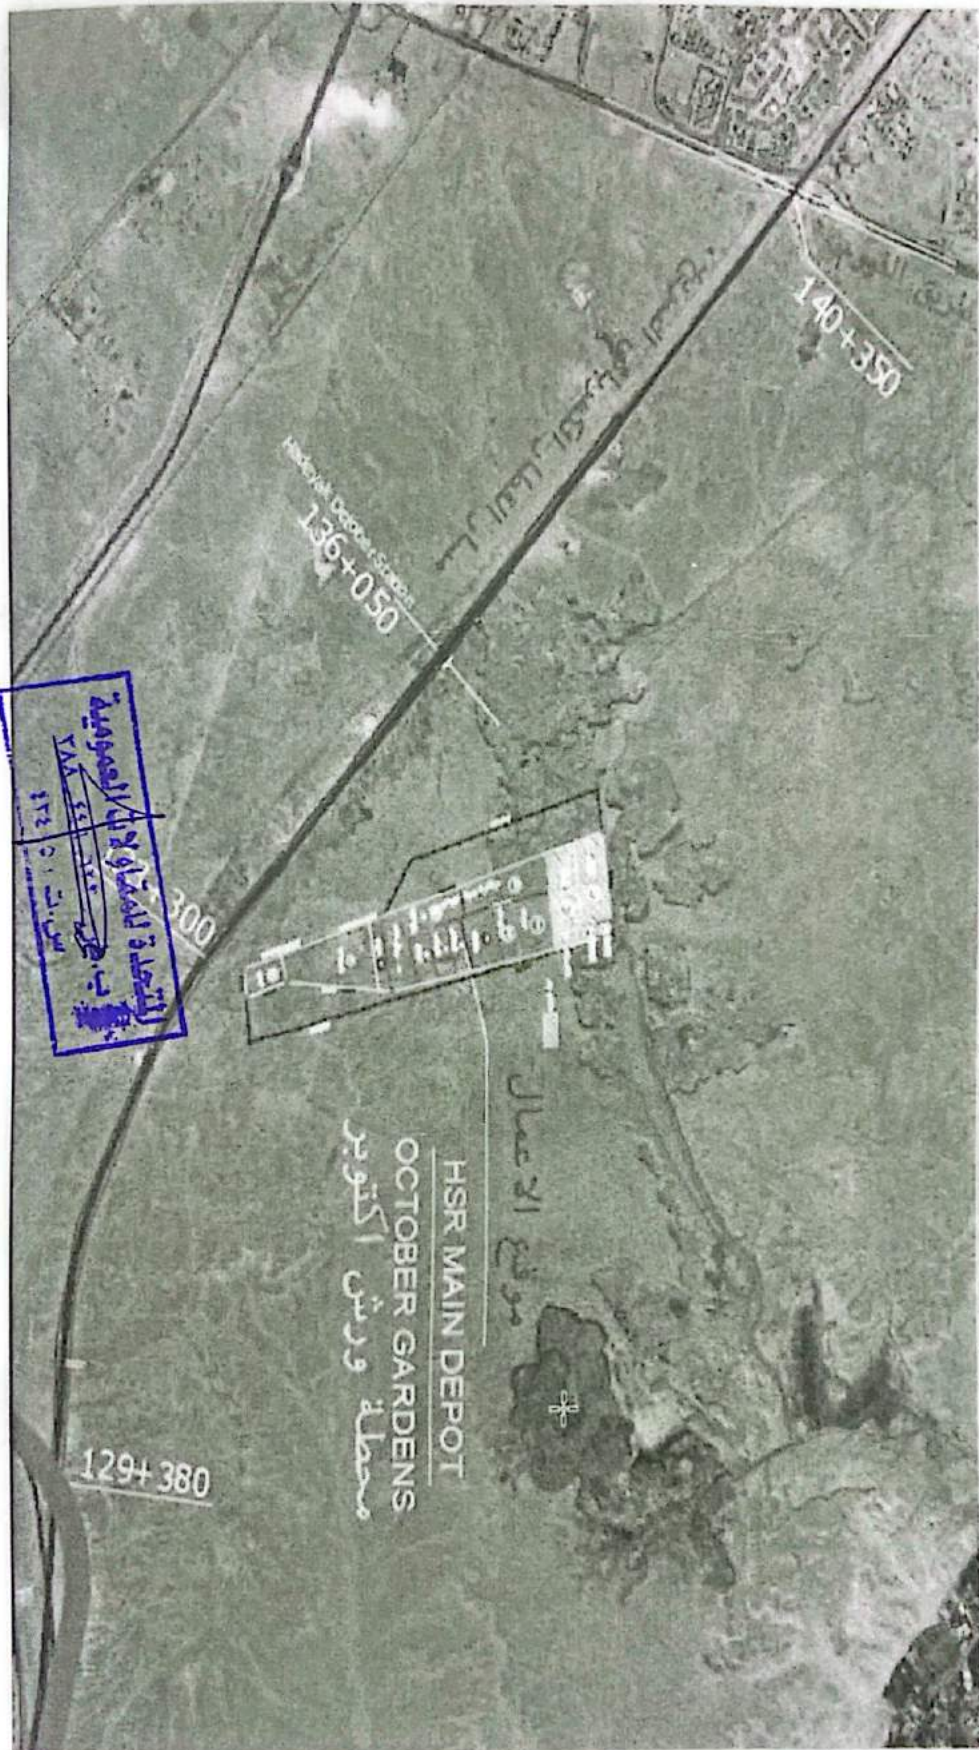

القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العيين - مطروح)
منطقة ورش محطة حائق أكتوبر للقطار السريع - المتحدة للمقاولات العامة

صور للموقع أثناء تنفيذ الأعمال

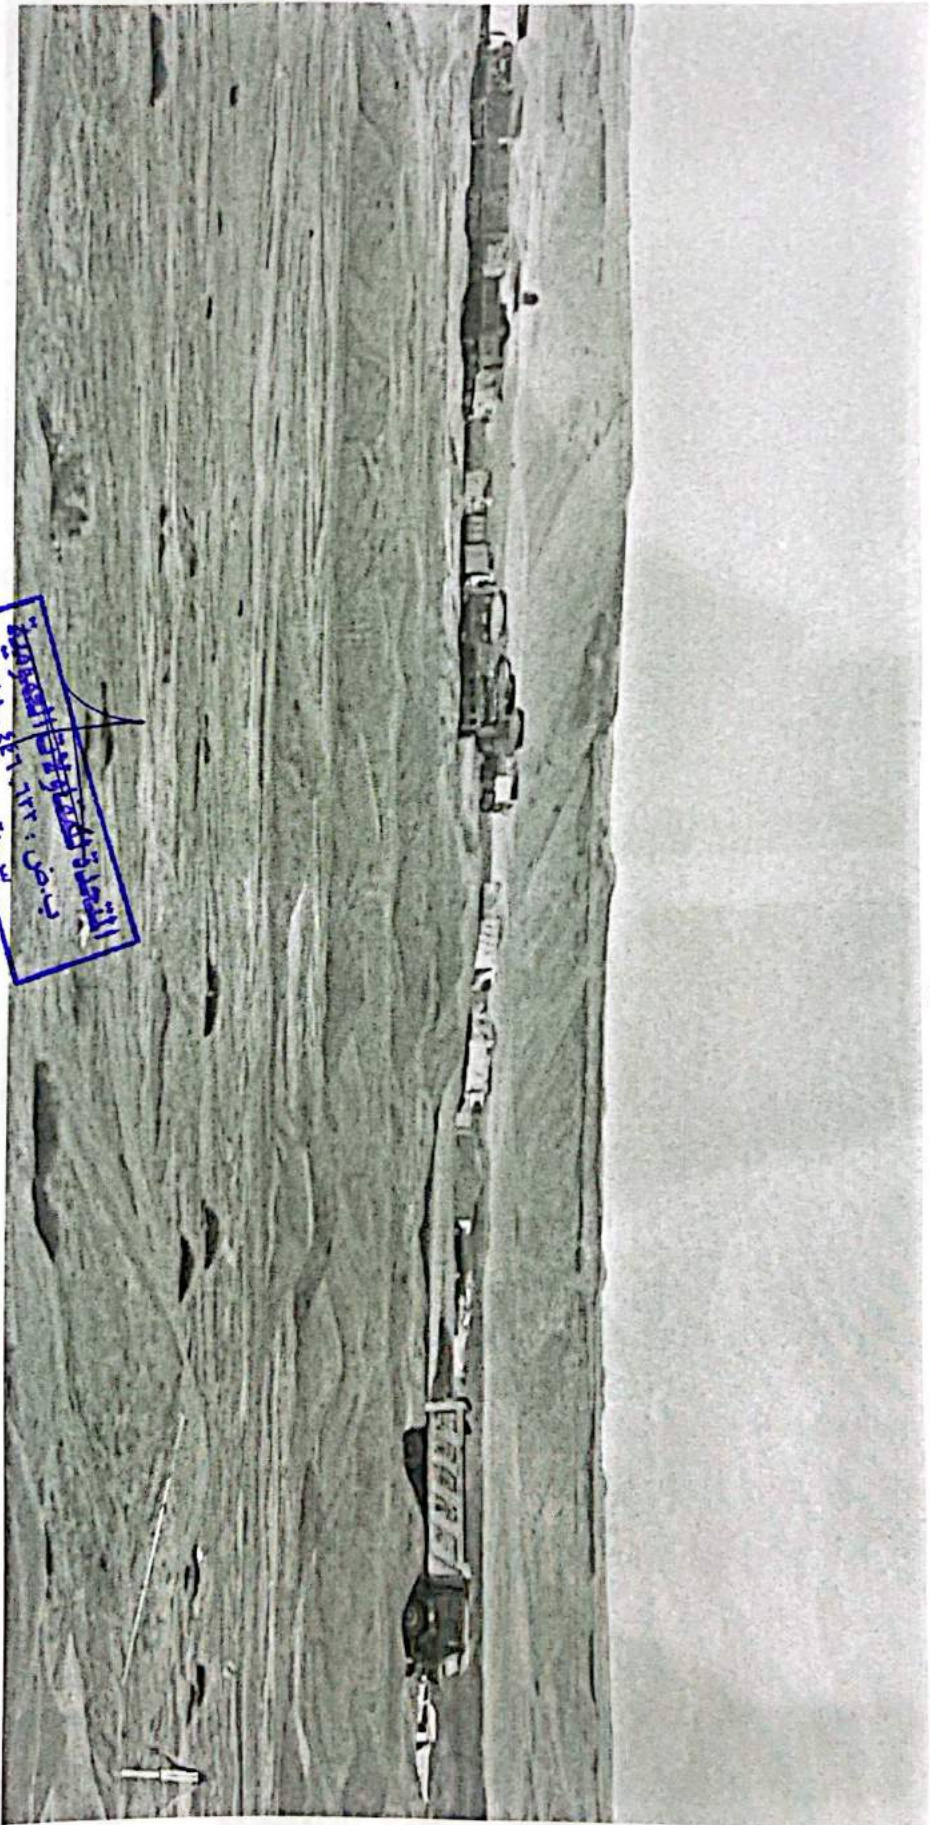

ب.ض : ٢١.٧٢٢ - ٢٨٨
٤٢٤٥ : ٢٠٠٣
المنطقة العامة للمقاولات العامة

القطار الكهربائي السريع - العاصمة الإدارية - العيين - مطروح)
منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر للقطار السريع - المتحده للمقارلات العامة

صور للموقع أثناء تنفيذ الأعمال



האגדה על יצחק ורבי

म.प. = ०४३५३

تقرير شهري

في الفترة من 17/8/2023 حتى 17/9/2023

المتحدة للمقاولات العمومية

اسم الشركة :

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

اولا : الموقف التنفيذي

البيان	اجمالى الكميات	اجمالى الكمية المنفذة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	170047.45	167550.3	98.53%	
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات	108895.6815	101438	93.15%	

ثانيا : بيان المعدات بالموقع

اسم المعدة	لودر	حفار	بلدوزر	جريد	هراس
العدد	5	-	1	1	2
اسم المعدة	فلاپ	دمر	ثانك مياه		
العدد	12	-	2		

ثالثا : بيان العاملين بالموقع

الوظيفة	مدير المشروع	م تنفيذى	م مكتب فنى	م مساحة	فنى مساحة
العدد	1	1	1	1	2
الوظيفة		سائق معدة و مساعد	محاسب		
العدد		23	1		

التوقيع
مدير المشروع

المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ض : ٢٨٨ - ٤٤٦ - ٦٣٣
س.ت : ٤٣٤٧٥

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - العين السخنة



التقرير الشهري

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العاصمة)

اعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و اعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة (A901)

القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات العمومية

(المنطقة الاولى المركزية)

من تاريخ 17/08/2023 حتى 17/09/2023

استشاري الهيئة



الشركة المنفذة

م. عبد الرحمن السليم



الفيديو - ٢٠٢٣/٧/١٤ إدارة الطرق

التاريخ - ٢٠٢٣/٧/٢٦

مذكرة للعرض علي السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن: طلب صرف كميات الردم بالمنطقة D04 علي مشروع أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار

الكهربائي السريع الخط الأول

(العين السخنة العاصمة الإدارية العلمين مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني بالأمر

المباشر عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ٢١٥١)

تنفيذ مكتب المتحده للمقاولات العمومية

اشراف المنطقة الاولى المركزية

أولاً :- الموضوع :


- بشأن / طلب الموافقة علي صرف كميات الردم بالمنطقة D04 علي مشروع تنفيذ أعمال حفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ٢١٥١) تنفيذ مكتب المتحده للمقاولات العمومية اشراف المنطقة الاولى المركزية .

ثانياً :- الإجراءات :

- تم استناد عقد رقم (رقم) (٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ٢١٥١) للمشروع عاليه للشركة المتحده للمقاولات العمومية بقيمة اجمالية قدرها ١١,٥٠٠ مليون جنيهه .
- تم تكليف الشركة المذكورة للقيام بأعمال الردم بالقطعة رقم (D04) ضمن أعمال الورش الخاصة بالقطار .

المطالب


- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي صرف كميات الردم بالمنطقة D04 ضمن أعمال الردم بالورش المركزية علي العقد عاليه لوجود فائض مالي به .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندس / منال السيد ممر
مدير عام صيانة الطرق


رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / هادي الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أمانة

**السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية
للشؤون المالية والإدارية
تحية طيبة وبعد ..**

مرفق طيه اصل موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة علي المتكرة المعروضة علي
حيادته بخصوص الموافقة علي صرف كميات الردم بالمنطقة (D04) ضمن اعمال الردم بالورش
لمركزية علي عملية اعمال حفر وتحويل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار
محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة -
للعاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني بالأمر المباشر- تنفيذ مكتب
لمتحدة للمقاولات العمومية
يرجي التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

" محسن محمد زهران "

حريافي ٢٠٢٣/٨/١٦



**بإدارة مرسلة للسيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
تحية طيبة وبعد ..**

رجي التكرم بالإحاطة والتنبيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مهندس /

" محسن محمد زهران "

حريافي ٢٠٢٣/٨/١٦



محضر إجتماع اللجنة الخاصة

بمفاوضة الشركات المنفذه

اعمال منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق الاهرام
إيماء إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ / ٢٠٢٣ / على اسناد اعمال منطقة الورش المركزية

للقطار السريع بجوار محطة حدائق الاهرام لمجموعة من الشركات المتخصصة

والى قرار السيد المهندس/ رئيس مجلس الادارة رقم () بتاريخ / ٢٠٢٣ / ٤ / على


تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المسند اليها الاعمال وأعضاء اللجنة:


المهندس/حسام بدر الدين إبراهيم	رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق	رئيسا
المهندس/منار عبدالهادى	مدير عام التنفيذ - الادارة المركزية للطرق	عضوا
السيد المهندس / نصر طيبيخ	رئيس الادارة المركزية لمنطقة المركزية	عضوا
المهندس/ مروة محمد مصطفى	مدير ادارة المقاييس والحصر المرورى	عضوا
السيد المهندس / كارم امام سلامه	مدير المشروع بالمنطقة المركزية	عضوا
السيد المهندس / اسلام البهادى	مهندس المنطقة المركزية	عضوا
المحاسب/ مندوب المراجعة	ادارة المراجعة	عضوا
المحاسب / مندوب العقود	ادارة العقود	عضوا
الاستاذ / مندوب الشئون القانونية	الادارة المركزية للادارة القانونية	عضوا

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق

/ ٢٠٢٣ / ٨ بمقر بحوث الطرق ، وبحضور مندوب الشركة المنفذه حيث قامت اللجنة

بمفاوضة الشركة على الأعمال الآتية:







شركة المتحدة
عماد احمد


حسام

شركة المتحدة
الطريق
عماد احمد

شركة المتحدة
الطريق
عماد احمد

المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ب. ٢٨٨.٤٤٦.٦٣٣
س.ت. ٤٣٤٧٥

م	البند	الوحدة	السعر قبل المفاوضة	السعر بعد المفاوضة
١	بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية و تشغيل الارض الطبيعية بسمك متوسط ٥٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الارض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقا لتعليمات الاستشارى.			١٥
٥	اعمال تحميل وتوريد و نقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢) متر اسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه ٢كم و ذلك طبقا لتعليمات الاستشارى . - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار و تبلغ ١,٧ جنية/م ^٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .			٦٥

٤٤١٣
٢٨٨

شركة المتحدة للمقاولات الهندسية
ب.ض : ٢٨٨ - ٤٤٦ - ٦٣٣
س.ت : ٤٣٤٧٥

م.م.م
٢٠٢٣/٥/٤

شركة جندة
٢٠٢٣/٥/٤

شركة المتحدة
٢٠٢٣/٥/٤

منطقة ورش محطة حقائق اكوير (اعمال حفر و ترقيم نواتج الصخر للاراضي المحيطة والمعمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة: المتعمدة للمقاولات العمومية

توزيع صرف كميات منطقة A801 على المقدر									
رقم البند	البند	كميات المنطقة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧	مبلغ (٢٠٢٣/٩/١٧)	مبلغ (٢٠٢٣/٩/١٧)	مبلغ (٢٠٢٣/٩/١٧)	مبلغ (٢٠٢٣/٩/١٧)	مبلغ (٢٠٢٣/٩/١٧)	مبلغ (٢٠٢٣/٩/١٧)	مبلغ (٢٠٢٣/٩/١٧)
1	حفر ترابية متعمدة	115,042.64	115,042.64	115,042.64	115,042.64	115,042.64	115,042.64	115,042.64	115,042.64
2	حفر ترابية متعمدة باستخدام بيلدر	487,547.45	305,500.00	305,500.00	12,000.00	127,050.26	40,500.00	2,497.19	317,500.00
	اجملي الكميات	602,590.09	420,542.64	420,542.64	12,000.00	127,050.26	40,500.00	2,497.19	432,542.64
3	اصلاح ردم D04	108,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	101,438.00	0.00	0.00
	اجملي الكميات	108,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	101,438.00	0.00	0.00
	اجملي الكميات	711,485.77	420,542.64	420,542.64	12,000.00	127,050.26	40,500.00	2,497.19	432,542.64
	اجملي الكميات	711,485.77	420,542.64	420,542.64	12,000.00	127,050.26	40,500.00	2,497.19	432,542.64

١٢
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

المتعمدة للمقاولات العمومية
 ب.م.م. ٢٨٨.٤٤٦.٦٣٣
 ص.م.م. ٢٢٤٧٥

شركة المتعمدة للمقاولات العمومية
 عبدالرحمن محمد

تقرير شهري

في الفترة من 17/8/2023 حتى 17/9/2023

المتحدة للمقاولات العمومية

اسم الشركة :

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

اولا : الموقف التنفيذي

البيان	اجمالى الكميات	اجمالى الكمية المنفذة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	170047.45	167550.3	98.53%	
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات	108895.6815	101438	93.15%	

ثانيا : بيان المعدات بالموقع

اسم المعدة	لودر	حفار	بلدوزر	جريد	هراس
العدد	5	-	1	1	2
اسم المعدة	فلاپ	دمر	ثانك مياه		
العدد	12	-	2		

ثالثا : بيان العاملين بالموقع

الوظيفة	مدير المشروع	م تنفيذى	م مكتب فنى	م مساحة	فنى مساحة
العدد	1	1	1	1	2
الوظيفة		سائق معدة و مساعد	محاسب		
العدد		23	1		

التوقيع
مدير المشروع

المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ض : ٢٨٨ - ٤٤٦ - ٦٣٣
س.ت : ٤٣٤٧٥

EnTrans
CONSULTING
مشروع القطار السريع - العين السخنة



التقرير النصف شهري

اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار السريع (قطاع العاصمة)

اعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و اعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة (A901)

القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات العمومية

(المنطقة الاولى المركزية)

من تاريخ 17/08/2023 حتى 2023/9/2

استشاري الهيئة



الشركة المنفذة

م.احمد الرحمة



تقرير نصف شهري

في الفترة من 17/8/2023 حتى 2/9/2023

المتحدة للمقاولات العمومية

اسم الشركة :

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطر السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

اولا : الموقف التنفيذي

البيان	اجمالى الكميات	اجمالى الكمية المنفذة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	170047.45	150000	88.21%	
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات	108895.6815	85000	78.06%	

ثانيا : بيان المعدات بالموقع

اسم المعدة	لودر	حفار	بلدوزر	جريدور	هرايس
العدد	5	-	1	1	2
اسم المعدة	قلايب	دمبر	تانك مياه		
العدد	12	-	2		

ثالثا : بيان العاملين بالموقع

الوظيفة	مدير المشروع	م تنفيذى	م مكتب فنى	م مساحة	فنى مساحة
العدد	1	1	1	1	2
الوظيفة		سائق معدة و مساعد	محاسب		
العدد		23	1		

التوقيع

مدير المشروع

المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ض : ٤٤٦.٦٣٣ - ٢٨٨
س.ت : ٤٣٤٧٥

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة معدلة رقم 2 لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح القطاع الثانى عقد 2151 - 2022 - 2023 منطقة A901 تنفيذ شركة المتحدة للمقاولات العمومية.




وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية


مهندس/

نصر محمد نصر طيخ





مشروع القطار الكهربائي السريع



شركة المتحدة للمقاولات العمومية

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتقليد الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العندين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني (بالأمير المباشر) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٥١) بتاريخ ٢٠٢٣/١/٥

مقاييس حفر رقم ٢

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي	ملاحظات
1	أعمال الحفر					
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليص طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - علاوة ١,٠٠ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٢ جنيه/ متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .	م³	1.00	23	23	مفاوضة القطار
2-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليص طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - علاوة ١,٠٠ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر .	م³	170,047.450	26	4,421,233.7	مفاوضة القطار
3-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (ظلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التخليص طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التخليص باستخدام البلدوزر . - علاوة ١,٠٠ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٢ جنيه/ متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .	م³	1	30	30.0	مفاوضة القطار
4-1	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتخليصها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليص طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. ذات الجهاد (٢٠٠ - ١٠٠) كجم / سم² ذات الجهاد (٢٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم² ذات الجهاد (٤٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم² ذات الجهاد (٥٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم² ذات الجهاد (٦٠٠ - ٥٠٠) كجم / سم² ذات الجهاد (٧٠٠ - ٦٠٠) كجم / سم²	م³				مفاوضة القطار
2	أعمال الردم Embankment					
1-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتخليصها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التخليص طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندسين المشرفين. ١- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة أجنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . ٢- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ أجنيه لكل كم بزيادة أو النقصان. ٣- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم , و البند لا يشمل القيمة المحجزة	م³	108,895.682	65	7,078,219	مفاوضة القطار
	الإجمالي				11,500,000.00	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى
نصر محمد طيخ
مهندس /
٢١٥ جاري (٢) حدة
١٤/١٢/٢٠٢٣

التيهدة للمقاولات العمومية
٢٨٨ - ٤٤٦ - ٦٣٣
س.ت : ٤٣٤٧٥



Electric Express Train - HSR

From El Ain El Sokhna City To El Alamein

SYSTRA

Employer Consultant

EntTrans
CONSULTING
GARB Consultant

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر و أعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة
حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة -
العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة (A901) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)

AL MUTAHIDA
شركة المتحدة
للمقاولات العامة
Contractor

الهيكل التنظيمي لشركة المتحدة للمقاولات العمومية

الوظيفة	الاسم	مسلسل
مدير مشروع	م/ عبدالرحمن أحمد سالم محمد	1
مهندس المكتب فني	م/ أحمد صلاح	4
مهندس ميكانيكا صيانة معدات	م/ محمود أحمد ماضي	6
مشرف عام	عاصم أحمد ماضي	7
محاسب	سالم محمد أحمد	9
مساح	مصطفى ربيع	10
مساعد مساح	عبدالله محمد	14

عبدالرحمن أحمد سالم
شركة المتحدة للمقاولات العمومية
ب.ض : ٢٣٣ - ٤٤٦ - ٢٨٨
س.ت : ٤٣٤٧٥

مكتب إنشائي
EntTrans
CONSULTING
شركة المتحدة للمقاولات العمومية
