


البند	البيان	وحدة	الفئة بعد التفاوض	كمية المعدلة ١	كمية المعدلة	اجمالي المعدلة ١	اجمالي المعدلة
	اعمال تجهيز الموقع العام						
١	بالمتر الطولي عمل جسات بعمق ١٠ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٤٥٠	٤٠	٣٠,٠٠	١٨٠٠٠	١٣٥٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة والبند يشمل التكسير اليدوي اذا لزم الامر ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٣٣٠	١٤٠	٦٠٠,٠٠	٤٦٢٠٠	١٩٨٠٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقالب العمومية والوصول لمنسوب التأسيس مع نهو الاعمال طبقا للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا حسب المواصفات القياسية المصرية و تعليمات جهاز الاشراف المحددة بالرسومات التنفيذية .	م.ط	١٠٠	١٦٠٠	١٥٤٠,٠٠	١٦٠٠٠٠	١٥٤٠٠٠٠
٤	بالمتر المكعب ردم برملا نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٧٠	١٧٠	٥٧,٠٠	٢٨٩٠٠	٩٦٩٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٣٠	٧٢٥	٦٦٥,٠٠	٢٣٩٢٥٠	٢١٩٤٥٠
	الاعمال الانشائية						
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المبنى علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠٦٠	١٩٥	١٨٧,٠٠	٤٠١٧٠٠	٣٨٥٢٢٠
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م.ط	٢٨٠٠	٥٠	٥٠,٠٠	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠

٣



البند	البيان	وحدة	الفئة بعد التفاوض	كمية المعدله ١	كمية المجنده	اجمالي المعدله ١	اجمالي المجنده
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلي الا نقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ٣	٣٦٠٠	٤٠	٣٧,٠٠	١٤٤٠٠٠	١٣٣٢٠٠
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٠,٨ م ٣ زلط نظيف و ٠,٤ م ٣ رمل نظيف حرش علي الا نقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	٢٢٠٠	٥	١١٠,٠٠	١١٠٠٠	٢٤٢٠٠٠
١٠	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمة طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	١٤٥	٦٥	٦١,٠٠	٩٤٢٥	٨٨٤٥
١١	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنيه وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٥٣٠٠٠	١٣	١١,٦٦	٦٦٢٥٠٠	٦١٧٩٨٠
١٢	بالمتر الطولي نقل وتركيب سور خرساني سابق الصب من مخازن الهيئة الي الموقع علي ان لا تزيد مسافه النقل عن ٩٠ كم والسعر يشمل التحميل والنقل والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٢٢٠٠	٦١٥	٦٠٠,٠٠	١٣٥٣٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠
	أعمال مباني						
١٣	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	٢٤٥	٢٧٥	٢٩٠,٠٠	٦٧٣٧٥	٧١٠٥٠
١٤	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ٣	٢٢٠٠	٦٥	٣٣,٠٠	١٤٣٠٠٠	٧٢٦٠٠

البند	البيان	وحدة	الفئة بعد التفاوض	كمية المعطلة ١	كمية المجنده	اجمالي المعطلة ١	اجمالي المجنده
١٥	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢٩٠	٢٠	١,٠٠	٥٨٠٠	٢٩٠
١٦	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت ٣م/ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣م	٢٤٠٠	٣٠	٢٦,٠٠	٧٢٠٠٠	٦٢٤٠٠
أعمال العزل							
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العازل للرطوبة من البيتومين البارد للأساسات ومباني قصية الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	٢م	٦٠	٤١٠	٤١٠,٠٠	٢٤٦٠٠	٢٤٦٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالبالشورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٩٠	٧٥	٦١,٠٠	١٤٢٥٠	١١٥٩٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من السليتون سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية السليتون وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٧٥	٦٥	٦١,٠٠	١١٣٧٥	١٠٦٧٥
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية للحمامات جيداً بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس الاشراف.	٢م	٢٣٥	٦٥	٦١,٠٠	١٥٢٧٥	١٤٣٣٥
اعمال البياض							
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت ٣م/ رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم ٣م رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم ٣م رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٤٠	١٠	١١١,٠٠	١٤٠٠	١٥٥٤٠

البند	البيان	وحدة	الفترة بعد التفاوض	كمية المعمله ١	كمية المعجدده	اجمالي المعمله ١	اجمالي المعجدده
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والضهرة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	١٩٠	٨٥٠	١٠٨٠,٠٠	١٦١٥٠٠	٢٠٥٢٠٠
	أعمال دهانات		٠				٠
٢٣	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك سايبس والتشطيب يوتن و يشمل (التجهيز +وجه برايمر مائي + ٣ سكنية معجون +وجه تحضيري) و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	١٨٠	١٠	١,٠٠	١٨٠٠	١٨٠
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الاستشاري .	م٢	١٨٠	٨٥٠	١٠٣٤,٠٠	١٥٣٠٠٠	١٨٦١٢٠
٢٥	بالمتر الطولي ترميم الأجزاء المتهاك من السور السابق الصب والبند يشمل المعالجه بماده اسمنتية مناسبة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٧٥	١٠	١,٠٠	٧٥٠	٧٥
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سلك شبك مجلفن سمك ٤ مم لزوم السور والفئة تشمل توريد الشبك والزوايا والربط بين الاعمده والعلب والقوائم الحديد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٧٤٠	١٧	١٥٧,٠٠	١٢٥٨٠	١١٦١٨٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب جر جوري صرف مطر سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٩٠٠	٢	٢,٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠
	اجمالي الاعمال الاعتيادية						
	الاعمال الكهربائية						
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء رئيسية من انتاج شركة ABB والبند يشمل مفتاح رئيسي ٢٥٠ A وعدد ٦ مفتاح فرعي ١٠٠ A والقواطع من نفس النوع واجهزة قياس وبارات بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة	عدد	١٢٠٠٠٠	١	١,٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء شوارع بخليه فوتوسيل بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة	عدد	٨٠٠٠٠	١	١,٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥×٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	م.ط	٦٠٠	١٠٠	١,٠٠	٦٠٠٠٠	٦٠٠
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦×٤) مم ٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة.	م.ط	٤٠٠	٢١٥	٦٩١,٠٠	٨٦٠٠٠	٢٧٦٤٠٠

٢٠٢
م.ط



البند	البيان	وحدة	الفترة بعد التفاوض	كمية المعجله ١	كمية المعجله	اجمالي المعجله ١	اجمالي المعجله
٥	بالعدد توريد وتركيب كشاف اناره طراز شوارع Watt ١٥٠ بدرجه حمايه IP ٦٥ السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠٠٠٠	٥٠	٣٣,٠٠	٥٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
٦	بالعدد نقل وصيانته واعاده تركيب عمود اناره البند يشمل النقل والتوصيل والتثبيت بجوايط وعمل القاعده اللازمه (٤٠ * ٤٠ * ٥٠ سم) والمرامحه والدهان اللازم باللون المطلوب وتجهيزه بعدد ٢ زراع شكل V وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	عدد	١٠٠٠٠	٢٥	٢٦,٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠
البند المستجده							
اعمال تجهيز الموقع العام							
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك لارضيات الرصيف سمك ٦ سم و البند يشمل توريد الرمل وتسوية الارض وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة	م.م	٢٦٠	٠	٥٥,٠٠	٠	١٤٣٠٠
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان برودرة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم * ١٥٠ سم) والبند يشمل التوريد والتركيب وعمل فرش عادي اسفل البرودرة والخامات اللازمة للتثبيت	م.ط.	٢٥٠	٠	٢٢,٠٠	٠	٥٥٠٠
أعمال دهانات							
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك (داخلي) على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ من وزنه ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم % عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م	١٧٠	٠	١١٣,٠٠	٠	١٩٢١٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرانش فيوتك ١٠ سم لزوم الحوائط لزوم الحمامات والغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م.ط.	١٥٠	٠	٥٠,٠٠	٠	٧٥٠٠
أعمال الارضيات							
٥	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك كليوثيرا او ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتيه وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.م	٤٧٥	٠	٣٠,٠٠	٠	١٤٢٥٠
٦	بالمتر المسطح تركيب سيراميك حوائط كليوثيرا ولزقة بمادة لزق مناسبة و ما يماثلها والسعر يشمل المونة الاسمنتيه وفرشة الرمل والتشطيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	م.م	٥٠٠	٠	٥٢,٠٠	٠	٢٦٠٠٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونه الاسمنتيه والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف.	م.ط.	٦٠	٠	٣٠,٠٠	٠	١٨٠٠
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جيرانيت محلي (احمر اسواني او حلايب او ما يماثلها) القاتم ٢ سم والنام ٤ سم والبند يشمل التلايس والوزر و التفتيح للترابزين وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط.	١٢٠٠	٠	١٠,٠٠	٠	١٢٠٠٠

٣٠٠٠
٥٠٠٠
١٠٠٠٠



البيانات	وحدة	الفئة بعد التفاوض	كمية المعمله ١	كمية المعمله	اجمالي المعمله ١	اجمالي المعمله
٩	م.ط	٤٠٠	٠	٦,٠٠	٠	٢٤٠٠
الاعمال المعدنية						
١٠	كجم	١٠٥	٠	١٢٠,٠٠	٠	١٢٦٠٠
أعمال ابواب و الشبابيك						
١١	٢م	٧٠٠٠	٠	١٥,٠٠	٠	١٠٥٠٠٠
			٠	٠	٠	٠
			٠	٠	٠	٠
			٠	٠	٠	٠
١٢	٢م	٥٤٠٠	٠	١٥,٠٠	٠	٨١٠٠٠
١٣	٢م	٨٥٠	٠	٢,٠٠	٠	١٧٠٠
الأعمال الصحية						
١٤	عدد	٧٠٠٠	٠	٢,٠٠	٠	١٤٠٠٠
١٥	عدد	٤٤٠٠	٠	٢,٠٠	٠	٨٨٠٠
١٦	عدد	٤٥٠٠	٠	١,٠٠	٠	٤٥٠٠

١٢



البند	البيان	وحدة	القيمة بعد التفاوض	كمية المعطلة ١	كمية المعطلة	اجمالي المعطلة ١	اجمالي المعطلة
١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي برويلين قطر ١ بوصة (32 مم) من اجود الأنواع (B.R. او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيماين ومشتراكات وخلافه وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٧٠	٠	١٥,٠٠	٠	٤٠٥٠
١٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٢ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيماين ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠٠	٠	١١,٠٠	٠	٣٣٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت بالحائط والرفايع من كيماين ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧٢٠	٠	١٥,٠٠	٠	١٠٨٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٦٠	٠	٢,٠٠	٠	١١٢٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب محبس بليه ١ بوصة قلب نحاس إيطالي ٢ لأكور من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اربعة فقط لا غير)	عدد	٧٥٠	٠	٢,٠٠	٠	١٥٠٠
٢٢	بالعدد إنشاء وتوريد وتركيب غرفة تفتيش ٦٠*٦٠ سم والبند يشمل المباني سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي والعزل والمحارة من الداخل وغطاء (GRP 15A) البند يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	٥٧٥٠	٠	٤,٠٠	٠	٢٣٠٠٠
٢٣	بالعدد إنشاء وتوريد وتركيب غرفة جاليترايب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المباني والعزل والتجهيز لمسارات المياه داخل الغرفة والبند يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	عدد	١٥٦٠	٠	١,٠٠	٠	١٥٦٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب خلاط حوض لحوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يمثله والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٢٧٥٠	٠	٢,٠٠	٠	٥٥٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب خلاط شجرة لحوض المطبخ جولد الثقيل او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٢٧٥٠	٠	١,٠٠	٠	٢٧٥٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب دش شامل الخلاط والسماحه جولد الثقيل او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٣٣٠٠	٠	٢,٠٠	٠	٦٦٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧٠٠	٠	٣,٠٠	٠	٢١٠٠
٢٨	بالعدد توريد وإنشاء بياره صرف بسعه ١٢ م وعمق ٢ متر تشمل الحفر والتطهير و عمل خسانة عادية اسفل المباني بسمك ٣٠ سم وعرض ٥٠ سم بمحتوي اسمنتي ٢٥٠ كجم / م٣ وعمل مباني بطوب اسمنتي بسمك ١٨ سم وعمل سقف خرساني بسمك ١٦ سم وطبقتين حديد ٧/٨ م.ط قطاع ١٠ مم بالاتجاهين وتركيب غطاء وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٤٠٠٠٠	٠	١,٠٠	٠	٤٠٠٠٠

١٢٠٠



البيان	وحدة	القيمة بعد التفاوض	كمية المحطة ١	كمية المجنده	اجمالي (المحطة ١)	اجمالي المجنده
١٠. توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ١٢٠ × ٢ سم بلمبات ليد بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياه والأتربة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢١٠٠	٠	٤٠,٠٠٠	٠	٨٤٠٠٠
١١. توريد وتركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٦٠ × ١ سم بلمبات ليد غاطس أو بارز بقدرة لا تقل عن ٣٦ وات وشدة إضاءة لا تقل عن ٣٤٠٠ ليومن IP 65 مضاد للمياه والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٥٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٣٠٠٠
١٢. توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ٢٦ وات IP54 والوحدة كامل بجميع أجهزة التشغيل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٠٠٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٦٠٠٠
١٣. بالعدد توريد وتركيب مروحة حائط ١٨ بوصة فريش او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٥٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	٥٠٠٠
١٤. بالعدد توريد وتركيب شفاط ٣٠*٣٠ توريندو او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهـ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٢٥٠	٠	٣,٠٠٠	٠	٦٧٥٠
١٥. بالعدد توريد وتركيب ماتور مياة ١ حصان كالبيدا او ما يماثلها والبند يشمل الاوتوماتيك واكسسوارات التجميع والتركيب وقصص حديد و كل ما يلزم لنهـ الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٢٩٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٠	٢٩٠٠٠
١٦. بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر اوليميك او ما يماثلها البند يشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لاقول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف (بالعدد اثنين فقط لا غير)	عدد	٩٠٠٠	٠	٢,٠٠٠	٠	١٨٠٠٠
الإجمالي					٤٩٩٦٤٨٠	٦٢٤٠٢٧٠

رئيس الاداره المركزية
مهندس /
ايمن محمد متولي

مدير المشروع
مهندسة /
مروه بدرت

مهندس الهيئة
٣٠٠
٣٠٠
٣٠٠





عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدة { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط								
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية للارضيات والارصفة							
	اسفل الانترلوك							
		١	٠,١	١٤,٦٥	١,٥٥		٢,٢٧	
		١	٠,١	١٤,٦٥	١,٢		١,٧٦	
		١	٠,١	٢,٣٠	٢,٨٥		٠,٨٩	
		١	٠,١	١,٣٤	٢,٨٥		٠,٥٢	
	غرفة ١	١	٠,١	٢,٣٥	٢,٢٩		١,١٤	
	معبرة باب المطبخ	١	٠,١	١	٠,٢٥		٠,٠٣	
	حمام ١	١	٠,١	٢,٣٦	١,٤٢		٠,٣٢	
	معبرة باب	١	٠,١	٠,٨	٠,٢٥		٠,٠٢	
	حمام ٢	١	٠,١	١,٦٢	١,٦٨		٠,٢٧	
	معبرة باب	١	٠,١	٠,٨	٠,٢٥		٠,٠٢	
	مطبخ	١	٠,١	١,٦٨	١,٤٠		٠,٢٤	
	غرفة ٢	١	٠,١	٢,٣٥	٢,٢٨		١,١٢	
		١	٠,١	١	١,٤٢		٠,١٤	
	معبرة باب	١	٠,١	٠,٨	٠,٢٥		٠,٠٢	
							٨,٧٦	٨,٧٦
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					

27





عملية إنشاء أسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعباط

رقم السند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي	
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي		
١٢	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ								
	اجمالي ماسبق								
							٢٥١,١٤	٢٥١,١٤	٠,٠٠
	مرمات المباني ف السور البريكاست								
		١	١	١,٢٤	٢,٢		٢,٩٥		
		١	٢	٢,٢	٢,٢		٥,٢٩		
		١	٣	٠,٢٥	١,٥		٠,٢٨		
		١	٤	٠,٦٥	٢,٢		١,٤٣		
		١	٥	٠,٢٠	١,٥		٠,٤٥		
		١	٦	٠,٢٠	١,٥		٠,٤٥		
		١	٧	٠,٢٠	١,٥		٠,٤٥		
		١	٨	٠,٢٠	١,٥		٠,٤٥		
		١	٩	٠,٢٠	١,٥		٠,٤٥		
		١	١٠	٠,٥٥	١,٩		١,٠٥		
		١	١١	٢,٢٠	٢,٢		٥,٢٩		
		١	١٢	٢,٢٠	٢,٢		٥,٠٦		
	مباني في السور الخارجي								
		١		٠,٤٥	١,٧		٠,٧٧		
		١		٠,٤٥	١,٧		٠,٧٧		
		١		٠,٩٠	٢,٢		٢,٠٧		
		١		٤,٥٥	٢,٢٥		١٠,٢٤		
							٠,٠٠		
							٠,٠٠		
							٠,٠٠		





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارى لزوم السطح							
	السطح	١		٥,٠٥	١٢,٢٢		٦١,٧١	
						</		







المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط مزايكو							
	السطح	١		٥,٠٥	١٢,٢٢		٦١,٧١	
							٦١,٧١	٦١,٧١
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								

عزل الاسطح والحمامات والامطبخ

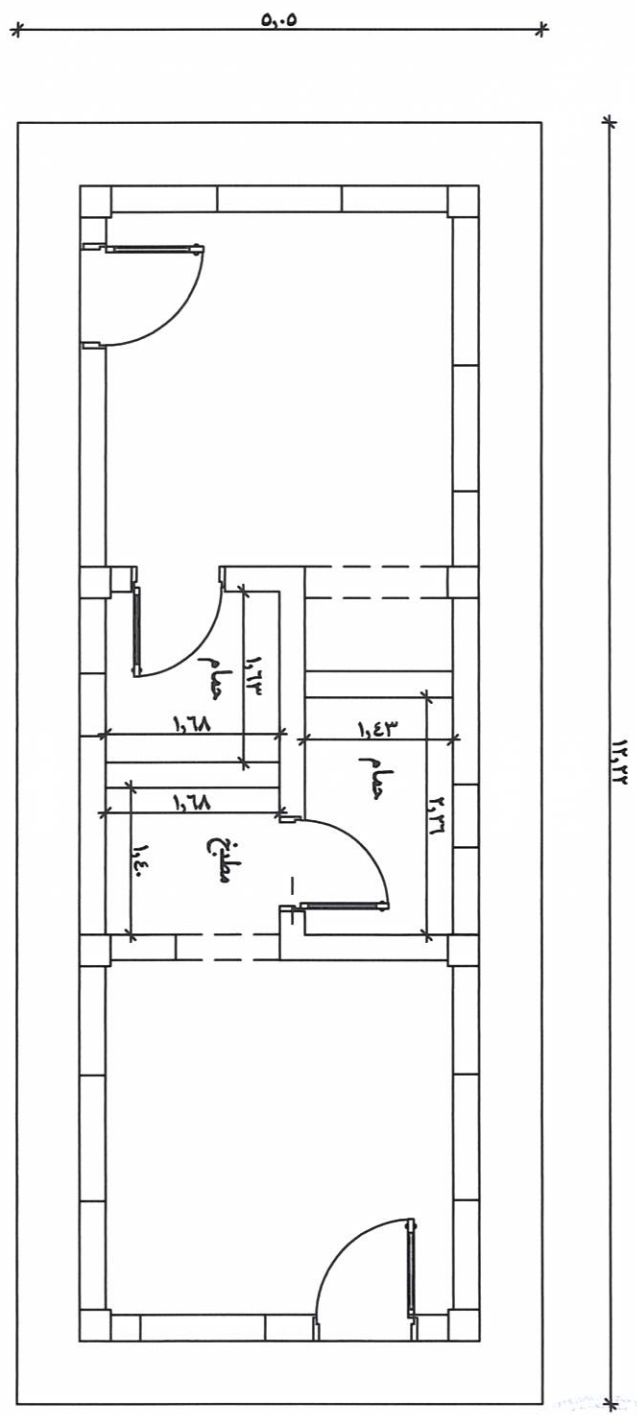



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }


وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل							
	غرفة ١							
	السقف	١	٢,٢٨	٢,٢٥			١١,٢٢	
	ح ١	١	٢,٢٨		٢,٩٠		٩,٨٠	
	حجم ش ٢	١	١,٢	١,٢٠		١,٤٤		
	ح ٢	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢	
	حجم ب ١	١		١	٢,٢	٢,٢٠		
	حجم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٢	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠	
	حجم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٤	١,٠٠		٢,٢٥	٢,٩٠		٩,٧٢	
	حجم معبرة	١	١		٢,٦	٢,٦		
	سقف المطبخ	١	١,٦٨	١,٤٠			٢,٢٥	
	سقف حمام ١	١	٢,٢٦	١,٤٢			٢,٢٢	
	الكمرة	٢	١		٠,٢		٠,٦٠	
	باطن الكمرة	١	١		٠,٢		٠,٢٠	
	غرفة ٢							
	السقف	١	٢,٢٨	٢,٢٥			١١,٢٢	
		١	١,٤٢	٠,٧			١,٠٠	
	ح ١	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠	
	حجم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٢	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

(Signature)






المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي	
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي		
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل								
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤			
	ح ٢	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠		
	خصم ب ٢	١		١	٢,٢	٢,٢			
	ح ٤	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢		
		٢		١	٢,٩		٥,٨٠		
	خصم ب ١	١		٠,٨٠	٢,٢	١,٧٦			
	سقف حمام ٢	١	١,٦٨	١,٦٢			٢,٧٤		
	الكمرة	٢	١,٤٢		٠,٢		٠,٨٥٨		
	باطن الكمرة	١	١,٤٢		٠,٢٠		٠,٤٢٩		
	الكابولي	٢	١١,٠٢	٠,٦			١٢,٢٢		
		٢	٥,٠٥	٠,٦			٦,٠٦		
	الإجمالي							١٣٧,٢١	١٢١,٢٥
مهندس الشركة					مهندس الهيئة				
									



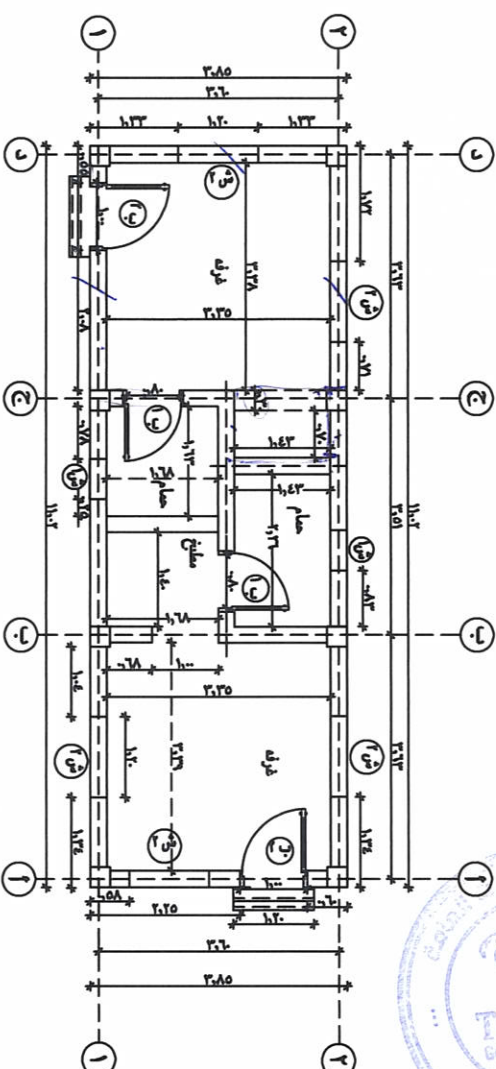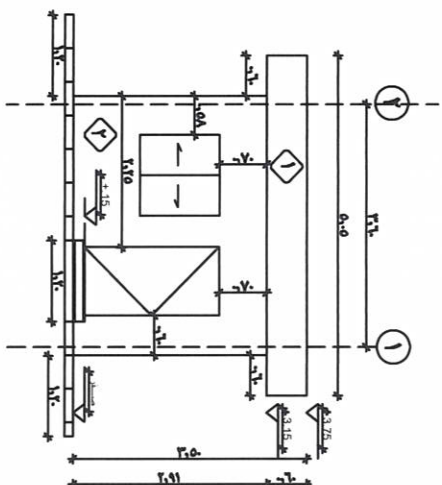

بایاض ت خشی ن داخ لی



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي	
			طول	عرض	ارتفاع	خضم	جزئي		
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية جرفياتو								
	غرفة الامن								
	الوجهة الامامية و الخلفية	٢	٣,٣٥		١١,٠٢		٧٣,٨٢		
	الدروة من الخارج الامامية و الخلفية	٢	٠,٧٥		١٢,٣٢		١٨,٣٢		
	الكابولي من اسفل	٢	٠,٦		١٢,٣٢		١٤,٦٦		
	الوجهة الجانبية اليمين و اليسار	٢	٣,٣٥		٣,٨٥		٢٥,٨٠		
	الدروة من الخارج	٢	٠,٧٥		٥,٠٥		٧,٥٨		
	اسفل الكابولي	٢	٠,٦		٥,٠٥		٦,٠٦		
	السور ناحية الجراش								
	من الداخل والخارج	١	١٥,١٨		٤,١		٦٢,٢٤	٣,٨٠	
		١	٧,٠٦		٤,١		٢٨,٩٥		
		١	٥,٣٥		٤,١		٣١,٩٤		
		١	٧,٧		٤,١		٣١,٥٧		
	من الداخل والخارج	١	١٥,١٨		٣,٨		٥٧,٦٨	٣,٨٠	
		١	٧,٣٥		٣,٨		٣٧,٩٣		
		١	٥,٣٥		٣,٨		٣٠,٣٢		
		١	٧,٧		٣,٨		٢٩,٣٦		
	الطبان من اعلي	١	١٥,١٨		٠,٤		٦,٠٧		
		١	٧,٣٥		٠,٤		٢,٩٤		
		١	٥,٣٥		٠,٤		٢,١٤		
		١	٧,٧		٠,٤		٣,٠٨		
	الإجمالي							٤٤٠,٣٨	٤٤٠,٣٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية جرفياتو							
	اجمالي ما سبق							٤٤٠,٢٨
	الطبان من اسفل	١	٤,١٥		٠,٢٨		١,١٦	٤٤٠,٢٨
		٢	٢,٢٥		٠,٢٨		١,٨٢	
		١	٢,٢٢		٠,٢٨		٠,٩٠	
		١	٤,٤٢		٠,٢٨		١,٢٤	
		١	١,٩٧		٠,٢٨		٠,٥٥	
		١	٤,٩١		٠,٢٨		١,٣٧	
		١	٢,٦٥		٠,٢٨		١,٠٢	
		١	٢,٢٥		٠,٢٨		٠,٩١	
	جوانب الاعمدة	١٨	٢,٥		٠,٢٨		١٢,٦٠	
		١٨	١,٦		٠,١٥		٤,٣٢	
		٤	٤,١		٠,٤		٦,٥٦	
	بين الطوبة والنص طوبة	١	٤,١٥		٠,١٢		٠,٥٠	
		٢	٢,٢٥		٠,١٢		٠,٧٨	
		١	٢,٢٢		٠,١٢		٠,٣٩	
		١	٤,٤٢		٠,١٢		٠,٥٢	
		١	١,٩٧		٠,١٢		٠,٢٤	
		١	٤,٩١		٠,١٢		٠,٥٩	
		١	٢,٦٥		٠,١٢		٠,٤٤	
		١	٢,٢٥		٠,١٢		٠,٣٩	
	السور ناحية مبني الهيئة							
	من الداخل والخارج	٢	٤٠,٦٥		٣,٦		٢٩٢,٦٨	
		٢	٢٤,٧٢		٣,٦		١٧٧,٩٨	
	الإجمالي							٩٤٧,٣٦

مهندس الهيئة


مهندس الشركة





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


وحده المنطقة المركزية بالبليدة

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية جرفياتو							
	اجمالي ما سبق							٩٤٧,٣٦
	الطيان من اعلي	١	٤٠,٦٥		٠,٤		٩٤٧,٣٦	٠,٠٠
		١	٢٤,٧٢		٠,٤		٩,٨٩	
	الطيان من اسفل	٧	٢,٢٥		٠,٢٨		٦,٢٧	
		١	٢,٩٧		٠,٢٨		٠,٨٣	
		٦	٣,١٦		٠,٢٨		٥,٣١	
		٣	٣,٠٣		٠,٢٨		٢,٥٥	
		١	٣,١٣		٠,٢٨		٠,٨٨	
		١	٢,٢		٠,٢٨		٠,٩٢	
	جوانب الاعمدة	٢٨	٢,٥		٠,٢٨		٣٦,٦٠	
		٢٨	١,٧		٠,١٥		٩,٦٩	
	بين الطوبة والنص طوبة	٧	٢,٢٥		٠,١٢		٢,٧٢	
		١	٢,٩٧		٠,١٢		٠,٣٦	
		٦	٢,١٦		٠,١٢		٢,٢٨	
		٣	٣,٠٣		٠,١٢		١,٠٩	
		١	٢,١٣		٠,١٢		٠,٢٨	
		١	٢,٢		٠,١٢		٠,٤٠	
	الإجمالي						١٠٣٢,٨٨	٠,٠٠
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٧	بالعدد توريد وتركيب جرحوري صرف مطر							
	اعلي غرفه الامن							
		٢					٢,٠٠	
	الإجمالي							
							٢,٠٠	٢,٠٠
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعباط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١ م	بالمتر المسطح انترلوك							
		١		١٤,٦٥	١,٥٥		٢٢,٧٧	
		١		١٤,٦٥	١,٢		١٧,٥٨	
		١		٢,٣٠	٢,٨٥		٨,٨٦	
		١		١,٢٤	٢,٨٥		٥,١٦	
							٥٤,٣٢	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢ م	بالمتر الطولي بردورة وسط							
							١٤,٦٥	
							٦,٦٠	
							٢١,٢٥	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								

برلورة و انترلوك

م. ج. م.

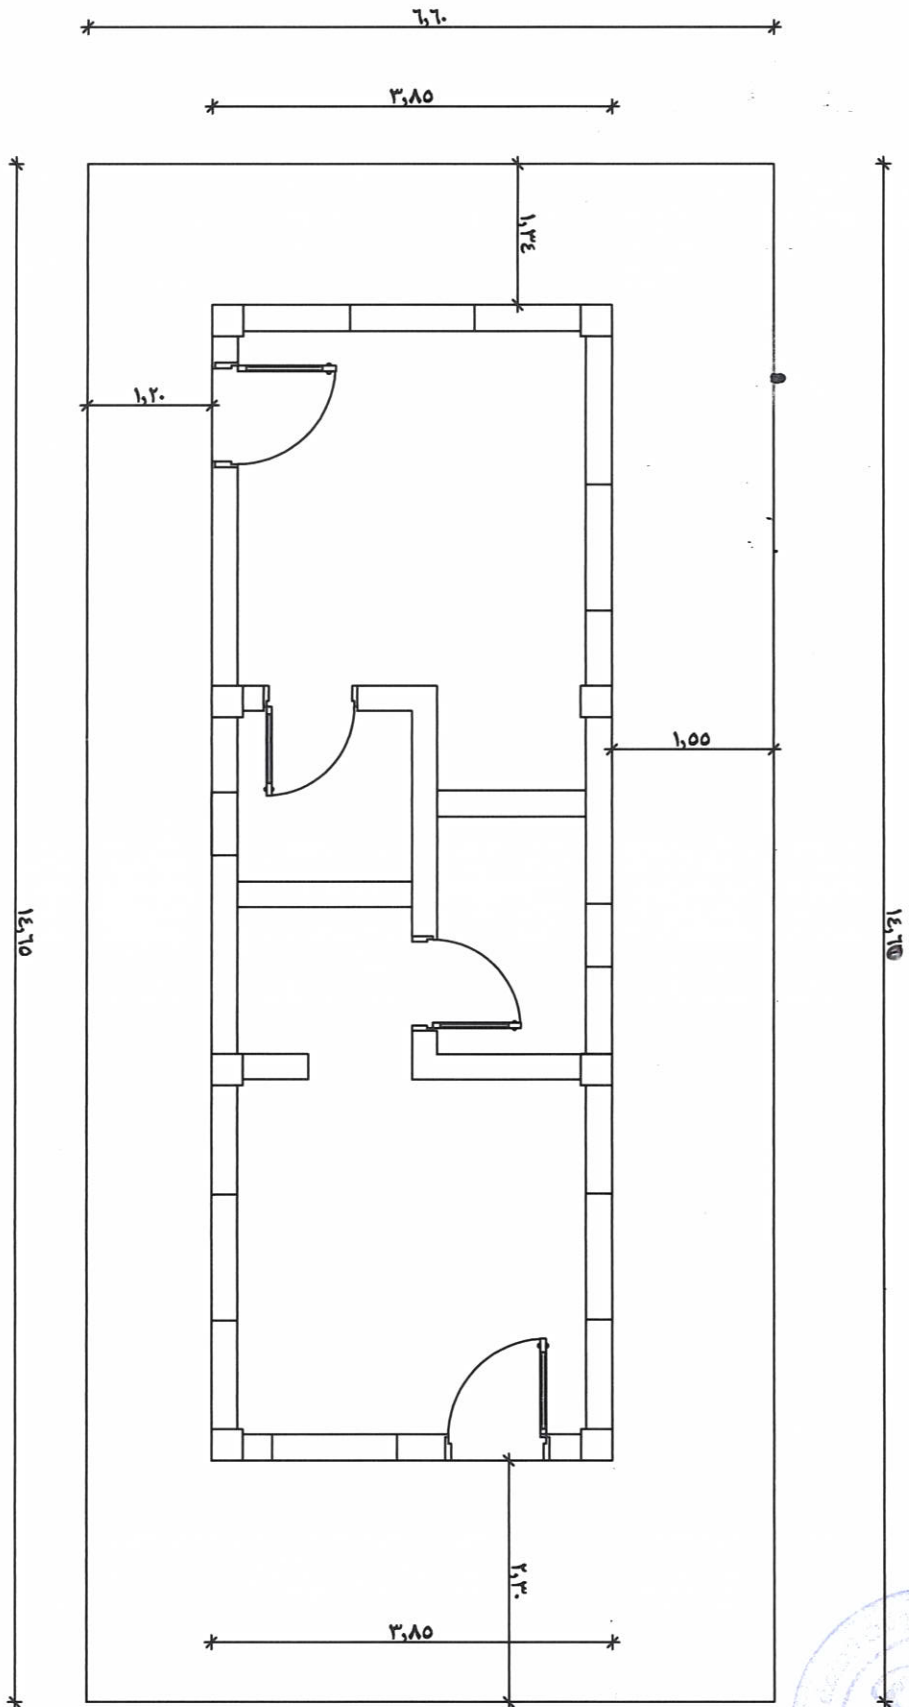





المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢ م	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية							
	غرفة ١							
	السقف	١	٢,٢٨	٢,٢٥			١١,٢٢	
	ح ١	١	٢,٢٨		٢,٩٠		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢	١,٢٠		١,٤٤		
	ح ٢	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢	
	خصم ب ١	١		١	٢,٢	٢,٢٠		
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٢	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٤	١,٠٠		٢,٢٥	٢,٩٠		٩,٧٢	
	خصم معبرة	١	١		٢,٦	٢,٦		
	سقف المطبخ	١	١,٦٨	١,٤٠			٢,٢٥	
	سقف حمام ١	١	٢,٢٦	١,٤٢			٢,٢٢	
	الكمرة	٢	٠,٢		٠,٢		٠,١٨	
	باطن الكمرة	١	٠,٢		٠,٢		٠,٠٩	
	غرفة ٢							
	السقف	١	٢,٢٨	٢,٢٥			١١,٢٢	
		١	١,٤٢	٠,٧			١,٠٠	
	ح ١	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٢	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢	
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								






المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري



عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي		
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي			
٢ م	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية									
	حجم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤				
	٢ ح	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠			
	حجم ب ٢	١		١	٢,٢	٢,٢				
	٤ ح	١		٢,٣٥	٢,٩		٩,٧٢			
		٢		١	٢,٩		٥,٨٠			
	حجم ب ١	١		٠,٨٠	٢,٢	١,٧٦				
	سقف حمام ٢	١	١,٦٨	١,٦٢			٢,٧٤			
	الكمرة	٢	٠,٢		٠,٢		٠,١٨			
	باطن الكمرة	١	٠,٢		٠,٣٠		٠,٠٩			
	الكابولي	٢	١١,٠٢	٠,٦			١٢,٢٢			
		٢	٥,٠٥	٠,٦			٦,٠٦			
	الإجمالي							١١٩,٧٠	١٢٥,٦٦	١٥,٩٦
مهندس الشركة					مهندس الهيئة					
										




دهانات داخلی

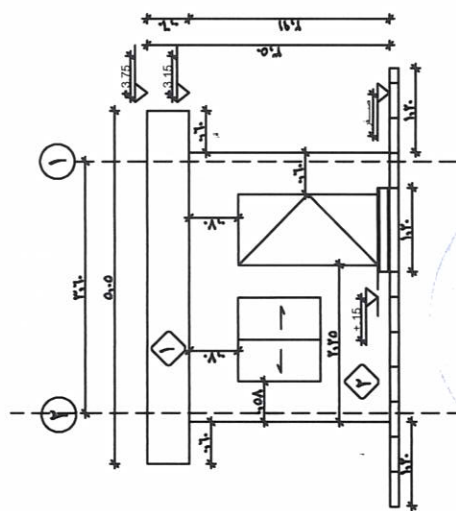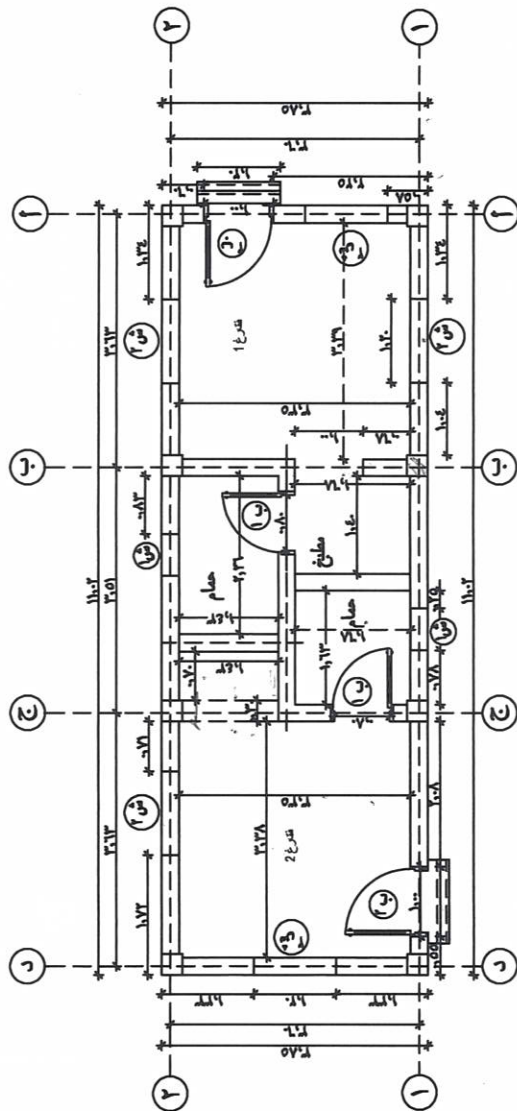

مهندس الشركة

سیرامیک ارضیات

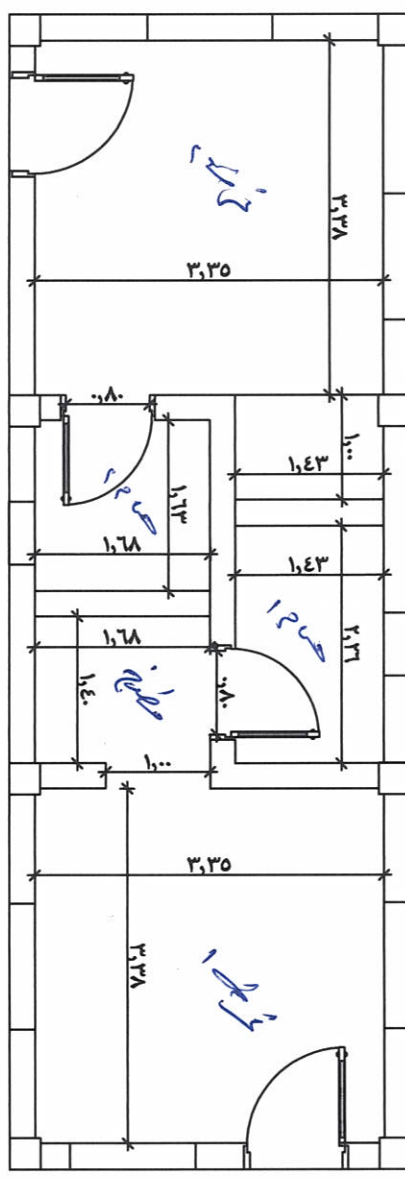



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


عملية انشاء اسوار حول قطعني الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي	
٦ م	بالمتر المسطح سيراميك حوائط							
	غرفة الامن							
	حمام ١	٢	٢,٣٦		٢,٩		١٢,١١	
		٢	١,٤٣		٢,٩		٨,٢٩	
	خصم شبك	١	٠,٦		٠,٦	٠,٣٦		
	خصم باب	١	٠,٨		٢,٢	١,٧٦		
	حمام ٢	٢	١,٦٣		٢,٩		٩,٤٥	
		٢	١,٦٨		٢,٩		٩,٧٤	
	خصم شبك	١	٠,٦		٠,٦	٠,٣٦		
	خصم باب	١	٠,٨		٢,٢	١,٧٦		
	مطبخ	٢	١,٤		٢,٩		٨,١٢	
		٢	١,٦٨		٢,٩		٩,٧٤	
	خصم باب	١	١		٢,٢	٢,٢٠		
	خصم سيار مطبخ							
	الإجمالي					٦,٤٤	٥٨,٤٦	٥٢,٠٢
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					



م. ج. تبارك

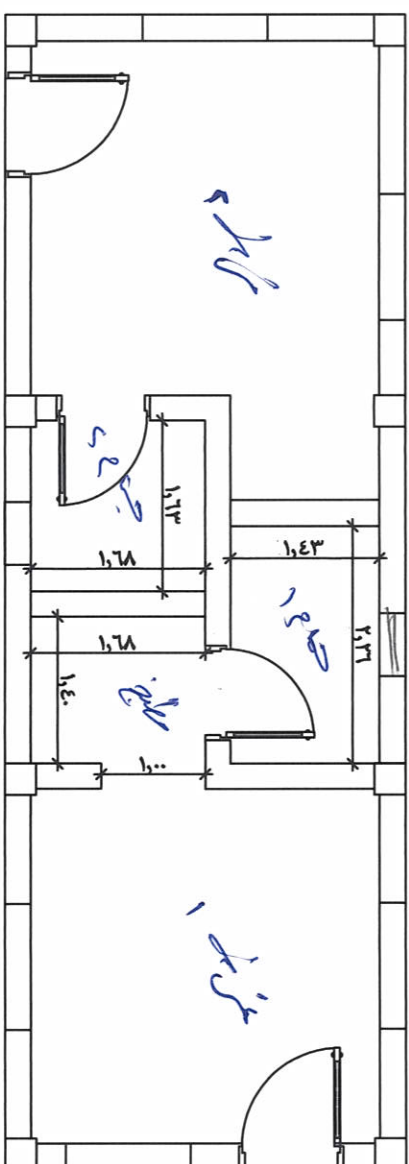

سيراميك حوائط




المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية




المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٨ م	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج حيرانيت محلي							
	عند الغرف	٨			١,١		٨,٨	
	عند باب الافراد	١			١,٥		١,٥	
							١٠,٣٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								

تذکرہ جمعہ

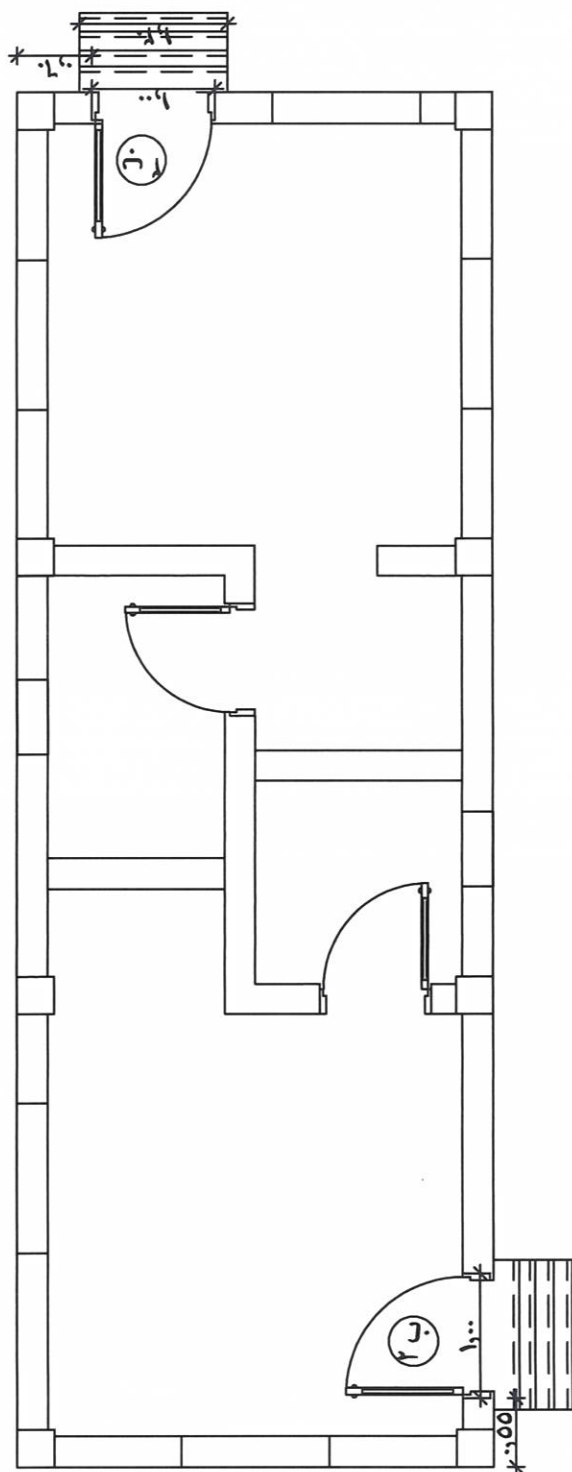



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعباط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٩ م	بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب رخام							
		٢			١		٢,٠٠	
		٢			٠,٨		١,٦٠	
							٣,٦٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٠ م	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول (مرفق كارتة) أوزان							
	شبابك حمام			١٢٠			١٢٠,٠٠	
	شبابيك غرف						٠,٠٠	
							٠,٠٠	
							٠,٠٠	
							٠,٠٠	
							٠,٠٠	
							١٢٠,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



مرفق كارتة اوزان

ميزان الوحدة المحلية بالبلدية

ميزان يسجل
الوحدة المحلية بالبلدية

التاريخ: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢

الوقت: ١٠ م

رقم السيارة: ٤٤٤٤

الوزن الاول قائم: ١٢٠

الوزن الثانى فارغ:

الصافى:

الحاج / محمود زغلـول : ٠١١١٨٠٣٠٠٧٤

الحاج / أحمد خطـاب : ٠١١٤٩٣٥٠٦٦٦

الاستاذ / محمود غنـيم : ٠١١٢١٨٦٩٥٧٢

الاستاذ / محمد رمضان : ٠١١١٩٢٢٧٩٤٥



العنوان: البلدية طريق مصر أسيوط الزراعى

الميزان يعمل ٢٤ ساعة



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١١ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب عظم موسكي							
	العرف	2	2.2	1			٤,٤٠	
	الحمام	٢	٢,٢	٠,٩			٢,٩٦	
							٨,٣٦	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٢ م	بالمتر المسطح شبايك الوميتال <u>صافي</u>							
	العرف	٥	١,٢	١,٢			٧,٢	
	الحمام	٢	٠,٦	٠,٦			٠,٧٢	
							٧,٩٢	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



ایوان و شبادیلک

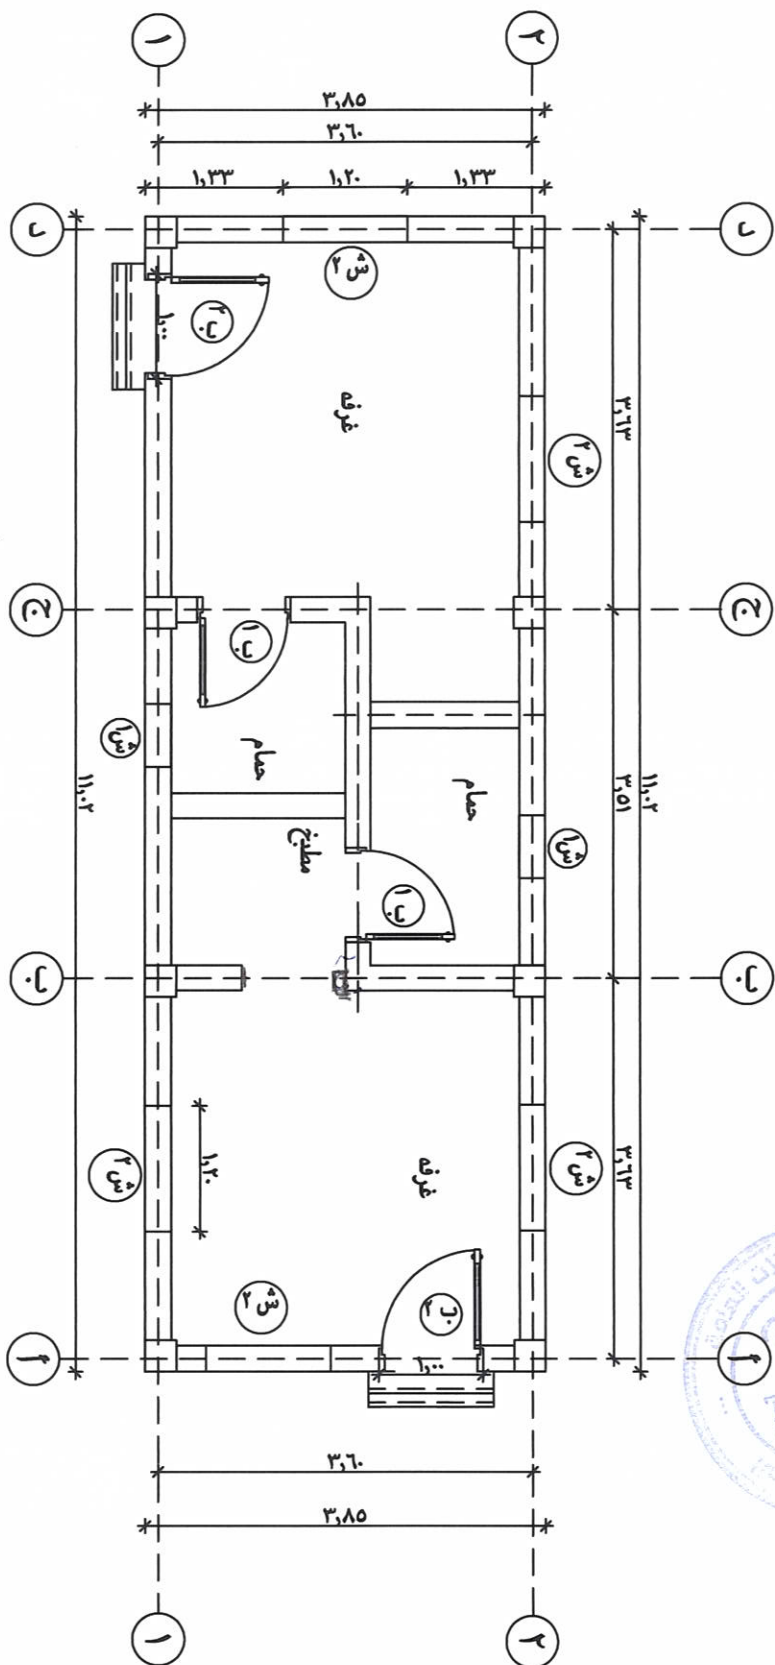



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٤ م	بالعدد مرحاض							
	حمام الغرف	2					٢,٠٠	



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٥ م	بالعدد حوض غسيل ايدي							
	حمام الغرف	2					٢,٠٠	





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزني	
١٦ م	بالعدد حوض مطبخ							
	حمام الغرف	1					١,٠٠	
							١,٠٠	
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								





المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٧ م	بالمتر الطولي مواسير ١ بوصة							
						٢٢,٧٠		



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٨ م	بالمتري الطولي مواسير ٢ بوصة							
		٢				<u>٤</u> ٥,٥٠	<u>٣</u> ١١,٠٠	تحت نظر عيا الطبيب
							<u>١١,٠٠</u>	
مهندس الشركة								مهندس الهيئة
								A 5




المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعني الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوران		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خضم	جزئي	
١٩م	بالمتر الطولي مواسير ٦ بوصة							
							٢٧,٨٠	
							٢٧,٨٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								

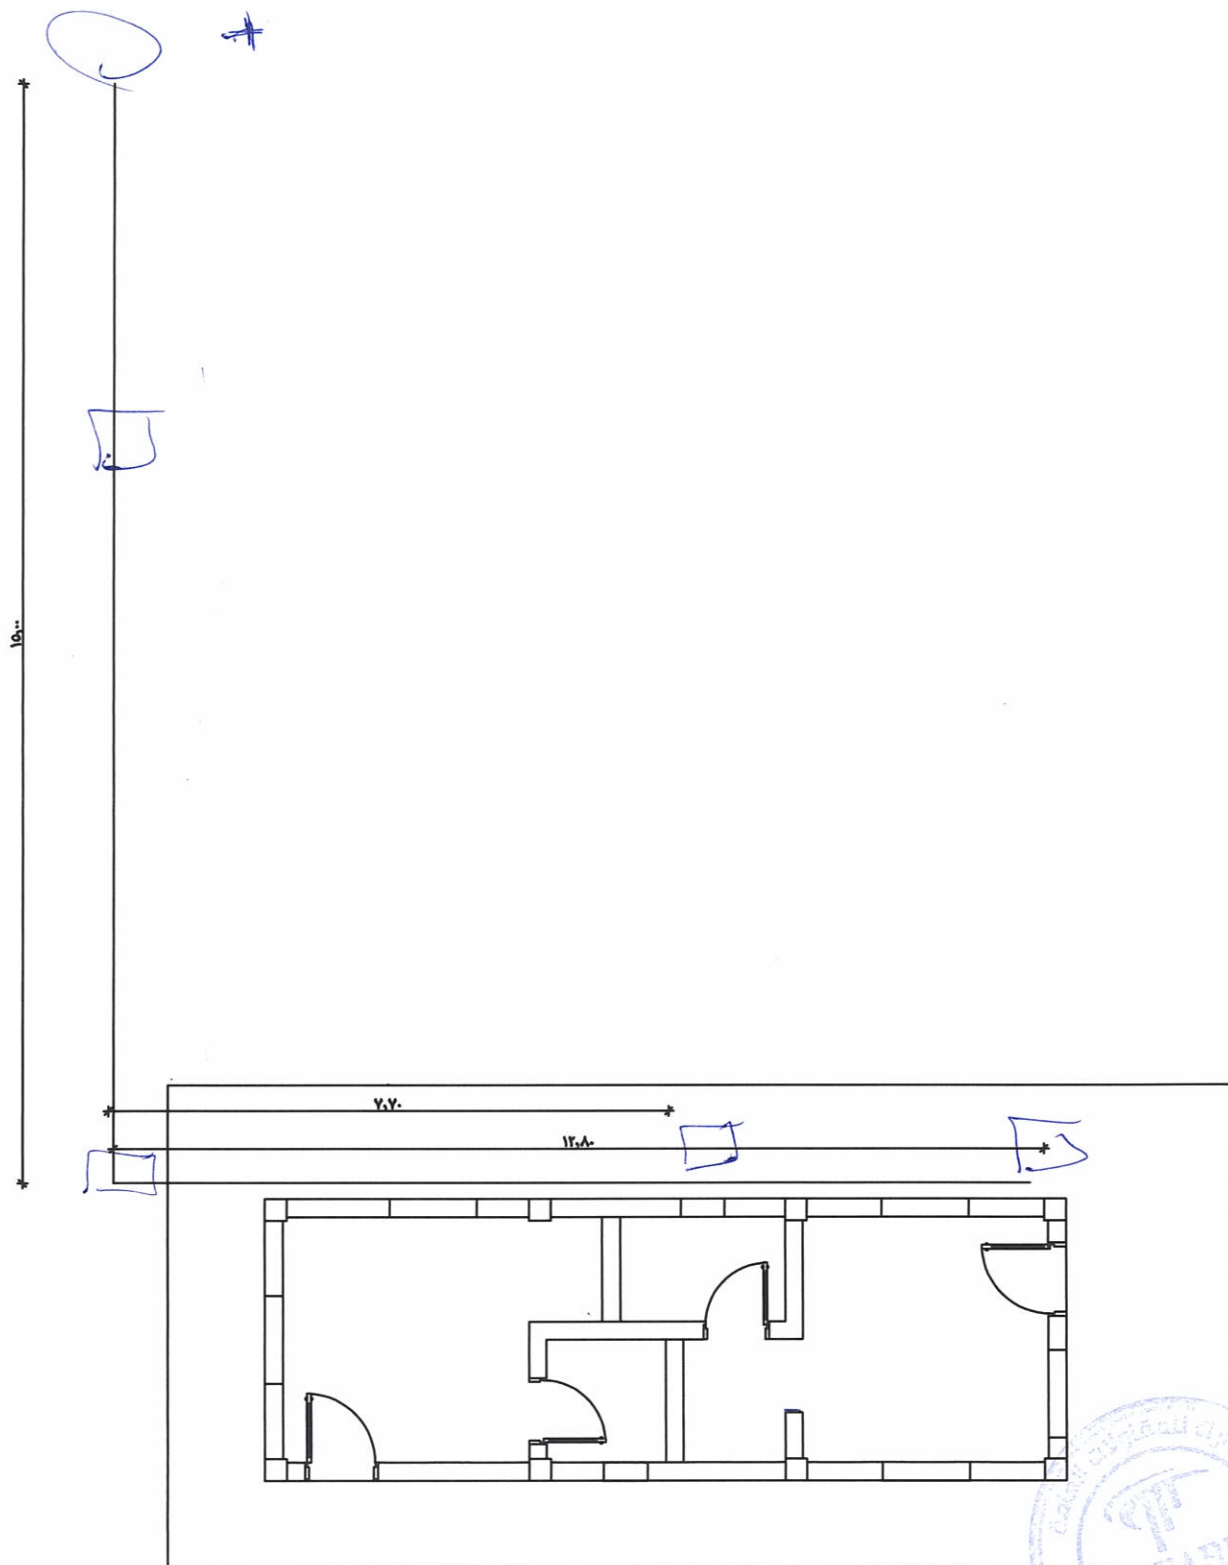

مواسير



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٠ م	بالعدد محبس دفن ٣/٤ بوصة							
		2					٢,٠٠	
							٢,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٢ م	بالعدد غرفة تفتيش							
		4					٤,٠٠	
							٤,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								




المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٤ م	بالعدد خلاط حوض مساح							
		2					٢,٠٠	
							٢,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٢٥ م	بالعدد خلاط حوض شجرة 							
		1					١,٠٠	
							١,٠٠	
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٣٦ م	بالعدد دش للحمام							
		2					٢,٠٠	
							٢,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٢٧ م	بالعدد سيفون أرضية							
		٢					٣,٠٠	
							٣,٠٠	
مهندس الشركة					مهندس الهيئة			
								





المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٨ م	بالعدد بيارة صرف							
		١					١,٠٠	
							</	

[illegible]

[illegible]



عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

[illegible]

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبيدة

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١م	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية (فينوس او ما يماثلها)							
		٢					٢,٠٠	
							٠,٠٠	




رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خضم	جزني	
٣م	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم دائره انارة شامل سلك سويدي							
	كشافات غرفه الامن	١					١,٠٠	
	كشافات غرفه المهندس	١					١,٠٠	
	حمام الغفير	١					١,٠٠	
	اوقيس	١					١,٠٠	
	حمام المهندس	٢					٢,٠٠	
	خارج المبني	٦					٦,٠٠	
							١٢,٠٠	١٢,٠٠
مهندس الشركة								مهندس الهيئة



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٤م	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم بريزة عادية شامل سلك سويدي							
	غرفه الغير	٦					٦,٠٠	
	غرفه المهندس	٦					٦,٠٠	
	حمام ١	٢					٢,٠٠	
	حمام ٢	٢					٢,٠٠	
	حمام اوفيس	٢					٢,٠٠	
							١٨,٠٠	١٨,٠٠
مهندس الشركة		مهندس الهيئة						
								

وحدة المنطقة المركزية بالعياط								
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٥٥	بالعدد توريد و تركيب دائرة فرعية لزوم مخرج ماتور او السخان شامل سلك سويدي ا							
	ماتور	١					١,٠٠	
	سخان الغفير	١					١,٠٠	
	سخان المدير	١					١,٠٠	



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


وحده المنطقة المركزية بالبليدة


[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٧م	مفتاح أنارة سكتين (two gang).							
	مهندس	١					١,٠٠	
							٠,٠٠	١,٠٠
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبلدة

وحده المنطقة المركزية بالبلدية								
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٩م	وريد وتركيب واختبار بربرة شوكو لقمة واحدة ١٦ امبير							
	غرفه الغفير	٦					٦,٠٠	
	غرفه المهندس	٦					٦,٠٠	
	حمام ١	٢					٢,٠٠	
	حمام ٢	٢					٢,٠٠	
	حمام اوفيس	٢					٢,٠٠	



عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

الإحما

مهندس الشركة

فر



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٢م	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ٣٦ وات							
	حمام الغفير	١					١,٠٠	
	حمام المدير	٢					٢,٠٠	
	الافيس	١					١,٠٠	
	خارج المبنى	٤					٤,٠٠	



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جرني	
١٤م	بالعدد توريد و تركيب شفاط ٣٠*٣٠ توريندو							
	حمام العغير	١					١,٠٠	
	حمام المهندس	١					١,٠٠	



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبلدية


رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٥م	بالعدد توريد و تركيب مانور مياه ١ حصان							
	للغرف	١					١,٠٠	






المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٦م	بالعدد توريد وتركيب سخان سعه ٥٠ لتر							
	حمام واوفيس الصغير	١					١,٠٠	
	حمام المهندس	١					١,٠٠	
	الإجمالي						٢,٠٠	٢,٠٠
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								

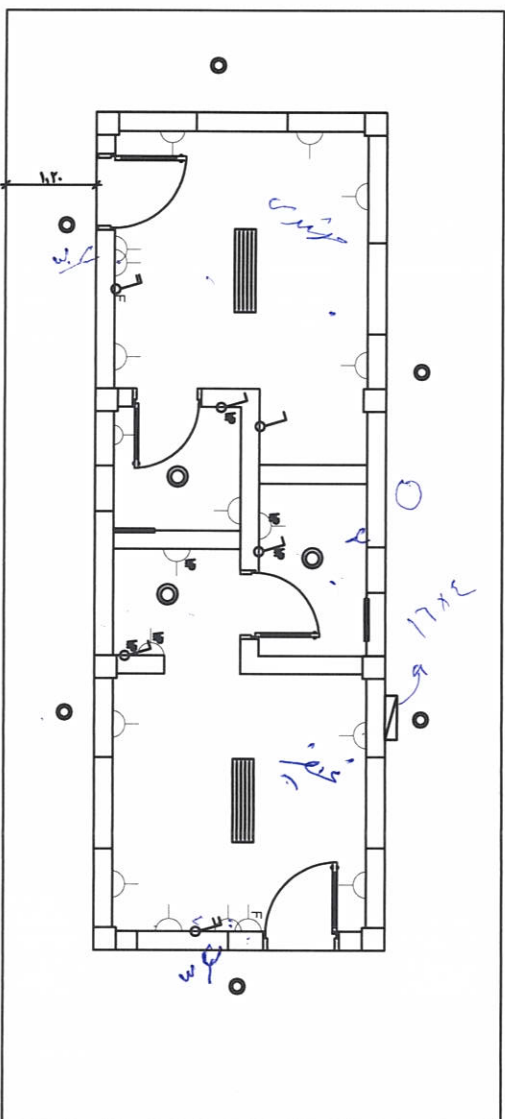

الوصف	الرمز
بریزه شوکه بقدره ۱۲ امیر	
بریزه شوکه بقدره ۱۲ امیر متضاد للمياه	
صندردوق بالارض بحد ۲ بریزه شوکه بقدره ۱۲ امیر + ۱ مخرج تلفیون + مخرج معلوميات	
لوحه توزيع ۱۸ خط	
مفتاح جرس	

الوصف	الرمز
کشاف ۱۶۰۰ بقدره ۳۱ وات	
کشاف ۱۲۰۰ بقدره ۳۱ وات	
سبوت بقدره ۱۸ وات	
وحده اتصاله دائریه لید بقدره ۳۱ وات	
مفتاح اناره احدى ۱۰ امیر	
مفتاح اناره احدى ۱۰ امیر مضاد للمياه	
مفتاح اناره قنای ۱۰ امیر	
مفتاح اناره قنای ۱۰ امیر ضاد للمياه	
لوحه شوارع	
کشاف واجحات ۱۰۰ وات ۲۲۰ فولت	
ابلیک حوض	
شفاط حمامه او مطبخ	



ومشون بمخازن العيثة وابعاده طبقا للطبيعة

لوحة مباني الممرات - سور البريكاست
من الواقع
عبد السلام

PREPARED	CHECKED	ISSUED	DATE

المشروع
انشاء اسوار حول قطعتي
المجاورة لوحدة صيانة البلدية

المالك
الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)

المقاول
شركة تبارك للمقاولات

DRAWING NAME

