



الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدمام

مقايمة معدلة لمصلحة رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر / (القطاع الرابع) بطول 3 كم - مرآل الصليبية - محافظة الشرقية
مطالبة : شركة اليوسف للمقاولات

م	الهند	الوحدة	القيمة (جنية)	الكمية	الاجمالي (جنية)
١	بالشتر المصمم أصل توريب واستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية . تسوية سطح بلاط تسوية وارش بدماء الاسفلتية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة . وذلك الجهد بالمقاييس للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القياسية) . ويصل على اليد بعمل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ م من محور الطريق ويتم تنفيذ طبقة التأسيس التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة . ويتم بجميع مشتملاته طبقا لأسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢١,٦٨	٧١٠,٦٧	١٧٨٦٦٨
١-٢	بالشتر المصمم أصل توريب وتشغيل تربة صلابة الترم ومطابقه للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والاكفاف (نسبة لعمل الفيورنيا لا تقل عن ٩٠%) ورشها بدماء الاسفلتية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة . وذلك الجهد بالمقاييس للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القياسية) . ويتم تنفيذ طبقة التأسيس التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة في مناطق شتتا نات الطيعة الزراعية الثقيلة والتفتت المرورية العاليه أو داخل المدن السكنية المرصعة والتيه بجميع مشتملاته طبقا لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . لمسافة التقل ٩٠ كم والسعر لا يشمل المادة المعجربة مع قيام الشركة باستلا بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة التسوية عن المعايير.	٢م	١١٨,٥	١	١١٨,٥
٢-٢	بالشتر المصمم أصل توريب وتشغيل تربة صلابة الترم ومطابقه للمواصفات وتشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشغيل الجسر والاكفاف (نسبة لعمل الفيورنيا لا تقل عن ٩٠%) ورشها بدماء الاسفلتية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة . وذلك الجهد بالمقاييس للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القياسية) . ويتم تنفيذ طبقة التأسيس التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة في مناطق شتتا نات الطيعة الزراعية الثقيلة والتفتت المرورية العاليه أو داخل المدن السكنية المرصعة والتيه بجميع مشتملاته طبقا لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . لمسافة التقل ٩٠ كم والسعر لا يشمل المادة المعجربة مع قيام الشركة باستلا بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة التسوية عن المعايير.	٢م	١١٨,٥	١	١١٨,٥
٣	بالشتر المصمم أصل تكسير وإزالة المسطحات المتهالكة بالرفع العالي في الأماكن التي يحدثها المهندس المشرف . ونقل نتج التكسير خارج الموقع ومتوسط سعة التقل حتى ١٠ كم وحمل ما يتم تحويل العمل طبقا لرخصة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . مسافة نقل لا تقل عن (٣٥) كم .	٢م	١٠٢	١١٠٠	١١٨٢٠٠
٤	بالشتر المصمم أصل توريب وارش طبقا لأساس من الأبعاد الفنية المتكررة لنجج تكسير القسرات والصقلية للمواصفات والترح التوريب بالاشترافات العامة والخاصة بالمساروح ٧ نقل نسبة تحمل الفيورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة التقل بجهل لوس الجولوس عن ٩٠% والأزيد الاستعاض عن ٩٠% مع فرش على طبقات باستخدام آلات تسوية المعينة على الأزيد سكت الطيعة على ٢٠ سم ورشها بدماء الاسفلتية الوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة . وذلك الجهد بالمقاييس للوصول إلى أقصى كثافة جافة قياسية ويتم تنفيذ طبقة الاسفلت الصناعية ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة التقل ٢١٠ كم والسعر يشمل المادة المعجربة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة التسوية عن المعايير.	٢م	١٨٢,٣٥	١١٥٠٠	٢١٠٢٠٣٥
٥	بالشتر المسطح أصل توريب وارش طبقا لتسوية من البترمين السائل متوسط لتطير H.C.S.D بمعدل ١,٢ م/م ٢ فرش طبقا للأساس بعد تمام عملها وتطهيرها جيدا ويتم تنفيذ طبقا القطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة . ويتم بجميع مشتملاته طبقا لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٥٨	٣٨١٠٠	٢٢٠٩٨٠٠
٦	بالشتر المسطح أصل توريب وارش طبقا رابطة من الفرسة الاسفلتية بسك ١ سم بعد ذلك باستخدام احوار اسلبة لنجج تكسير القسرات والبيترمين المصنوب ١٠/٧٠ واد شرفة التصر بالجس أو مملتها والقبة لتشمل انحاء التجارب المدنية والمطبة على المملوط وعلى السواد المستخدمة ويتم تنفيذ طبقا لقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المعتمدة . ويتم بجميع مشتملاته طبقا لاسول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٢١٢	٢٢٢٠٠	٢٤٨٢٠٠

مهندس الزينية
الكمبيوتر
مهندس

للجنة الشركة
مهندس الزينية
مهندس



الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدمام

مقاييس معجلة لتشييد رواق كفاءة طريق سعود / سان الحجر / (القطاع الرابع) بطول ٣ كم - مركز الصناعية - محافظة الشرقية
مقاييس : شركة اليوسف للمقاولات

م	البيانات	الوحدة	الكمية (جنية)	الكمية	الاجمالي (جنية)
٧	بالمتر المسطح اصال توريد ورش طبقة الاسفلت من البترمين السائل سريع التصلب RC3000 بمعدل ٠.٠٥ كم/م ² فرش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دملها وتطليها جيدا ويتم تشطيب طبقة التفتحات العرضية التسوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	٢٠	١	٢٠
٨	بالمتر المسطح اصال تشاء طبقة سطحية من الفرسة الاسفلتية بسك ٥ سم بعد دمل باستخدام احمول اسفلت ناتج تسير الكسارات والبيترمين الصلب ١٠/٢٠ وقرش سرعة التمر بالسويس او مايعادلها والفئة تشمل اجراء انجارب المعالجة والتفتحات على المفلوظ وعلى السواء المستقيمة ويتم تشطيب طبقة التفتحات العرضية التسوية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	١٧١	١	١٧١
٩	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب براديرة اسفلتية (عشاري) بالبعد ٠.٠٢٠x٢.٠x٢.٠ سم مصترحة تتكون من ٠.٨ م ² من ملموت الازيد الكبر بعد التعبيات عن ١.٥ سم ٢٠.٤ م ² رمل ٢٠.٤ م ² / ٢٠.٤ سم اسفلت ويتم تركيب البراديرة على قرشة من الفرسة المعوية سك ١٠ سم ويعرض ٣٠ سم طبقة المفلوظ والتفتحات التصميمية ويصير لا تزيد التفتحات عن ٢ سم والتي تشمل بونولة من الاسفلت والرمل بنسبة ١:٢ البراديرة والسور يشمل التسوية اسفل البراديرات ويتم تشطيب طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	١١٢	١	١١٢
١٠	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب براديرة اسفلتية (وسط) بالبعد ٠.٠٣٠x١.١x١.١ سم مصترحة تتكون من ٠.٨ م ² من ملموت الازيد الكبر بعد التعبيات عن ١.٥ سم ٢٠.٤ م ² رمل ٢٠.٤ م ² / ٢٠.٤ سم اسفلت ويتم تركيب البراديرة على قرشة من الفرسة المعوية سك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقة المفلوظ والتفتحات التصميمية ويصير لا تزيد التفتحات عن ٢ سم والتي تشمل بونولة من الاسفلت والرمل بنسبة ١:٢ البراديرة والسور يشمل التسوية اسفل البراديرات ويتم تشطيب طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	١٢٥	١	١٢٥
١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الاتراكود الفرسي طبقة التهيئة المعتمدة واجهده ٢٠٠ كم/م ² وتكون المسطوح يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسك ١٠ سم في الاسفلت المرشحة على التروحات التصميمية ومعدل على الفئة جميع مايزم للتركيب والتفتحات وانجز الاصل طبقا لاصول الصناعة طبقا ١٠x٢٠٠x١٠٠ م	م ²	١٧٩	١	١٧٩
١٢	بالمتر اصال راقع ارض خلط منسوب المفلوظ وراقع التفتحات الخاصة بالمرافق (مياه - صرف - حتى منسوب الرصيف الجديد ويتم تشطيب طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ²	٢٠٢٤٠	٢٢	٢٠٢٤٠
١٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب البلاعات مطر مزودة بطلاء GRB معمل عليها مواسير PVC قطر ١٦ بوصة ويحفظ ٦ متر والفئة تشمل اصال قمار والفئة الجهد وصل سفلة من الرمال الثقيلة اسفل الماسورة وال مايزم لاجراء الاصل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م/م	١١٧٠٠٠	٢٦	١١٧٠٠٠
١٤	بالمتر الطولي اصال توريد وتشاء حائط من الفرسة المسطحة بتقريب جلاس (لوجرس) وجه واحد ٨٠ سم طبقة الترسومات على ان يكون وجه الفرسة (FAIR FACE) بمحتوي اسفلت لا يقل عن ٣٥٠ كم/م ² واجهه لا يقل عن ١٥٠ كم/م ² والفئة تشمل عمل قرشة من الفرسة المعوية سك ١٠ سم ويعرض ٦٠ سم اسفل المائل والواجهه لا يقل عن ٢٠٠ كم/م ² والسور يشمل توريد وتثبيت الانشور ٦ اسماخ قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم تشطيب طبقة لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة بجميع مشكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م/م	١٥٢,٠٣	١	١٥٢,٠٣

مهندس المنطقة
محمد السيد العلي

مهندس المنطقة
محمد السيد العلي



الإدارة المركزية بمنطقة شرق الدلتا

مطالبة معلة لاسية ورفع لقادة طريق سحر / صان الحجر / (القطاع الرابع) بطول 3 كم - مركز الحسينية - محافظة الشرقية
مقولة وشركة اليوسلف للمقاولات

م	البلد	الوحدة	الكل (جنية)	القسم	الاجملي (جنية)
١٥	احصل توريد وتركيب مواسير سائلة التجهيز من الفرسة المستلمة بالانظر الداخلية السيلة رسمه اسم بنسبة الخط (350) كجم استلمت مقوم لتقريبات ٠.٨٥ م (خط ٠.٨٥ م) (٢٠٠ م) (استخدام سيلة من حديد التسليح المشرشر على المقوم رتبة ٣١/٥٢٢ بمعدل (5 قطر ١٠٠ سم) (لتر الخولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل (6 قطر ١٦ سم) (لتر الخولي في الاتجاه المعودي مع تدعيم لهابلات الماسورة بافوس من الحديد مع عزل الوصلات بالفتيش السطرن والقة شغلة اصل الحفر حتى منسوب التسمسي وزح المياه وحمل السدود والقة غير شغلة قدم بالرمال حول واطي السوسير ويتم التثابة ويتم التثابة طبقا لتعليمات المنطقة المتكاسة والرسومات المتشدة والركة واليه لا يشمل الجلب واليه لا يشمل اصل الحفر طبقا لوصفات الهبة وتعليمات المهندس المشرف وال ما يلزم تهور اصل بطر الخولي طبقا لاتي	ط/م	١١١١	١	١١١١
	مواسير قطر ١٠٠ سم				
١٦	احصل توريد وتركيب مواسير سائلة التجهيز من الفرسة المستلمة بالانظر الداخلية السيلة رسمه اسم بنسبة الخط (350) كجم استلمت مقوم لتقريبات ٠.٨٥ م (خط ٠.٨٥ م) (٢٠٠ م) (استخدام سيلة من حديد التسليح المشرشر على السكورة رتبة ٣١/٥٢٢ مع تدعيم لهابلات المقورة بافوس من الحديد مع عزل الوصلات بالفتيش السطرن والقة شغلة اصل الحفر حتى منسوب التسمسي وزح المياه وحمل السدود والقة غير شغلة قدم بالرمال حول واطي السوسير ويتم التثابة ويتم التثابة طبقا لتعليمات المنطقة المتكاسة والرسومات المتشدة والركة واليه لا يشمل الجلب واليه لا يشمل اصل الحفر طبقا لوصفات الهبة وتعليمات المهندس المشرف وال ما يلزم تهور اصل بطر الخولي طبقا لاتي	ط/م	١٢٢٢	١	١٢٢٢
	مواسير قطر ٧٠ سم				
١٧	بالشتر التسليم اصل توريد وصب خرسانة عادية لاسية مواسير الرابع والحوط السيلة طبقا لرسومات التثابة ذات معنوي استلمت ٢٠٠ كجم/م استلمت بورتلاندي مع السك الميكانيكي على ان تحاقل الخرسانة رتبة ٧ نل عن ٢٠٠ كجم/م ويتم التثابة طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتشدة واليه لا يشمل جميع مشتلاته طبقا لوصفات الهبة العامة للطرق والهارر وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١٢٠٠,١٩	١	٢١١١,٩٨
١٨	بالشتر التسليم خرسانة عادية للحوط السيلة للطريق لزوم اصل الخرسانة او مقلية استن الاظهارات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط السك ميكانيكي على الا نل المقومة لخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٢٠٠ كجم/م سم بمحتوي استلمت ٣٠٠ كجم/م استلمت بورتلاندي على والسعر يشمل تصميم الخلطة والفرم للحصول على سطح استن (Elev. face) للاسطح القاعرة وحمل السدود الازمة (المنسبة) وزح المياه وسد جوتب الحفر فا لزم الاسر والازمة لواتج الحفر والقدم من السجري السلي (ازالة المنسبة) حتى المنسوب التسمسي او حسب طبيعة العمل وذلك طبقا لشروط والوصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويشمل سعر التشغيل والحفر حتى منسوب التسمسي	٢م	٢٦٠٠	١	٢٦٠٠
١٩	بالشتر التسليم توريد وتشغيل طبقة اعلال من (اسن ٠٠٠ م) بنسبة ١:٢ موزدة من خارج الدواغ حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الفرغ طبقات لا يزيد سكه اي عليها عن ٢٠ سم مع الراس بكمياء والسك جدا باستخدام الات السك الميكانيكي الترسول في السلي شغلة جافة وال ما يلزم تهور العمل فلاما طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٢٢٠	١	٢٢٠
تقريبات					
١	توريد وتشغيل تراب	٢م	١٢	١	١٢
٢	توريد وتشغيل طبقة اسفل	٢م	٢٥	١١٥٠٠	٢٥٧٥٠٠
٣	توريد وتشغيل طبقة اسفل	٢م	٣	٢٢٢٠٩	١١١٠٢
الاجملي					
١٥٠٠٠٠٠					

لينة
مفوض
مفوض

مفوض
مفوض

مفوض
مفوض
مفوض



اسم المشروع : الاعمال المتبقية على طريق سعود / صان الحجر " القطاع الرابع "

تنفيذ شركة : اليوسف للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/٢٢

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : م / احمد سمير

بيان العينات :-

عدد (٢) عينة مخلوط أسفلتي طبقة رابطة (د٣)

ختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت وتحديد الثبات والانسياب بطريقة مارشال

الرابطة (د٣)

النتائج :-

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي	ك ١,٠٥٠	ك ٠,٧٠٠	المهزات
100	100	100	100	مهزة سعة 1"
100 75	95.1 85.1	95	97	3/4"
70 45	58.4 48.4	60	61	3/8"
50 30	37.1 30	35	33	#4
35 20	24.6 20	22	23	8#
20 5	15.5 9.5	14	13	30#
12 3	9.3 3.3	7.6	6.7	50#
8 2	5.7 2.7	4.5	4.3	100#
4 0	4.0 2.2	2.7	3.1	200#
	4.95 4.45	4.63	4.67	نسبه الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم		1723	1718	الثبات بالكجم
2-4		3.3	3.2	الانسياب بالمم
300-500		522	537	الجساءة بالكجم / مم

العينات تخرج عن حدود المواصفات في المهزات المشار اليها وكذلك الجساءة

العينة تتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية

ملحوظة : تم مقارنة التدرج التصميمي للخلطة الأسفلتية (د٣) بالتصميم الوارد من المعامل المركزية رقم (١٧٥/٥٢٢) بناء على طلب الشركة وموافقة جهاز الاشراف

العينات مسنولة من احضرها

ج/ التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
مخلوط أسفلتي	2	650	1300
قالب مارشال	4	205	820
م. اعداد تقرير			250
قيمة التجارب			2370
ض. ق. م ١٤ %			331.80
الإجمالي			2701.80

٢٠٢٥/٠٤/٠٧

تحريراً في :

مهندس المعمل / M. H. H.

مدير المعمل


مهندس / M. H. H.

منار السيد عبدالله

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / M. H. H.

سلوى سامى صالح

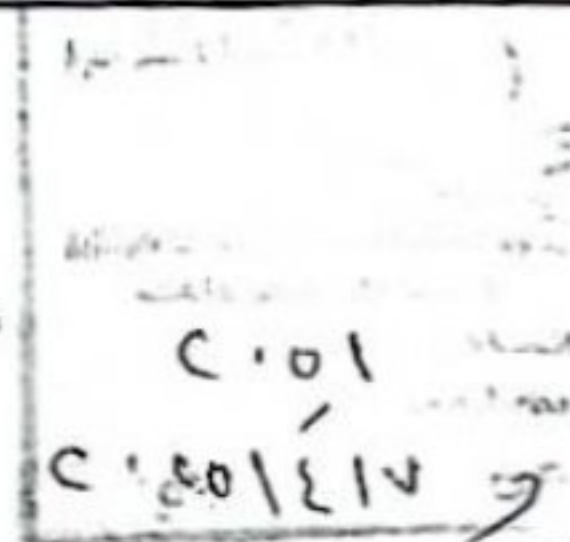

تنفيذ شركه :	اليوسف للمقاولات
--------------	------------------

بيان العيّنات :-

خَبَرَاتُ النَّبِيِّ اجْزَيْتَ عَلَيْهَا :-

الرابطة (د۳)

النتائج :-

العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

٢٠٥٢
٢٠٥١

تحريراً في :

مدير العمل

هناك

منار المريد عبدالله

اسم المشروع	رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع)
تنفيذ شركته	اليوسف للمقاولات

تقرير معماري رقم (٦٥) لسنة ٢٠٢٥

بيانات إدارية :- قام بإحضار العينات : م / أحمد سمير بتاريخ : ٢٠٢٥/١/٢٧

بيان العينات :- عدد (٢) عينة مخلوط أسفلتي لطبقة الرابطه (٢) من مواقع مختلفة .
الاختبارات التي أجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المعدات	ك ١,٥٥٠	ك ١,٩٥٠	التدرج التصميمي	المواصفات (د٣)
١"	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٢/٤"	٩٥	٩٥	٩٥,١	٧٥
٢/٨"	٦٣	٦٣	٥٨,٤	٤٥
٤"	٣٥	٣٥	٢٧,١	٢٠
٨"	٢٣	٢٣	٢٤,٦	٢٠
٣٠"	١٤	١٤	١٥,٥	٥
٥٠"	٧	٧	٩,٣	٣
١٠٠"	٥	٥	٥,٧	٢
٢٠٠"	٢,٨٨	٢,٦١	٥,٢	٢,٢
نسبة الاسفلت %	٤,٦٤	٤,٦	٤,٩٥	٤,٤٥
الثبات بالكم	١٥٧٠	١٤٩٠	لا يقل عن ١٠٠٠ كم	
الانسياب بالمم	٣,١	٢,٩	٢-٤	
الجماءه كجم/م	٥٠,٦	٥٠,١٤	٥٠٠-٣٠٠	

العينة تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمعدات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية .
تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزية الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ بناء على طلب الشركة وموافقة جهاز الاشراف .

ملحوظة : العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٢	٦٥٠	١٣٠٠
مارشال	٤	٢٠٥	٨٢٠
م . اعداد تقرير			٢٥٠
قيمة التجارب			٢٣٧٠
ض.ق.م ١.٤ %			٢٣٨,٨
الاجمالي			٢٧٠١,٨

تجربيا في : ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

مهندس المعمل : د. م. م. م. م.

رئيس الاداره المركزيه

مدير المعمل

مهندس / عمر
سلوي سامي صالح

العمارة العامة
الادارة العامة للعلوم والتكنولوجيا

إ. م. م. م.


مهندس /
منار السيد عبد الله

السادس ٩١٥


٢٢

إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
حصر مستخلص جارى 6			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
1	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة بالمتر المكعب	م3	7095.375
3	اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة بالرصف الحالى	م3	4075.5
4	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	م3	11498.24
5	اعمال انشاء طبقة تشريب MC30	م2	38092.91
6	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة	م2	22263.5
12	اعمال رفع وخفض غرف الصرف الصحي	عدد	55
13	بالمتر الطولي توريد وتركيب بلاعات المطر مزودة بغطاء GRP	عدد	26

مهندس الهيئة




مهندس الشركة




المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"				
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات				
مستخلص 6 جاري				
اجمالي بند رقم 5 :اعمال انشاء طبقة تشريب MC30				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الملاحظات
5	اعمال انشاء طبقة تشريب MC30	م2	1323.75	تشريب ايسر
			7110.63	تشريب ايمن
			29658.53	باقي القطاع
اجمالي كمية طبقة التشريب (م2)			38092.91	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 6 جاري			
بند رقم 5 : اعمال انشاء طبقة تشريب MC30			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
75	9.4		
100	7.9	8.65	216.25
125	6.8	7.35	183.75
150	7.5	7.15	178.75
175	8.3	7.9	197.50
200	7.4	7.85	196.25
225	6.7	7.05	176.25
250	7.3	7	175.00
اجمالي الكمية (م2)			1323.75

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

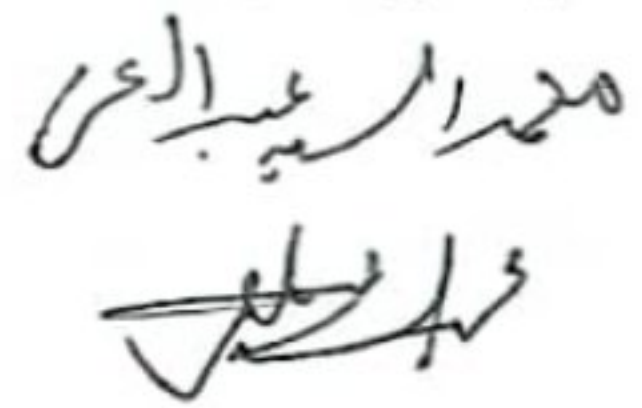

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 6 جاري			
ند رقم 5 : اعمال انشاء طبقة تشریب MC30			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
0	16.20		
25	16.50	16.35	408.75
50	15.50	16.00	400
75	15.70	15.60	390
كم	العرض	م. العرض	الكمية م2
75	6.30		
100	6.30	6.30	157.5
125	6.20	6.25	156.25
150	6.90	6.55	163.75
175	7.50	7.20	180
200	6.40	6.95	173.75
225	6.45	6.43	160.625
250	6.20	6.33	158.125
كم	العرض	م. العرض	الكمية م2
250	13.50		
275	14.30	13.90	347.5
300	13.00	13.65	341.25
325	11.40	12.20	305
350	14.60	13.00	325
375	13.00	13.80	345

١٠٦
الحسينية
محافظة الشرقية


محمد عبد الله
مدير المشروع

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 6 جاري			
ند رقم 5 : اعمال انشاء طبقة تشريب MC30			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
400	11.00	12.00	300
425	13.10	12.05	301.25
450	9.00	11.05	276.25
475	11.30	10.15	253.75
500	10.50	10.90	272.5
525	10.00	10.25	256.25
550	11.40	10.70	267.5
575	11.90	11.65	291.25
600	10.70	11.30	282.5
625	12.40	11.55	288.75
650	12.25	12.33	308.125
اجمالي الكمية (م2)			7110.625

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

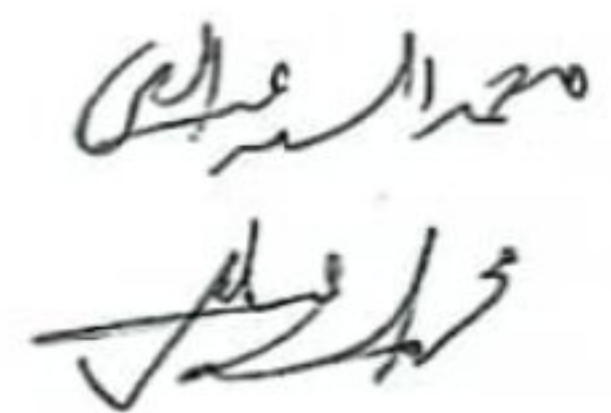

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 6 جارى			
بند رقم 5 : اعمال انشاء طبقة تشرىب MC30			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
650	6.3		
675	7.05	6.68	166.88
700	7.25	7.15	178.75
725	7.55	7.40	185.00
750	7.95	7.75	193.75
775	8.35	8.15	203.75
800	8.2	8.28	206.88
825	8.5	8.35	208.75
850	7.9	8.20	205.00
860	7.9	7.90	79.00
650	5.95		
675	6.7	6.33	158.13
700	7.25	6.98	174.38
725	6.15	6.70	167.50
750	7.5	6.83	170.63
775	8.5	8.00	200.00
800	10	9.25	231.25
825	10.2	10.10	252.50
850	8.8	9.50	237.50
860	8	8.40	84.00
860	15.9		
875	14.7	15.30	229.50
900	13.1	13.90	347.50
925	12	12.55	313.75
950	11.7	11.85	296.25
975	10.65	11.18	279.38
1000	9	9.83	245.63
1025	11	10.00	250.00
1050	9.75	10.38	259.38
1075	8.9	9.33	233.13
1100	9.1	9.00	225.00
1125	10.9	10.00	250.00

١٠٤ / ١٠٤
 محمد عبد الله
 محمد عبد الله

محمد عبد الله
 محمد عبد الله

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 6 جارى			
بند رقم 5 : اعمال انشاء طبقة تشريب MC30			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
1150	10.7	10.80	270.00
1175	9.5	10.10	252.50
1200	9.4	9.45	236.25
1225	8.9	9.15	228.75
1250	9.7	9.30	232.50
1275	9.1	9.40	235.00
1300	10.7	9.90	247.50
1325	11.2	10.95	273.75
1350	11.1	11.15	278.75
1375	11	11.05	276.25
1400	10.8	10.90	272.50
1425	9.9	10.35	258.75
1450	10.5	10.20	255.00
1475	11.1	10.80	270.00
1500	11.1	11.10	277.50
1525	11.5	11.30	282.50
1550	10.5	11.00	275.00
1575	11.5	11.00	275.00
1600	10.75	11.13	278.13
1625	10.45	10.60	265.00
1650	11.3	10.88	271.88
1675	9.8	10.55	263.75
1700	10.7	10.25	256.25
1725	11.2	10.95	273.75
1750	10.9	11.05	276.25
1775	11.75	11.33	283.13
1800	12.2	11.98	299.38
1825	11.2	11.70	292.50
1850	12.5	11.85	296.25
1875	13.3	12.90	322.50
1900	13.45	13.38	334.38
1925	11.9	12.68	316.88
1950	11.95	11.93	298.13
1975	13.7	12.83	320.63

20/12/2019

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ/ شركة البوسف للمقاولات			
مستخلص 6 جاري			
بند رقم 5 : اعمال انشاء طبقة تشرىب MC30			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
2000	12.9	13.30	332.50
2025	13.7	13.30	332.50
2050	14.7	14.20	355.00
2075	12.2	13.45	336.25
2100	14.4	13.30	332.50
2125	13.1	13.75	343.75
2150	14.2	13.65	341.25
2175	13.5	13.85	346.25
2200	13.5	13.50	337.50
2225	13	13.25	331.25
2250	12.6	12.80	320.00
2275	11.5	12.05	301.25
2300	11.6	11.55	288.75
2325	12.25	11.93	298.13
2350	12.25	12.25	306.25
2375	12.2	12.23	305.63
2400	11.6	11.90	297.50
2425	11.4	11.50	287.50
2450	12.2	11.80	295.00
2475	13.5	12.85	321.25
2500	13	13.25	331.25
2525	15.2	14.10	352.50
2550	12.1	13.65	341.25
2575	11.7	11.90	297.50
2600	11.3	11.50	287.50
2625	11.45	11.38	284.38
2650	11.05	11.25	281.25
2675	10.9	10.98	274.38
2700	11.25	11.08	276.88
2725	11.2	11.23	280.63
2750	11	11.10	277.50
2775	11.25	11.13	278.13
2800	11.25	11.25	281.25
2825	11.25	11.25	281.25

١٠٣
 محمد
 محمد


محمد
 محمد

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسيديه - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص G جارى			
بند رقم 5 : اعمال انشاء طبقة تشريب MC30			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
2850	10.8	11.03	275.63
2875	10.75	10.78	269.38
2900	11	10.88	271.88
2925	12.15	11.58	289.38
2950	12.45	12.30	307.50
2975	12.6	12.53	313.13
مدخل الكوبرى 1			
0	29.7		
25	13.6	21.65	541.25
50	10.2	11.90	297.50
مدخل الكوبرى 2			
0	8.6		
47	8.6	8.60	404.20
مدخل 1	3.9	4.00	15.60
مدخل 2	11.5	7.40	85.10
مدخل 3	8	4.00	32.00
مدخل 4	6	6.30	37.80
مدخل 5	4.5	6.40	28.80
مدخل 1	4.4	6.5	28.60
مدخل 2 (مجلس المدينة)	27	5.4	145.80
مدخل 3	25	6.5	81.25
مدخل 4	19	12.5	118.75
اجمالى طبقة التشريب (م2)			29658.53

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

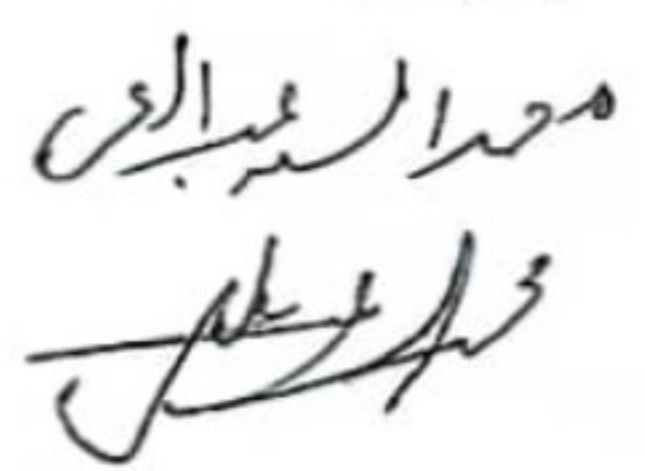


إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"				
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات				
مستخلص 6 جارى				
اجمالى بند رقم 6 :اعمال توريد وفرش طبقة رابطة				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م2)	
6	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة	م2	19733.5	السابق
			2530	الحالى
اجمالى كمية الطبقة الرابطة (م2)			22263.50	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




اعمال رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 5 جارى			
بند رقم 6 : اعمال توريد ولرش طبقة رابطة			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
1450	10.5		
1475	11.1	10.80	270.00
1500	11.1	11.10	277.50
1525	11.5	11.30	282.50
1550	10.5	11.00	275.00
1575	11.5	11.00	275.00
1600	10.75	11.13	278.13
1625	10.45	10.60	265.00
1650	11.3	10.88	271.88
1675	9.8	10.55	263.75
1700	10.7	10.25	256.25
1725	11.2	10.95	273.75
1750	10.9	11.05	276.25
1775	11.75	11.33	283.13
1800	12.2	11.98	299.38
1825	11.2	11.70	292.50
1850	12.5	11.85	296.25
1875	13.3	12.90	322.50
1900	13.45	13.38	334.38
1925	11.9	12.68	316.88
1950	11.95	11.93	298.13
1975	13.7	12.83	320.63
2000	12.9	13.30	332.50
2025	13.7	13.30	332.50
2050	14.7	14.20	355.00
2075	12.2	13.45	336.25
2100	14.4	13.30	332.50
2125	13.1	13.75	343.75
2150	14.2	13.65	341.25
2175	13.5	13.85	346.25
2200	13.5	13.50	337.50
2225	13	13.25	331.25
2250	12.6	12.80	320.00
2275	11.5	12.05	301.25
2300	11.6	11.55	288.75
2325	12.25	11.93	298.13
2350	12.25	12.25	306.25
2375	12.2	12.23	305.83
2400	11.6	11.90	297.50
2425	11.4	11.50	287.50
2450	12.2	11.80	295.00
2475	13.5	12.85	321.25
2500	13	13.25	331.25
2525	15.2	14.1	352.50
2550	12.1	13.65	341.25
2575	11.7	11.90	297.50
2600	11.3	11.50	287.50

محمد عبد الله
مدير المشروع


محمد عبد الله
مدير المشروع

اعمال رفع كفاءة طريق سعودي / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية - مبادرة "حياء كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 5 جاري			
بند رقم 6 : اعمال توريد وفرش طبقة رابطة			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
2625	11.45	11.38	284.38
2650	11.05	11.25	281.25
2675	10.9	10.98	274.38
2700	11.25	11.08	276.88
2725	11.2	11.23	280.63
2750	11	11.10	277.50
2775	11.25	11.13	278.13
2800	11.25	11.25	281.25
2825	11.25	11.25	281.25
2850	10.8	11.03	275.63
2875	10.75	10.78	269.38
2900	11	10.88	271.88
2925	12.15	11.58	289.38
2950	12.45	12.30	307.50
2975	12.6	12.53	313.13
مدخل الكوبري 1			
0	29.7		
25	13.6	21.65	541.25
50	10.2	11.9	297.50
مدخل الكوبري 2			
0	8.6		
47	8.6	8.6	404.20
مدخل 1	3.9	4	15.60
مدخل 2	11.5	7.4	85.10
مدخل 3	8	4	32.00
مدخل 4	6	6.3	37.80
مدخل 5	4.5	6.4	28.80
اجمالي الطبقة الرابطة (م2)			19733.50

مهندس الهيئة




مهندس الشركة

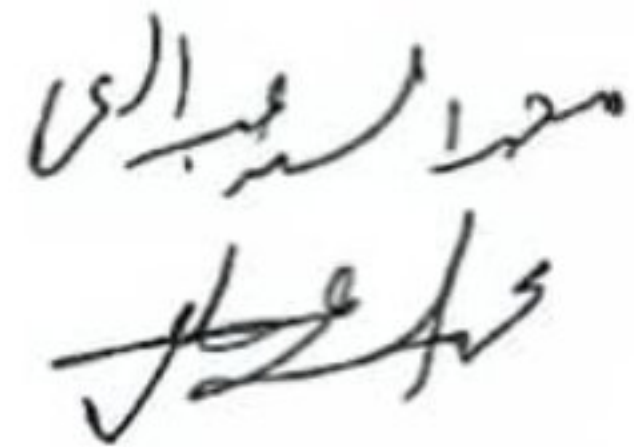


اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 6 جارى			
بند رقم 6 : اعمال توريد وفرش طبقة رابطة			
كم	العرض	م العرض	الكمية م2
1225	8.9		
1250	9.7	9.30	232.50
1275	9.1	9.40	235.00
1300	10.7	9.90	247.50
1325	11.2	10.95	273.75
1350	11.1	11.15	278.75
1375	11	11.05	276.25
1400	10.8	10.90	272.50
1425	9.9	10.35	258.75
1450	10.5	10.20	255.00
مدخل 3	25	6.5	81.25
مدخل 4	19	12.5	118.75
اجمالى الطبقة الرابطة (م2)			2530.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة




اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"		
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات		
مستخلص 6 جارى		
بند رقم 12 : اعمال رفع وخفض غرف الصرف		
العدد	البند	رقم البند
55.00	اعمال رفع وخفض غرف الصرف الصحي	12
55.00	اجمالى عدد الغرف (العدد)	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الرابع) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"		
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات		
مستخلص 6 جارى		
بند رقم 13 : بالمتر الطولي توريد وتركيب بلاعات المطر مزودة بغطاء GRP		
العدد	البند	رقم البند
26.00	بالمتر الطولي توريد وتركيب بلاعات المطر مزودة بغطاء GRP	13
26.00	اجمالى بلاعات المطر (بالسعر)	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

