

محضر استلام موقع

مشروع القطار السريع - القطاع الخامس (قوص / ارمنت) .
في المسافة من 701+780 الى 702+780 بطول 1 كم
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي
و شركاه رقم العقد (2025 / 2024 / 11) بتاريخ 2024/07/01 لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2024/ 07 / 02 بحضور كلا من :

- 1 - م/ أحمد النوبي ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
 - 2 - م/ عبدالعزيز مصطفى ممثل مكتب الاستشاري (اسبكتروم)
 - 3 - م/ عبد الله محمد ممثل مكتب برليانت للاستشارات الهندسيه
 - 4 - م/ أحمد عبد الباسط ممثل الشركة المنفذة (ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه)
- وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ .

وعليه يكون تاريخ 2024/ 07 / 02 هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :-

الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :	الاسم : التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب استشاري اسبكتروم	مكتب استشاري برليانت

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا

مهندس / عماد حسين

٣٠٨٩

٢



المقايمة المعدلة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١)
طبقاً لمفاوضة مارس ٢٠٢٤




استناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل)
القطاع الخامس (قوص - ارننت) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم (أعمال التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول)

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة (جنيه)	الاجمالى (جنيه)
١	اعمال التطهير				
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة . ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م ^٢	٣٢٤١٠,٠٠	٨,٠٠	٢٥٩٢٨٠,٠٠
		م ^٢	٧٠٠٠٠,٠٠	٨,٣٥	٥٨٤٥٠٠,٠٠
٢-١	المتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التنقيب باستخدام (اللودر أو البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و البند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقابل العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر. تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة . ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م ^٢	٢٠,٠٠	١٥,٣٠	٣٠٦,٠٠
٣-١	العدد ازالة اشجار من مسار الطريق و التخلص منها على الا يقل قطر الشجرة عن ٣٠ سم و ازالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	العدد	١٠٤١,٠٠	٧٥,٠٠	٧٨٠٧٥,٠٠
٤-١	العدد ازالة اشجار ونخل بأرتفاع لا يقل عن ٤ متر و القطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	العدد	٢٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠
٢	اعمال الحفر				
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م ^٣	٤٠١,٠٠	٢٨,٢٠	١١٢٨٢٨,٢٠
		م ^٣	١٥٠٠٠,٠٠	٢٩,٣٢	٤٣٩٨٠٠,٠٠
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .	م ^٣	١٠,٠٠	٣٤,٢٠	٣٤٢,٠٠

مهندس الهيئة
المهندس / محمد سالم
التوقيع

استشارى سبكتروم



مهندس الشركة المتفادى
المهندس / أحمد عبد المنعم
التوقيع



المقايمة المعدلة رقم (١) عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ١١)
طبقاً لمفاوضة مارس ٢٠٢٤



**اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابو سمبل)
القطاع الخامس (قوص - ارننت) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٠١+٧٨٠ إلى الكم ٧٠٢+٧٨٠ بطول ١ كم (أعمال التطهير والحفر والردم وخرسانة حماية الميول)**

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفنة (جنيه)	الاجمالى (جنيه)
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١,١ اجنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .	م³	١١,٠٠	٣٨,٣٠	٤٢١,٣٠
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ذات إجهاد (٢٠٠-١٠٠) كجم/سم² . ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ . ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم/سم² . ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ . ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم² . ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ . علاوة زيادة إجهاد كل ١٠٠ كجم/سم² لكل متر مكعب . ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢ .	م³	١٠,٠٠	٨٠,٢٠	٨٠٢,٠٠
		م³	١٠,٠٠	٩٧,٥٠	٩٧٥,٠٠
		م³	١٠,٠٠	١١٢,٧٠	١١٢٧,٠٠
		م³	٢٠,٠٠	٨,٩٥	١٧٩,٠٠
٣	اعمال الردم Embankment				
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢-) متر اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة. ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ ابتداء من ٢٠٢٤-٣-٢٢	م³	٨٤٥٣٥,٠٠	٧١,٧٠	٦٠٦١١٥٩,٥٠
		م³	١٦٥٠٠٠,٠٠	٧٤,٥٠	١٢٢٩٢٥٠٠,٠٠
	الأجمالي				١٩٩١٢٢٩٥,٠٠

مهندس الهيئة
المهندس /
التوقيع /
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /
م/ عماد حسين

استشارى سبكتروم
Spectrum Consulting
مشروع القطار السريع
SPECTRUM

مهندس الشركة المنفذة
المهندس / أحمد عبد الباقى
التوقيع /
٢١٩/٢٦/١٠٠
س.ت
١٧٣٠٧٤

     	وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة بقنا
--	--

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى	من بداية الاعمال	حتى تاريخ	07/07/2024
---------------------------------------	------------------	-----------	------------

العقد رقم : 11/2024/2025			
--------------------------	--	--	--

تنفيذ شركة	شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
رقم البند وبيانه:(1-1)	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 0.3 جنية لكل كم زيادة

0.000	مقدار العمل السابق	102410.000	الكمية بالمقايضة		
		الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال بالمقايضة
			الى	من	
			1120 m	702+900	701+780

الاجمالى	
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	52175.00
اجمالى كميات الاعمال السابقة	0.00
اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة	52175.00
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	46957.00

مهندس الشركة المنفذة م / التوقيع /	مهندس استشارى المساحة (بريلينت) استشارى / التوقيع /	مكتب استشارى الهيئة (اسبكترم) المكتب الفنى م / التوقيع /
---	--	--

	
---	---



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والمنطقة
الثامنة بقنا

07/07/2024

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1.1 جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر .

رقم البند وبيانه: (1-2)

0.00

مقدار العمل السابق

19001.00

الكمية بالمقايضة

اجمالى كميات اعمال البند

بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	الى	من	
أعمال الحفر	701+940	701+780	160 m
	702+360	702+220	140 m

الاجمالى

3907.22	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة
3907.22	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
0.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
3516.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مكتب استشارى الهيئة (اسبكتروم)

المكتب الفنى

مهندس استشارى المساحة بريليانت
HSR - Blue Line Sec.05
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
التوقيع /

م/ عبد الممنون طاهر
م/ محمد شحات الهياكلية
التوقيع /
Spectrum Consulting
مشروع القطار السريع



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة
الثامنة بقنا

07/07/2024

حتى تاريخ

من بداية الاعمال

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

العقد رقم : 11/2024/2025

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

تنفيذ شركة

أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2-) متراسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل -السعرلا يشمل قيمة المادة المحجرية.

رقم البند وبيانه:(1-3)

0.000

مقدار العمل السابق

249535.000

الكمية بالمقايسة

اجمالى كميات اعمال البند


بيان الأعمال بالمقايسة	الموقع الكيلو مترى		الطول (م)
	الى	من	
أعمال الردم	701+780	702+880	1100 m

الاجمالى

168879.41	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة
168879.41	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
0.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
147000.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى

مكتب استشارى الهيئة(سبكتروم)

المكتب الفنى



بريليات مهندس استشارى المساحة بريليات



مهندس الشركة المنفذة

م /

التوقيع /





مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الخامس)

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

من الكم 701+780 حتى الكم 703+840 بطول 2.06 كم

بيان اعمال توضيحي لمستخلص جارى 1 عقد (11/2024/2025)

م	العقد	قيمة العقد	المستخلص	كميات حفر في تربة عاديه	كميات التطهير	كميات ردم
1	11/2024/2025	19912295.00	جارى 1	3516.00	46957.00	147000.00
اجمالى كميات تم حصره		عقد (11/2024/2025)	3907.22	52175.00	168879.41	
اجمالى كميات تم صرفها		عقد (11/2024/2025)	3516.00	46957.00	147000.00	
المتبقى من الكميات		عقد (11/2024/2025)	391.22	5218.00	21879.41	

استشارى المساحه (برليانت)

المهندس/ نسيب الاستشارات الهندسية
HSR - Blue Line - Section 5
استشارى الأعمال المساحية بالقطاع الخامس

استشارى الهيئه (سبكتروم)

المهندس/ سبكتروم
Spectrum Consultancy
مشروع القطار الكهربائي السريع

مهندس الشركة المنفذة
المهندس/ حسن المنابلي وشركاه
التوقيع/ 172075



مشروع القطار الكهربائي السريع (القطاع الخامس)

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

من الكم 693+780 حتى الكم 694+360 بطول 0.580 كم و من الكم 701+780 حتى الكم 703+840 بطول 2.06 كم

بيان اعمال مجمع

م	العقد	قيمة العقد	المستخلص	كميات حفر في تربة عادية	كميات حفر في تربة متماسكة	كميات حفر في تربة شديدة التماسك	كميات التطهير	كميات ردم
1	11/2024/2025	19912295.00	جارى 1	3516.00	0.00	0.00	46957.00	147000.00
2	12/2024/2025	19906388.00	جارى 1	21178.00	4235.00	16943.00	0.00	59410.00
اجمالى كميات تم حصره		عقد (11/2024/2025)	3907.22	0.00	0.00	52175.00	168879.41	
		عقد (12/2024/2025)	23532.00	4706.40	18825.60	0.00	62537.86	
اجمالى كميات تم صرفها		عقد (11/2024/2025)	3516.00	0.00	0.00	46957.00	147000.00	
		عقد (12/2024/2025)	21178.00	4235.00	16943.00	0.00	59410.00	
المتبقى من الكميات		عقد (11/2024/2025)	391.22	0.00	0.00	5218.00	21879.41	
		عقد (12/2024/2025)	2354.00	471.40	1882.60	0.00	3127.86	

استشاري الأعمال المساحية بالقطاع الخامس
HSR - Blue Line - Sec. 1
المهندس / التوقيع

استشاري الهيئة (ميكروم)
المهندس / التوقيع
Spectrum Consulting
مشروع

مهندس الشركة المنفذة
المهندس / التوقيع



محضر اعتماد كميات

إسم المشروع: مشرع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (6 أكتوبر- اسوان- ابوسمبل)
القطاع الخامس (قوص- أرمنت)

قامت شركة بريليانت كونسلت للاستشارات المساحية (إستشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبرى):
باعتماد الكميات المنفذه الخاصه بشركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه عقد (2025-2024-11)
مستخلص جارى 1

كميات قطاع 701+780 الي المحطة 703+840

أعمال الردم بالمتر المكعب		أعمال التطهير بالمتر المربع			أعمال القطع احلال بالمتر المكعب	
بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024	اجمالي	بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22	بعد 22-3-2024	اجمالي	بعد سبتمبر 2023 وقبل 2024-3-22
81289.08	87590.33	168879.41	32394	19781	52175	3907.22

المرفقات :

1- استلام ميزانية شبكيه

2- قطاعات عرضيه

3- شيت اكسل لتوضيح أعمال الحصر

إستشارى الهيئه (سبيكترم)

مهندس استشارى المساحه (بريلينت)

مهندس الشركه المنفذه



    					
مشروع القطار الكهربائي السريع					
2025/2024/11					رقم العقد
أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه					تنفيذ شركة :
07/07/2024			اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسويةالخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
	30539.19	-1.50	0.00	155.03	701+780
			3122.46	157.21	701+800
			3134.13	156.20	701+820
			2987.40	142.54	701+840
			2726.92	130.15	701+860
			2565.36	126.38	701+880
			2563.97	130.01	701+900
			2635.54	133.54	701+920
			2668.82	133.34	701+940
			2675.91	134.25	701+960
			2694.46	135.20	701+980
			2764.22	141.23	702+000
	25282.35	-1.25	0.00	147.61	702+000
			3078.07	160.19	702+020
			3182.06	158.01	702+040
			3145.33	156.52	702+060
			3116.62	155.14	702+080
			3125.13	157.37	702+100
			3150.37	157.67	702+120
			3218.28	164.16	702+140
			3266.49	162.49	702+160
	10136.53	-1.00	0.00	168.69	702+160
			3351.10	166.42	702+180
			3338.88	167.46	702+200
			3446.55	177.19	702+220
	47647.17	-1.50	0.00	164.60	702+220
			3471.65	182.56	702+240
			3714.81	188.92	702+260
			3780.08	189.09	702+280
			3803.35	191.24	702+300
			3904.18	199.18	702+320
			3976.28	198.45	702+340
			3966.92	198.24	702+360
			4021.33	203.89	702+380
			4143.08	210.42	702+400
			4254.18	215.00	702+420
			4303.34	215.33	702+440
			4307.97	215.47	702+460

    					
مشروع القطار الكهربائي السريع					
2025/2024/11					رقم العقد
أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه					تنفيذ شركة :
07/07/2024			اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسويةالخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
	25647.0	-2.50	0.00	188.15	702+460
			3784.16	190.26	702+480
			3798.27	189.56	702+500
			3743.82	184.82	702+520
			3657.47	180.93	702+540
			3612.11	180.28	702+560
			3571.25	176.84	702+580
			3479.93	171.15	702+600
	10163.92	-4.50	0.00	107.29	702+600
			2072.50	99.96	702+620
			2054.62	105.50	702+640
			2132.38	107.73	702+660
			2052.74	97.54	702+680
			1851.68	87.63	702+700
	781.60	-6.50	0.00	1.84	702+700
			109.72	9.13	702+720
			361.15	26.98	702+740
			310.73	4.09	702+760
	9148.58	-2.50	0.00	149.85	702+760
			3006.18	150.76	702+780
			3056.57	154.89	702+800
			3085.83	153.69	702+820
	9533.06	-2.00	0.00	166.13	702+820
			3246.92	158.56	702+840
			3158.88	157.33	702+860
			3127.26	155.40	702+880
168879.41		الاجمالي			





مشروع القطار الكهربائي السريع

2025/2024/11	رقم العقد
أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه	تنفيذ شركة :
21/03/2024	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
	20270.39	-2.00	0.00	141.69	701+780
			2855.67	143.87	701+800
			2867.36	142.86	701+820
			2720.63	129.20	701+840
			2460.14	116.81	701+860
			2298.58	113.04	701+880
			2297.20	116.68	701+900
			2368.77	120.20	701+920
			2402.04	120.00	701+940
	16305.74	-2.50	0.00	105.91	701+940
			2127.37	106.82	701+960
			2145.90	107.77	701+980
			2215.66	113.80	702+000
			2401.76	126.38	702+020
			2505.74	124.20	702+040
			2469.00	122.70	702+060
			2440.31	121.33	702+080
	24143.44	-3.00	0.00	106.49	702+080
			2152.02	108.71	702+100
			2177.25	109.01	702+120
			2245.19	115.51	702+140
			2293.37	113.83	702+160
			2253.95	111.57	702+180
			2241.77	112.61	702+200
			2349.41	122.33	702+220
			2626.28	140.30	702+240
			2869.47	146.65	702+260
			2934.73	146.82	702+280
	4020.93	-5.50	0.00	61.37	702+280
			1249.02	63.53	702+300
			1349.93	71.46	702+320
			1421.98	70.73	702+340
	16548.58	-4.50	0.00	107.16	702+340
			2141.16	106.95	702+360
			2195.63	112.61	702+380
			2317.46	119.14	702+400
			2428.53	123.72	702+420
			2477.64	124.05	702+440
			2482.28	124.18	702+460
			2505.88	126.41	702+480

81289.08

الاجمالي



حصر اجمالي التطهير

AREA=52175 M2


Daylight+2MLEFT+2M Right

مهندس استشاري الهيئة
سبكترم
Spectrum Consulting
مشروع التطهير

مهندس استشاري المساحة
بريلينا
HSE - Blue Line Dec.05
استشاري المساحة بالقطاع الخامس


مهندس الشركة
عبدالمجيد
17/05

حصار التطهير بعد سبتمبر 2023
و قبل 2024-3-22

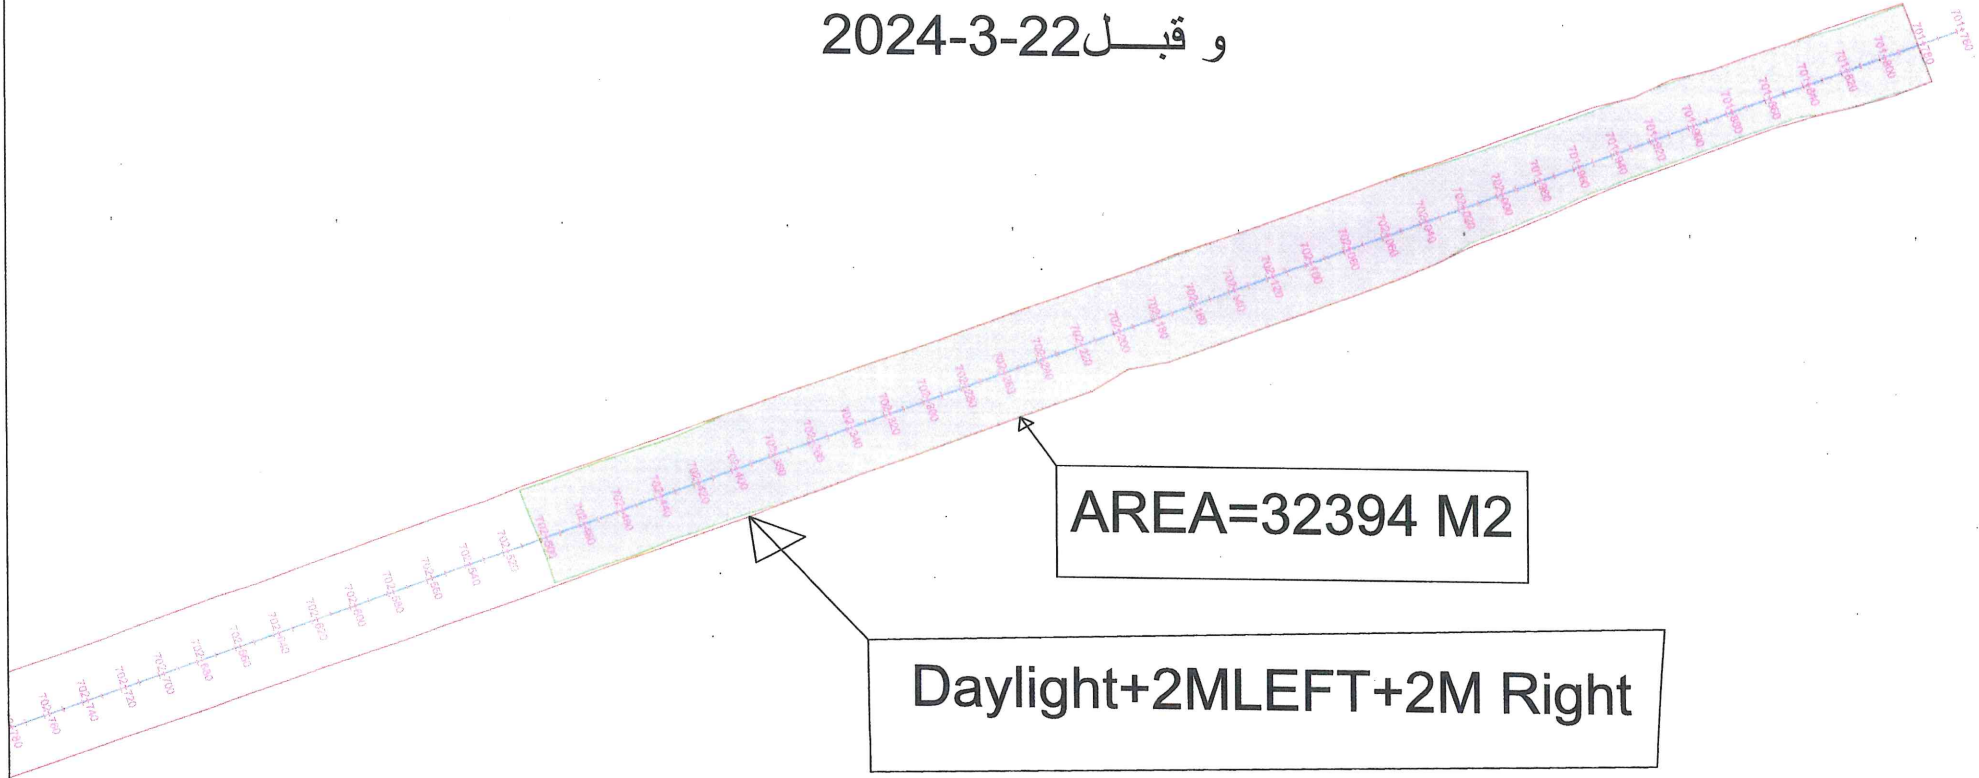


مهندس استشاري الهيئة
سبب بگترم

مهندس استشاري المساحة



				
مشروع القطار الكهربائي السريع				
2025/2024/11			رقم العقد	
أبناء حسن محمد حسن المنايي وشركاه			تنفيذ شركة :	
07/01/2024			اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	

بند رقم (1-2): بالتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية للتربة العادية الخ				
Notse	Cum Cut Volume	Cut Vol	Cut Area	Station
	0.00	0.00	28.60	701+780
	511.19	511.19	22.52	701+800
	984.83	473.64	24.85	701+820
	1450.48	465.65	21.72	701+840
	1819.20	368.72	15.15	701+860
	2126.83	307.63	15.61	701+880
	2410.09	283.26	12.72	701+900
	2689.13	279.04	15.19	701+920
	2959.79	270.66	11.88	701+940
	2959.79	0.00	0.00	701+960
	2959.79	0.00	0.00	701+980
	2959.79	0.00	0.00	702+000
	2959.79	0.00	0.00	702+020
	2959.79	0.00	0.00	702+040
	2959.79	0.00	0.00	702+060
	2959.79	0.00	0.00	702+080
	2959.79	0.00	0.00	702+100
	2959.79	0.00	0.00	702+120
	2959.79	0.00	0.00	702+140
	2959.79	0.00	0.00	702+160
	2959.79	0.00	0.00	702+180
	2959.79	0.00	0.00	702+200
	2959.79	0.00	0.00	702+220
	2959.79	0.00	12.92	702+240
	3233.12	273.33	14.41	702+260
	3459.28	226.16	8.20	702+280
	3572.28	113.00	3.10	702+300
	3694.70	122.42	9.14	702+320
	3838.58	143.88	5.24	702+340
	3907.22	68.64	1.62	702+360
3907.22		الاجمالي		





محضر اثبات حالة

حيث انه في يوم الاثنين 2024/7/16 بالمرور علي الطبيعة تبين تواجد مناطق زراعية متداخلة مع المسار في قطاع شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه من المحطة 701+780 الي المحطة 703+840 وهي عبارة عن مساحات زراعية أهالي وقد تم التوجيه بتطهير المناطق الزراعية بالكامل بعروض (DAYLIGHT) ويضاف اليها 2 متر من كل جانب

م	بيان القطاعات
1	من المحطة 701+780 الي 702+900

الاسم: ش. الهادي
التوقيع: ش. الهادي
الهيئة العامة للطرق والكبارى



محضر اثبات حالة

بالاحالة الي مشروع القطار السريع -المرحلة الثانية 6 اكتوبر ابو سمبل - القطاع الخامس
(قوص - ارمنت) .

تم عمل إحلال في القطاعات (من محطة 701+780 الي المحطة 701+940) و (من المحطة 702+220 الي المحطة 702+360) بسبب وجود أراضي زراعية كثيفة و تربة غير صالحة لتأسيس مما يؤثر علي جودة وسلامة المشروع في هذه القطاعات بعد توصية الاستشاري (سبكتروم) المشرف في قطاع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه للوصول الي الأرض الثابتة الصالحة للتأسيس في حالة أن منسوب الأرض الثابتة أقل من 1.5 متر وبعرض طبقة الاستبدال وقد ادي أعمال الاحلال الي تغير في منسوب الأرض الطبيعية.

الاسم: عبد العزيز مكي
التوقيع: [مكتوب]
مكتب استشارى اسبكتروم

براليات كونسالت للاستشارات الهندسية
الاسم: HSR - Blue Line Sec.05
التوقيع: [مكتوب]
مكتب استشارى براليات

الاسم: د. محمد د. د. د.
التوقيع: [مكتوب]
الشركة المنفذة

يعتمد من:

الاسم:

التوقيع: [مكتوب]

الهيئة العامة للطرق والكبارى
