

محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -
مطروح) منطقة (A 8) القطاع الثاني (بالأمر المباشر)
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه .

انه في يوم الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2023/2022/1934)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / كرم امام | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 2- السيد المهندس / اسلام محمد | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى |
| 3- السيد المهندس / محمد حسن | سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام |
| 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين | مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة |
| 5- السيد المهندس / محمد حسن | مكتب XYZ |
| 6- السيد المهندس / سعد سالم سعد | شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه |

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام
الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 18 / 5 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .
واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

- | |
|-------------|
| 6- سعد سالم |
| 5- محمد حسن |
| 4- محمد حسن |
| 3- محمد حسن |
| 2- محمد حسن |
| 1- محمد حسن |

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى

مهندس /

الهيئة العامة للطرق والكبارى



عن عملية : تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية
بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطر السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة (A8) القطاع الثاني (بالأمر المباشر) .
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مقايضة ختامية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

العقد رقم : (١٩٣٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١١ / ٠٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة قرش / جنيه	الوحدة	الكميات الختامية المنقذة	جملة قيمة الأعمال المنقذة قرش / جنيه
٣	الغمر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عند التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوز . - علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر . - علاوة ٨٠٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م ^٣ وذلك بعد أول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٣٠٠٠	م ^٣	٧٦٨١٩.٠٠	٢٣.٤٥٧.٠٠
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنقذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤) .	٣٠٠٠	م ^٣	٣٣٤٢٢.٠٠	١.٠٢٦٦.٠٠
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٠.٩٠	م ^٣	١١.٢٤١.٠٠	٩٩٢١٦.٩٠
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل ١.٤ كم - ٠.٥ كم)	٠.٨٠	م ^٣	٣٣٤٢٢.٠٠	٢٦٧٣٧.٦٠
	علاوة ٨٠٠ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة) .	٢.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٢ جنيه من عمق ٥ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٤ جنيه من عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية				
٤	الغمر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات لتصميم تشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والأكتاف) (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه / م ^٣ وذلك بعد أول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية .	٨٢.٠٠	م ^٣	١٧٩٧١٤.٠٠	١٤٧٣٦٥٤٨.٠٠
	ذات إجهاد (٤٠٠٠-٤٠٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنقذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤) .	٨٢.٠٠	م ^٣	٤٢٠.٠٠	٣٤٤٤٠.٠٠
	ذات إجهاد (٤٠٠٠-٤٠٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢.٢٠	م ^٣	٤٢٠.٠٠	٩٢٤.٠٠
	علاوة ٢.٢ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة) .	٢.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٢ جنيه من عمق ٥ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٤ جنيه من عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية	٨٨.٠٠	م ^٣	١٩٩٧٧.٠٠	١٧٥٧٩٧٦.٠٠
	ذات إجهاد (٥٠٠٠-٤٠٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنقذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤) .	٨٨.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠
	ذات إجهاد (٥٠٠٠-٤٠٠٠) كجم / سم ^٢ (الكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤) .	٢.٤٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٢.٤ جنيه / م ^٣ لارتفاع السورار وذلك للكميات المنقذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقاً للمفاوضة) .	٢.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٢ جنيه من عمق ٥ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية	٤.٠٠	م ^٣	٠.٠٠	٠.٠٠
	علاوة ٤ جنيه من عمق ١٠ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية	١.٠٠	م ^٣	٣٦٩٢٥.٠٠	٣٦٩٢٥.٠٠
	علاوة ١ جنيه من عمق ١٥ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق ٢٠ م من منسوب الأرض الطبيعية طبقاً للمفاوضة				
اجمالي قيمة الأعمال المنقذة					١٩٦٩٩٩٩٧.٥٠



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
مهندس / نصر محمد نصر طيخ
مهندس / نصر محمد نصر طيخ
مهندس / نصر محمد نصر طيخ

مهندس / نصر محمد نصر طيخ
مهندس / نصر محمد نصر طيخ
مهندس / نصر محمد نصر طيخ

مهندس / نصر محمد نصر طيخ
مهندس / نصر محمد نصر طيخ
مهندس / نصر محمد نصر طيخ

طريقة والكبارى
الهيئة العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

[illegible]

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8) القطاع الثاني (بالأمر المباشر) .

عقد رقم :- (1934 / 2022 / 2023) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/9/20 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (74) بتاريخ 2023/8/9 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- المهندس / خالد محمود محمد حسونة | المنطقة الاولى المركزية - رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزية - عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / سعد سالم | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع.

الاعمال مقبوله بصفه عامه كون الاعمال اعمال قطع فقط .

توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

5- 

6- 

7- 

8- 

1- 

2- 

3- 

4- 



التقييم الفنى

العملية :- تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) منطقة (A 8) القطاع الثانى (بالأمر المباشر) .

عقد رقم :- (1934 / 2022 / 2023) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشارى العام سيسترا – استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاحد الموافق 2023/9/24 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (74) بتاريخ 2023/8/9 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2023/9/20 تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- المهندس / خالد محمود محمد حسونة | المنطقة الاولى المركزية – رئيساً |
| 2- المهندس / كريم محمد زين | المنطقة الاولى المركزية – عضواً |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه | مدير المشروع (الهيئة) – عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا – الاستشارى العام – عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس – استشارى الهيئة – عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً |
| 8- المهندس / سعد سالم | مندوب الشركة المنفذه – عضواً |

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتى :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى :- لا يوجد خصم على الاستلام الإبتدائى نظراً لقبول الاعمال (اعمال قطع فقط) .

الخصم للتجارب المعملية :- لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط .

مرشد محمد عبد الجبار

التوقيعات :-

- | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| 8- سعد سالم | 7- احمد هشام | 6- محمد شرف الدين | 5- مصطفى السيد |
| 4- اسلام محمد البهادي | 3- كريم محمد زين | 2- خالد محمود محمد حسونة | 1- رئيساً |

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بشأن تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8) (القطاع الثاني) عقد رقم (2023/2022/1934)

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 18 / 5 / 2023

بحضور كل من:-

- ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل سيسترا للاستشارات الهندسية
ممثل مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة
ممثل مكتب XYZ
ممثل شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

- 1- م / علاء محمد البهاري
2- م / علاء السيد عبد الحميد
3- م / محمود حسام جمعة
4- م / علي ربيع
5- م / نادر عصام مينا

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نواتج الحفر من القطاع الي المقالب المحددة من جهة الاشراف علي الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (1400) م عن مكان المقلب المعتمد .

واقفل المحضر علي ذلك


التوقيعات

التوقيع :

علاء محمد البهاري
علاء السيد عبد الحميد
محمود حسام جمعة
علي ربيع
نادر عصام مينا

الاسم :

- 5- نادر عصام مينا
4- علي ربيع
3- محمود حسام جمعة
2- علاء السيد عبد الحميد
1- علاء محمد البهاري

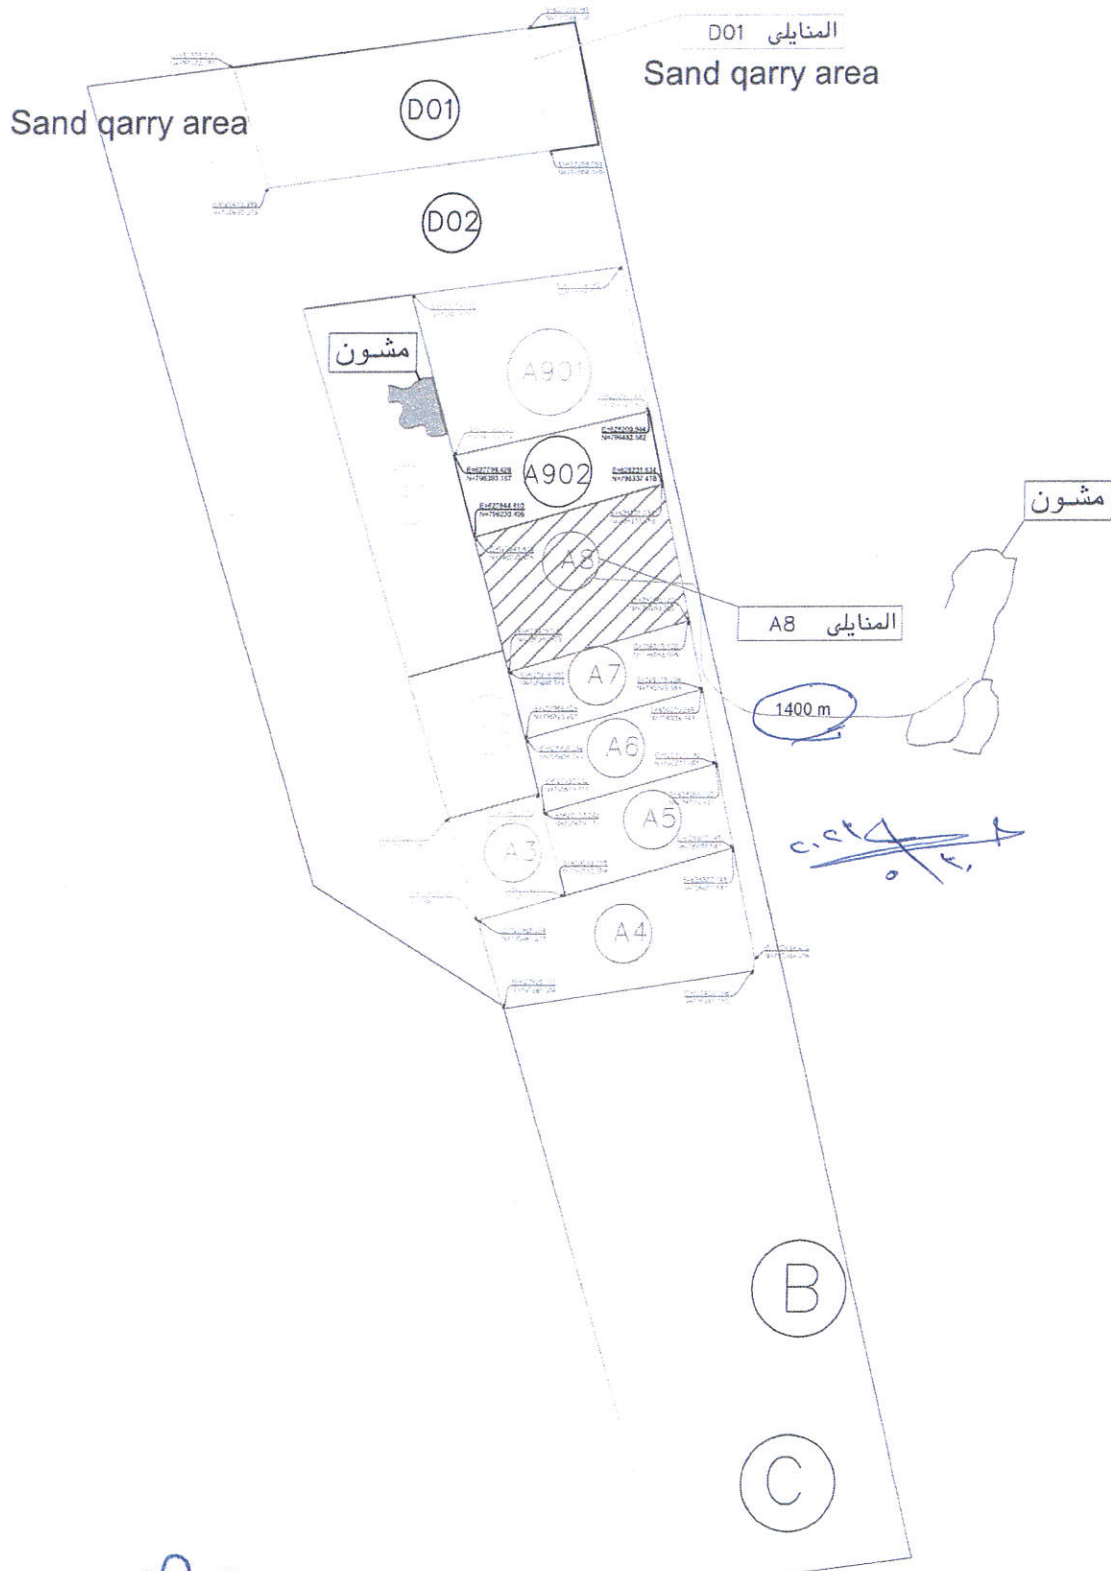

Handwritten signature and date: 14/10/2018

المنطقة المركزية الاولى

تتفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن
أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8)
القطاع الثانى (بالأمر المباشر) عقد رقم (2023/2022/1934)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه

شهادة المحاجر


كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه :
لايوجد كميات للمحاجر مستخدمة بالمشروع

مدير عام مشروعات الطرق



م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى



م / اسلام محمد

شركة ابناء حسن محمد حسن
المنابلى و شركاه



مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية



مهندس / نصر محمد نصر



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن
أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8)
القطاع الثانى (بالأمر المباشر) عقد رقم (2023/2022/1934)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة
بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات الطرق



م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى



م / اسلام محمد

شركة ابناء حسن محمد حسن

المنابلى و شركاه



مهندس / محمد أحمد يوسف

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس /  محمد نصر طيخ



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن
اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8)
القطاع الثانى (بالأمر المباشر) عقد رقم (2023/2022/1934)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنائلى و شركاه

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد أحمد يوسف ابراهيم

بكالوريوس هندسة مدني : جامعة عين شمس

المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 3/5402571/2014/3

مدير عام مشروعات الطرق



م / مشيرة السيد

الهيئة العامة للطرق والكبارى



م / اسلام محمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيع



نموذج رقم 2

بشان: حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

القيد:..... /..... / 2023 المنطقة المركزية الاولى

التاريخ:..... /..... / 2023

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية (تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A 8) القطاع الثاني (بالأمر المباشر) تنفيذ شركة (أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه) عقد رقم (2023/2022/1934) يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجزة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .


يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسلام محمد

المستشاري



شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ



مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية
(باستخدام البلدوزر)....م3 (حتى 2023-09-30)

الكمية الكلية المنفذة م3	ZONE
1,010,852	A8
1,010,852	الاجمالي م3

الاستشاري العام


سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف



الاستشاري المساحة

مكتب XYZ



شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العطين - مطروح)
منطقة الورش المركزية للقطر السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية
(باستخدام البلدوزر) 3م.... (حتى 30-9-2023)

Station	الكمية المنفذة الكلية م3	
	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
0+000	5589.41	
0+005	4076.51	0.00
0+010	4009.06	24164.98
0+015	3994.00	20214.11
0+020	3989.08	20007.81
0+025	3966.28	19957.84
0+030	3933.26	19888.58
0+035	3922.06	19749.05
0+040	3886.62	19638.50
0+045	3858.35	19521.91
0+050	3853.62	19362.64
0+055	3873.49	19280.09
0+060	3905.09	19317.96
0+065	3863.26	19446.62
0+070	3837.28	19421.07
0+075	3787.20	19251.57
0+080	3744.36	19061.40
0+085	3752.62	18829.13
0+090	3718.23	18742.70
0+095	3711.47	18677.35
0+100	3787.07	18574.46
0+105	3748.26	18746.53
0+110	3681.22	18838.47
0+115	3609.58	18573.88
0+120	3571.24	18227.20
0+125	3522.43	17952.20
0+130	3385.11	17734.37
0+135	3384.82	17269.07
0+140	3356.04	16925.02
0+145	3334.31	16852.35
0+150	3280.14	16726.08
0+155	3227.96	16536.32
0+160	3176.32	16270.46
0+165	3167.77	16010.91
0+170	3193.42	15860.44
0+175	3226.48	15903.20
0+180	3253.19	16049.95
0+185	3221.42	16199.34
0+190	3278.12	16186.67
0+195	3369.04	16249.01
0+200	3356.05	16618.04
0+205	3368.95	16812.86
0+210	3396.09	16812.64
0+215	3429.73	16912.75
0+220	3607.96	17064.73
0+225	3661.79	17594.40
0+230	3647.45	18174.56
0+235	3554.05	18273.29
0+240	3444.99	18003.94
0+245	3451.19	17497.78
0+250	3470.05	17240.61
0+255	3517.59	17303.28
0+260	3546.80	17469.30
0+265	3590.66	17661.16
0+270	3557.60	17843.83
0+275	3773.35	17870.83
0+279.540	3782.41	18327.55
الإجمالي م3	207,202	1,010,852

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

استشاري المساحة
مكتبة
مشروع القطر الكهربائي السريع - الخط الأول

الشركة المنفذة
شركة / أبناء حسين محمد حسن المنابلي وشركاه

الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفلى - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية 3م (حتى 2023-9-30)

ZONE	الإجهاد (كجم / سم ²)	الكمية الكلية المنفذة 3م
A 8 - 1	300-400	230,206
A 8 - 2	400-500	19,977
A 8 - 3	600-700	7,351
A 8 - 4	600-700	259
A 8 - 5	300-400	53,736
A 8 - 6	200-300	36,307
A 8 - 7	500-600	6,455
A 8 - 8	600-700	12,304
A 8 - 9	600-700	541
A 8 - 10	600-700	1,564
A 8 - 11	600-700	4,800
A 8 - 12	400-500	873
الإجمالي 3م		374,372

الاستشاري العام
مستشار الاستشارات الهندسية

EnTrans
مستشاري المساحة
مكتب استشاري المساحة
مكتب استشاري المساحة

استشاري المساحة
مكتب استشاري المساحة


الشركة المنفذة
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة الورش المركزية للقطر السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

مسمى البند: بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية م3 (حتى 30-9-2023)


Station	الكمية المنفذة الكلية م3	
	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
0+000	444.66	0.00
0+005	1998.64	6108.05
0+010	2081.55	10200.28
0+015	2089.93	10428.54
0+020	2087.57	10443.61
0+025	2089.92	10443.54
0+030	2107.05	10492.24
0+035	2099.50	10516.17
0+040	2104.35	10509.40
0+045	2088.18	10481.09
0+050	2066.06	10385.43
0+055	2020.53	10216.31
0+060	1968.79	9973.14
0+065	1949.47	9795.45
0+070	1937.16	9716.33
0+075	1940.79	9694.68
0+080	1924.64	9663.37
0+085	1868.86	9483.51
0+090	1853.18	9304.88
0+095	1836.45	9223.87
0+100	1758.53	8987.28
0+105	1737.96	8741.08
0+110	1717.79	8639.19
0+115	1681.55	8498.15
0+120	1641.66	8307.86
0+125	1614.35	8139.82
0+130	1680.96	8238.07
0+135	1624.89	8264.44
0+140	1569.67	7986.21
0+145	1530.39	7749.95
0+150	1515.49	7614.50
0+155	1492.58	7519.97
0+160	1483.38	7439.70
0+165	1455.69	7347.45
0+170	1401.65	7143.11
0+175	1343.46	6862.56
0+180	1292.64	6590.08
0+185	1220.82	6283.50
0+190	1076.53	5743.20
0+195	918.52	4987.46
0+200	856.82	4438.20
0+205	804.37	4152.83
0+210	742.83	3867.85
0+215	677.18	3549.84
0+220	506.94	2960.13
0+225	461.23	2420.25
0+230	440.05	2253.01
0+235	412.12	2130.23
0+240	349.13	1902.93
0+245	302.55	1629.02
0+250	282.95	1463.56
0+255	271.73	1386.50
0+260	254.57	1315.56
0+265	229.39	1209.73
0+270	191.10	1051.05
0+275	0.00	477.57
0+279.540	0.00	0.00
الاجمالي م3	75,099	374,372

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية



استشاري المراقبة
مكتب استشاري المراقبة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
منطقة الورش المركزية للقطر السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) (منطقة A8)
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الكمية المنفذة أسفل 8 متر من منسوب الأرض الطبيعية 3م (حتى 2023-9-30)

Station	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
0+000	2876.57	
0+005	2911.40	0.00
0+010	2919.97	14469.93
0+015	2908.68	14578.43
0+020	2895.85	14571.63
0+025	2869.69	14511.32
0+030	2846.54	14413.86
0+035	2823.87	14290.59
0+040	2789.57	14176.03
0+045	2740.56	14033.61
0+050	2710.96	13825.33
0+055	2682.78	13628.80
0+060	2660.15	13484.35
0+065	2598.02	13357.33
0+070	2557.85	13145.43
0+075	2510.45	12889.67
0+080	2450.55	12670.74
0+085	2402.51	12402.48
0+090	2352.29	12132.64
0+095	2328.27	11887.00
0+100	2326.10	11701.40
0+105	2267.83	11635.93
0+110	2183.06	11484.84
0+115	2075.34	11127.24
0+120	1997.23	10646.01
0+125	1921.33	10181.42
0+130	1847.51	9796.40
0+135	1790.71	9422.09
0+140	1709.96	9095.55
0+145	1654.06	8751.70
0+150	1588.68	8410.07
0+155	1514.32	8106.87
0+160	1446.54	7757.52
0+165	1397.38	7402.16
0+170	1383.60	7109.81
0+175	1366.03	6952.45
0+180	1346.73	6874.06
0+185	1243.18	6781.90
0+190	1148.63	6474.78
0+195	1074.40	5979.53
0+200	984.29	5557.58
0+205	957.12	5146.74
0+210	933.39	4853.53
0+215	907.69	4726.25
0+220	908.61	4602.69
0+225	920.19	4540.76
0+230	902.79	4572.01
0+235	793.71	4557.45
0+240	634.15	4241.25
0+245	605.92	3569.66
0+250	596.50	3100.17
0+255	606.74	3006.06
0+260	619.82	3008.10
0+265	624.28	3066.40
0+270	536.14	3110.25
0+275	568.10	2901.03
0+279.540	564.36	2760.59
الإجمالي 3م	99,783.0	2570.68
		490,052

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية

استشاري المساحة
استشاري المرافق
استشاري التربة والجيوتقني
استشاري الطرق
استشاري الجسور
استشاري المياه
استشاري الصرف الصحي
استشاري البيئة
استشاري السلامة
استشاري الجودة
استشاري الحفظ الأثري

الشركة المنفذة
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإصاحبة إلى إسم)												
الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 09 / 30				شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه								
رقم البند	البند	الكميات الاجمالية المنفذة قبل 2023 / 5 / 4						الكميات الاجمالية المنفذة بعد 2023 / 6 / 4 (زيادة اسعار سعر الدولار)				
		Zone			اجمالي	Zone			اجمالي	Zone		
		A 8	A7			A 8	A7			A 8	A7	
0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
1	حفر جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2	حفر تربة متماسكة عدا الصخرية	0	0	0		0	0	0		0	0	0
3	حفرة تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	621,947	159,548	781,495		388,905	0	388,905		1,010,852	159,548	1,170,400
4	حفر تربة صخرية					0	0					
	إجهاد (200-100) كجم / سم2	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	إجهاد (300-200) كجم / سم2	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	إجهاد (400-300) كجم / سم2	179,714	49,134	228,848		104,228	0	104,228		283,942.00	49,134	333,076
	إجهاد (500-400) كجم / سم2	19,977	0	19,977		873	0	873		20,850.00	0	20,850
	إجهاد (600-500) كجم / سم2	0	0	0		6,455	0	6,455		6,454.51	0	6,455
	إجهاد (700-600) كجم / سم2	0	1,627	1,627		26,819	0	26,819		26,819.00	1,627	28,446
	الاجمالي الكلي م3	0	1,627	1,627		26,819	0	26,819		1,385,224	210,309	1,595,533

210,309	Zone A 7	إجمالي الكميات المنفذة لكل منطقة لجميع أنواع التربة حتى تاريخه
1,385,224	Zone A 8	
0		
1,595,533	إجمالي الكميات المنفذة حتى تاريخه	

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الاستشاري العام

مستشار للاستشارات الهندسية

الإستشاري المشرف

استشاري المساحة

مکتبہ XYZ

الشركة المنفذة


شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

فان



Trans

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)
Green Line (GL) MAIN DEPOT



منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

بيان اعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

كميات القطع	كميات الردم	المستخلص	العقد
204,000	186,400	جاري 1	منطقة (A7) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1931)
6,309	3,300	جاري 2	
0	-21,851	ختامي 3	
210,309	167,849		الاجمالي منطقة (A7)
357,750	142,904	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1932)
17,250	3,000	جاري 2	
223,464	-145,904	جاري 3	
2,082	0	ختامي 4	
269,111	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثاني عقد (2023 / 2022 / 1934)
8,050	0	جاري 2	
32,200	0	جاري 3	
991	0	ختامي 4	
170,128	0	جاري 1	منطقة (A8) القطاع الثالث عقد (2023 / 2022 / 1933)
205,496	0	جاري 2	
7,000	0	جاري 3	
1,148	0	ختامي 4	
1,294,670	0		الاجمالي منطقة (A8)
0	273,780	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الرابع عقد (2024 / 2023 / 181)
0	5,351	جاري 2	
0	288,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الخامس عقد (2024 / 2023 / 182)
20,000	0	جاري 2	
0	288,115	جاري 1	منطقة (D01) القطاع السادس عقد (2024 / 2023 / 183)
20,000	0	جاري 2	
90,555	244,829	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثامن عقد (2024 / 2023 / 453)
0	295,000	جاري 1	منطقة (D01) القطاع الثالث عقد (2024 / 2023 / 454)
130,555	1,395,075		الاجمالي منطقة (D01)
1,635,534	1,562,924		الاجمالي منطقة (A7) و منطقة (A8) و منطقة (D01)


الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري العام

الاستشاري المصمم

مكتب XXX

الشركة المنفذة





Trans

Employer Consultant GARB Consultant

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السبخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح) - (قطاع غرب النيل)

Green Line (GL) MAIN DEPOT



الهيئة العامة للطرق والكباري

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

توزيع صرف كميات منطقة A 8 علي العقود							
رقم البند	البند	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 09 / 30	عقد (2023 / 2022 / 1932)	عقد (2023 / 2022 / 1934)	عقد (2023 / 2022 / 1933)	عقد (2024 / 2023 / 453)	الكمية الاجمالية المصروفة
3	حفرة تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	1,010,852	579,486	110,241	237,807	83,318	1,010,852
4	حفر تربة صخرية						
	إجهاد (200-300) كجم / سم ²	36,307	6,857	0	29,450		36,307
	إجهاد (300-400) كجم / سم ²	283,942	0	180,134	103,808		283,942
	إجهاد (400-500) كجم / سم ²	20,850	0	19,977	0	873	20,850
	إجهاد (500-600) كجم / سم ²	6,455	3,450	0	3,005		6,455
	إجهاد (600-700) كجم / سم ²	26,819	10,753	0	9,702	6,364	26,819

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام

مستشار الاستشارات الهندسية

الإستشاري المنفذ

الاستشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه
