

ELOMDA

FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT
شركة العمدة للمقاولات العامة
وإنشاء ورصف الطرق
EST. 1975



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في
المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية)

طول ١٠ كم

ashraf / المنطقة الثالثة عشر (كفر الشيخ - البحيرة).

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

(حسني ممدوح عبد الوهاب وشركاه)



حصر جاري لأعمال مستخلص رقم (٣) جاري



عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

بيان بحصر كميات مستخلص رقم ٣

الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثالثة عشر (البيرة - كفرالشيخ)



م	توصيف البند	الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييسة	الحصر حتى تاريخه	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي
٢	أعمال تطهير الموقع من الأشجار المزروعة والمخلفات ... الخ	٢م	١٨٠,٠٠٠	١٧٦٣٨٢,٩	١٢٠٠,٠
٤	أعمال حفر في جميع أنواع التربة عد الصخريه ... الخ	٣م	٢٥٠,٠٠٠	٢٨٤٥٠٥,١	١٢٣٠٠,٠
٦	أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ... الخ	٣م	٢٥٠,٠٠٠	١٣٣٣٢٠,٠	٤٠٠٠,٠
١٢	أعمال توريد وتركيب برايخ مواسير قطر ١ م ... الخ	م.ط	١,٥٠٠	٧٠٢,٠	٢٢٠
١٣	أعمال توريد وصب خرسانة العادية ... الخ	٣م	١,٠٠٠	١٠٨٦,٠	١٠٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



 <p>ELOMDA FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT شركة المدنة للمقاولات العامة وأشغال البناء ورصف الطرق EST. 1975</p>	<p>عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم</p> <p>عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨١</p> <p>تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة لانشاء ورصف الطرق</p> <p>حصر مستخلص رقم (٣) جاري</p>	 <p>الهيئة العامة للطرق والجسور المنطقة الثالثة غرب (الجيزة - قطاع غرب)</p>
اسم البند : بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ		
رقم البند : (٤)		
كمية البند بالمقاييسة : ١٨٠٠٠٠ م ٢		
١٧٦٣٨٢,٩	الكمية الاجمالية للحصر	
١٦٨٠٠٠	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص	
٥٩٥,٢%	نسبة الصرف للبند	
١٥٦٠٠٠	الكمية المصروفة بأخر مستخلص	
١٢٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	

مهندس الهيئة



الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة
الاسم / صيام أمير



عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

قطاع من محطة ١٢٤,٨٢٠ حتى محطة ١٢٧,٨٢٠

المسطح	متوسط العرض	العرض	الطول	محطة
٤٥٣,٩	٢٣,١	٢٣,١	٠	١٢٤,٨٢٠
٤٥٢,٨	٢٢,٦	٢٢,١	٢٠	١٢٤,٨٤٠
٤٥٩,٥	٢٣,٠	٢٣,٨	٢٠	١٢٤,٨٦٠
٤٧٠,٤	٢٣,٥	٢٣,٢	٢٠	١٢٤,٨٨٠
٤٥٨,٤	٢٢,٩	٢٢,٦	٢٠	١٢٤,٩٠٠
٤٤٧,٨	٢٢,٤	٢٢,٢	٢٠	١٢٤,٩٢٠
٤٤٤,٥	٢٢,٢	٢٢,٣	٢٠	١٢٤,٩٤٠
٤٤٤,٣	٢٢,٢	٢٢,٢	٢٠	١٢٤,٩٦٠
٤٤٤,٥	٢٢,٢	٢٢,٣	٢٠	١٢٤,٩٨٠
٤٥٩,٧	٢٣,٠	٢٣,٧	٢٠	١٢٥,٠٠٠
٤٦١,٣	٢٣,١	٢٢,٥	٢٠	١٢٥,٠٢٠
٤٥٧,٨	٢٢,٩	٢٢,٣	٢٠	١٢٥,٠٤٠
٤٦١,٤	٢٣,١	٢٢,٨	٢٠	١٢٥,٠٦٠
٤٥٥,٥	٢٢,٨	٢٢,٧	٢٠	١٢٥,٠٨٠
٤٥٤,٨	٢٢,٧	٢٢,٨	٢٠	١٢٥,١٠٠
٤٤٩,٤	٢٢,٥	٢٢,٢	٢٠	١٢٥,١٢٠
٤٤٦,٥	٢٢,٣	٢٢,٥	٢٠	١٢٥,١٤٠
٤٤٥,٢	٢٢,٣	٢٢,١	٢٠	١٢٥,١٦٠
٤٤٢,٣	٢٢,١	٢٢,٢	٢٠	١٢٥,١٨٠
٤٤٤,٦	٢٢,٢	٢٢,٣	٢٠	١٢٥,٢٠٠
٤٥٠,٢	٢٢,٥	٢٢,٧	٢٠	١٢٥,٢٢٠
٤٥٧,٥	٢٢,٩	٢٣,٠	٢٠	١٢٥,٢٤٠
٤٦١,٦	٢٣,١	٢٣,١	٢٠	١٢٥,٢٦٠
٤٦١,٣	٢٣,١	٢٣,٠	٢٠	١٢٥,٢٨٠
٤٦١,٣	٢٣,١	٢٣,١	٢٠	١٢٥,٣٠٠
٤٦١,٨	٢٣,١	٢٣,١	٢٠	١٢٥,٣٢٠
٤٥٥,١	٢٢,٨	٢٢,٥	٢٠	١٢٥,٣٤٠
٤٤٦,٣	٢٢,٣	٢٢,٢	٢٠	١٢٥,٣٦٠
٣٩٠,٨	١٩,٥	١٦,٩	٢٠	١٢٥,٣٨٠
٣٦٣,٢	١٨,٢	١٩,٤	٢٠	١٢٥,٤٠٠
٣٩٥,٢	١٩,٨	٢٠,١	٢٠	١٢٥,٤٢٠
٤٠١,١	٢٠,١	٢٠,٠	٢٠	١٢٥,٤٤٠
٤٠٥,٤	٢٠,٣	٢٠,٥	٢٠	١٢٥,٤٦٠
٤١٨,٣	٢٠,٩	٢١,٣	٢٠	١٢٥,٤٨٠
٤٢٧,٠	٢١,٣	٢١,٤	٢٠	١٢٥,٥٠٠
٤٢٦,٤	٢١,٣	٢١,٢	٢٠	١٢٥,٥٢٠
٤١٤,٢	٢٠,٧	٢٠,٢	٢٠	١٢٥,٥٤٠
٤١٦,٨	٢٠,٨	٢١,٥	٢٠	١٢٥,٥٦٠
٤٢٥,٤	٢١,٣	٢١,٠	٢٠	١٢٥,٥٨٠
٤١٩,٢	٢١,٠	٢٠,٩	٢٠	١٢٥,٦٠٠
٤٢٨,٠	٢١,٤	٢١,٩	٢٠	١٢٥,٦٢٠
٤٤٦,٣	٢٢,٣	٢٢,٧	٢٠	١٢٥,٦٤٠
٤٥٨,٦	٢٢,٩	٢٣,١	٢٠	١٢٥,٦٦٠
٤٦٤,٣	٢٣,٢	٢٣,٣	٢٠	١٢٥,٦٨٠
٤٦٩,١	٢٣,٥	٢٣,٦	٢٠	١٢٥,٧٠٠
٤٧٦,٣	٢٣,٨	٢٤,٠	٢٠	١٢٥,٧٢٠
٤٧٦,٧	٢٣,٨	٢٣,٧	٢٠	١٢٥,٧٤٠
٤٧٣,٤	٢٣,٧	٢٣,٧	٢٠	١٢٥,٧٦٠
٤٧٣,١	٢٣,٧	٢٣,٦	٢٠	١٢٥,٧٨٠
٤٧٣,٣	٢٣,٧	٢٣,٧	٢٠	١٢٥,٨٠٠
٤٧٤,٤	٢٣,٧	٢٣,٨	٢٠	١٢٥,٨٢٠
٢٢٢٧٢,٠	حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

قطاع من محطة ١٢٤,٨٢٠ حتى محطة ١٢٧,٨٢٠

المسطح	متوسط العرض	العرض	الطول	محطة
اجمالي الكمية السابقة				
٤٧٥,٥	٢٣,٨	٢٣,٨	٢٠	١٢٥,٨٤٠
٤٧٦,٦	٢٣,٨	٢٣,٩	٢٠	١٢٥,٨٦٠
٤٧٥,٢	٢٣,٨	٢٣,٧	٢٠	١٢٥,٨٨٠
٤٧٢,٩	٢٣,٦	٢٣,٦	٢٠	١٢٥,٩٠٠
٤٧٣,٢	٢٣,٧	٢٣,٧	٢٠	١٢٥,٩٢٠
٤٧٣,٤	٢٣,٧	٢٣,٧	٢٠	١٢٥,٩٤٠
٤٧١,٥	٢٣,٦	٢٣,٥	٢٠	١٢٥,٩٦٠
٤٧٠,٦	٢٣,٥	٢٣,٦	٢٠	١٢٥,٩٨٠
٤٦٩,١	٢٣,٥	٢٣,٣	٢٠	١٢٦,٠٠٠
٤٦٥,٣	٢٣,٣	٢٣,٢	٢٠	١٢٦,٠٢٠
٤٥٧,٤	٢٢,٩	٢٢,٥	٢٠	١٢٦,٠٤٠
٤٦٢,٤	٢٣,١	٢٣,٧	٢٠	١٢٦,٠٦٠
٤٧٠,٧	٢٣,٥	٢٣,٤	٢٠	١٢٦,٠٨٠
٤٦٥,٢	٢٣,٣	٢٣,١	٢٠	١٢٦,١٠٠
٤٦٤,١	٢٣,٢	٢٣,٣	٢٠	١٢٦,١٢٠
٤٥٨,٤	٢٢,٩	٢٢,٦	٢٠	١٢٦,١٤٠
٤٤٩,٧	٢٢,٥	٢٢,٤	٢٠	١٢٦,١٦٠
٤٥٦,٦	٢٢,٨	٢٢,٣	٢٠	١٢٦,١٨٠
٤٦٧,٠	٢٢,٤	٢٣,٤	٢٠	١٢٦,٢٠٠
٤٦٧,٦	٢٢,٤	٢٣,٣	٢٠	١٢٦,٢٢٠
٤٦٢,٨	٢٣,١	٢٢,٩	٢٠	١٢٦,٢٤٠
٤٥٤,٩	٢٢,٧	٢٢,٥	٢٠	١٢٦,٢٦٠
٤٤٥,٤	٢٢,٣	٢٢,٠	٢٠	١٢٦,٢٨٠
٤٥٩,١	٢٣,٠	٢٣,٩	٢٠	١٢٦,٣٠٠
٤٧٨,٤	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٠	١٢٦,٣٢٠
٤٧٨,٥	٢٣,٩	٢٣,٩	٢٠	١٢٦,٣٤٠
٤٧٨,٧	٢٣,٩	٢٤,٠	٢٠	١٢٦,٣٦٠
٤٨٠,٣	٢٤,٠	٢٤,١	٢٠	١٢٦,٣٨٠
٤٨١,٤	٢٤,١	٢٤,١	٢٠	١٢٦,٤٠٠
٤٧٦,١	٢٣,٨	٢٣,٦	٢٠	١٢٦,٤٢٠
٤٦٥,٦	٢٣,٣	٢٣,٠	٢٠	١٢٦,٤٤٠
٤٥٤,٤	٢٢,٧	٢٢,٤	٢٠	١٢٦,٤٦٠
٤٤٢,٩	٢٢,١	٢١,٨	٢٠	١٢٦,٤٨٠
٤٣٨,٢	٢١,٩	٢٢,٠	٢٠	١٢٦,٥٠٠
٤٣٩,٧	٢٢,٠	٢٢,٠	٢٠	١٢٦,٥٢٠
٤٣٩,٢	٢٢,٠	٢١,٩	٢٠	١٢٦,٥٤٠
٤٤٠,٥	٢٢,٠	٢٢,١	٢٠	١٢٦,٥٦٠
٤٣٦,٣	٢١,٨	٢١,٥	٢٠	١٢٦,٥٨٠
٤٢٩,٩	٢١,٥	٢١,٥	٢٠	١٢٦,٦٠٠
٤٢٦,٠	٢١,٣	٢١,١	٢٠	١٢٦,٦٢٠
٤٠٣,٠	٢٠,١	١٩,٢	٢٠	١٢٦,٦٤٠
٤٣٥,٠	٢١,٧	٢٤,٣	٢٠	١٢٦,٦٦٠
٤٨٦,١	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٢٦,٦٨٠
٤٨٥,٧	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٢٦,٧٠٠
٤٨١,٧	٢٤,١	٢٣,٩	٢٠	١٢٦,٧٢٠
٤٨٢,٥	٢٤,١	٢٤,٤	٢٠	١٢٦,٧٤٠
٤٨٧,٨	٢٤,٤	٢٤,٤	٢٠	١٢٦,٧٦٠
٤٨٦,٥	٢٤,٣	٢٤,٢	٢٠	١٢٦,٧٨٠
٤٨٦,٣	٢٤,٣	٢٤,٤	٢٠	١٢٦,٨٠٠
٤٨٦,٤	٢٤,٣	٢٤,٢	٢٠	١٢٦,٨٢٠
حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ				
٤٥٤٤٣,٧				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم


حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق


قطاع من محطة ١٢٤,٨٢٠ حتى محطة ١٢٧,٨٢٠

محطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح
اجمالي الكمية السابقة				
٤٥٤٤٣,٧				
٤٨٥,١	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٢٦,٨٤٠
٤٨٦,٤	٢٤,٣	٢٤,٤	٢٠	١٢٦,٨٦٠
٤٨٥,٠	٢٤,٢	٢٤,١	٢٠	١٢٦,٨٨٠
٤٨٥,٢	٢٤,٣	٢٤,٤	٢٠	١٢٦,٩٠٠
٤٨٩,٥	٢٤,٥	٢٤,٦	٢٠	١٢٦,٩٢٠
٤٨٦,٨	٢٤,٣	٢٤,١	٢٠	١٢٦,٩٤٠
٤٦٥,٢	٢٣,٣	٢٢,٤	٢٠	١٢٦,٩٦٠
٤٥٥,٨	٢٢,٨	٢٣,٢	٢٠	١٢٦,٩٨٠
٤٧٣,٥	٢٣,٧	٢٤,٢	٢٠	١٢٧,٠٠٠
٤٨٩,٢	٢٤,٥	٢٤,٨	٢٠	١٢٧,٠٢٠
٤٩٦,٣	٢٤,٨	٢٤,٩	٢٠	١٢٧,٠٤٠
٤٩٣,٥	٢٤,٧	٢٤,٥	٢٠	١٢٧,٠٦٠
٤٩٤,٣	٢٤,٧	٢٥,٠	٢٠	١٢٧,٠٨٠
٤٩٨,٣	٢٤,٩	٢٤,٩	٢٠	١٢٧,١٠٠
٤٩٥,٨	٢٤,٨	٢٤,٧	٢٠	١٢٧,١٢٠
٤٧٨,٤	٢٣,٩	٢٣,١	٢٠	١٢٧,١٤٠
٤٥٥,٥	٢٢,٨	٢٢,٤	٢٠	١٢٧,١٦٠
٤٤٧,١	٢٢,٤	٢٢,٣	٢٠	١٢٧,١٨٠
٤٧٤,١	٢٣,٧	٢٥,١	٢٠	١٢٧,٢٠٠
٥٠١,٦	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٢٧,٢٢٠
٥٠٠,٤	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٠	١٢٧,٢٤٠
٤٩٨,٨	٢٤,٩	٢٤,٩	٢٠	١٢٧,٢٦٠
٤٩٨,١	٢٤,٩	٢٤,٩	٢٠	١٢٧,٢٨٠
٤٩٨,٦	٢٤,٩	٢٤,٩	٢٠	١٢٧,٣٠٠
٥٠١,٣	٢٥,١	٢٥,٢	٢٠	١٢٧,٣٢٠
٥٠٤,٠	٢٥,٢	٢٥,٢	٢٠	١٢٧,٣٤٠
٥٠٤,٢	٢٥,٢	٢٥,٢	٢٠	١٢٧,٣٦٠
٥٠٤,٤	٢٥,٢	٢٥,٢	٢٠	١٢٧,٣٨٠
٥٠٢,٩	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٢٧,٤٠٠
٥٠١,٣	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٢٧,٤٢٠
٥٠١,٥	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٢٧,٤٤٠
٥٠٢,٣	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٢٧,٤٦٠
٥٠٣,٤	٢٥,٢	٢٥,٢	٢٠	١٢٧,٤٨٠
٥٠٤,٩	٢٥,٢	٢٥,٣	٢٠	١٢٧,٥٠٠
٥٠٥,٩	٢٥,٣	٢٥,٣	٢٠	١٢٧,٥٢٠
٥٠٣,٤	٢٥,٢	٢٥,٠	٢٠	١٢٧,٥٤٠
٥٠١,٢	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٢٧,٥٦٠
٥٠٠,٥	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٠	١٢٧,٥٨٠
٥٠٤,٥	٢٥,٢	٢٥,٥	٢٠	١٢٧,٦٠٠
٥٠٧,٤	٢٥,٤	٢٥,٣	٢٠	١٢٧,٦٢٠
٥٠٤,٩	٢٥,٢	٢٥,٢	٢٠	١٢٧,٦٤٠
٥٠٥,٢	٢٥,٣	٢٥,٣	٢٠	١٢٧,٦٦٠
٥٠٥,٣	٢٥,٣	٢٥,٢	٢٠	١٢٧,٦٨٠
٥٠٢,٩	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٢٧,٧٠٠
٥٠٠,٧	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٠	١٢٧,٧٢٠
٥٠٠,١	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٠	١٢٧,٧٤٠
٥٠٢,٤	٢٥,١	٢٥,٢	٢٠	١٢٧,٧٦٠
٥٠٠,١	٢٥,٠	٢٤,٨	٢٠	١٢٧,٧٨٠
٤٦٧,٨	٢٣,٤	٢٢,٠	٢٠	١٢٧,٨٠٠
٤٤١,٤	٢٢,١	٢٢,١	٢٠	١٢٧,٨٢٠
حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ				
٧٠٠٦٠,١				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصص بند رقم (٢) بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

قطاع من محطة ١٢٨,٨٢٠ حتى محطة ١٢٩,٦٠٠

محطة	الطول	العرض	متوسط العرض	المسطح
اجمالي الكمية السابقة				
١٢٨,٨٢٠	٠	٢٥,٢	٢٣,٦	٤٩٩,٦
١٢٨,٨٤٠	٠	٢٤,٨	٢٥,٠	٤٨٩,١
١٢٨,٨٦٠	٠	٢٤,٢	٢٤,٥	٤٨٣,٩
١٢٨,٨٨٠	٠	٢٤,٢	٢٤,٢	٤٨٢,٧
١٢٨,٩٠٠	٠	٢٤,٠	٢٤,١	٤٧٤,٥
١٢٨,٩٢٠	٠	٢٣,٤	٢٣,٧	٤٧٨,٩
١٢٨,٩٤٠	٠	٢٤,٥	٢٣,٩	٤٨٧,٣
١٢٨,٩٦٠	٠	٢٤,٣	٢٤,٤	٤٧٥,٩
١٢٨,٩٨٠	٠	٢٣,٣	٢٣,٨	٤٧٦,٣
١٢٩,٠٠٠	٠	٢٤,٣	٢٣,٨	٤٨٦,٧
١٢٩,٠٢٠	٠	٢٤,٤	٢٤,٣	٤٨٤,٥
١٢٩,٠٤٠	٠	٢٤,١	٢٤,٢	٤٨٣,٤
١٢٩,٠٦٠	٠	٢٤,٢	٢٤,٢	٤٨٤,٩
١٢٩,٠٨٠	٠	٢٤,٢	٢٤,٢	٤٨٣,٣
١٢٩,١٠٠	٠	٢٤,١	٢٤,٢	٤٨٢,٤
١٢٩,١٢٠	٠	٢٤,١	٢٤,١	٤٨١,٤
١٢٩,١٤٠	٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٤٨١,٧
١٢٩,١٦٠	٠	٢٤,٢	٢٤,١	٤٨٢,٩
١٢٩,١٨٠	٠	٢٤,١	٢٤,١	٤٨٠,٢
١٢٩,٢٠٠	٠	٢٣,٩	٢٤,٠	٤٨٢,٦
١٢٩,٢٢٠	٠	٢٤,٣	٢٤,١	٤٨٧,٤
١٢٩,٢٤٠	٠	٢٤,٤	٢٤,٤	٤٨٦,٩
١٢٩,٢٦٠	٠	٢٤,٣	٢٤,٣	٤٨٥,٣
١٢٩,٢٨٠	٠	٢٤,٣	٢٤,٣	٤٨٦,٤
١٢٩,٣٠٠	٠	٢٤,٤	٢٤,٣	٤٨٨,٧
١٢٩,٣٢٠	٠	٢٤,٥	٢٤,٤	٤٨٩,٧
١٢٩,٣٤٠	٠	٢٤,٥	٢٤,٥	٤٨٣,٥
١٢٩,٣٦٠	٠	٢٣,٩	٢٤,٢	٤٧٠,٢
١٢٩,٣٨٠	٠	٢٣,١	٢٣,٥	٤٧١,٠
١٢٩,٤٠٠	٠	٢٤,٠	٢٣,٦	٤٨٣,٥
١٢٩,٤٢٠	٠	٢٤,٤	٢٤,٢	٤٨٧,٠
١٢٩,٤٤٠	٠	٢٤,٣	٢٤,٤	٤٨٦,١
١٢٩,٤٦٠	٠	٢٤,٣	٢٤,٣	٥٣١,١
١٢٩,٤٨٠	٠	٢٨,٨	٢٦,٦	٥٠٨,٢
١٢٩,٤٠٠	٠	٢٢,٠	٢٥,٤	٤٥٢,٠
١٢٩,٤٢٠	٠	٢٣,٢	٢٢,٦	٤٥٦,٠
١٢٩,٤٤٠	٠	٢٢,٤	٢٢,٨	٤٦٤,٠
١٢٩,٤٦٠	٠	٢٤,٠	٢٣,٢	٤٨٢,٠
١٢٩,٤٨٠	٠	٢٤,٢	٢٤,١	٤٩٠,٠
١٢٩,٤٠٠	٠	٢٤,٨	٢٤,٥	٨٨٩١٠,٦

حصص بند رقم (٢) بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

ELOMDAFOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT
شركة العمدة للمقاولات العامة
وأشغال ورصف الطرق
EST. 1975الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثالثة غرب (البيرة - كل شيخ)

عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق


قطاع من محطة ١٢٩,٦٠٠ حتى محطة ١٣٢,٦٠٠

المسطح	متوسط العرض	العرض	الطول	محطة
اجمالي الكمية السابقة				
٨٨٩١٠,٦				
٠,٠	٢٥,٢	٢٥,٢	٠	١٢٩,٦٠٠
٥٠٣,٦	٢٥,٢	٢٥,١	٢٠	١٢٩,٦٢٠
٥٠٢,٨	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٢٩,٦٤٠
٥٠١,٧	٢٥,٣	٢٥,٥	٢٠	١٢٩,٦٦٠
٥١٠,٨	٢٥,٥	٢٥,٥	٢٠	١٢٩,٦٨٠
٥٠٩,٥	٢٥,٥	٢٥,٤	٢٠	١٢٩,٧٠٠
٥٠٨,١	٢٥,٣	٢٥,٢	٢٠	١٢٩,٧٢٠
٤٩٩,٦	٢٥,٠	٢٤,٨	٢٠	١٢٩,٧٤٠
٤٨٩,١	٢٤,٥	٢٤,٢	٢٠	١٢٩,٧٦٠
٤٨٣,٩	٢٤,٢	٢٤,٢	٢٠	١٢٩,٧٨٠
٤٨٢,٧	٢٤,١	٢٤,٠	٢٠	١٢٩,٨٠٠
٤٧٤,٥	٢٣,٧	٢٣,٤	٢٠	١٢٩,٨٢٠
٤٧٨,٩	٢٣,٩	٢٤,٥	٢٠	١٢٩,٨٤٠
٤٨٧,٣	٢٤,٤	٢٤,٣	٢٠	١٢٩,٨٦٠
٤٧٥,٩	٢٣,٨	٢٣,٣	٢٠	١٢٩,٨٨٠
٤٧٦,٣	٢٣,٨	٢٤,٣	٢٠	١٢٩,٩٠٠
٤٨٦,٧	٢٤,٣	٢٤,٤	٢٠	١٢٩,٩٢٠
٤٨٤,٥	٢٤,٢	٢٤,١	٢٠	١٢٩,٩٤٠
٤٨٣,٤	٢٤,٢	٢٤,٢	٢٠	١٢٩,٩٦٠
٤٨٤,٩	٢٤,٢	٢٤,٢	٢٠	١٢٩,٩٨٠
٤٨٣,٣	٢٤,٢	٢٤,١	٢٠	١٣٠,٠٠٠
٤٨٦,٧	٢٤,١	٢٤,١	٢٠	١٣٠,٠٢٠
٤٨١,٠	٢٤,٠	٢٤,٠	٢٠	١٣٠,٠٤٠
٤٨١,٧	٢٤,١	٢٤,٢	٢٠	١٣٠,٠٦٠
٤٨٢,٩	٢٤,١	٢٤,١	٢٠	١٣٠,٠٨٠
٤٨٠,٢	٢٤,٠	٢٣,٩	٢٠	١٣٠,١٠٠
٤٨٢,٦	٢٤,١	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,١٢٠
٤٨٧,٤	٢٤,٤	٢٤,٤	٢٠	١٣٠,١٤٠
٤٨٦,٩	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,١٦٠
٤٨٥,٣	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,١٨٠
٤٨٦,٤	٢٤,٣	٢٤,٤	٢٠	١٣٠,٢٠٠
٤٨٨,٧	٢٤,٤	٢٤,٥	٢٠	١٣٠,٢٢٠
٤٨٩,٧	٢٤,٥	٢٤,٥	٢٠	١٣٠,٢٤٠
٤٨٣,٥	٢٤,٢	٢٣,٩	٢٠	١٣٠,٢٦٠
٤٧٠,٢	٢٣,٥	٢٣,١	٢٠	١٣٠,٢٨٠
٤٧١,٠	٢٣,٦	٢٤,٠	٢٠	١٣٠,٣٠٠
٤٨٣,٥	٢٤,٢	٢٤,٤	٢٠	١٣٠,٣٢٠
٤٨٧,٠	٢٤,٤	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,٣٤٠
٤٨٦,١	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,٣٦٠
٤٨٦,١	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,٣٨٠
٤٨٨,٢	٢٤,٤	٢٤,٥	٢٠	١٣٠,٤٠٠
٤٨٠,٠	٢٤,٠	٢٣,٥	٢٠	١٣٠,٤٢٠
٤٧١,٠	٢٣,٦	٢٣,٦	٢٠	١٣٠,٤٤٠
٤٨١,٦	٢٤,١	٢٤,٦	٢٠	١٣٠,٤٦٠
٤٩١,٨	٢٤,٦	٢٤,٦	٢٠	١٣٠,٤٨٠
٤٩٤,٥	٢٤,٧	٢٤,٨	٢٠	١٣٠,٥٠٠
٤٩٥,٦	٢٤,٨	٢٤,٧	٢٠	١٣٠,٥٢٠
٤٩٦,٣	٢٤,٨	٢٤,٩	٢٠	١٣٠,٥٤٠
٥٠٤,٣	٢٥,٢	٢٥,٥	٢٠	١٣٠,٥٦٠
٥٠٧,٠	٢٥,٤	٢٥,٢	٢٠	١٣٠,٥٨٠
٥٠٣,٠	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٣٠,٦٠٠
حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ				
١١٣٣١٦,٧				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



ELOMDAFOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT
شركة المعدة للمقاولات العامة
وإنشاء ورصف الطرق
EST. 1975الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثالثة عشر (الجديدة - فلورنس)

عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

قطاع من محطة ١٢٩,٦٠٠ حتى محطة ١٣٢,٦٠٠

المسطح	متوسط العرض	العرض	الطول	محطة
اجمالي الكمية السابقة				
١١٣٣١٦,٧				
٥٠٣,٠	٢٥,١	٢٥,٢	٢٠	١٣٠,٦٢٠
٤٩٧,٨	٢٤,٩	٢٤,٦	٢٠	١٣٠,٦٤٠
٤٨٨,٨	٢٤,٤	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,٦٦٠
٤٨٥,٢	٢٤,٣	٢٤,٢	٢٠	١٣٠,٦٨٠
٤٨٥,٧	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,٧٠٠
٤٩٢,٢	٢٤,٦	٢٤,٩	٢٠	١٣٠,٧٢٠
٤٩٨,٩	٢٤,٩	٢٥,٠	٢٠	١٣٠,٧٤٠
٥٠٢,٥	٢٥,١	٢٥,٣	٢٠	١٣٠,٧٦٠
٥٠٣,٧	٢٥,٢	٢٥,١	٢٠	١٣٠,٧٨٠
٥٠٢,٧	٢٥,١	٢٥,٢	٢٠	١٣٠,٨٠٠
٤٩٦,٢	٢٤,٨	٢٤,٥	٢٠	١٣٠,٨٢٠
٤٨٧,٢	٢٤,٤	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,٨٤٠
٤٨٥,٤	٢٤,٣	٢٤,٣	٢٠	١٣٠,٨٦٠
٤٩٢,٤	٢٤,٦	٢٥,٠	٢٠	١٣٠,٨٨٠
٥٠٢,٠	٢٥,١	٢٥,٢	٢٠	١٣٠,٩٠٠
٤٩٨,٨	٢٤,٩	٢٤,٦	٢٠	١٣٠,٩٢٠
٤٩٠,٧	٢٤,٥	٢٤,٤	٢٠	١٣٠,٩٤٠
٤٨٨,٢	٢٤,٤	٢٤,٤	٢٠	١٣٠,٩٦٠
٤٨٤,٢	٢٤,٢	٢٤,٠	٢٠	١٣٠,٩٨٠
٤٨١,٣	٢٤,١	٢٤,١	٢٠	١٣١,٠٠٠
٤٨٥,٨	٢٤,٣	٢٤,٥	٢٠	١٣١,٠٢٠
٤٩٤,٠	٢٤,٧	٢٤,٩	٢٠	١٣١,٠٤٠
٥٠١,٤	٢٥,١	٢٥,٢	٢٠	١٣١,٠٦٠
٥٠٥,٨	٢٥,٣	٢٥,٤	٢٠	١٣١,٠٨٠
٥٠٤,٧	٢٥,٢	٢٥,١	٢٠	١٣١,١٠٠
٥٠٣,٨	٢٥,٢	٢٥,٣	٢٠	١٣١,١٢٠
٥٠٧,٥	٢٥,٤	٢٥,٥	٢٠	١٣١,١٤٠
٥١١,٢	٢٥,٦	٢٥,٦	٢٠	١٣١,١٦٠
٥١١,٦	٢٥,٦	٢٥,٥	٢٠	١٣١,١٨٠
٥١٠,٧	٢٥,٥	٢٥,٥	٢٠	١٣١,٢٠٠
٥١٠,٤	٢٥,٥	٢٥,٥	٢٠	١٣١,٢٢٠
٥١٢,١	٢٥,٦	٢٥,٧	٢٠	١٣١,٢٤٠
٥١١,٦	٢٥,٦	٢٥,٥	٢٠	١٣١,٢٦٠
٥٠٤,٨	٢٥,٢	٢٥,٠	٢٠	١٣١,٢٨٠
٥٠٣,٦	٢٥,٢	٢٥,٣	٢٠	١٣١,٣٠٠
٥٠٣,٩	٢٥,٢	٢٥,١	٢٠	١٣١,٣٢٠
٤٧٨,٩	٢٢,٩	٢٢,٨	٢٠	١٣١,٣٤٠
٤٦٥,٩	٢٢,٣	٢٢,٨	٢٠	١٣١,٣٦٠
٤٧٢,٢	٢٢,٦	٢٢,٥	٢٠	١٣١,٣٨٠
٤٦٧,٥	٢٢,٤	٢٢,٣	٢٠	١٣١,٤٠٠
٤٦٧,٣	٢٢,٤	٢٢,٤	٢٠	١٣١,٤٢٠
٤٦٩,١	٢٢,٥	٢٢,٥	٢٠	١٣١,٤٤٠
٤٦٩,٣	٢٢,٥	٢٢,٥	٢٠	١٣١,٤٦٠
٤٦٩,٤	٢٢,٥	٢٢,٥	٢٠	١٣١,٤٨٠
٤٦٧,٨	٢٢,٤	٢٢,٣	٢٠	١٣١,٥٠٠
٤٤٩,٧	٢٢,٥	٢١,٧	٢٠	١٣١,٥٢٠
٤٠٦,٨	٢٠,٣	١٩,٠	٢٠	١٣١,٥٤٠
٤٤٢,٩	٢٢,٢	٢٥,٤	٢٠	١٣١,٥٦٠
٥٠٧,٩	٢٥,٤	٢٥,٤	٢٠	١٣١,٥٨٠
٥٠٥,٨	٢٥,٣	٢٥,٢	٢٠	١٣١,٦٠٠
حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ				
١٣٧٨٠٧,٩				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

تنفيذ / شركة العدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

قطاع من محطة ١٢٩,٦٠٠ حتى محطة ١٣٢,٦٠٠

المسطح	متوسط العرض	العرض	الطول	محطة
اجمالي الكمية السابقة				
١٣٧٨٠٧,٩				
٥٠٥,٧	٢٥,٣	٢٥,٤	٢٠	١٣١,٦٢٠
٥٠٨,٦	٢٥,٤	٢٥,٥	٢٠	١٣١,٦٤٠
٥٠٥,٢	٢٥,٣	٢٥,١	٢٠	١٣١,٦٦٠
٥٠٣,٤	٢٥,٢	٢٥,٣	٢٠	١٣١,٦٨٠
٥٠٠,٧	٢٥,٠	٢٤,٨	٢٠	١٣١,٧٠٠
٤٩٦,٦	٢٤,٨	٢٤,٩	٢٠	١٣١,٧٢٠
٤٩٩,٢	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٠	١٣١,٧٤٠
٥٠١,٣	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٣١,٧٦٠
٥٠١,٣	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٣١,٧٨٠
٤٩٨,٨	٢٤,٩	٢٤,٨	٢٠	١٣١,٨٠٠
٤٩٨,٤	٢٤,٩	٢٥,٠	٢٠	١٣١,٨٢٠
٤٩٩,٠	٢٥,٠	٢٤,٩	٢٠	١٣١,٨٤٠
٤٩٣,٣	٢٤,٧	٢٤,٤	٢٠	١٣١,٨٦٠
٤٩٦,٤	٢٤,٨	٢٥,٢	٢٠	١٣١,٨٨٠
٥٠١,١	٢٥,١	٢٥,٠	٢٠	١٣١,٩٠٠
٤٩٦,٩	٢٤,٨	٢٤,٧	٢٠	١٣١,٩٢٠
٥٠٠,٤	٢٥,٠	٢٥,٤	٢٠	١٣١,٩٤٠
٥٠٤,١	٢٥,٢	٢٥,١	٢٠	١٣١,٩٦٠
٥٠١,٣	٢٥,١	٢٥,١	٢٠	١٣١,٩٨٠
٥٠١,١	٢٥,١	٢٥,٠	٢٠	١٣٢,٠٠٠
٥٠٠,٨	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٠	١٣٢,٠٢٠
٥٠١,٩	٢٥,١	٢٥,٢	٢٠	١٣٢,٠٤٠
٥٠١,٨	٢٥,١	٢٥,٠	٢٠	١٣٢,٠٦٠
٥٠٠,٣	٢٥,٠	٢٥,٠	٢٠	١٣٢,٠٨٠
٤٩٤,١	٢٤,٧	٢٤,٤	٢٠	١٣٢,١٠٠
٤٩٦,٣	٢٤,٨	٢٥,٢	٢٠	١٣٢,١٢٠
٥١٤,٧	٢٥,٧	٢٦,٣	٢٠	١٣٢,١٤٠
٥٣٩,٧	٢٧,٠	٢٧,٧	٢٠	١٣٢,١٦٠
٥٦٣,٨	٢٨,٢	٢٨,٧	٢٠	١٣٢,١٨٠
٥٧٦,٤	٢٨,٨	٢٩,٠	٢٠	١٣٢,٢٠٠
٥٧٧,٥	٢٨,٩	٢٨,٨	٢٠	١٣٢,٢٢٠
٥٧٣,٠	٢٨,٧	٢٨,٥	٢٠	١٣٢,٢٤٠
٥٦٩,٤	٢٨,٥	٢٨,٤	٢٠	١٣٢,٢٦٠
٥٧٢,٣	٢٨,٦	٢٨,٨	٢٠	١٣٢,٢٨٠
٥٨٧,٧	٢٩,٤	٣٠,٠	٢٠	١٣٢,٣٠٠
٦١٨,٠	٣٠,٩	٣١,٨	٢٠	١٣٢,٣٢٠
٦٧٢,٥	٣٣,٦	٣٥,٤	٢٠	١٣٢,٣٤٠
٧٣٩,٤	٣٧,٠	٣٨,٥	٢٠	١٣٢,٣٦٠
٧٨٤,٧	٣٩,٢	٣٩,٩	٢٠	١٣٢,٣٨٠
٨٠٠,٩	٤٠,٠	٤٠,٢	٢٠	١٣٢,٤٠٠
٨٠٤,٩	٤٠,٢	٤٠,٣	٢٠	١٣٢,٤٢٠
٦٠٣,٣	٣٠,٢	٣٠,٠	٢٠	١٣٢,٤٤٠
٤٠٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٢٠	١٣٢,٤٦٠
٤٠٠,٠	٣٠,٠	٣٠,٠	٢٠	١٣٢,٤٨٠
٤٤٠,١	٢٢,٠	٢٤,٠	٢٠	١٣٢,٥٠٠
٤٨٥,٣	٢٤,٣	٢٤,٥	٢٠	١٣٢,٥٢٠
٤٨٨,٦	٢٤,٤	٢٤,٣	٢٠	١٣٢,٥٤٠
٤٦٧,٨	٢٣,٤	٢٢,٤	٢٠	١٣٢,٥٦٠
٤٤٥,٢	٢٢,٣	٢٢,١	٢٠	١٣٢,٥٨٠
٤٤١,٧	٢٢,١	٢٢,١	٢٠	١٣٢,٦٠٠
١٦٤٤٨٤,٠	حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

ELOMDA

FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT
شركة المددة للمقاولات العامة
وإنشاء ورصف الطرق
EST. 1975

البنية العامة للطرق والجاري
المنطقة الثالثة غرب (البيضاء - كل الشيخ)



عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

قطاع من محطة ١٢٧,٨٢٠ حتى محطة ١٢٨,٢٢٠

المسطح	متوسط العرض	العرض	الطول	محطة
اجمالي الكمية السابقة				
١٦٤٤٨٤,٠	٢٢,١	٢٢,١	٠	١٢٧,٨٢٠
٤٤٥,٥	٢٢,٣	٢٢,٤	٢٠	١٢٧,٨٤٠
٤٤٨,٧	٢٢,٤	٢٢,٥	٢٠	١٢٧,٨٦٠
٤٤٤,٨	٢٢,٢	٢٢,٠	٢٠	١٢٧,٨٨٠
٤٦٥,١	٢٣,٣	٢٤,٥	٢٠	١٢٧,٩٠٠
٥٠١,٦	٢٥,١	٢٥,٧	٢٠	١٢٧,٩٢٠
٥٢٧,٠	٢٦,٤	٢٧,٠	٢٠	١٢٧,٩٤٠
٥٥٨,٢	٢٧,٩	٢٨,٨	٢٠	١٢٧,٩٦٠
٥٩٠,٢	٢٩,٥	٣٠,٢	٢٠	١٢٧,٩٨٠
٦١٠,٠	٣٠,٥	٣٠,٨	٢٠	١٢٨,٠٠٠
٦١٦,٢	٣٠,٨	٣٠,٨	٢٠	١٢٨,٠٢٠
٦١٩,٦	٣١,٠	٣١,١	٢٠	١٢٨,٠٤٠
٦٤٢,٣	٣٢,١	٣٣,١	٢٠	١٢٨,٠٦٠
٦٥٧,٤	٣٢,٩	٣٢,٦	٢٠	١٢٨,٠٨٠
٦٥٤,٩	٣٢,٧	٣٢,٩	٢٠	١٢٨,١٠٠
٦٥٩,٤	٣٢,٠	٣٣,١	٢٠	١٢٨,١٢٠
٦٦٧,٧	٣٣,٤	٣٣,٧	٢٠	١٢٨,١٤٠
٦٧٦,٧	٣٣,٨	٣٤,٠	٢٠	١٢٨,١٦٠
٦٩٠,٧	٣٤,٥	٣٥,١	٢٠	١٢٨,١٨٠
٧٠٦,٥	٣٥,٣	٣٥,٦	٢٠	١٢٨,٢٠٠
٧١٦,٧	٣٥,٨	٣٦,١	٢٠	١٢٨,٢٢٠
حصر بند رقم (٢) بالметр المسطح اعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ... الخ				
١٧٦٣٨٢,٩				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

 ELOMDA <small>FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT</small> <small>شركة المددة للمقاولات العامة</small> <small>وأشغال البناء ورصف الطرق</small> <small>EST. 1975</small>	<p>عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم</p> <p>عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨١</p> <p>تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة لإنشاء ورصف الطرق</p> <p>حصر مستخلص رقم (٣) جاري</p>	
اسم البند : بالметр المكعب أعمال حفر في جميع أنواع التربة ما عدا الصخرية ... الخ		
رقم البند : (٤)		
كمية البند بالمقاييسة : ٣ م ٢٥٠٠٠		
٢٨٤٥٠٥,١	الكمية الإجمالية للحصر	
٢٥٠٠٠	الكمية الإجمالية المنصرفة بالمستخلص	
%٨٧,٩	نسبة الصرف للبند	
١٢٧٠٠	الكمية المصروفة بآخر مستخلص	
١٢٣٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	

مهندس الهيئة

الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم /
التوقيع /



 <p>الهيئة العامة للطرق والجسور المنطقة الثالثة غرب (البحيرة - كفرالشيخ)</p>		عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم															
		حصر بند رقم (٤) بالметр المكعب أعمال حفر في جميع أنواع التربة ما عدا الصخرية ... الخ															
		تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق															
		ميزانية من محطة ١٢٧,٨٢٠ حتى محطة ١٢٨,٢٢٠															
المكعب	متوسط السمك	فرق المتناسب				متناسب قاع حفر				متناسب الأرض الطبيعية				متوسط العرض	عرض	الطول	محطة
		١٢	٨	٤	٠	١٢	٨	٤	٠	١٢	٨	٤	٠				
٢٦٣٠٢٧,٣		اجمالي الكمية السابقة												٢٠	١٢٧,٨٤٠		
٨٣١,١	١,٨٥	٢,١٨	٢,١٣	١,٩٨	١,١٣	٦,٩٥	٧,٠٣	٧,١١	٧,١٩	٩,١٣	٩,١٦	٩,٠٩	٨,٣٢	٢٢,٤٢	٢٢,٤٢	٢٠	١٢٧,٨٤٠
٨٣٨,٣	١,٨٧	٢,٢٠	٢,١٤	٢,٠٢	١,١٣	٦,٩٥	٧,٠٣	٧,١١	٧,١٩	٩,١٥	٩,١٧	٩,١٣	٨,٣٢	٢٢,٤٣	٢٢,٤٥	٢٠	١٢٧,٨٦٠
٨٢٧,٥	١,٨٦	٢,٢١	٢,١٤	١,٩٦	١,١٢	٦,٩٦	٧,٠٤	٧,١٢	٧,٢٠	٩,١٧	٩,١٨	٩,٠٨	٨,٣٢	٢٢,٤٤	٢٢,٤٣	٢٠	١٢٧,٨٨٠
٨٤٦,٢	١,٨٢	٢,٠٩	٢,٠٧	٢,٠٠	١,١٢	٦,٩٦	٧,٠٤	٧,١٢	٧,٢٠	٩,٠٥	٩,١١	٩,١٢	٨,٣٢	٢٢,٤٥	٢٤,٤٧	٢٠	١٢٧,٩٠٠
٩٤٢,٤	١,٨٨	٢,٢٦	٢,٠٧	٢,٠٨	١,١٢	٦,٩٦	٧,٠٤	٧,١٢	٧,٢٠	٩,٢٢	٩,١١	٩,٢٠	٨,٣٢	٢٥,٠٨	٢٥,٦٨	٢٠	١٢٧,٩٢٠
٩١٢,٢	١,٧٣	٢,٠٤	١,٩٨	١,٩٣	٠,٩٦	٦,٩٧	٧,٠٥	٧,١٣	٧,٢١	٩,٠١	٩,٠٣	٩,٠٦	٨,١٧	٢٦,٣٥	٢٧,٠٢	٢٠	١٢٧,٩٤٠
٩٧٢,٧	١,٧٤	٢,٠٧	٢,٠٢	١,٩٢	٠,٩٦	٦,٩٧	٧,٠٥	٧,١٣	٧,٢١	٩,٠٤	٩,٠٧	٩,٠٥	٨,١٧	٢٧,٩١	٢٨,٨٠	٢٠	١٢٧,٩٦٠
١١٣٧,٣	١,٩٣	٢,٠١	١,٩٦	١,٨٩	١,٨٦	٦,٩٧	٧,٠٥	٧,١٣	٧,٢١	٨,٩٨	٩,٠١	٩,٠٢	٩,٠٧	٢٩,٥١	٣٠,٢٢	٢٠	١٢٧,٩٨٠
١١٤٧,٦	١,٨٨	١,٩٨	١,٨٨	١,٨٦	١,٧٩	٦,٩٨	٧,٠٦	٧,١٤	٧,٢٢	٨,٩٦	٨,٩٤	٩,٠٠	٩,٠١	٣٠,٥٠	٣٠,٧٧	٢٠	١٢٨,٠٠٠
١١٣٨,٨	١,٨٥	١,٩٤	١,٩٠	١,٨٣	١,٧٢	٦,٩٨	٧,٠٦	٧,١٤	٧,٢٢	٨,٩٢	٨,٩٦	٨,٩٧	٨,٩٤	٣٠,٨١	٣٠,٨٥	٢٠	١٢٨,٠٢٠
١١٤٩,٥	١,٨٦	١,٩٧	١,٨٨	١,٨٤	١,٧٤	٦,٩٨	٧,٠٦	٧,١٤	٧,٢٢	٨,٩٥	٨,٩٤	٨,٩٨	٨,٩٦	٣٠,٩٨	٣١,١٢	٢٠	١٢٨,٠٤٠
١١٦٤,٥	١,٨١	١,٩٠	١,٨٦	١,٧٧	١,٧٢	٦,٩٨	٧,٠٦	٧,١٤	٧,٢٢	٨,٨٨	٨,٩٢	٨,٩١	٨,٩٤	٣٢,١١	٣٣,١١	٢٠	١٢٨,٠٦٠
١٢٤٥,١	١,٨٩	١,٩٣	١,٩٥	١,٩٥	١,٧٥	٦,٩٣	٧,٠١	٧,٠٩	٧,١٧	٨,٨٦	٨,٩٦	٩,٠٤	٨,٩٢	٣٢,٨٧	٣٢,٦٣	٢٠	١٢٨,٠٨٠
١٠٧٧,٦	١,٥٥	١,٧١	١,٦٧	١,٦٦	١,٥٤	٦,٨٣	٦,٩١	٦,٩٩	٧,٠٧	٨,٥٤	٨,٥٨	٨,٥٥	٨,٦١	٣٢,٧٥	٣٢,٦٦	٢٠	١٢٨,١٠٠
١١٦١,٩	١,٧٦	١,٨٣	١,٧٩	١,٧٨	١,٦٣	٦,٧١	٦,٧٩	٦,٨٧	٦,٩٥	٨,٥٤	٨,٥٨	٨,٥٥	٨,٥٨	٣٢,٩٧	٣٣,٠٨	٢٠	١٢٨,١٢٠
٨٦١,٠	١,٢٩	١,١٨	١,١٤	١,١٣	١,٧٧	٦,٦٢	٦,٧٠	٦,٧٨	٦,٨٦	٧,٨٠	٧,٨٤	٧,٩١	٨,٥٨	٣٣,٣٨	٣٣,٦٩	٢٠	١٢٨,١٤٠
١٢٨١,٤	١,٨٩	٢,٠٥	١,٩٣	١,٨٩	١,٧١	٦,٥٩	٦,٦٧	٦,٧٥	٦,٨٣	٨,٦٤	٨,٦٠	٨,٦٤	٨,٥٤	٣٣,٨٣	٣٣,٩٨	٢٠	١٢٨,١٦٠
١٣٠٤,٠	١,٨٩	١,٩٧	١,٩٣	١,٨٨	١,٧٧	٦,٥٩	٦,٦٧	٦,٧٥	٦,٨٣	٨,٥٦	٨,٦٠	٨,٦٣	٨,٦٠	٣٤,٥٤	٣٥,٠٩	٢٠	١٢٨,١٨٠
١٣١٣,٨	١,٦٦	١,٩٦	١,٨٧	١,٨٣	١,٧٧	٦,٥٩	٦,٦٧	٦,٧٥	٦,٨٣	٨,٥٥	٨,٥٤	٨,٥٨	٨,٦٠	٣٥,٣٢	٣٥,٥٦	٢٠	١٢٨,٢٠٠
١٣٢٥,٠	١,٨٥	١,٩٥	١,٨٨	١,٨٤	١,٧١	٦,٥٩	٦,٦٧	٦,٧٥	٦,٨٣	٨,٥٤	٨,٥٥	٨,٥٩	٨,٥٤	٣٥,٨٤	٣٦,١٢	٢٠	١٢٨,٢٢٠
٢٨٤٥٠٥,١		اجمالي حصر بند رقم (٤) بالметр المكعب أعمال حفر في جميع أنواع التربة ما عدا الصخرية ... الخ															

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



 <p>ELOMDA FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT شركة العمدة للمقاولات العامة و الشفاف و رصف الطرق EST. 1975</p>	<p>عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوibri الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم</p> <p>عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨١</p> <p>تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة لإنشاء ورصف الطرق</p> <p>حصر مستخلص رقم (٣) جاري</p>	 <p>الهيئة العامة للطرق والجسور النطئة الثالثة عشر (المنيرة - كل شرق)</p>
اسم البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ... الخ		
رقم البند : (٦)		
كمية البند بالمقاييسة : ٣ ٢٥٠٠٠ م³		
١٣٣٣٢٠,٠٠	الكمية الاجمالية للحصر	
١٢٧٠٠	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص	
٩٦٩٥,٣	نسبة الصرف للبند	
٨٧٠٠	الكمية المصروفة بأخر مستخلص	
٤٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	

مهندس الهيئة



الاسم /
التوقع /

مهندس الشركة
الاسم / **محمد أزىز**
التوقيع / **محمد أزىز**



ELOMDAFOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT
شركة العمداء للمقاولات العامة
وأشغال إنشاء ورصف الطرق
EST. 1975

الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (٦) بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ... الخ (لزوم الطبات)

تنفيذ / شركة العمداء للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

(اتجاه الشمال)

المسطح	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	محطة	قطاع
٠,٠	٠,١٢	٣,٠٠	٠	١٢٥,٠٠٠	١
١٠٨٠٠,٠	٠,١٢	٣,٠٠	٣٠٠	١٢٨,٠٠٠	
٠,٠	٠,١٢	٣,٠٠	٠	١٢٩,٥٠٠	٢
١٨٠٠٠,٠	٠,١٢	٣,٠٠	٥٠٠	١٣٤,٥٠٠	

(اتجاه الجنوب)

المسطح	متوسط السمك	متوسط العرض	الطول	محطة	قطاع
٠,٠	٠,١٢	٣,٠٠	٠	١٢٣,٠٠٠	٣
١٨٠٠٠,٠	٠,١٢	٣,٠٠	٥٠٠	١٢٨,٠٠٠	

حصر بند رقم (٦) بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ... الخ
(لزوم الطبات)

٤٦٨٠٠,٠	لتصبح إجمالي حصر بند رقم (٦) بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ... الخ
٩١٢٩٠,٠	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

 <p>ELOMDA FOR CONSTRUCTION AND PAVING شركة الهمد للبناء والطريق وإنشاء ورصف الطرق EST. 1975</p>	عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوibri الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم			<p>الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كل الرشيد)</p> 	
	حصر بند رقم (٦) بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ... الخ				
	تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق				
	حصر اعمال الردم من محطة ١٢٤,٨٢٠ حتى محطة ١٢٧,٨٢٠				
المكعب	متوسط السمك	متوسط العرض التصميمي	الطول	محطة	
٩١٢٩٠,٠				اجمالي الكمية السابقة	
.	٠,٦٠	٢٣,٣٥	.	١٢٤,٨٢٠	
٤٢٠٣٠	٠,٦٠	٢٣,٣٥	٣٠٠٠	١٢٧,٨٢٠	
١٣٣٣٢٠,٠	حصر بند رقم (٦) بالметр المكعب أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ... الخ				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



 <p>ELOMDA FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT شركة المددة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق EST. 1975</p>	<p>عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم</p> <p>عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨١</p> <p>تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة لانشاء ورصف الطرق</p> <p>حصر مستخلص رقم (٣) جاري</p>	 <p>الهيئة العامة للطرق والجسور المنطقة الثالثة غرب (الجيزة - قرارыш)</p>
اسم البند : بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية ... الخ		
رقم البند : (١٢)		
كمية البند بالمقاييسة : ١٥٠٠ م.م		
٧٠٢	الكمية الاجمالية للحصر	
٦٧٠	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص	
٪٩٥,٤	نسبة الصرف للبند	
٤٥٠	الكمية المصروفة بآخر مستخلص	
٢٢٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	

مهندس الهيئة



الاسم /
التوقع /

مهندس الشركة
الاسم /
التوقع /



ELOMDA

FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT

شركة المددة للمقاولات العامة

وإنشاء ورصف الطرق

EST. 1975



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة غرب (البحيرة - كفر الشيخ)



عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (١٢) بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية ... الخ

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

اجمالي الاطوال	طول العدائية	محطة
٢٠,٠٠	٢٠	٠,٤٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	٠,٥٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	٠,٥٥٠
٢٠,٠٠	٢٠	٠,٧٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	٠,٨٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	١,١٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	١,٢٥٠
٢٠,٠٠	٢٠	١,٣٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	١,٣٥٠
٢٠,٠٠	٢٠	١,٦٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	٢,١٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	٢,١٢٥
٢٠,٠٠	٢٠	٢,١٥٠
٢٠,٠٠	٢٠	٢,١٧٥
٢٠,٠٠	٢٠	٢,٤٢٥
٢٠,٠٠	٢٠	٢,٤٧٥
٢٠,٠٠	٢٠	٢,٥٥٠
٢٠,٠٠	٢٠	٢,٦٥٠
٢٠,٠٠	٢٠	٢,٧٥٠
٢٠,٠٠	٢٠	٢,٨٧٥
٢٠,٠٠	٢٠	٣,١٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	٣,١٤٠
٢٠,٠٠	٢٠	٣,٢٠٠
٢٠,٠٠	٢٠	٣,٣٧٥
٤٨٠,٠٠	حصر بند رقم (١٢) بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية ... الخ	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم

حصر بند رقم (١٢) بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية ... الخ

قطاع بداية من محطة ١٢٤,٨٢٠ الى محطة ١٢٧,٨٢٠ .

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

محطة	طول الماسورة	عدد المواسير	اجمالي طول الفرع
اجمالي الكمية السابقة			
١٢٧,٦٣٠	٣	٧	٢١,٠٠
١٢٧,٢٩٠	٣	٨	٢٤,٠٠
١٢٦,٩٥٠	٣	٨	٢٤,٠٠
١٢٦,٦٠٠	٣	٨	٢٤,٠٠
١٢٦,٧٠٠	٣	١٠	٣٠,٠٠
١٢٦,٤٠٠	٣	٨	٢٤,٠٠
١٢٥,٧١٥	٣	٩	٢٧,٠٠
١٢٦,٠٧٠	٣	٨	٢٤,٠٠
١٢٥,٣٨٠	٣	٨	٢٤,٠٠
حصر بند رقم (١٢) بالметр الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية ... الخ			
٧٠٢			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

 <p>ELOMDA FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق EST. 1975</p>	عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨١ تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة لانشاء ورصف الطرق حصر مستخلص رقم (٣) جاري	 الهيئة العامة للطرق والجسور المنظمة الثالثة عشر (البرة - كلارش)
	اسم البند : بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية ... الخ	
	رقم البند : (١٣)	
	كمية البند بالمقاييسة : ١٠٠٠ م³	
١٠٨٦	الكمية الاجمالية للحصر	
١٠٠٠	الكمية الاجمالية المنصرفه بالمستخلص	
%٩٢,١	نسبة الصرف للبند	
٠	الكمية المتصروفة باخر مستخلص	
١٠٠٠	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	

مهندس الهيئة



الاسم /
التوقع /

مهندس الشركة





عملية / صيانة ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (القطاع الخامس) في المسافة من نفق الشهابية حتى كوبري الشيخ مبارك (اتجاه الإسكندرية) بطول ١٠ كم


حصر بند رقم (١٣) بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية ... الخ

قطاع بداية من محطة ١٢٤,٨٢٠ الى محطة ١٢٧,٨٢٠

وقطاع بداية من ١٢٨,٦٠٠ حتى ١٣٢,٦٠٠

تنفيذ / شركة العدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

القطاع التصميمي للخرسانة حول المواسير

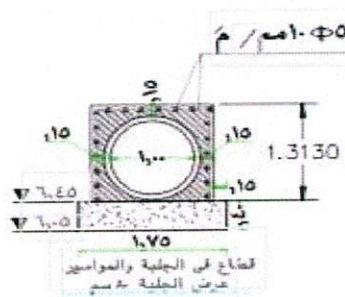

الوصف	القياس	ملاحظات
قطر الماسورة الداخلية	١	م
تخانة الماسورة	٠,٠٨	م
قطر الماسورة الخارجية	١,١٦	م
نقاط	٠,٥٨	م
مساحة الماسورة	٣,١٤٣	٢٨*نق
أبعاد البوكس	١,٠٥٧	٢٨*ارتفاع
مساحة البوكس	١,٤٥٧*١,٣١٣	الارتفاع موضح بالتصميم ، العرض = ١,٧٥ - ٠,١٥ (٠,١٥ * ارتفاع)
مساحة الخرسانة داخل البوكس	١,٩٠٤	(العرض ١,٤٥ * ارتفاع ١,٣١٣) (٢م)
مساحة الفرشة أسفل الماسورة	٠,٨٤٧	(مساحة البوكس - مساحة الماسورة) (٢م)
اجمالي مساحة الخرسانة لكل متر طولي	١,٥٤٧	مجموع المساحتين (٠,٧٤٠+٠,٨٤٧) موضح بالتصميم

القطاعات المنفذة

اجمالي اطوال المواسير	مكعب الخرسانة لكل م.ط	اجمالي مكعب الخرسانة
٧٠٢	١,٥٤٧	١٠٨٦,٠
١٠٨٦	حصر بند رقم (١٣) بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية ... الخ	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
