

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحیہ طیبہ وبعد ،،،

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة .

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه بما يلزم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

بدر عبد التواب بدر



خطاب بالمحملات

الإحالة إلى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)

نفيد : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة

مقد رقم (١٧٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م.

حيط علم سيادتكم بأن لا يوجد أي محملات سوي عدد (١) سيارة متواجد بالمنطقة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٠٢٤/٢/٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة

عقد رقم (١٧٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م.

نحيط علم سيادتكم بأن لا يوجد عمالة محملة علي عقد العملية عاليه .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً : ٢٠٢٤/٢/٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



خطاب السيارات

بالإحالة إلى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة

عقد رقم (١٧٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م.

يحيط علم سيادتكم بأن يوجد عدد (١) سيارات محملة علي عقد العملية عاليه متواجدة بالمنطقة
وتعمل بصفة منتظمة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٠٢٤/٢/٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر

C.C.E
A.C



شهادته بالموقف النهائي

اسم العميل: أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر " عقد رقم (١٧٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م .
تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة .

قيمة العقد : ١٩٧٣٦,٩٠٠ جنيهاً

تاريخ إستلام الموقع : ٦ / ٤ / ٢٠٢٣ م

تاريخ نهو العمل الفعلي : ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ م

قيمة ختامي الأعمال : ١٨٧٥٥٠,٤١,٣ جنيهاً


نسبة المنفذ طبقاً لآخر مقايضة معتمده ٩٥,٠٢ %

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



شهادة بكميات المواد المحجّرة

لعملية: أعمال رفع كفاءة طريق دميّاط / شربين الغربي (القطاع السابع)
بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر
عقد رقم (١٧٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م .
تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة

- (١) سن ٦ = ٥٣١,٥٠ م ٣ (خمسمائة و واحد وثلاثون وخمسون متر مكعب)
(٢) أتربة = ٦٨٦٠ م ٣ (ستة آلاف وثمانمائة وستون متر مكعب)

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر






المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية شهادة

تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية بأنه تم إجراء التجارب المعملية بمعرفة معمل المنطقة وقد تم خصم تكاليفها من المستخلصات الجارية بأن الشركة مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة المنفذة مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر " عقد رقم (١٧٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م .
وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

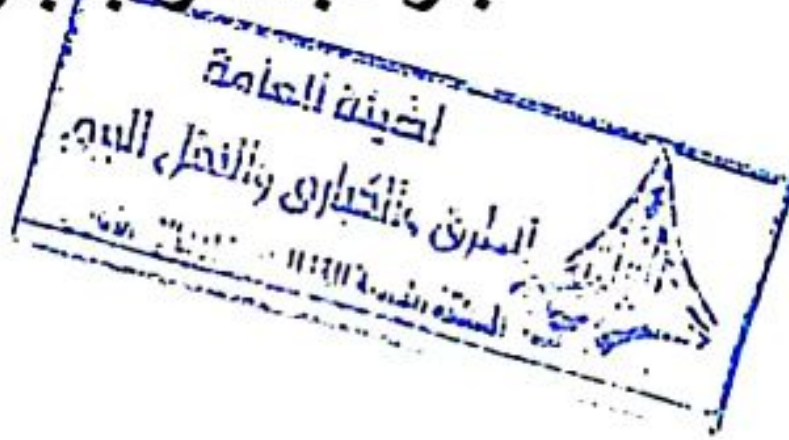

المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية شهادة

تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر .

عقد رقم (١٧٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م .

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة .

بأنها التزمت بكافة الالتزامات الموقعة عليها والمحرره بعقد العملية .
وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية شهادة

تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية بأن مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة المنفذة لعملية أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر " عقد رقم (١٧٠٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٣ م .

تنفيذ : مكتب أحمد محمود هلال للمقاولات العامة

بأن الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد .

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
بدر عبد التواب بدر



مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (إتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

الحصر الأجمالي

م	البنـد	الكمية
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات ... (بالمتر المكعب)	٦٨٦٠,٠٠
٢	أعمال حفر فرمة باستخدام المعدات الميكانيكية ... (بالمتر المكعب)	١٤٥٥,٥٠
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة ... (بالمتر المكعب)	٣,٠٠
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسارات ... (بالمتر المكعب)	٥٣١,٥٠
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO ... (المتر المسطح)	١١٣٣٠,٠٠
٦	أعمال توريد ورش طبقة لأصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 ... (المتر المسطح)	١٣٩٥١,٥٠
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم ... (المتر المسطح)	١١١٧١,٥٠
٨	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم ... (المتر المسطح)	٢١٠٧٤,٠٠
٩	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيرسي) وجه واحد ... (بالمتر الطولي)	٤٢٠,٠٠

بند مستحدث

١	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والقواعد ... (بالمتر المكعب)	٤٦٨٨,٠٠
٢	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيرسي) وجهين ... (بالمتر الطولي)	٢٠١٨,٠٠
٣	أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي على الساخن : ريج (٥3) ... (بالمتر المكعب)	١٩٢,٠٠
٤	أعمال توريد وتعمل دهانات خليط من السافيتو العازل للرطوبة (بالمتر المسطح)	١٤١٩٧,٠٠

مهندس المينة
أحمد محمد

مهندس الشركة
محمد الشوقاري

منروع : رفيع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط.
ضمن المبادرة التناسبية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي
الاعداد المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البيد : بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمة، لايزيد عن ٢٥ سم ... الخ.

Element	Station		Length (m)	Ava. Area	Σ Sum. (m3)	Section
	From :	To :				
القطاع الثاني	16+452	16+482.20	30.20	18.38	555.08	SEC (1:2)
القطاع الثالث	16+487.40	16+515	27.60	19.17	529.09	SEC (2:2)
القطاع الرابع	16+519.85	16+550	30.15	19.95	601.49	SEC (3:3)
القطاع الخامس	18+418	18+500	82.90	22.15	1816.30	SEC (4:4)
						SEC (5:5)
القطاع السادس	18+242	18+300	58.00	25.8	1496.40	SEC (6:6)
إجمالي الكمية (أعمال اردم للحائط الساند من الخرسانة العادية)					4998.36	m3

مهندس الهيئة

١٠

مهندس الشركة

١٠

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شرين الخري (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شرين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) اختامي الأعمال المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البيند : بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم ... إلخ.

Station		Length (m)	area (m2)	Σ Sum. (m3)	Section
From :	To :				
16+000	21+000	4850.00	0.177	858.45	SEC (7:7)
		347.95	0.693	241.13	SEC (8:8)
16+000	17+000	235.00	0.921	216.44	SEC (9:9)
19+500	20+000	167.00	0.963	160.82	SEC (10:10)
20+000	21+000	385.00	1.000	385.00	SEC (11:11)
إجمالي الكمية (أعمال الردم للطبقات)				1861.84	m3

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شريان الغربي (القطاع السابع) بطول 5 كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (اتجاه شريان/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنقولة حتي تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البيانات بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة ... إلخ.

Element	Station		Length (m)	Width (m)	Thickness (m)	Σ Sum. (m3)	Section
	From :	To :					
القطاع الثاني	16+452	16+482.20	30.20	5.00	1.30	196.30	SEC (12 : 12)
القطاع الثالث	16+417.40	16+455	27.60	5.00	1.30	179.40	SEC (12 : 12)
القطاع الرابع	16+189.85	16+220	30.15	5.00	1.30	195.98	SEC (12 : 12)
القطاع الخامس	18+422	18+500	78.00	5.00	1.30	507.00	SEC (12 : 12)
القطاع السادس	18+242	18+300	58.00	5.00	1.30	377.00	SEC (12 : 12)
إجمالي الكمية (أعمال الحفر للقائمة للحالات السائد من الخرسانة العادية)						1455.68	m3

مهندس الهيئة
أحمد أحمد

مهندس الشركة
عبد الله الشاذلي

مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

القطاع : من ك (16+000) حتى ك (21+000) بطول (5) كم

بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتآكلة ...

Station	Length (m)	Width (m)	Thickness (m)	Σ Sum	Cumulative Total
0+125	3.000	9.700	0.110	3.20	3.20
بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتآكلة ...				3.20	

مهندس الهيئة

1/

مهندس الاستشاري

1/ محمد عبد الحليم

مهندس الشركة

1/ محمد عبد الحليم

مهندس الهيئة

1/ محمد عبد الحليم

مهندس الشركة

1/ محمد عبد الحليم

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شرين الغربى (القطاع السابع) بطول 5 كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (التجاه شرين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي
الأعمال المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٢/٠٩/٢٠)

البيند : بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار المسبلة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات ... إلخ.

Element	Station		Length (m)	Width (m)	Thickness (m)	Σ Sum. (m³)	Section
	From :	To :					
القطاع الأول	16+578	16+760	120.00	3.33	0.37	149.58	SEC (13 : 13)
القطاع الثانى	16+452	16+482.20	30.20	3.00	0.34	30.58	SEC (14 : 14)
القطاع الثالث	16+417.40	16+455	27.60	3.20	0.36	31.90	SEC (15 : 15)
القطاع الرابع	16+189.85	16+220	30.15	4.25	0.35	44.53	SEC (16 : 16)
القطاع الخامس	18+422	18+500	82.00	4.50	0.40	147.60	SEC (17 : 17)
القطاع السادس	18+242	18+300	58.00	5.50	0.40	127.60	SEC (18 : 18)
إجمالي الكميات (أعمال طبقة الأساس للجانب السائد الملاصق للطريق)						531.79	m³

مهندس القيمة

مهندس الشركة

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنقذة حتى تاريخ : ٢٠٢٣/٠٩/٢٠ (

البتسند : بالتر المسطح أعمال فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) ... إلخ.

Element	Σ Sum. (m2)
إجمالي كمية طبقة التشريب (اتجاه شربين / دمياط) من (16+000) الى كم (16+427)	4210.20
إجمالي كمية طبقة التشريب (الزيارة الرئاسية) مدخل الأستاذ + الأستاذ	7120.07
إجمالي الكمية (أعمال طبقة التشريب MCO بالطريق - اتجاه شربين/دمياط)	11330.27 m2

مهندس الهيئة
أحمد خليل

مهندس الشركة
أحمد خليل

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنقذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

الهندس : بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) ... إلخ.

Station	Length (m)	Width (m)	Σ Sum. (m3)
16+000	10.00	9.10	91.00
16+020	20.00	9.75	195.00
16+040	20.00	9.75	195.00
16+060	20.00	9.70	194.00
16+080	20.00	9.60	192.00
16+100	20.00	9.60	192.00
16+120	20.00	9.60	192.00
16+140	20.00	9.60	192.00
16+160	20.00	9.60	192.00
16+180	20.00	9.60	192.00
16+200	20.00	9.60	192.00
16+220	20.00	9.80	196.00
16+240	20.00	9.80	196.00
16+260	20.00	9.80	196.00
16+280	20.00	9.60	192.00
16+300	20.00	9.60	192.00
16+320	20.00	9.60	192.00
16+340	20.00	9.60	192.00
16+360	20.00	9.60	192.00
16+380	20.00	9.60	192.00
16+400	20.00	9.60	192.00
16+427	27.00	9.60	259.20

إجمالي الكميات (أعمال طبقة التشريب MCO بالطريق - إتجاه شربين/دمياط)

4210.20 m2

مهندس الهيئة
أحمد محمود حسين هلال

مهندس الشركة
أحمد محمود حسين هلال

مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

القطاع : من ك (١٦+٠٠٠) حتي ك (٢١+٠٠٠) بطول (٥) كم

بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) ...

Station	Length	Width	Σ Sum.	Cumulative Total
مخطط الأستاذ				
0+000	12.50	6.40	80.00	80.00
0+025	25.00	6.80	170.00	250.00
0+050	25.00	9.60	240.00	490.00
0+075	25.00	8.60	215.00	705.00
0+100	25.00	6.60	165.00	870.00
0+125	25.00	6.40	160.00	1030.00
0+150	25.00	6.90	172.50	1202.50
0+175	25.00	8.20	205.00	1407.50
0+200	25.00	7.50	187.50	1595.00
0+225	25.00	7.00	175.00	1770.00
0+250	25.00	9.40	235.00	2005.00
0+275	25.00	11.00	275.00	2280.00
0+300	25.00	10.90	272.50	2552.50
0+325	25.00	7.40	185.00	2737.50
0+350	21.50	7.60	163.40	2900.90
0+367	11.00	9.30	102.30	3003.20

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


١٢

مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

القطاع : من ك (١٦+٠٠٠) حتى ك (٢١+٠٠٠) بطول (٥) كم

بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة تشريب ٠٠ البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) ...

Station	Length	Width	Σ Sum.	Cumulative Total
الامتداد				
Area 1	19.50	8.70	169.65	3172.35
Area 2	11.70	24.75	289.58	3462.43
Area 3	4.10	12.70	52.07	3514.50
Area 4	17.40	22.00	382.80	3897.30
Area 5	77.00	8.60	662.20	4559.50
Area 6	50.30	34.50	1735.35	6294.85
Area 7	24.00	6.80	163.20	6458.05
Area 8	3.80	2.40	9.12	6467.17
Area 9	73.00	7.30	532.90	7000.07
Area 10	15.00	8.00	120.00	7120.07
بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) ...			7120.07	

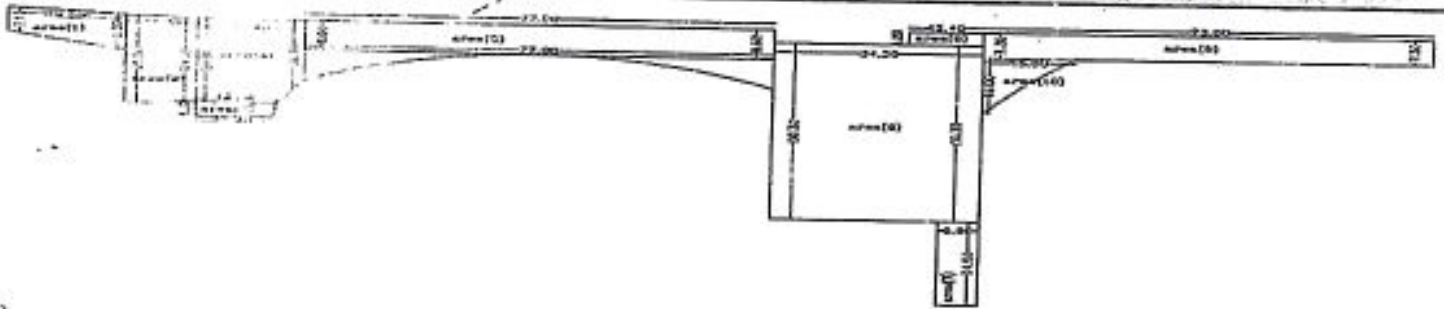

مهندس الهيئة

1/2

مهندس الاستشاري

1/2

مهندس الشركة

1/2

مهندس الهيئة

1/2

مهندس الشركة

1/2

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القضاع السايح) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط

ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

(٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

"أعداد المنفذة حتى تاريخ :"

رقم المستخلص : (٤) ختامي

البيانات : بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة الصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000) ... إلخ.

Station	Length (m)	Width (m)	Σ Sum. (m3)
16+000	10.00	9.10	91.00
16+020	20.00	9.75	195.00
16+040	20.00	9.75	195.00
16+060	20.00	9.70	194.00
16+080	20.00	9.60	192.00
16+100	20.00	9.60	192.00
16+120	20.00	9.60	192.00
16+140	20.00	9.60	192.00
16+160	20.00	9.60	192.00
16+180	20.00	9.60	192.00
16+200	20.00	9.60	192.00
16+220	20.00	9.80	196.00
16+240	20.00	9.80	196.00
16+260	20.00	9.80	196.00
16+280	20.00	9.60	192.00
16+300	20.00	9.60	192.00
16+320	20.00	9.60	192.00
16+340	20.00	9.60	192.00
16+360	20.00	9.60	192.00
16+380	20.00	9.60	192.00
16+400	20.00	9.60	192.00
16+427	27.00	9.60	259.20
إجمالي الكميات (أعمال طبقة اللصق RC3000 بالطريق - اتجاه شربين/دمياط)			4210.20 m2

مهندس الهيئة
محمد عبد الحليم

مهندس الشركة
محمد عبد الحليم

مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

القطاع : من كـ (١٦+٠٠٠) حتى كـ (٢١+٠٠٠) بطول (٥) كم

بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة اللصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000) ...

Station	Length	Width	Σ Sams.	Cumulative Total
0+900	25.00	7.70	192.50	8940.10
0+925	25.00	7.30	182.50	9122.60
0+950	25.00	6.85	171.25	9293.85
0+975	25.00	6.70	167.50	9461.35
1+000	25.00	7.00	175.00	9636.35
1+030	17.50	6.00	105.00	9741.35
بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة اللصق من البيتومين السائل سريع التطاير (RC3000) ...			9741.35	

مهندس الهيئة

١٢

مهندس الاستشاري

١٢ / ٢٠٢١

مهندس الشركة

١٢ / ٢٠٢١

مهندس الهيئة

١٢

مهندس الشركة

١٢ / ٢٠٢١

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البيند : بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة الرابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك (٦) سم إلخ.

Element	Σ Sum. (m2)
إجمالي كمية طبقة الرابطة (اتجاه شربين/دمياط - الزيارة الرئاسية) من (15+195) الي كم (16+000)	6961.75
إجمالي كمية طبقة الرابطة (اتجاه شربين / دمياط) من (16+000) الي كم (16+427)	4210.20
إجمالي الكمية (أعمال الطبقة الرابطة بسمك (٦) سم ... بالطريق - اتجاه شربين/دمياط)	11171.95 m2

مهندس الهيئة
م
الحمد لى

مهندس الشركة
محمد النور تاج

١٢

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البنء : بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة الرابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك (٦) سم إلخ.

Station	Length (m)	Width (m)	Σ Sum. (m3)
15+195	15.00	9.65	144.75
15+220	20.00	9.60	192.00
15+240	20.00	9.60	192.00
15+260	20.00	9.70	194.00
15+280	20.00	9.70	194.00
15+300	20.00	9.70	194.00
15+320	20.00	8.90	178.00
15+340	20.00	8.60	172.00
15+360	20.00	8.50	170.00
15+380	20.00	8.50	170.00
15+400	20.00	8.40	168.00
15+420	20.00	8.40	168.00
15+440	20.00	8.30	166.00
15+460	20.00	8.30	166.00
15+480	20.00	8.20	164.00
15+500	20.00	8.10	162.00
15+520	20.00	8.20	164.00
15+540	20.00	8.40	168.00
15+560	20.00	8.50	170.00
15+580	20.00	8.50	170.00
15+600	20.00	8.50	170.00
15+620	20.00	8.60	172.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



١٢

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البيانات : بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة الرابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك (٦) سم إلخ.

Station	Length (m)	Width (m)	Σ Sum. (m3)
15+640	20.00	8.60	172.00
15+660	20.00	8.60	172.00
15+680	20.00	8.60	172.00
15+700	20.00	8.60	172.00
15+720	20.00	8.60	172.00
15+740	20.00	8.60	172.00
15+760	20.00	8.50	170.00
15+780	20.00	8.50	170.00
15+800	20.00	8.40	168.00
15+820	20.00	8.40	168.00
15+840	20.00	8.40	168.00
15+860	20.00	8.40	168.00
15+880	20.00	8.40	168.00
15+900	20.00	8.50	170.00
15+920	20.00	8.50	170.00
15+940	20.00	8.60	172.00
15+960	20.00	8.60	172.00
15+980	20.00	8.50	170.00
16+000	10.00	8.70	87.00
إجمالي الكميات (أعمال الطبقة الرابطة بسمك (٦) سم ... بالطريق - اتجاه شربين/دمياط)			6961.75 m2

مهندس الهيئة
/٤

مهندس الشركة
/٥

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البيسند : بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة الرابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك (٦) سم إلخ.

Station	Length (m)	Width (m)	Σ Sum. (m3)
16+000	10.00	9.10	91.00
16+020	20.00	9.75	195.00
16+040	20.00	9.75	195.00
16+060	20.00	9.70	194.00
16+080	20.00	9.60	192.00
16+100	20.00	9.60	192.00
16+120	20.00	9.60	192.00
16+140	20.00	9.60	192.00
16+160	20.00	9.50	192.00
16+180	20.00	9.60	192.00
16+200	20.00	9.60	192.00
16+220	20.00	9.80	196.00
16+240	20.00	9.80	196.00
16+260	20.00	9.80	196.00
16+280	20.00	9.60	192.00
16+300	20.00	9.60	192.00
16+320	20.00	9.60	192.00
16+340	20.00	9.60	192.00
16+360	20.00	9.60	192.00
16+380	20.00	9.50	192.00
16+400	20.00	9.60	192.00
16+427	27.00	9.60	259.20
إجمالي الكمية (أعمال الطبقة الرابطة بسمك (٦) سم ... بالطريق - (اتجاه شربين/دمياط)			4210.20 m2

مهندس الهيئة
م. محمد عبد الله

مهندس الشركة
محمد عبد الله

١٤

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفذة حتي تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البتد : بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة السطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك (٥) سم إلخ.

Element	Σ Sum. (m2)
إجمالي كمية طبقة السطحية (اتجاه شربين / دمياط) من (16+000) الي كم (16+427)	4210.20
إجمالي كمية طبقة السطحية (الزيارة الرئاسية) المهبط + مدخل المهبط	16861.42
إجمالي الكمية (أعمال طبقة الطبقة السطحية بسمك (٥) سم ... بالطريق - اتجاه شربين/دمياط)	21071.62 m2

مهندس الهيئة
محمد

مهندس الشركة
محمد الشحات تاري

١٢

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط

ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البلد : بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة السطحية من الخرسانة الأسفالتية بسمك (٥) سم إلخ.

Station	Length (m)	Width (m)	Σ Sum. (m3)
16+000	10.00	9.10	91.00
16+020	20.00	9.75	195.00
16+040	20.00	9.75	195.00
16+060	20.00	9.70	194.00
16+080	20.00	9.60	192.00
16+100	20.00	9.60	192.00
16+120	20.00	9.60	192.00
16+140	20.00	9.60	192.00
16+160	20.00	9.60	192.00
16+180	20.00	9.60	192.00
16+200	20.00	9.60	192.00
16+220	20.00	9.80	196.00
16+240	20.00	9.80	196.00
16+260	20.00	9.80	196.00
16+280	20.00	9.60	192.00
16+300	20.00	9.60	192.00
16+320	20.00	9.60	192.00
16+340	20.00	9.60	192.00
16+360	20.00	9.60	192.00
16+380	20.00	9.60	192.00
16+400	20.00	9.60	192.00
16+427	27.00	9.60	259.20
إجمالي الكمية (أعمال طبقة السطحية بسمك (٥) سم ... بالطريق - اتجاه شربين/دمياط)			4210.20 m2

مهندس الهيئة
أحمد محمود حسين هلال

مهندس الشركة
أحمد محمود حسين هلال

مشروع: أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي بطول 5 كم - ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

القطاع : من كـ (17+000) حتى كـ (21+000) بطول (5) كم

بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة السطحية من الخرسانة الأمتامية بسمك (5) سم ...

Station	Length	Width	Σ Sum	Cumulative Total
مدخل الأمتام				
0+000	12.50	6.40	80.00	80.00
0+025	25.00	6.80	170.00	250.00
0+050	25.00	9.60	240.00	490.00
0+075	25.00	8.60	215.00	705.00
0+100	25.00	6.60	165.00	870.00
0+125	25.00	6.40	160.00	1030.00
0+150	25.00	6.90	172.50	1202.50
0+175	25.00	8.20	205.00	1407.50
0+200	25.00	7.50	187.50	1595.00
0+225	25.00	7.00	175.00	1770.00
0+250	25.00	9.40	235.00	2005.00
0+275	25.00	11.00	275.00	2280.00
0+300	25.00	10.90	272.50	2552.50
0+325	25.00	7.40	185.00	2737.50
0+350	21.50	7.60	163.40	2900.90
0+367	11.00	9.30	102.30	3003.20

مهندس القيمة

مهندس الاستشاري

مهندس الشبكة

مهندس القيمة

مهندس الشبكة

مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي بطول ٥ كم - ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

القطاع : من ك (١٦+٠٠٠) حتي ك (٢١+٠٠٠) بطول (٥) كم

بالمتر المسطح أعمال فرش طبقة السطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك (٥) سم ...

Station	Length	Width	Σ Sum.	Cumulative Total
مدخل المخطط (اتجاه شربين / المنصورة)				
	26.00	5.10	132.60	7252.67
0+000	12.50	9.40	117.50	7370.17
0+025	25.00	9.40	235.00	7605.17
0+050	25.00	9.30	232.50	7837.67
0+075	25.00	9.30	232.50	8070.17
0+100	25.00	10.35	258.75	8328.92
0+125	25.00	10.20	255.00	8583.92
0+150	25.00	10.00	250.00	8833.92
0+175	25.00	10.10	252.50	9086.42
0+200	25.00	10.20	255.00	9341.42
0+225	25.00	10.00	250.00	9591.42
0+250	25.00	9.60	240.00	9831.42
0+275	25.00	9.50	237.50	10068.92
0+300	25.00	9.50	237.50	10306.42
0+325	25.00	9.50	237.50	10543.92
0+350	25.00	9.65	241.25	10785.17
0+375	25.00	9.50	237.50	11022.67
0+400	25.00	9.60	240.00	11262.67
0+425	25.00	9.70	242.50	11505.17
0+450	25.00	9.60	240.00	11745.17
0+475	25.00	9.50	237.50	11982.67
0+500	25.00	9.50	237.50	12220.17
0+525	25.00	9.60	240.00	12460.17
0+550	25.00	9.50	237.50	12697.67
0+575	25.00	9.40	235.00	12932.67
0+600	25.00	9.55	238.75	13171.42
0+625	25.00	9.80	245.00	13416.42
0+650	25.00	9.80	245.00	13661.42
0+675	25.00	9.55	238.75	13900.17
0+700	25.00	9.80	245.00	14145.17
0+725	25.00	9.60	240.00	14385.17
0+750	25.00	8.80	220.00	14605.17
0+775	25.00	10.80	270.00	14875.17
0+800	25.00	11.70	292.50	15167.67
0+825	25.00	11.30	282.50	15450.17
0+850	25.00	8.90	222.50	15672.67
0+875	25.00	7.80	195.00	15867.67

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفلة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البند : بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيبرجلاس (النيوجيرسي) وجه واحد إلخ.

Station		Element	Σ Sum.	Cumulative Total
From	To			
19+380	19+800	نيوجيرسي وجه واحد	420.00	420.00

إجمالي الكمية (أعمال الحاجز من الخرسانة المسلحة بالنيوجيرسي) 420.00


مهندس الهيئة
/م

مهندس الشركة
/م

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنفذة حتي تاريخ : (٢٠٢٢/٠٩/٢٠)


البند : بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والقواعد ... إلخ.

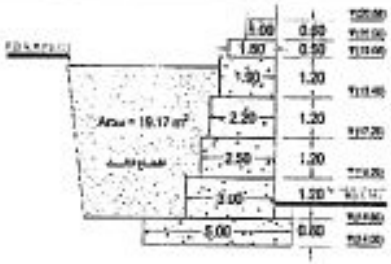Station	Element	Length (m)	Width (m)	Thickness (m)	Σ Sum. (m3)	Section
From :	To :					
From : (16+578) to: (16+700) القطاع الأول					980.13	
From : (16+452) to: (16+482.20) القطاع الثاني	القاعدة	30.20	5.00	0.80	120.80	
	الحطة (1)	30.20	3.00	1.20	108.72	
	الحطة (2)	30.20	2.50	1.20	90.60	
	الحطة (3)	30.20	2.20	1.20	79.73	
	الحطة (4)	30.20	1.90	1.20	68.86	
	الحطة (5)	30.20	1.60	0.50	24.16	
	الحطة (6)	30.20	1.00	0.60	18.12	
From : (16+417.40) to: (16+455) القطاع الثالث	القاعدة	27.60	5.00	0.80	110.40	
	الحطة (1)	27.60	3.00	1.20	99.36	
	الحطة (2)	27.60	2.50	1.20	82.80	
	الحطة (3)	27.60	2.20	1.20	72.86	
	الحطة (4)	27.60	1.90	1.20	62.93	
	الحطة (5)	27.60	1.60	0.50	22.08	
	الحطة (6)	27.60	1.00	0.60	16.56	
From : (16+189.85) to: (16+220) القطاع الرابع	القاعدة	30.15	5.00	0.80	120.60	
	الحطة (1)	30.15	3.00	1.20	108.54	
	الحطة (2)	30.15	2.50	1.20	90.45	
	الحطة (3)	30.15	2.20	1.20	79.60	
	الحطة (4)	30.15	1.90	1.20	68.74	
	الحطة (5)	30.15	1.60	0.50	24.12	
	الحطة (6)	30.15	1.00	0.60	18.09	
الزيارة الرئيسية	بريورة	40.00	0.30	0.40	4.80	

إجمالي الكميات (أعمال لاجاليد الساند الملاصق للطريق)

2473.04

m3

مهندس الهيئة


1/٤


مهندس الشركة


1/٥

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي الأعمال المنقذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البلد : بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والقواعد، ... إلخ.

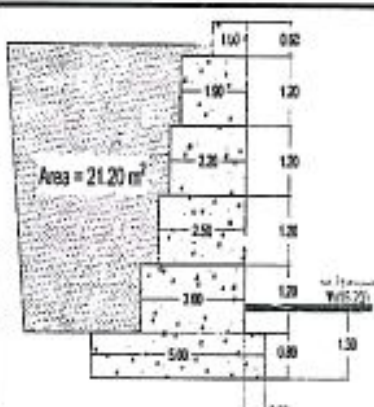Station		Element	Length (m)	Width (m)	Thickness (m)	Σ Sum. (m3)	Section
From :	To :						
From : (18+420) to : (18+500) القطاع الخامس		القناة	78.00	5.00	0.80	312.00	 Area = 21.20 m²
		الحطة (1)	78.00	3.00	1.20	280.80	
		الحطة (2)	78.00	2.50	1.20	234.00	
		الحطة (3)	78.00	2.20	1.20	205.92	
		الحطة (4)	78.00	1.90	1.20	177.84	
		الحطة (5)	78.00	1.00	0.52	40.56	
		الجناح	4.00	2.50	1.20	12.00	
			4.00	2.20	1.20	10.56	
			4.00	1.90	1.20	9.12	
			4.00	1.00	0.52	2.08	
From : (18+242) to : (18+300) القطاع السادس		القناة	58.00	5.00	0.80	232.00	 Area = 25.80 m²
		الحطة (1)	58.00	3.00	1.20	208.80	
		الحطة (2)	58.00	2.50	1.20	174.00	
		الحطة (3)	58.00	2.20	1.20	153.12	
		الحطة (4)	58.00	1.90	1.20	132.24	
		الحطة (5)	58.00	1.00	0.52	30.16	
إجمالي الكميات (أعمال للحائط السائد الملاصق للطريق)						2215.20	m3

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربى (القطاع السابع) بطول ٥ كم - مركز كفر سعد - محافظة دمياط
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (اتجاه شربين/دمياط)

رقم المستخلص : (٤) ختامي
تأعمال المنقذة حتى تاريخ : (٢٠٢٣/٠٩/٢٠)

البند : بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (النيوجيرسي) وجهين إلخ.

Station		Element	Σ Sum.	Cumulative Total
From	To			
6+965	7+796	نيوجيرسي وجهين	554.00	554.00
8+490	8+590	نيوجيرسي وجهين	110.00	664.00
14+580	14+596	نيوجيرسي وجهين	78.00	742.00
14+660	15+313	نيوجيرسي وجهين	648.00	1390.00
15+545	15+970	نيوجيرسي وجهين	438.00	1828.00
الزيارة الرئاسية		نيوجيرسي وجهين	190.00	2018.00
إجمالي الكمية (أعمال الحاجز من الخرسانة المسلحة النيوجيرسي)				2018.00

مهندس الهيئة

 ١٢

مهندس الشركة

 ١٢

مشروع : رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي - مركز كفر سعد - محافظة دمياط - ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

القطاع السابع : من ك (١٦+٠٠٠) حتى ك (٢١+٠٠٠) بطول (٥) كم


بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي علي الساخن تدرج (د٣) إلخ.

Station		Element	Σ Sum.	Cumulative Total
From	To			
بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي علي الساخن تدرج (د٣) إلخ.			192.00	192.00
بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي علي الساخن تدرج (د٣) إلخ.			192.00	


مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري




مهندس الشركة



مهندس الهيئة



مهندس الشركة



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

عملية رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القضيب السابع) بطول ٥ كم
مركز كفر سعد - محافظة دمياط - المنطقة الثانية (القناة وسيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			فرش	جنية	فرش	جنية
١	٦٨٦.٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسك ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري لمسافة نقل حتى ١٩٠ كم والفئة شاملة بالمتر المكعب	-	٢٧٨	-	١٩٠٧٠٨٠
٢	١٤٥٥,٥٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بترتبات التسوية وترش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب	-	٢٣	-	٢٣٤٧٦,٥٠
٤	٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة و بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٥ كم وعمل سايكز لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	-	٦١	-	١٨٣
٨	٥٣١,٥٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة خبثة أساس من الأحجار الصلبة المندرجة ناتج تكسير الكسارات: ١- والى طبقة للمواصفات والتدرج الوارد بالأشراطات العامة الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس إنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الأمصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري لمسافة نقل ٢٥٠ كم	-	٤٤٦	-	٢٣٧٠٤٩
٩	١١٣٣.٠	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متر سط التصلب (MC30) بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠	٢٧	-	٣١١٥٧٥
١٠	١٢٩٥١,٥٠	أعمال توريد ورش طبقة لأصبة من البيتومين السائل سريع التطاير (MC3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠	٩	-	١٢٨٣٥٣,٨٠
١١	١١١٧١,٥٠	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسك ٦ سم بمعدل ١٠٠ كجم/م ^٢ باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	١٤٦	-	١٦٣١٠٣٩
١٢	٢١٠٧١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	١٤٠	-	٢٩٤٩٩٤٠
١٥	٤٢٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (Face) يحتوي أسمنتي ٢٥٠ كجم/م ^٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٤ م.نجم/م.م ويتم تسليح على فرش من الخرسانة العادية بسك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز ووجهها: ٢٠٠ كجم/م ^٣ أسمنتي ٢ سم/م ^٣ السعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار (١٦٥٦) م ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	٥٠٠	-	٢١٠٠٠٠
بند مستحدث						
١	٤٦٨٨	توريد وصب خرسانة عادية للأساسات والقواعد ذات محتوي أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي على أن تحقق الخرسانة رتبة الانقل عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للهيئة العامة سنزل والكباري والفئة شاملة بالمتر المكعب.	-	١٦٩٠	-	٧٩٢٢٧٢٠
٢	٢٠١٨	بالمتر خطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة على أن تحقق الخرسانة رتبة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل عمل حرسه من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً للرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	-	٦٨٥	-	١٣٨٢٣٣٠



محمد سعيد الشارح
مهندس

عملية رفع كفاءة طريق دمياط / شربين الغربي (القصاص السانح) بطول ٥ كم
مركز كفر سعد - محافظة دمياط - المنطقة الثانية (القناة وسيناء)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنية	قرش	جنية
٣	١٩٢ ٣م	أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي على الساخن تدرج (٥٣) في أماكن الكشط ولأستعمال المناسب وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الأنصاف والأسفلت واستخدام الأسفلت ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينة الفرش الميكانيكية (الغفر) لفرش طبقة الترميم على أن يتم التنفيذ على طبقات ولا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف واله حاسبة هندسياً بعد الدمك والفئة شاملة وضع طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R.C3000) أو بالمستحلبات الأسفلتية: للمطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل (٠,٤ كجم/م ^٢) أسفل طبقات الترميم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب.	-	٢٢٠٠	-	٤٢٢٤٠٠
٤	١٤١٩٧ ٢م	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات خليط من السافيتو العازل للرطوبة للحواجز الخرسانية وكوبيستات وجسم الكوبري والفئة تشمل كل ما يلزم بنهوا العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	-	١٠٠	-	١٤١٩٧٠٠
الأجمالي						
١٨٥٥٥٨٤٦						

الكـارـتات						
١	٦٨٦٠ ٣م	الكارتات طبقة الأتربة الصالحة للردم ومطابقة للمواصفات ..	-	١٣	-	٨٩١٨٠
٢	٥٣١,٥٠ ٣م	الكارتات طبقة الأساس الحجري ناتج تكسير الكسارات ..	-	٢٥	-	١٣٢٨٧,٥٠
٣	١١١٧١,٥٠ ٢م	الكارتات طبقة الرابطة - من الخرسانة الأسفلتية..	-	٣	-	٣٣٥١٤,٥٠
٤	٢١٠٧١ ٢م	الكارتات طبقة السطحية من الخرسانة الأسفلتية..	-	٣	-	٦٣٢١٣
الأجمالي بالكارتات (ثمانية عشر مليون وسبع مائة وخمسة وخمسون ألفاً وواحد وأربعون جنيهاً و ١٠٠/٣٠ مصرى فقط لا غير)						
١٨٧٥٥٠٤١,٣٠						

مهندس الهيئة
/ م / أحمد / م /

مهندس الشركة
/ م / محمد / م /

رئيس الإدارة المركزية

/ م / بدر عبد التواب بدر

مدير عام
/ م /

