

محضر استلام موقع

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم 460+520 الى الكم 460+740 بطول 0,220 كم (بالأمر المباشر) .

تنفيذ: شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي و المقاولات العامة

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (846 / 2023/ 2024) بتاريخ 2023/12/14

إنه في يوم الخميس الموافق 14 / 12 / 2023 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات الهيئة- الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس/أشرف محمد مدير مشروع -شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي و المقاولات العامة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2023 / 12 / 14 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- السيد

2-

1- السيد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطاع السريع (العلمين - فوكه)

شركة سكاى لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة - من المحطة 460+600 الى المحطة 464+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق: - 2022/10/5

بناء على طلب المقاول شركة سكاى لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من
محجر (المصرية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل: -

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1- السيد المهندس / إبراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى محمود نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب XYZ |
| 4- السيد المهندس / كمال نجيب | استشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 5- السيد المهندس / أشرف محمد | ممثل شركة سكاى لايت |

وتبين ان المحجر على مسافة 188 كم من منتصف قطاع شركة سكاى لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة

احداثي منتصف القطاع E 28° 20' 53.03" N 31° 1' 52.20"

احداثي المحجر E 36° 37' 09.61" N 92° 70' 06.28"

وعلي ذلك تم التوقيع "

5
4
3
2
1

MATERIAL INSPECTION REQUEST

الهيئة العامة
للمرور والكباري
(GARB)



مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمقاولات
(مركز الاستشارات الهندسية
للتنفيذ والمقاولات)



Contractor Company				Designer Company							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time							
	ENG/Ashraf Mohamed										
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials		Fill material results					
Location to be Used		1-From ST: 460+780 to ST: 460+980 LE:-3.50 2-From ST: 460+600 to ST: 460+780 LE:-3.50					
MAR Approval No						Date	
Supplier Name							
Test Requirement		Specification				Clause	
Reference Photos		Yes attached / No		Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note		
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3	5000				
2	Proctor	m3	5000				
3	Classification	m3	5000				
4	Seive analysis	m3	5000				
Comments by:		Comments by:					
Asample has been taken form fill material by SGAC office to (consulting engineering bureau & laboratories) lab and the results founded meet the specificonctions and accepted							
APPROVAL STATUS							
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R			
Contractor	Eng/Ashraf Mohamed						
QA/QC *	SGAC						
GARB**	ENG/Mustafa Negm						
Comment by ER							
Employers Representative							

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

SL-M-22

Company Name : Sky Light
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : Middle & Upper Embankment
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (462+360) : (462+420)
Delivery Date : 08/04/2022
Reporting Date : 14/04/2022
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 08/04/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /.....



Company Name : Sky Light
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : Middle & Upper Embankment
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (462+360) : (462+420)
Delivery Date : 08/04/2022
Reporting Date : 14/04/2022
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	100
25	96.6
19	93.0
12.50	81.7
9.50	72.6
4.75	55.4
2.36	52.8
2.00	50.7
1.18	46.9
0.600	39.2
0.425	37.9
0.300	25.8
0.150	16.0

Signature / ...

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاسماء: 
رئيس المكتب: 
مدير المكتب: 
مدير المكتب: 

Company Name : Sky Light
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : Middle & Upper Embankment
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (462+360) : (462+420)
Delivery Date : 08/04/2022
Reporting Date : 14/04/2022
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

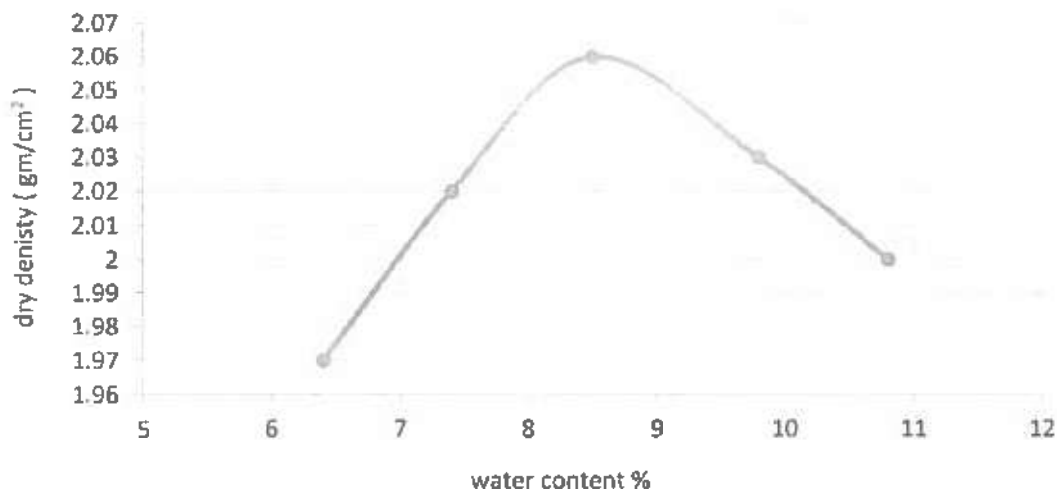
Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	14.9

Signature /....



Company Name	: Sky Light
Project	: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location	: Middle & Upper Embankment
Type of sample	: Soil Embankment
Location	: St. (462+360) : (462+420)
Delivery Date	: 08/04/2022
Reporting Date	: 14/04/2022
Reporting No.	: 07
Sample No.	: 07

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- **Max dry density (gm/cm²)** : 2.06
- **Optimum moisture content %** : 8.5

Signature



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

SL-P-001

Company : Sky Light Co.

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa
Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of
soil by the plate loading test according ASTM D 1196 and
project specs requirements

Test Date : 02/03/2022

Report Date : 05/03/2022

Test location : Station 460+600 to 460+700

Type of soil : Native soil

Report No. : 001

Dear Gentleman,

As per the above mentioned subject the test performed as follows:



7. Start loading with equal increment according the calculation sheet (attached)
8. The loading until **9.813 ton** to achieve soil stress (**5.00 Kg/cm²**)
9. Records the reading of dial gauge for settlement
10. Remove the loads
11. Record the deformation of the soil under the loading plate

Report

1. Evaluation and representation of results
2. load settlement curve
3. The test report content the following :-
 - Location of test site
 - Dimension of loading plates
 - Measuring device used
 - Type of soil
 - Type of bedding material below the plate
 - Weather condition
 - Time and date of measurement
 - Time of start and compilation of test
 - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress
 - Load – settlement curve
 - Description of the soil conditions below the plate after testing



(02 of 6)



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Determine the deformation and strength characteristics of soil
By the plate loading test according specifications

ASTM D 1196

Report

- Test location : Station 460+600 to 460+700
- TEST No. : 01
- Type of soil : Native soil

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural sand
- Plate Diameter (mm)	500
- date of measurement	02/03/2022
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

No.	settlement (mm)	Soil stress Kg/cm ²
1	2.38	5.00 (Load 1)
2	2.53	5.00 (Load 2)

Signature /  

(03 of 6)

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Sky Light Co.
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Test Date : 02/03/2022
report date : 05/03/2022
Location : Station 460+600 to 460+700
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
ASTM D 1196

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	1.00	19.42	0.58	19.46	0.54	19.42	0.58	0.57
2	2.00	19.02	0.98	19.06	0.94	18.95	1.05	0.99
3	3.00	18.54	1.46	18.67	1.33	18.45	1.55	1.45
4	4.00	18.10	1.90	18.27	1.73	17.95	2.05	1.89
5	5.00	17.53	2.47	17.84	2.16	17.50	2.50	2.38

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	5.00	17.53	2.47	17.84	2.16	17.50	2.50	2.38
2	3.00	17.78	2.22	17.96	2.04	17.81	2.19	2.15
3	1.00	18.22	1.78	18.47	1.53	18.30	1.70	1.67
4	0.00	18.72	1.28	19.15	0.85	18.78	1.22	1.12

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	18.72	0.00	19.15	0.00	18.78	0.00	0.00
1	1.00	18.34	1.66	18.71	1.29	18.28	1.72	1.56
2	2.00	18.05	1.95	18.37	1.63	17.98	2.02	1.87
3	3.00	17.84	2.16	18.13	1.87	17.74	2.26	2.10
4	4.00	17.63	2.37	17.98	2.02	17.61	2.39	2.26
5	5.00	17.36	2.64	17.72	2.28	17.34	2.66	2.53

Unloading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	5.00	17.36	2.64	17.72	2.28	17.34	2.66	2.53
2	3.00	17.45	2.55	17.87	2.13	17.50	2.50	2.39
3	0.00	18.36	1.64	18.77	1.23	18.39	1.61	1.49

Signature

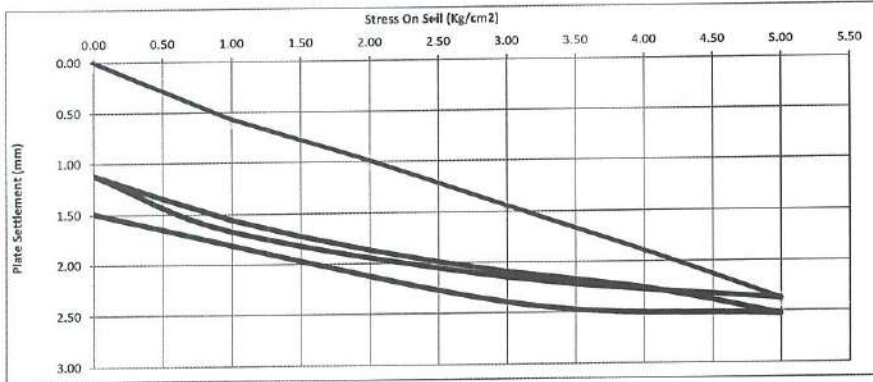

 محمد عزالعزب
 مهندس الاستشارات الهندسية
 رقم الترخيص 837 - 891 - 219
 القاهرة - الجيزة

CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : Sky Light Co.
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
Test Date : 02/03/2022
report date : 05/03/2022
Location : Station 460+600 to 460+700
Test No. : 001

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils ASTM D1196



Loading (1)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1963	3925	5888	7850	9813
Stress (Kg/cm2)	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Settlement (mm)	0.00	0.57	0.99	1.45	1.89	2.38

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	9813	5888	1963	0
Stress (Kg/cm2)	5.00	3.00	1.00	0.00
Settlement (mm)	2.38	2.15	1.67	1.12

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0.00	1963	3925	5888	7850	9813
Stress (Kg/cm2)	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Settlement (mm)	1.12	1.56	1.87	2.10	2.26	2.53

UnLoading (2)	1	2	3
Stage(Kg)	9813	5888	0
Stress (Kg/cm2)	5.00	3.00	0.00
Settlement (mm)	2.53	2.39	1.49

Signature \.....





MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة إصدار التأمين
المركز الرئيسى
سيسى مجدى يوسف
التوقيع / ٤/١٦٥

وثيقه تامين جميع اخطار المقاولين

الفرع الرئيسى

رقم الوثيقة 17772 هـ / 4

اسم المؤمن له	سكاي لايت للاستثمار الزراعى و المقاولات العامة SKY LIGHT
العنوان	القاهرة شقة 32 - الدور الثالث - برج 6 - ابراج صفوة الميثاق - قطعة 4 (أ،ب) شريحة أرض شمال طريق الميثاق - الحى
لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاوله	العقد رقم (846 / 2023 / 2024) تنفيذ أعمال الجسر الترابى للخط الاول للقطار الكهربائى السريع
موقع العمل	(العين السخنة - العلمين) قطاع (العلمين - فوكة) مرحلة تشكيل الجسر الترابى المسافة من الكم 460,520
وصف المشروع الى الكم	460,740 بطول 0.22 كم.
مدة التامين	أ - بالنسبة للاعمال
	ويبدأ التامين فى 2023/12/13
	وينتهى فى 2024/12/13
	الساعة الثانيه عشره ظهرا
	الساعة الثانيه عشره ظهرا
ب - بالنسبة لآعمال الصيانه	وتبدأ فى 2024/12/13
	وتنتهى فى 2025/12/13
	الساعة الثانيه عشره ظهرا
	الساعة الثانيه عشره ظهرا
مبلغ التامين	
القسم الاول	الاضرار الماديه 11500000.00 جنيه مصرى
القسم الثانى	المسئوليه المدينه قبل الغير 500000.00 جنيه مصرى

القسم الاول : الاضرار الماديه

البنود المؤمن عليها	مبلغ التامين	التحمل عن كل حادث
1- اعمال المقاوله		
الاعمال الدائمه والمؤقته متضمنه جميع المواد المبنيه فيما بعد		
1/1- قيمه العقد	11500000 جـم	20% الاولى من قيمه كل حادث بحد ادنى 100000 جـم.
2/1- الاشياء والمواد التى يوردها صاحب او اصحاب المشروع	لا يوجد	
2- ادوات ومهمات التشبيد	لا يوجد	
3- الات ومعدات التشبيد طبقا لقائمه المرفق	لا يوجد	
4- ازاله الانقاض	لا يوجد	
5- المنشآت المؤقته	لا يوجد	

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمين الهندسية - المركز الرئيسى - ٤/١٦٥



MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة إصدار الهندسي
المركز الرئيسى ٤/١٦٥
بمبنى مهندسين يوسف
التوقيع/ *حبيب*

التحملات	حدود التعويض	الاخطار الطبيعى
	غير مغطى	1 - الزلازل / البراكين / الاعاصير
	غير مغطى	2 - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه
	غير مغطى	/ انزلاق وانهيار التربه

(1) حدود التعويض لكل خساره او ضرر او سلسله من الخسائر او الاضرار الناشئه عن حادث واحد
القسم الثانى
المسئوليه المدنيه قبل الغير

التحملات	حدود التعويض	البنود المؤمن عليها
	ر-100000 (مائة الف جنيه).	1 - الاصابات الجسمانيه
	ر-250000 (مائتان وخمسون الف جنيه).	1/1 للشخص الواحد
	ر-250000 (مائتان وخمسون الف جنيه).	2/1 مهما كان عدد الاشخاص
الـ10% الاولى من قيمة كل حادث بحد أدنى ر-15000		2 - الاضرار الماديه للممتلكات

(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسله من الحوادث الناشئه عن واقعه واحد 500000.00

يعتبر متمما لهذه الوثيقه طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له
وتعتبر الملاحق التاليه والمرفقه جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقه

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة التأمينات الهندسيه - المركز الرئيسى ٤/٤٠

حبيب

ملحق زيارات الصيانة

ملحق وسائل مكافحه الحريق

مرفق شرط سقوط الحق

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ما يلى:
- إن هذه الوثيقة لا تغطى أية خسائر أو أضرار أو تلفيات ناتجة عن عمليات الإرهاب والتخريب.
- إنه من ضمن تغطيات الوثيقة خطرى الحريق والسطو (السرقه بالاكراه).
- بشرط عدم وقوع حوادث حتى تاريخه.
- يستثنى من التغطية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة أية أعمال تتم داخل المياه.
- إن هذه الوثيقة لا تشمل أية خسائر أو تلفيات ناتجة عن الإخلال بالعناصر الإنشائية للمبنى مثل الأعمدة الخرسانية / الأساسات / القواعد/ الكمرات/
المباني القائمة.... الخ، وأن مسئوليتنا فقط عن الأعمال التى تخص عقد المقاوله.



((للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط بسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب مؤدى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد منسوخا فإذا لم يهر المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب مؤدى عليه مصحوب بعلم الوصول))

1 390.00	القسط الصافي
77.00	نصف الدمغة النسيبه
8.00	رسم الاشراف والرقابه
7.00	نصف الدمغة النوعيه
100.00	مصاريف الاصدار
14.00	رسم تنميه موارد
4.00	مصاريف الهيئه
1 600.00	القسط الاجمالى

فقط ألف وستمائة جنيه مصرى لا غير

تحريرا فى 2023/12/14

اسم المنتج ادارة المركز الرئيسى

0 2020/01/01

صفحة 3 من 3

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين

إدارة التأمينات الهندسية - المركز الرئيسى ٤/٤٠

حري

حري

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين

إدارة إصدار الهندسى

المركز الرئيسى ٤/١٦٥

سلمى مجدى يوسف

التوقيع/ حري

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة أو الملحقة بها وفيما عدا ذلك.
فأن الشركة سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط ما يلي :-
١- توافر معدات مكافحة الحريق المناسبة ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الأوقات مع تقدم العمل.

ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهز فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة
٢- يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل أسبوع .

٣- ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد إزالة القوالب المستخدمة فى الإنشاء.

أن يتم الغلق المؤقت لفتحات أبواب المصاعد ، أنابيب الخدمات وأى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات.

٤- أن يتم إزالة النفايات بانتظام - إزالة النفايات القابلة للاشتعال من جميع الأدوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .

٥- اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال حرارية) من أى نوع مثل:-

- عمليات الجلف،التقطيع،اللحام .

- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .

- استعمال النتومين الساخن - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخون.

يتم تنفيذ (العمل الحرارى) فقط بوجود عامل على الأقل مجهز بطفاية حريق ومدرّب على مكافحة الحريق ويتم فحص منطقة (العمل الحرارى) بعد انتهاء هذا العمل بساعة.

٦- يتم تقسيم عملية تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب إلى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبيّنة ادانة لكل وحدة تخزين

كل وحدة تخزين يجب أن تعزل بما لا يقل عن ٥٠ متر أو ان تفصل بحوائط غير قابله

للحريق يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أى عمل حرارى.

٧- تعيين منسق امان بالموقع.

- تركيب نظام مضمون للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع

اقرب مركز إطفاء حريق متى أمكن ذلك .

- اتباع خطة حماية من الحريق وخطة التصرف بالموقع عند وقوع حريق مع إعادة النظر فيها بانتظام .

- ان يكون قد تم تدريب عمالي المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية أسبوعيا .

- ان يكون اقرب مركز إطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل فورية مجهزة له فى جميع الأوقات .

٨ - ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .

قيمة كل وحدة تخزين : - ٥٠٠٠٠ جم

ملحق خاص بتغطية زيارات صيانة

من المعلوم والمتفق عليه أنه مع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والأشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحقة بها ومقابل قيام المؤمن له بسداد القسط الإضافي المتفق عليه ، ليمتد التأمين ليغطي فقط التلف أو الخسارة التي تلحق بأعمال المقولة والتي تنشأ بسبب وأثناء قيام المقاول (المقاولون) المؤمن له (لهم) بالعمليات التي تتعلق بالالتزامات الواردة بشروط الصيانة في عقد المقولة وذلك خلال فترة الصيانة المبينة فيما بعد

- تغطية الصيانة من : ٢٠٢٤/١٢/١٣ الى ٢٠٢٥/١٢/١٣

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة إصدارة الهندسي
المركز الرئيسي ٤/١٦٥
سليمى مجدى يوسف
التوقيع

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة إصدارة الهندسي
المركز الرئيسي ٤/١٦٥
سليمى مجدى يوسف
التوقيع

الساده
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد:

تتشرف شركه المهندس للتأمين بأن تتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم
مؤكدين استعدادنا الدائم لتقديم افضل الخدمات التأمينيه .
وعليه نفيديكم علما بان الوثيقة رقم ١٧٧٧٢ هـ / ٤ .

الصادره باسم عميلكم / SKY LIGHT سكاى لايت للاستثمار الزراعى و المقاولات العامة

ولصالحكم عن الفترة ٢٠٢٣/١٢/١٣ حتى ٢٠٢٤/١٢/١٣ .

مسدده طرفنا نقدا وساريه المفعول

لايجوز اجراء اى تعديل او الغاء فى الوثيقة الا بموافقه كتابيه من جهتكم الموقرة

تصرف كافة التعويضات الجزئيه والكلية الى جهتكم الموقرة

مع عدم الاخلال بالشروط العامة للوثيقة

ونحن نشكركم على حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
الإدارة العامة للتأمين
٤/٣٧

شركة المهندسين للتأمين

٢٢٤٣

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٢/١٤

عبد حليم

أمان بلا حدود

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	الرئيس	رقم الوثيقة	20117	و/	4	تاريخ طلب التأمين	2023/12/13
العملة	جنية مصرى	مدة التأمين من	2023/12/13	ظهرا الى	2024/12/13	ظهرا	ظهورا
اسم المتعاقد	SKY LIGHT سكاي لايت للاستثمار الزراعى والمقاولات العامة						
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق						
العنوان	القاهرة شقة ٣٢ - الدور الثالث - برج ٦ - ابراج صفوة الميثاق - قطعة ٤ (أب) شريحة أرض						
لصالح	شمال طريق الميثاق - الحى العاشر - مدينة نصر الهيئة العامة للطرق والكبارى						

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسماءهم بسبب الحوادث التى تقع لهم اثناء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل
اثناء تنفيذ عملية " تنفيذ اعمال الجسر الترابى للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العالمين) (قطاع العلمين - فوكه) مرحلة تشكيل
جسر الترابى المسافة من الكم ٤٦٠,٥٢٠ الى الكم ٤٦٠,٧٤٠ بطول ٠,٢٢ كم بالامر المباشر " و بشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد
المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٨٤٦
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت

القسط الصافى	نصف الدفعة النسبية	نصف الدفعة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالى
731.25	3.65	3.00	55.50	4.40	0.73	1.47	800.00

فقط ثمانمائة جنية مصرى لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

- اولا : اذا توفى المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا وقدره وذلك وفقا لما جاء
بالبنء الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثانيا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا وقدره وذلك وفقا لما
جاء بالبنء الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- ثالثا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء
بالبنء الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- رابعا : اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا وقدره اسبوعيا بواقع
(خمسة فى الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم الوارد بالبنء ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد اقصى ٥٢
اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبى وذلك وفقا لما جاء بالبنء الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
- خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى اقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين
- سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

وثيقة تأمين حوادث شخصية



2023/12/13	تاريخ طلب التأمين	4 / 20117	رقم الوثيقة	الرئيسي	الفرع المصدر
2024/12/13	ظهر الى	2023/12/13	مدة التأمين من	جنية مصري	العملة

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة ١٤٤

تحريرا في 2023/12/14





كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف مَتمم للوثيقة 20117 و 4

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
الوفاة	حالة العجز الكلى او الجزئى المستديم	العجز الكلى المؤقت	العلاج	اسعاف	جنازة
مهندس	1	75000	75000	0	0.00
تامينا على عدد (١) مهندس بدون ذكر اسماء				4.50	337.50
مساعد مهندس ١ او ملاحظ	1	30000	30000	0	0.00
تامينا على عدد (١) مساعد مهندس او ملاحظ بدون ذكر اسماء				4.50	135.00
سائق معدة او سيارة	1	15000	15000	0	0.00
تامينا على عدد (١) سائق معدة او سيارة بدون ذكر اسماء				4.50	67.50
عامل عادى	1	10000	10000	0	0.00
تامينا على عدد (١) عامل عادى بدون ذكر اسماء				4.50	45.00
اجمالى مبلغ التأمين		130000	جنية مصرى		

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم 25.00
146.25

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
تقتصر التغطية التأمينية على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسماءهم بسبب الحوادث التى تقع لهم اثناء ويسبب العمل فقط وداخل موقع العمل اثناء تنفيذ عملية " تنفيذ اعمال الجسر الترابى للخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العالمين) (قطاع العلمين - فوكه) مرحلة تشكيل الجسر الترابى المسافة من الكم ٤٦٠,٥٢٠ الى الكم ٤٦٠,٧٤٠ بطول ٠,٢٢ كم بالامر المباشر "و بشرط الا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموجب هذه الوثيقة والا سقط حقه فى الانتفاع بمزايا التأمين عقد رقم ٢٠٢٤ /٢٠٢٣ /٨٤٦
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لاتزيد عن ٢٢٠ فولت

صافى القسط 731.25

الساده
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد:

تشرف شركه المهندس للتأمين بأن نتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم
مؤكدين استعدادنا الدائم لتقديم افضل الخدمات التأمينيه .
وعليه نفيدكم علما بان الوثيقة رقم ٢٠١١٧ ٤ / و .

الصادره باسم عميلكم / SKY LIGHT سكاى لايت للاستثمار الزراعى و المقاولات العامة

ولصالحكم عن الفترة ٢٠٢٣/١٢/١٣ حتى ٢٠٢٤/١٢/١٣ .

مسدده طرفنا نقدا وساريه المفعول

لايجوز اجراء اى تعديل او الغاء فى الوثيقه الا بموافقه كتابيه من جهتكم الموقرة

تصرف كافة التعويضات الجزئيه والكلية الى جهتكم الموقرة

مع عدم الاخلال بالشروط العامه للوثيقه

ونحن نشكركم على حسن تعاونكم معنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٢/١٤

٢٢٤٣

MIC
MOHANDES INSURANCE CO.
شركة المهندس للتأمين
الأمانة العامة للتأمين
٤/٢٧

شركة المهندس للتأمين

أمان بلا حدود
