

البند	البيان	وحدة	الفئة بعد التفويض	كمية التفويض	الكمية المعمله	اجمالي التفويض	اجمالي المعمله (١)
اعمال تجهيز الموقع العام							
١	بالمتر الطولي عمل جسارت بعمق ١٠ متر وعمل تقرير طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٤٥٠	٤٠	٣٠	١٨٠٠٠	١٣٥٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة والبند يشمل التكسير اليدوي اذا لزم الامر ونقل المخلفات للمقلب العمومي وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.٣	٣٣٠	١٤٠	١٥١	٤٦٢٠٠	٤٩٨٣٠
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقلب العمومي والوصول لعنسوب التأسيس مع نهر الاعمال طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً حسب المواصفات القياسية المصرية و تعليمات جهاز الاشراف المعتمدة بالرسومات التنفيذية.	م.٣	١٠٠	١٦٠٠	١٥٦٤	١٦٠٠٠٠	١٥٦٤٠٠
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفة تشمل عمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والفة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٣	١٧٠	١٧٠	٥٨	٢٨٩٠٠	٩٨٦٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال (١:٢) رمل التي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والفة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.٣	٣٣٠	٧٢٥	٦٦٦	٢٣٩٢٥٠	٢١٩٧٨٠
الاعمال الانشائية							
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المني على الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد السب طبقاً للمواصفات والفة تشمل كل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.٣	٢٠٦٠	١٩٥	١٨٨	٤٠١٧٠٠	٣٨٧٢٨٠
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من السب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد السب طبقاً للمواصفات والفة تشمل اعمال الغرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م.٣	٢٨٠٠	٥٠	٥١	١٤٠٠٠٠	١٤٢٨٠٠

محمد السيد
٣

محمد السيد
٣

البند	البيان	وحدة	الفترة بعد التفاوض	كمية التفاوض	الكمية المعدله	اجمالي التفاوض	اجمالي المعدله (١)
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٣٦٠٠	٤٠	٣٨	١٤٤٠٠٠	١٣٦٨٠٠
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٠,٨ م ^٣ زلط نظيف و ٠,٤ م ^٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٢٠٠	٥	١	١١٠٠٠	٢٢٠٠
١٠	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمه طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهـ العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٤٥٠	٦٥	٦٦	٩٤٢٥	٩٥٧٠
١١	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحة والفئة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا طبقا للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٥٣٠٠٠	١٢,٥	١٢	٦٦٢٥٠٠	٦٣٦٠٠٠
١٢	بالمتر الطولي نقل وتركيب سور خرساني سابق الصب من مخازن الهيئة الي الموقع علي ان لا تزيد مسافه النقل عن ٩٠ كم والسعر يشمل التحميل والنقل والتركيب وكل ما يلزم لنهـ العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٢٢٠٠	٦١٥	٦٠٠	١٣٥٣٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠
أعمال مباني							
١٣	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طغلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٤٥	٢٧٥	٢٩٩	٦٧٣٧٥	٧٣٢٥٥
١٤	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طغلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٢٠٠	٦٥	٥٠	١٤٣٠٠٠	١١٠٠٠٠
١٥	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م ^٣ رمل والفئة يشمل توريد المون وعمل السقاييل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهـ العمل كاملا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٩٠	٢٠	١	٥٨٠٠	٢٩٠

محمد الصبيح
A.2



البيد	البيان	وحدة	اللقطة بعد التفاوض	كمية التفاوض	الكمية المعدلة	اجملي التفاوض	اجملي المعدلة (١)
١٦	بالمقر مكتب عمل موائى سمك طبقة من الطوب الاستمى بوية مكورة من ٢٠٠ كجم اسمنت / ٣ رمل واللقطة يشمل توريد المون وعمل المنقلل اللازمة مع رش الحصى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لتبوير العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢ _م	٢٤٠٠	٣٠	٤٨	٧٨٠٠٠	١١٥٢٠٠
	اصول التزل					٠	٠
١٧	بالمقر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم المسطح والعمامات والمطابخ الدور العلوى على الابقى التركيب بين الشرائح ص واللقطة تشمل الدخان اسفلها و على الابقى التركيب بين الشرائح ص ١٥ سم وعمل ورزة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والحدام بارتفاع ١٥ سم وعمل طبقة لينة استمى سمك ٢ سم لحدامه العزل مع تقديم عينة لاختبار قبل التوريد وكل ما يلزم لتبوير العمل كاملا طبقا للمواصفات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢ _م	٦٠	٤١٠	٤١٠	٢٤٦٠٠	٢٤٦٠٠
١٨	بالمقر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم المسطح من السليطون سمك ٥ سم ويحمل على اللبنة عمل طبقة لينة استمى سمك ٢ سم لحدامه السليطون وكل ما يلزم لتبوير العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢ _م	١٩٠	٧٥	٧٦	١٤٢٥٠	١٤٤٤٠
١٩	بالمقر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك حصوة كراتية مقاس ٣٠٠ × ٣٠٠ سم قرز اول من ابعاد الانواع واللقطة تشمل التوريد وتركيب وسقاية اللوحات جيدا بموية الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لتبوير العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢ _م	١٧٥	٦٥	٦٦	١١٣٧٥	١١٥٥٠
٢٠	بالمقر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحواط الداخلية والاسقف ودروة المسطح من الداخل ويعمل على طبقتين سمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة المعموية بموية مكورة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ رمل الطائفة سمك ٥ سم بموية مكورة من ٢٠ سم اسمنت / ١٠٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى والصفه سمك ٥٠٠ رمل + سم بموية مكورة من ٢٠ سم + رمل ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى واللقطة تشمل كل ما يلزم لتبوير العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢ _م	٢٣٥	٦٥	٦٦	١٥٢٧٥	١٥٥١٠
	اصول البياض					٠	٠
٢١	بالمقر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحواط الخارجية والاسقف ودروة المسطح من الداخل ويعمل على طبقتين سمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة المعموية بموية مكورة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ رمل الطائفة سمك ٥ سم بموية مكورة من ٢٠ سم اسمنت / ١٠٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى والصفه سمك ٥٠٠ رمل + سم بموية مكورة من ٢٠ سم + رمل ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى واللقطة تشمل كل ما يلزم لتبوير العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢ _م	١٤٠	١٠	١٢٠	١٤٠٠	١٦٨٠٠
٢٢	بالمقر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحواط الخارجية والاسقف ودروة المسطح من الداخل ويعمل على طبقتين سمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة المعموية بموية مكورة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣ رمل الطائفة سمك ٥ سم بموية مكورة من ٢٠ سم اسمنت / ١٠٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى والصفه سمك ٥٠٠ رمل + سم بموية مكورة من ٢٠ سم + رمل ٢٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عالى واللقطة تشمل كل ما يلزم لتبوير العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢ _م	١٩٠	٨٥٠	١٢٠٠	١٦١٥٠٠	٢٢٨٠٠٠

المهندس
Ker

المهندس
Ker

البند	البيان	وحدة	الفئة بعد التفاوض	كمية التفاوض	الكمية المعدله	اجمالي التفاوض	اجمالي المعدله (١)
	أعمال دهانات						
٢٣	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك سبايس والتشطيب بونن و يشمل (التجهيز+وجه برايمر مائي + ٣ سكينة معجون+وجه تحضيري) و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	١٨٠	١٠	١٢٠	١٨٠٠	٢١٦٠٠
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعة وتعليمات الاستشاري.	م ^٢	١٨٠	٨٥٠	١٢٠٠	١٥٣٠٠٠	٢١٦٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي ترميم الأجزاء المتهاكلة من السور السابق الصنب والبنو يشمل المعالجة بماده اسمنتية مناسبة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٧٥	١٠	١	٧٥٠	٧٥
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب ملك شبك مجلفن سمك ٤ مم لزوم السور والفئة تشمل توريد الشبك والزوايا والربط بين الاعنده والعلب والقوائم الحديد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف	م ^٢	٧٤٠	١٧	١	١٢٥٨٠	٧٤٠
٢٧	بالعدن توريد وتركيب جرجوري صرف مطر سمات او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصنعة.	عدن	٩٠٠	٢	٢	١٨٠٠	١٨٠٠
	اجمالي الاعمال الاعتيادية					٣٩٠٠٤٨٠	٣٩٣٣٨٨٠
	الاعمال الكهربائية						
١	بالعدن توريد وتركيب لوحة كهرباء رئيسية من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي A ٢٥٠ و عدد ٦ مفتاح فرعي A ١٠٠ والقواطع من نفس النوع واجهزة قياس وبارات بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعة	عدن	١٢٠٠٠٠	١	١	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
٢	بالعدن توريد وتركيب لوحة كهرباء شوارع بخليه فوتوسيل بدرجة حماية IP54 و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعة	عدن	٨٠٠٠٠	١	١	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥×٤) مم ^٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعة.	م.ط	٦٠٠	١٠٠	١	٦٠٠٠٠	٦٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦×٤) مم ^٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصنعة.	م.ط	٤٠٠	٢١٥	٦٨٠	٨٦٠٠٠	٢٧٢٠٠٠
	بالعدن توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع Watt ١٥٠ بدرجه حمايه IP6٥ السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصنعة.	عدن	١٠٠٠٠	٥٠	٣٣	٥٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
	بالعدن نقل وصيانته واعاده تركيب عمود انارة البند يشمل النقل والتوصيل والتثبيت بجوايط وعمل القاعده اللازمه (٥٠*٤٠*٤٠ سم) والمرامحه والدهان اللازم باللون المطلوب وتجهيزه بعدن ٢ زراع شكل V وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	عدن	١٠٠٠٠	٢٥	٢٦	٢٥٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠
	اجمالي الاعمال الكهربائية					٤٩٩٦٤٨٠	١٠٦٢٦٠٠
	الإجمالي					٤٩٩٦٤٨٠	٤٩٩٦٤٨٠

رئيس الاداره المركزيه
مهندس /
ايمن محمد متولي

مدير المشروع
مهندس /
مروه بدرت

مهندس الهيئة
عبدالرحمن /
م

مهندس الشركة
مهندس /
م

بيان اعمال جاري (٢)
عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

رقم البند	نوع العمل	كمية المعاملة ١	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف
اعمال تجهيز الموقع العام					
١	بالمتر الطولي عمل جسات بعرض ١٠ متر وعمل تقرير طبقات لاصول الصناعة وتخطيطات مهندس الاشراف.	٣٠	٣٠,٠٠٠	٣٠	%١٠٠
٢	بالمتر المكعب تسوير بلاطت خرسانية مسلحة والبند يشمل التسوير البدوي اذا لزم الامر ونقل المخلطات للمطابق الصومية وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لاصول الصناعة وتخطيطات مهندس الاشراف	١٥١	١٥١,٠٥٤	١٥٠	%١٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمطابق الصومية والوصول لمتسوبي التأسيس مع نهو الاعمال طبقا لرسومات التنفيذ وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا حسب المواصفات القياسية المصرية و تخطيطات جهاز الاشراف المحددة بالرسومات التنفيذية.	١٥٦٤	١٥٤٢,١٥	١٥٤٠	%١٠٠
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد واللفة تشمل عمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف	٥٨	٥٧,٩٥	٥٧	%٩٨
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول واللفة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف	٦٦٦	٦٦٥,٠٩	٦٦٥	%١٠٠
الاعمال الانشائية					
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المني على الانكسار كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معقبة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللفة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف.	١٨٨	١٨٧,٠٥	١٨٥	%٩٩
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاسفلت (قواعد وسمات) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الانكسار المقومة الممطرة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معقبة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللفة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٥١	٥٠,٥٨	٥٠	%٩٩
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعددة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الانكسار المقومة الممطرة عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معقبة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات واللفة تشمل اعمال القرم الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٣٨	٣٧,٥٤	٣٧	%٩٩
١١	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح (٢٧/٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة واللفة تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لرسومات المصممة والشروط والمواصفات القياسية وتخطيطات جهاز الاشراف.	١٢,٠	١١,٦٦	١١,٦٠	%٩٩
١٢	بالمتر الطولي نقل وتركيب سور خرساني سابق الصب من مخارن الهيئة الي الموقع على ان لا تزيد مسافة النقل عن ٩٠ كم والسور يشمل التسليم والنقل وتركيب وكل ما يلزم لتجهيز العمل طبقا لاصول الصناعة وتخطيطات مهندس الاشراف.	٦٠٠	٥٩٩,٣١	٥٩٥	%٩٩
اعمال دهانات					
١٣	بالمتر المسطح عمل مبني سمك طوية من الطوب ظلي الممرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل واللفة يشمل توريد المون وعمل السقف اللازمة مع رش المبني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف.	٢٩٩	٢٥١,١٤	٢٥١	%١٠٠
١٤	بالمتر المكعب عمل مبني سمك طوية من الطوب ظلي الممرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل واللفة يشمل توريد المون وعمل السقف اللازمة مع رش المبني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف.	٥٠	٣٣,٧٨	٣٣	%٩٨
١٥	بالمتر مكعب عمل مبني سمك طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت ٣/م رمل واللفة يشمل توريد المون وعمل السقف اللازمة مع رش المبني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف.	٤٨	٢٦,٠٤	٢٦	%١٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طيله من العزل للرطوبة من البينومين البارد للاسفلت ومبني قصبة الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتخطيطات مهندس الاشراف.	٤١٠	٤١١,٣٤	٤١٠	%١٠٠
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بعض تشييد لزوم الحوائط الداخلية والسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الخرقة الصومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت ٣/م رمل الطبقة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والظاهرة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم رمل ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي واللفة تشمل كل ما يلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتخطيطات المهندس المشرف.	١٢٠	١١٣,٦٧	١١٠	%٩٧

٥.٨

بيان اعمال جاري (٢)
عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

رقم البند	نوع العمل	كمية المحلة ١	كمية الحصر	كمية المستخلص	نسبة الصرف
٢٢	بالقتر المسطح توريد وعمل بهامش تشكيلين لزوم الحواجز الخارجي والاسفلق ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة الصومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / م٣ ومل البطقة بسمك ٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م٣ رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عدي والشنهرة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م٣ رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عدي والفئة تشمل كل ما يلزم للهي العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠٠	١٠٣٣,٨٨	١٠٣٣	%١٠٠
٢٤	بالقتر المسطح أعمال دملقات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من التاج شركة جرفلقتو او ما يمثلها ويشمل كل ما يلزم للهي الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الاستشاري.	١٢٠٠	١٠٣٣,٨٨	١٠٠٠	%٩٧
الاعمال المذكورة					
٦	بالقدر نقل وصيقله واعاده تركيب عود الفراء البند يشمل النقل والتوصيل والتثبيت بهوايط وعمل القاعدة اللازمه (٥٠*٤٠*٤٠ سم) والمرامحه والدهان اللازم بخلتون المطبوع وتجهيزه بعد ٢ زراع شكل ٧ وكل ما يلزم للهي العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	٢٦	٢٦,٠٠	٢٦	%١٠٠
تشوينت					
٤٤	بالقتر الطولي توريد وتركيب واختيار كليل قطاع (١٦*١) سم ٢ المنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم للهي الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	٦٨٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠	%١٠٠
٤٥	بالقدر توريد وتركيب كشاف الفراء طراز شوارع Watt ١٥٠ بدرجة حمايه IP ٦٥ السعر يشمل كل ما يلزم للهي الاعمال حسب اصول الصناعة.	٢٦	٣٣,٠٠	٣٣	%١٠٠

مهندس الهيئة

مهندس

عبدالكريم





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعباط

مهندس الشير



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

22/3

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبلدة

الإجمالي

مهندس الشركة

عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم السند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوران		احمالي
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	حزني	
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواحبات الخارجية بوية اسمنتية							
	احمالي ما سبق							
	الطيات من اسفل	١	٤,١٥		٠,٢٨		٤٤٠,٢٨	٤٤٠,٢٨
		٢	٢,٢٥		٠,٢٨		١,٨٢	١,٨٢
		١	٢,٢٢		٠,٢٨		٠,٩٠	
		١	٤,٤٢		٠,٢٨		١,٢٤	
		١	١,٩٧		٠,٢٨		٠,٥٥	
		١	٤,٩١		٠,٢٨		١,٢٧	
		١	٢,٦٥		٠,٢٨		١,٠٢	
		١	٢,٢٥		٠,٢٨		٠,٩١	
	حوائب الاعمدة	١٨	٢,٥		٠,٢٨		١٢,٦٠	
		١٨	١,٦		٠,١٥		٤,٢٢	
		٤	٤,١		٠,٤		٦,٥٦	
	بين الطوبة والنص طوبة	١	٤,١٥		٠,١٢		٠,٥٠	
		٢	٢,٢٥		٠,١٢		٠,٧٨	
		١	٢,٢٢		٠,١٢		٠,٢٩	
		١	٤,٤٢		٠,١٢		٠,٥٢	
		١	١,٩٧		٠,١٢		٠,٢٤	
		١	٤,٩١		٠,١٢		٠,٥٩	
		١	٢,٦٥		٠,١٢		٠,٤٤	
		١	٢,٢٥		٠,١٢		٠,٢٩	
	السور ناحية مبني الهيئة							
	من الداخل والخارج	٢	٤٠,٦٥		٢,٦		٢٩٢,٦٨	
		٢	٢٤,٧٢		٢,٦		١٧٧,٩٨	
	الإجمالي							
							٩٤٧,٣٦	٩٤٧,٣٦
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				


عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { منشئ + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوران		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
حان	بالمتر الطولى نوريد وتركيب واختيار كابل قطاع (١٦×٤) مم ² الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة.							
	اعمده الانارة بالمنشل	٢١	٢٢				٤٦٢,٠٠	
		١	٢١,٤٨				٢١,٤٨	
	بحوار الوحدة القديمة	٩	٢٢				١٩٨,٠٠	
على انه مقوم الشركة في البند في تصديره بالجدات طبقا لتعليمات المهندس طهرت وذلك بعد كيانته عند طهنة وتلتزم الشركة بالتزبيد كجيد باناسب وفي عهدة الشركة								
٢٠٢٤								

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





تقرير فنى

مُبحاث التربة وتوصيات التأسيس

لمشروع انشاء سور ومباني بوحدہ البليده

المرجع ..

وحدة البليدة - العياط - الجيزه

المالك : الهيئه العامه للطرق والكباري

الشركه المنفذه : شركه تبارك للمقاولات العموميه

٢٠٢٣

المهندس الاستشاري
د / عماد عبد العظيم رضوان
مكتبه هندسيه استشاري
تصميم، دراسات، دراسات
١٦ / ٢٠٢٣
(استشاري) ١ / ٥٥٠٠٤
سجل ٩٦ / ٢٥٧ - ٨٦٤

تليفون / ٠١٣٢٧ ١١٤٢١

موبايل / ٠١٢٤٢ ٢٥٣١٣

E-mail : braaemad@yahoo.com

تصميمات معمارية وإنشائية

جسات تربة - تراخيص بناء


إشراف وإدارة مشروعات

المحتويات

- ١ : المقدمة .
- ٢ : وصف الموقع العام وطبيعة المنشأ .
- ٣ : استخراج الجسات وعينات التربة .
- ٤ : التجارب الحقلية والمعملية .
- ٥ : طبيعة التربة .
- ٦ : اقتراحات وتوصيات التأسيس .

المرفقات

- 1- كروكي الموقع العام موضح عليه أماكن الجسات شكل رقم (١)
- 2- تفصيلات الجسات وطبقات التربة و نتائج التجارب الموقعية والمعملية أشكال رقم (٢ : ٤)
- 3- منحنيات التدرج الحبيبي أشكال رقم (٥-٦)



١ - مقدمة

أعد هذا التقرير بناء على طلب السادة شركه تبارك للمقاولات العموميه لعمل دراسة لطبيعة التربة والأساسات لمشروع إنشاء سور ومباني بوحدہ البليده بالعنوان/ وحدة البليدة - العياط - الجيزة بناءً على نتائج الجسات التي تمت بموقع المشروع وأجراء التجارب الموقعية والمعملية على العينات المستخرجة من التربة. وقد تم عمل الجسات وأخذ العينات بمعرفة السيد المقاول / راضي العرينى وأجريت التجارب المعملية بمعامل مكتبنا. ويتضمن التقرير مايلي:

- أ- دراسة الخواص الطبيعية والميكانيكية لعينات ممثلة لطبقات التربة بموقع المشروع.
- ب- الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالاساسات وتشمل نوع الاساس ومنسوب التأسيس وإجهاد التحميل الصافى المسموح باستخدامه عند منسوب التأسيس.
- ج- توصيات عامة وتشمل الاحتياطات والاقتراحات الواجب اتباعها عند تصميم وتنفيذ أساسات المشروع.

٢ - وصف الموقع العام وطبيعة المنشأ

الشكل رقم (١) يوضح الموقع العام للسور ومباني بوحدہ البليده .

٣ - استخراج الجسات وعينات التربة

تم أخذ عدد "٣" جسة بالموقع على عمق - ١٠,٠٠ م من منسوب سطح الأرض الطبيعية بطريقة الحفر الميكانيكى الدوار باستخدام القاطع المفرد ومستحلب البنتونيت لسند جوانب الحفر وتبريد القواطع . وتم الكشف على الاساسات لمعرفة منسوب التأسيس ويوضح شكل رقم (١) موقع الجسات فى الموقع العام .
تم استخراج عينات مقلقله وغير مقلقله من الموقع لكل ١ متر والعينات المقلقله تم حفظها فى اكياس من البلاستيك والغير مقلقله تم تشميعها فى الموقع وتم نقلهما الى المعمل لأجراء التجارب عليهما .

د/ عماد عبدالعظيم رضوان
م. إستشارى
تصميم وتنشيطات إنشائية
١٦ / ٢٨٤
١ / ٥٥٠٤
سجل ٨٦٤ / ٢٥٧

٤- التجارب الحقلية والمعملية

٤-١ تجربة الاختراق القياسى (spt) :
تم تنفيذها اثناء استخراج العينات من التربة وذلك بدق الملعقة القياسيه لمسافه ٤٥ سم عند اسفل الجسه وبعد ذلك تدق لمسافه ٣٠ سم ويطلق على عدد الدقات اللازمه قيمه الاختراق القياسى لهم ونتائج تجربه فى الشكل رقم (٢ - ٤) .

٤-٢ الفحص الظاهرى:
تم تصنيف عينات التربة بالفحص الظاهرى طبقا لمواصفات الكود المصرى لميكانيكا التربة والاساسات .

٤-٣ تجارب التدرج الحبيبي :
تم اجراء تجارب التدرج الحبيبي على بعض عينات من طبقات التربة المستخرجه من موقع الجسه باستخدام المناخل القياسيه وذلك لتصنيفها على وجه الدقة ولتأكيد التصنيف الظاهرى . والنتائج التفصيلية لهذه تجربه مبينه بالاشكال رقم (٥-٤) بالمرفقات

٤-٤ منسوب المياه الجوفيه:
تم رصد منسوب المياه الجوفيه وتحديد مناسيبها الابتدائيه (اثناء تنفيذ الجسات) والنهائيه (بعد خلع العده ب ٢٤ ساعه) ونتائج الاختبار موضحه بالجدول التالى :

رقم الجسه	المنسوب الابتدائى	المنسوب النهائى
٣-٢-١	٣,٠٠-	٢,٥٠-

م. إستشارى د/عماد عبدالعظيم رضوان
م. إستشارى د/عبدالله محمد
تصميم وتنشيط الرسائيه
١٦ / ٤٨٤
١ / ٥٥٠٤
سجل ٢٥٧ / ٩١ رقم المص ٨٦٤

٥ - طبيعة التربة

أجرى الفحص الحقلى والمعملى على عينات التربة المستخرجة من الجسات ومنها تم تصنيف التربة إلى الطبقات المبينة بالأشكال رقم (٢ - ٤) . وذلك من سطح الارض الطبيعية وحتى منسوب نهاية الجسة كما يلى:

الجسة الأولى:


- * من سطح الارض وحتى عمق ١,١٠ متر : ردم
- * يليها من عمق ١,١٠ وحتى عمق ٣,٣٠ متر: طين بني شديد التماسك .
- * يليها من عمق ٣,٣٠ وحتى عمق ٤,٥٠ متر: ردم .
- * يليها من عمق ٤,٥٠ وحتى عمق ٧,٤٠ متر: طين بني شديد التماسك .
- * يليها من عمق ٧,٤٠ وحتى عمق ٨,٦٠ متر: طمي طيني رملي .
- * يليها من عمق ٨,٦٠ وحتى عمق ١٠,٠٠ متر: رمل متوسطه الخشونه .

الجسة الثانية:

- * من سطح الارض وحتى عمق ١,٢٠ متر : ردم
- * يليها من عمق ١,٢٠ وحتى عمق ٦,٥٠ متر : طين بني شديد التماسك .
- * يليها من عمق ٦,٥٠ وحتى عمق ٨,٤٠ متر: طمي رملي .
- * يليها من عمق ٨,٤٠ وحتى عمق ١٠,٠٠ متر: رمل متوسطه الخشونه .

الجسة الثالثة:

- * من سطح الارض وحتى عمق ١,٢٥ متر : ردم
- * يليها من عمق ١,٢٥ وحتى عمق ٦,٤٠ متر : طين بني شديد التماسك .
- * يليها من عمق ٦,٤٠ وحتى عمق ٨,٣٠ متر: طمي رملي .
- * يليها من عمق ٨,٣٠ وحتى عمق ١٠,٠٠ متر: رمل متوسطه الخشونه .



٦- إقتراحات وتوصيات التأسيس

- نتيجة لهذه الدراسة يمكن أن نعطي الإقتراحات والتوصيات الآتية :-
- ٦-١ نوع الأساس نوصى بأستخدام أساس سطحي يتكون من لبشة من الخرسانة العادية بسمك ٣٠ سم وقواعد مسلحة ويتم تربيطها بواسطة ميدات جاسئه وطبقا للتصميم الهندسي
- ٦-٢ يتم حفر الموقع بكامل مسطح المبني حتى عمق لا يقل عن (١,٠٠م) من متوسط منسوب الأرض الطبيعية الحالى أو منسوب الصفر المعمارى أيهما أقل .
- ٦-٣ يتم عمل احلال من الرمل والزلط بنسبه ١:١ بسمك ٥٠,٠ متر علي طبقات ويدمك دمكا شديدا طبقا للمواصفات علي طبقات كل طبقه لاتزيد عن ٢٥ سم حتي اقصى كثافه جافه طبقا لتجربه بروكتور القياسيه ٩٥% من اقصى كثافه جافه .
- ٦-٣- إجهاد التأسيس الصافى عند منسوب التأسيس فوق طبقه الاحلال (١,٥٠ كجم/سم ٢)


- بالنسبة للسور

- نوع الأساس نوصى بأستخدام أساس سطحي يتكون من لبشة من الخرسانة العادية بسمك ٣٠ سم وقواعد مسلحة ويتم تربيطها بواسطة ميدات جاسئه وطبقا للتصميم الهندسي
- ٦-٤ يمكن استخدام الأسمنت البورتلاندى العادى فى الخلطات الخرسانية للأساسات بنسبة ٣٥٠ كجم من الأسمنت لكل متر مكعب من الخرسانة المسلحة على الأتزيد نسبة المياه إلى الأسمنت ٥,٠ وتدهن الأساسات بطبقتين من البتومين او أي مادة عازلة اخري قبل الردم حولها مع تكثيف جميع الخرسانات إلى أقصى حد ممكن وإستخدام الخلطات والهزازات فى كافة اعمال الخرسانات الموجودة تحت سطح الأرض.
- يراعى عمل فاصل انشائي للسور علي مسافه لاتزيد ٢٠ متر او طبقا للتصميم .
- ٦-٥ يستخدم الركام السليسي فى جميع أعمال خرسانة الأساسات مع مراعاة تكثيف الخرسانة إلى أقصى حد ممكن ، ويراعى اتباع كافة الشروط والمواصفات الخاصة بالأعمال الخرسانية للأساسات مثل تنفيذ طبقات عازلة ، مراقبة الجودة الخ ، كما يراعى ألا يقل جهد الكسر للمكعبات القياسية المأخوذة من خلطات الخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوما عن ٢٥٠ كجم/سم ٢.
- ٦-٦ علي المقاول سند جوانب الحفر وعمل الاحتياطات اللازمه لذلك لتأمين جوانب المنشآت المجاوره .
- ٦-٧- إذا ظهر أثناء الحفر ما يخالف ما جاء بهذا التقرير فإنه يجب الرجوع إلينا .

وبالله التوفيق ،،،

مهندس إستشارى


د. عماد عبدالعظيم رضوان



م.أستشارى د/ عماد عبدالعظيم رضوان.

مركز براء للاستشارات الهندسية ودراسات التنمية الشاملة.
تقرير فنى لأبحاث التربة وتوصيات التأسيس.

المالك / الميثة العامه للطرق والكبارى

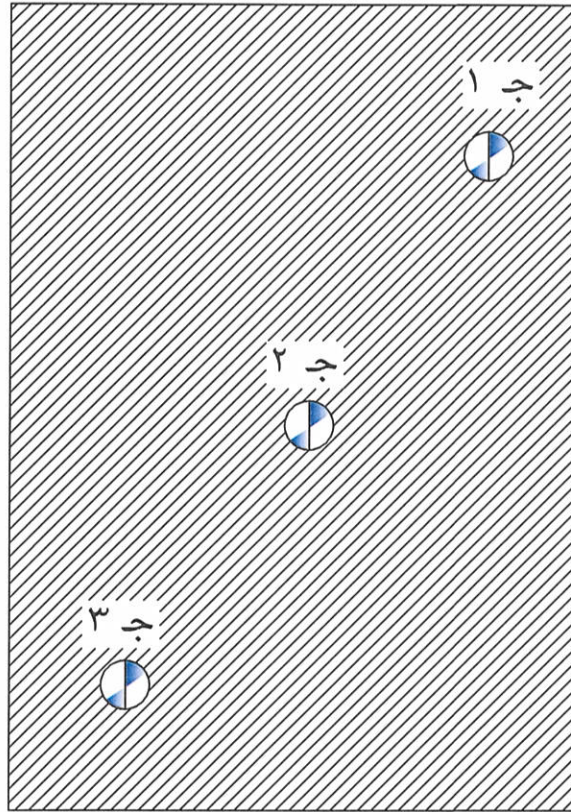

مهندس أ.أستشارى
د/ عماد عبد العظيم رضوان
مكتب هندسي أ.أستشارى
تصميم واستشارات إنشائية
تيمر ٢٨٩ / ١٦
أ.أستشارى ١ / ٤٥٠٠٤
سجل ٢٥٧ / ٩١ - ٨٦٤

كروكى يوضح الموقع العام ومواقع الجسات شكل رقم (١)

Ⓢ موقع الجسة

مركز براء للاستشارات الهندسية ودراسات التنمية الشاملة. الموقع / وحدة البلدية - العياط - الجيزة
م. استشاري د/ عماد عبدالعظيم رضوان.
تقرير فني لبحاث التربة وتوصيات التأسيس.

جسة رقم (١)
منسوب المياه الجوفية الابتدائي (- ٣,٠٠)
منسوب المياه الجوفية النهائي (- ٢,٥٠)

المالك / الهيئه العامه للطرق والكبارى

الارتفاع المتر Fs %	محتوى الطين PI %	اللدونة PL %	اللدونة LL %	المحتوى المائى الطبيعى W _p %	الكثافه الطبيعيه	q _u	وصف طبقات التربة	القطر (متر)	عدد البيانات N	العمق (متر)
							ردم	1.10	20	1.0
34	15	24	39	24	1.70	1.50	طين بنى شديد التماسك	3.30		2.0
							ردم	4.50	26	3.0
120	28	33	61	32	1.90	1.6	طين بنى شديد التماسك	7.40		4.0
							طمي طيني رملى	8.60		5.0
32					1.92		رمل متوسطه الخشونه			6.0
										7.0
										8.0
										9.0
										10.0

نهاية الجسة شكل رقم ٢ 10.0

الهندس الاستشارى
د/ عماد عبدالعظيم رضوان
مهندس استشارى
تصميم وتنفيذ التأسيسات
١٩ / ٢٠١٦
١ / ٥٥٠٠
١٦٤ / ٢٥٧
١٦٤ / ٢٥٧

مركز براء للاستشارات الهندسية ودراسات التنمية الشاملة. الموقع / وحدة البلدية - العياط - الجيزة

م. أستاذ د/ عماد عبدالعظيم رضوان.

تقرير فنى لبحاث التربة وتوصيات التأسيس.

جسة رقم (٢)

منسوب المياه الجوفية الابتدائى (- ٣,٠٠).

منسوب المياه الجوفية النهائى (- ٢,٥٠).

المالك / الهيئه العامه للطرق والكبارى

العمق (متر)	عدد الدقات N	السمك (متر)	القطاع	وصف طبقات التربة	q_u	الكثافة الطبيعية	المحتوى المائى الطبيعى	اللدونة LL %	اللدونة PL %	معامل اللدونة PI %	الانقباض الحصر Fs %	ϕ
1.0	20	1.20		ردم								
2.0	26			طين بنى شديد التماسك	1.6	1.90	37	73	42	31	80	
3.0												
4.0												
5.0												
6.0				طمي طيني رملى								
7.0		6.50										
8.0				رمل متوسطه الخشونه								32
9.0		8.60										
10.0						1.92						

10.0 نهاية الجسة شكل رقم ٣

مهندس استشارى
د/ عماد عبد العظيم رضوان
مهندس استشارى
تصميم وتنفيذ ودراسات
١٦ / ٤٨٤
١ / ٥٥٠٤
سجل ٩١ / ٢٥٧
٨٦٤


منسوب المياة الجوفية الابتدائي (- ٣,٠٠).
منسوب المياة الجوفية النهائي (- ٢,٥٠).

العمق (متر)	عدد الدقات القياسية N	السك (متر)	القطاع	وصف طبقات التربة	q_u	الكثافة الطبيعية	المحتوى المائي الطبيعي	حد السيولة LL %	حد اللدونة PL %	معامل اللدونة PI %	الانكماش الحر Fs %	ϕ
1.0	20	1.20		ردم								
2.0	26			طين بني شديد التماسك	1.6	1.90	37	73	42	31	80	
3.0												
4.0												
5.0												
6.0												
7.0		6.50		طمي طيني رملي								
8.0	8.60											
9.0				رمل متوسطه الخشونه		1.92						32
10.0												

10.0 نهاية الجسة شكل رقم ع

الهندس (المستشار)
 و / عماو عبد العظيم رضوان
 مقيم في مصر (المستشار)
 تصنيف (المستشار)
 ١٦ / ٢٨٤
 ١ / ٥٥-٤
 سجل ٢٥٧ / ٩١ (١٩٦٤)

تربة ناعمة			تربة خشنة		
طين	طيني		رمل	زلط	
	ناعم	متوسط	خشن	ناعم	متوسط
				خشن	خشن

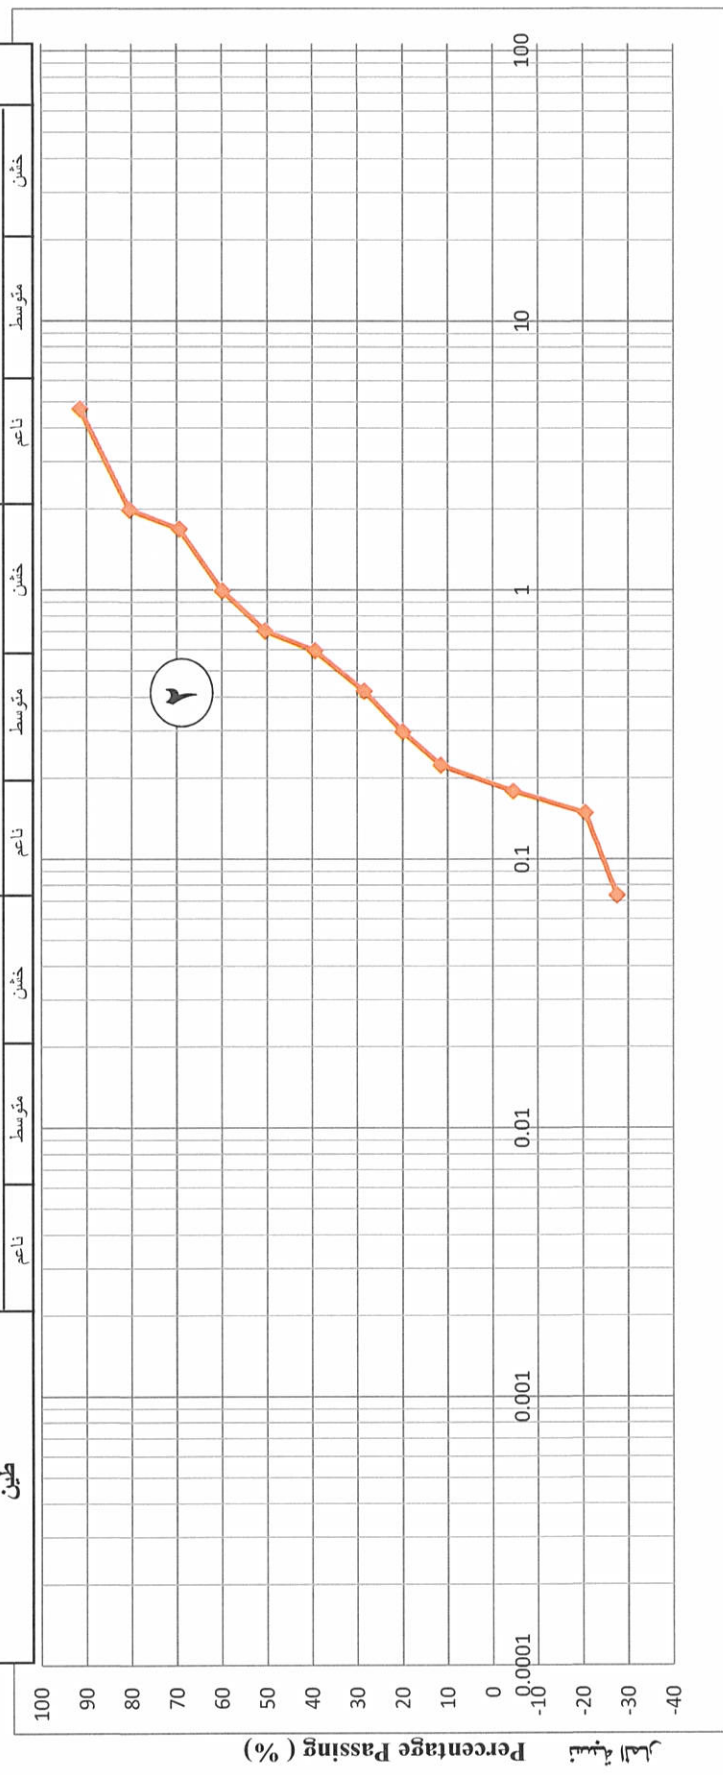

Particle Size (mm) قطر الحبيبات بالمليمتر

٢ منحنيات التدرج الحبيبي - جسة رقم ٢

منحنى	2
عمق	9.5


شكل رقم ٥

تقرير فنى لأبحاث التربة وتوصيات التأسيس


المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مركز براء للإستشارات الهندسية ودراسات التنمية الشاملة

م/ استشاري د. عماد عبدالعزيز رضوان



طین	تربة ناعمة			تربة خشنة		
	طمي	رمل	زلط	طمي	رمل	زلط
	ناعم	متوسط	خشن	ناعم	متوسط	خشن

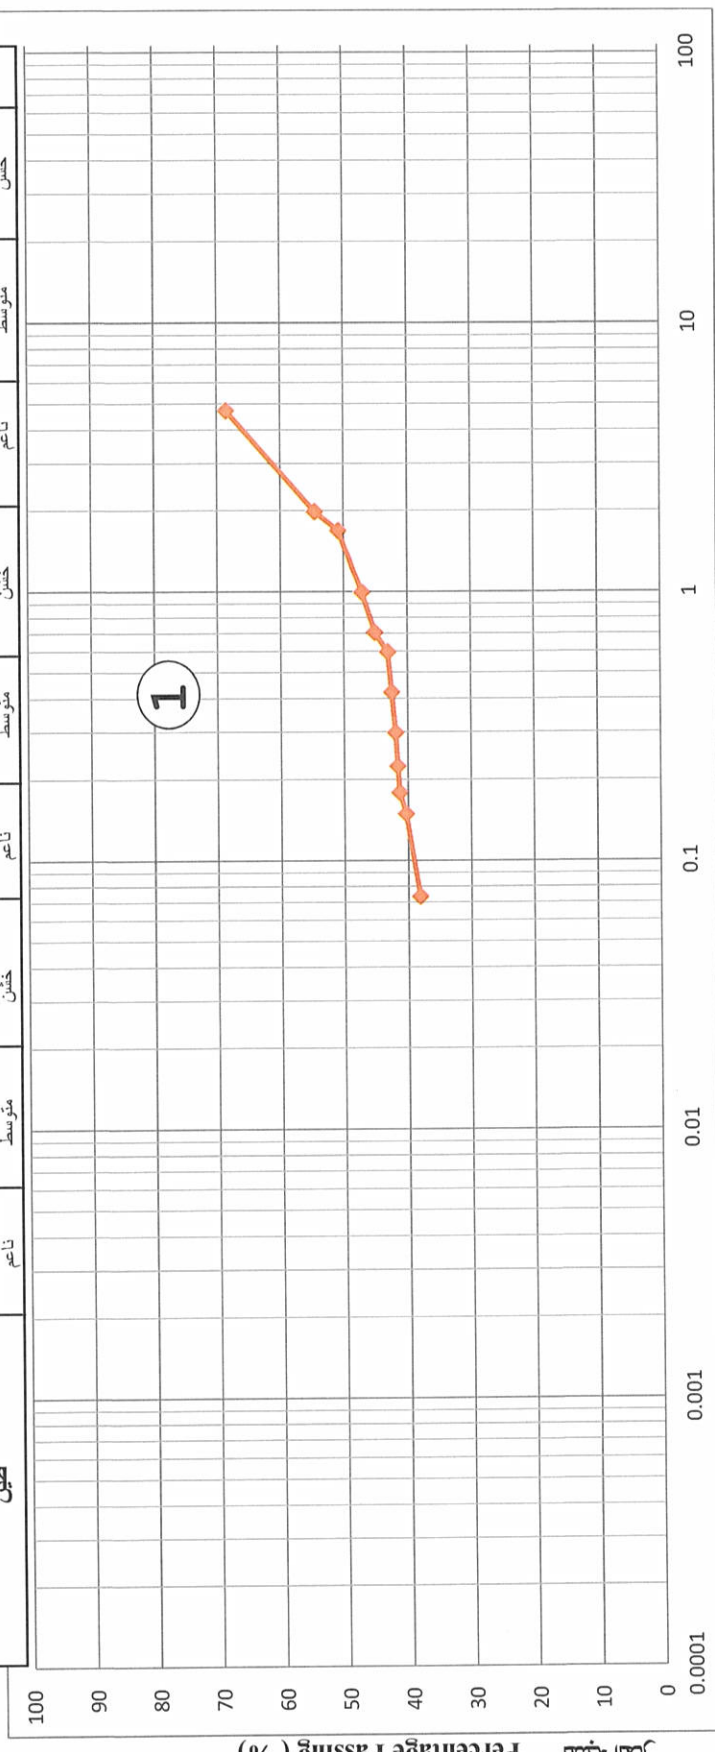

منحنيات التدرج الحبيبي - جسة رقم ()

عمق	9
منحنى	1

شکل رقم ۱

تقرير فني لأبحاث التربة وتوصيات التأسيس

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري

مركز براء للاستشارات الهندسية ودراسات التنمية العامة / د.عبدالمستشاري
تصميم وتنفيذ دراسات استشارية
م / استشاري د.عبدالمعظم رضوان

م/ استشاری د. عماد عبدالعظیم رضوان

ترخيص مكتب هندسي استشاري متعدد التخصصات

بعد الإطلاع على قرار السيد المهندس وزير الري رقم ١٢٦٨٤ لسنة ٢٠٢١م،

في شأن إنشاء سجل المهندسين الاستشاريين والترخيص في تأسيس المكاتب الهندسية

الاستشارية وعلى اعتبار اللجنة العليا للهندسة الاستشارية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢

وإعتماد المجلس الأعلى بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٩م، وذلك للأعمال المقدمة من السيد

المهندس المعطاة له هذه الشهادة وفقاً لما جاء بالمادتين ٤، ٥ من القرار الوزاري

المشار إليه وما تضمنه من بنود أخرى، فقد أعطيت هذه الشهادة إلى:

السيد المهندس الاستشاري الدكتور عماد عبد العظيم محمد رضوان

عضو النقابة رقم: ١٦/٤٨٤ واستشاري رقم: ١/٥٥٠٤

وتم الترخيص لمكتب هندسي استشاري متعدد التخصصات في مجالات:

(تصميم المنشآت الخرسانية والتصميم الهيكلي للمباني العالية والأبراج)

السلامة والصحة المهنية والأعمال الكهربائية للمنشآت)


مكتب رقم (٨٦٤) :

لمدة عام واحد فقط اعتباراً من ٢٠٢١/١٢/٢٩م.

وكيل النقابة

أ. م. ع. م.

م / أحمد عثمان أحمد عثمان

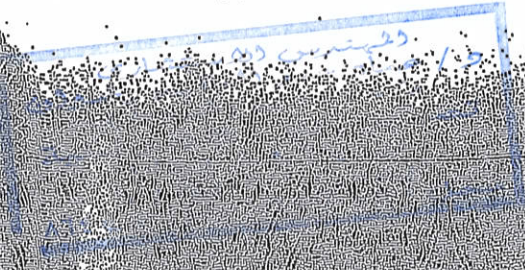



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES








CLIENT :	تبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	Cement Contn/Type :	300 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	14/6/2023	STRUCTURE TYPE :	خرسانة عادية
CONCRETE SLUMP :	16 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	200 Kg/cm ²
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	24

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	21/6/2023					
Age of Test (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8453	8431	8473			
Density (kg/m ³)	2505	2498	2511			
Failure Load (kN)	526	511	500			
Comp. Strength Kg/cm ²	238	232	227			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	232	116%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory

QC Engineer

QC CONSULTANT

21-6-2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE


DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

CLIENT :	تبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكباري	Cement Contn/Type :	300 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	21/6/2023	STRUCTURE TYPE :	خرسانة عادية
CONCRETE SLUMP :	16 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	200 Kg/cm ²
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	27

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	19/7/2023					
Age of Test (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8512	8507	8504			
Density (kg/m ³)	2522	2521	2520			
Failure Load (kN)	668	693	715			
Comp. Strength Kg/cm ²	303	314	324			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	314	157%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

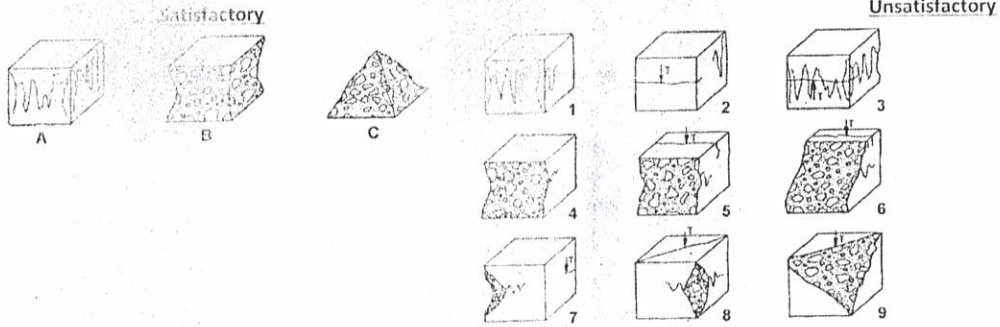

QC Engineer

QC CONSULTANT

19/7/2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES








CLIENT :	تبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	Cement Contn/Type :	300 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	21/6/2023	STRUCTURE TYPE :	خرسانة عادية
CONCRETE SLUMP :	16 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	200 Kg/cm2
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	27

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	28/6/2023					
Age of Test (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8457	8449	8470			
Density (kg/m ³)	2506	2503	2510			
Failure Load (kN)	492	468	499			
Comp. Strength Kg/cm ²	223	212	226			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	220	110%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory

QC Engineer

QC CONSULTANT

[Signature]
28-6-2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES








CLIENT :	تبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية	Cement Concn/Type :	300 KG o.p.C
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	STRUCTURE TYPE :	خرسانة عادية
DATE OF CASTING :	14/6/2023	SPECIFIED STRENGTH :	200 Kg/cm2
CONCRETE SLUMP :	16 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	24
TARGET SLUMP :	20 Cm		

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	12/7/2023					
Age of Test (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8455	8437	8471			
Density (kg/m³)	2505	2500	2510			
Failure Load (kN)	661	652	694			
Comp. Strength Kg/cm²	300	296	315			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm²	303	152%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory

QC Engineer

QC CONSULTANT

12-7-2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

CLIENT :	شمارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صالة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	Cement Conen/Type :	300 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	9/5/2023	STRUCTURE TYPE :	خرسانة عادية
CONCRETE SLUMP :	16 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	200 Kg/cm2
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	24

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	6/6/2023					
Age of Test (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8453	8431	8473			
Density (kg/m³)	2505	2498	2511			
Failure Load (kN)	669	653	674			
Comp. Strength Kg/cm²	303	296	306			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm²	302	151%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983


Satisfactory



A




B




C




1




2



3



4




5




6



7



8



9

Unsatisfactory

QC Engineer

QC CONSULTANT

6-6-2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES








CLIENT :	تبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	Cement Contn/Type :	300 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	9/5/2023	STRUCTURE TYPE :	خرسانة عادية
CONCRETE SLUMP :	16 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	200 Kg/cm ²
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	24

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	16/5/2023					
Age of Test (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8402	8396	8419			
Density (kg/m ³)	2489	2488	2495			
Failure Load (kN)	445	449	438			
Comp. Strength Kg/cm ²	202	204	199			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	201	101%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory

QC Engineer

QC CONSULTANT

16-5-2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES





CLIENT :	تبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكباري	Cement Concn/Type :	350 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	23/7/2023	STRUCTURE TYPE :	قواعد مسلحة
CONCRETE SLUMP :	16 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	250 Kg/cm ²
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	29

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	20/8/2023					
Age of Test (Days)	28					
Moist. Condition at Testing	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8580	8512	8507			
Density (kg/m ³)	2542	2522	2521			
Failure Load (kN)	783	789	819			
Comp. Strength Kg/cm ²	355	358	371			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	361	145%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory

QC Engineer

QC CONSULTANT

20-8-2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES






CLIENT :	سبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	Cement Conten/Type :	350 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	23/7/2023	STRUCTURE TYPE :	قواعد مسلحة
CONCRETE SLUMP :	16 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	250 Kg/cm ²
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	29

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	30/7/2023					
Age of Test (Days)	7					
Moist. Condition at Testing	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8589	8517	8849			
Density (kg/m ³)	2545	2524	2622			
Failure Load (kN)	623	601	613			
Comp. Strength Kg/cm ²	282	272	278			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	278	111%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory

QC Engineer

QC CONSULTANT

30-7-2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE








DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES

CLIENT :	تبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	Cement Concn/Type :	350 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	10/8/2023	STRUCTURE TYPE :	سملات وأعمدة
CONCRETE SLUMP :	18 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	250 Kg/cm ²
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	26

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	17/8/2023					
Age of Test (Days)	7					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8529	8597	8693			
Density (kg/m ³)	2527	2547	2576			
Failure Load (kN)	552	573	591			
Comp. Strength Kg/cm ²	250	260	268			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	259	104%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983



QC Engineer

QC CONSULTANT

17-8-2023



شركة سامكو للخرسانة الجاهزة
محطة البدرشين

SAMCO FOR READY MIXED CONCRETE

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES








CLIENT :	تبارك للمقاولات العامة	SAMPLED BY :	سامكو للخرسانة الجاهزة
PROJECT :	إنشاء سور حول القطعة المجاورة لوحدة صيانة البلدية		
CONSULTANT :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	Cement Conten/Type :	350 KG o.p.C
DATE OF CASTING :	10/8/2023	STRUCTURE TYPE :	سملات وأعمدة
CONCRETE SLUMP :	18 Cm	SPECIFIED STRENGTH :	250 Kg/cm2
TARGET SLUMP :	20 Cm	CONCRETE TEMP (°C) :	26

Results :

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Date of Test	7/9/2023					
Age of Test (Days)	28					
Moist. Condition at Testing.	Cube					
Average Dimension (mm)	150					
Weight (g)	8733	8534	8690			
Density (kg/m ³)	2588	2529	2575			
Failure Load (kN)	776	859	791			
Comp. Strength Kg/cm ²	352	389	359			
Mode of Failure	A	B	B			
AVERAGE Comp. Strength Kg/cm ²	367	147%				

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory



Unsatisfactory

QC Engineer

QC CONSULTANT

7-9-2023

محضر إستلام موقع

=====

إيماءاً الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٧) المؤرخ فى ٢١/٩/٢٠٢٣ م.

لعملية / أعمال إنشاء أسوار حول قطعتى الأرض المجاورة لوحدة صيانه البليدة { مشتل + مخزن }


أنه فى يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ وبحضور كلاً من

- ١ - مهندسة / مروة بدرت محمود { مدير المشروع (الأعمال المدنية) }
- ٢ - مهندس / أحمد ماهر غمرى { مهندس المشروع (الأعمال المدنية) }
- ٣ - مهندسة / ريهام عبد الرحمن حسن علام { مهندس المشروع (الأعمال المدنية) }
- ٤ - مهندسة / هبة الله عبد الفتاح تاج الدين { مهندس المشروع (الأعمال الكهربائية) }
- ٥ - مهندس / نادر مصطفى حسين { مهندس المشروع (عن شركة تبارك للمقاولات العمومية) }

بالمرور على المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق العمل وعليه تم إستلام الموقع

وأقبل المحضر على ذلك ،،،

التوقيعات :

٥. 
٤. 
٣. 
٢. 
١. 

التوقيع "  "

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

