

مقايسة ختامية

اسم العملية	
عملية انشاء أسوار حول قطعتي الأرض المجاورة لوحدة صيانة البلدية (مشتل + مخزن)	
اسم الشركة المنفذة	شركة تبارك للمقاولات العمومية
قيمة العملية طبقاً للعقد	٤٩٩٦٤٨٠ جنية
قيمة العملية طبقاً لزيادة امر الاسناد	٦٢٤٠٢٧٠ جنية
رقم عقد العملية	(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٧)
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٦ اشهر
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٣/١٠/١
تاريخ النھو طبقاً للتعاقد	٢٠٢٤/٣/٣١
تاريخ النھو الفعلي طبقاً لآخر مد مده معتمد	٢٠٢٤/١١/٣٠
المقايسة وارده من	إدارة الكباري
قيمة المقايسة الختامية	٥٨٦٥٤٤٠ جنية
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	٨٦٨٩٦٠
نسبة الزيادة عن العقد الاصلي	١٧,٤ %

مبررات المقايسة

كميات الأعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ونفاثر الحصر و البنود المستجدة

مهندس / ريهام علام	دس المش روع
مهندس / أحمد الغمري	دس المش روع
مهندسة / هبة الله تاج الدين	مدير الأعمال الكهربائية
مهندسة / مروه بدرت	مدير عام الانشاءات و المباني
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الكباري
محاسب / شكري فؤاد شكري	رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية
الأستاذ / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع "

مهندس / محمد عبدالخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

التوقيع "

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

البند	البيان	وحدة	الفئة	كمية المقايسة المجددة	كمية المقايسة الختامية	اجمالي المجدده	اجمالي الختامية
اعمال تجهيز الموقع العام							
١	بالمتر الطولي عمل جسات بعمق ١٠ متر وعمل تقرير طبقا لاصول الصنائه وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٤٥٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير بلاطات خرسانية مسلحة والبند يشمل التكسير اليدوي اذا لزم الامر ونقل المخلفات للمقابل العموميه وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصنائه وتعليمات مهندس الاشراف	م.٣	٣٣٠	٦٠٠,٠٠	٨١٧,٠٤	١٩٨٠٠٠	٢٦٩٦٢٣
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية لزوم الاساسات والبند يشمل نقل ناتج الحفر للمقابل العمومية و الوصول لمنسوب التأسيس مع نهوه الأعمال طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا حسب المواصفات القياسية المصرية و تعليمات جهاز الأشراف المحددة بالرسومات التنفيذية	م.٣	١٠٠	١٥٤٠,٠٠	١٥٤٢,١٥	١٥٤٠٠٠	١٥٤٢١٥
٤	بالمتر المكعب ردم برمالي نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد والفئة تشمل عمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصنائه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٣	١٧٠	٥٧,٠٠	٥٧,٩٥	٩٦٩٠	٩٨٥٢
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل تربه احلال (١:٢) زلط الي رمل على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة علي حساب المقاول والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصنائه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٣	٣٣٠	٦٦٥,٠٠	٦٦٥,٠٩	٢١٩٤٥٠	٢١٩٤٨٠
الاعمال الانشائية							
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمات المبني علي الا تقل كمية الأسمنت عن ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصنائه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.٣	٢٠٦٠	١٨٧,٠٠	١٨٧,٠٥	٣٨٥٢٢٠	٣٨٥٣٢٣

٢٠٢٤/٠٥/٢٥

٢



البند	البيان	وحدة	الفئة	كمية المقايضة المجددة	كمية المقايضة الختامية	اجمالي المجدده	اجمالي الختامية
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسملات) مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكيو علي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب وحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصنعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	م ^٣	٢٨٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٥٨	١٤٠٠٠٠	١٤١٦٢٤
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة عن ٢٥٠ كجم /سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة وحتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت البورتلاندي العادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصنعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ^٣	٣٦٠٠	٣٧,٠٠	٣٧,٥٤	١٣٣٢٠٠	١٣٥١٤٤
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارضيات والارصفة بسمك من (١٠ سم الي ٢٠ سم) بنسبة خلط ٠,٨ م ^٣ زلط نظيف و ٠,٤ م ^٣ رمل نظيف حرش علي الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصنعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٢٠٠	١١٠,٠٠	٨,٧٦	٢٤٢٠٠٠	١٩٢٧٢
١٠	بالمتر مسطح توريد وعمل خرسانة ميول بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل السمك عند الجرجوري عن ٣ سم والبند يشمل عمل الاوتار اللازمه طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصنعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٤٥	٦١,٠٠	٦١,٧١	٨٨٤٥	٨٩٤٨
١١	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه المسلحه والفئه تشمل رص الحديد وتشغيله وكل ما يلزم لنهوا العامل كاملا طبقا للرسومات المعتمده والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٥٣٠٠٠	١١,٦٦	١١,٦٦٤	٦١٧٩٨٠	٦١٨١٩٢
١٢	بالمتر الطولي نقل وتركيب سور خرساني سابق الصب من مخازن الهيئة الي الموقع علي ان لا تزيد مسافه النقل عن ٩٠ كم والسعر يشمل التحميل والنقل والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لأصول الصنعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	٢٢٠٠	٦٠٠,٠٠	٥٩٩,٣١	١٣٢٠٠٠٠	١٣١٨٤٨٢
أعمال مبنائي							

٢٠٢٠/٠٥/١٤

البند	البيان	وحدة	الفئة	كمية المقايضة المجددة	كمية المقايضة الختامية	اجمالي المجدده	اجمالي الختامية
١٣	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفتة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٤٥	٢٩٠,٠٠	٢٨٨,٦٦	٧١٠,٥٠	٧٠,٧٢٢
١٤	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب طفلى المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفتة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٢٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٧٨	٧٢٦,٠٠	٧٤٣,١٦
١٥	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمطي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفتة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٩٠	١,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠	٠
١٦	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمطي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / ٣م رمل والفتة يشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٤٠٠	٢٦,٠٠	٢٦,٠٤	٦٢٤,٠٠	٦٢٤,٩٦
أعمال العزل							
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة من العازل للرطوبة من البيتومين البارد للأساسات ومباني قصيه الردم والبند يشمل عمل طبقتين من العزل وكل يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات مهندس الاشراف .	م ^٢	٦٠	٤١٠,٠٠	٤١١,٣٤	٢٤٦,٠٠	٢٤٦,٨٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأنسومات سمك ٤ م والفتة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدائر بارتفاع ٢٠ سم و اللحام بالباشورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٩٠	٦١,٠٠	٧٠,٠٣	١١٥٩,٠	١٣٣,٠٦
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من السليتون سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية السليتون وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٧٥	٦١,٠٠	٦١,٧١	١٠٦٧٥	١٠٧٩٩
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠ x ٣٠ x ٣ سم فرز أول من اجود الانواع والفتة تشمل التوريد والتركيب وسقاية الحمامات جيذا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس الاشراف.	م ^٢	٢٣٥	٦١,٠٠	٧٢,٠٧	١٤٣٣٥	١٦٩٣٦

١٢/٥/٢٠٢٠

٥

البند	البيان	وحدة	الفئة	كمية المقايضة المجددة	كمية المقايضة الختامية	اجمالي المجددة	اجمالي الختامية
اعمال البياض							
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والظهرة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف .	م٢	١٤٠	١١١,٠٠	١٢١,٣٥	١٥٥٤٠	١٦٩٨٩
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥٥ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والظهرة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٥ م رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف .	م٢	١٩٠	١٠٨٠,٠٠	١٠٧١,٤٠	٢٠٥٢٠٠	٢٠٣٥٦٦
أعمال دهانات							
٢٣	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية ببوية البلاستيك سايبس والتشطيب يوتن و يشمل (التجهيز+وجه برايمر مائي + ٣ سكية معجون+وجه تحضيري) وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	١٨٠	١,٠٠	٠,٠٠	١٨٠	٠
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية من انتاج شركة جرفياتو او ما يماثلها و يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات الاستشاري.	م٢	١٨٠	١٠٣٤,٠٠	١٠٤٤,١١	١٨٦١٢٠	١٨٧٩٤٠
٢٥	بالمتر الطولي ترميم الأجزاء المتهالكة من السور السابق الصب والبند يشمل المعالجة بماده اسمانتيه مناسبه وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	م.ط	٧٥	١,٠٠	٠,٠٠	٧٥	٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب سلك شبك مجلفن سمك ٤ مم لزوم السور والفئة تشمل توريد الشبك والزوايا والربط بين الاعمده والعلب والقوائم الحديد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م٢	٧٤٠	١٥٧,٠٠	١٥٧,٥٠	١١٦١٨٠	١١٦٥٥٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف مطر سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الأعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٩٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١٨٠٠	١٨٠٠
اجمالي الاعمال الاعتيادية							٤٠٩٣٧٥٥
الاعمال الكهربائية							٤٢٣٤٥٢٠

م. احمد م. م. م.

م. احمد م. م. م.

م. احمد م. م. م.



البند	البيان	وحدة	الفئة	كمية المقايضة المجددة	كمية المقايضة الختامية	اجمالي المجدده	اجمالي الختامية
١	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء رئيسية من انتاج شركة ABB و البند يشمل مفتاح رئيسي ٢٥٠ A وعدد ٦ مفتاح فرعي ١٠٠ A والقواطع من نفس النوع واجهزة قياس وبارات بدرجة حماية IP54 وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٢٠٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠	٠
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة كهرباء شوارع بخليه فوتوسيل بدرجة حماية IP54 وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	٨٠٠٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣٥x٤) مم ٢ الومنيوم مسلح البند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٦٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠	٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦x٤) مم ٢ الومنيوم مسلح والبند يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.	م.ط	٤٠٠	٦٩١,٠٠	٧١٥,٠٠	٢٧٦٤٠٠	٢٨٦٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب كشاف انازه طراز شوارع Watt ١٥٠ بدرجة حماية ٦٥IP السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	١٠٠٠٠	٣٣,٠٠	٣٣,٠٠	٣٣٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
٦	بالعدد نقل وصيانته واعاده تركيب عمود انازه البند يشمل النقل والتوصيل والتثبيت بجوايط وعمل القاعده اللازمه (٤٠ * ٥٠ سم) والمراشمه والدهان اللازم باللون المطلوب وتجهيزه بعدد ٢ زراع شكل ٧ وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لتعليمات مهندس الاشراف	عدد	١٠٠٠٠	٢٦,٠٠	٢٩,٠٠	٢٦٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠
اجمالي الاعمال الكهربائية							٩٨٦٠٠٠
البند المستجده							
اعمال تجهيز الموقع العام							
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب انترلوك لارضيات الرصيف سمك ٦ سم و البند يشمل توريد الرمل و تسوية الارض وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة	م.٢	٢٦٠	٥٥,٠٠	٥٤,٣١	١٤٣٠٠	١٤١٢١
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب و دهان بردورة وسط مقاس (٥٠ سم * ٣٠ سم) والبند يشمل التوريد والتركيب وعمل فرش عاديه اسفل البردوره والخامات اللازمه للتثبيت	م.ط	٢٥٠	٢٢,٠٠	٢١,٢٥	٥٥٠٠	٥٣١٣
أعمال دهانات							
٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك (داخلي) على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة من وزنه ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود 50 % الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.٢	١٧٠	١١٣,٠٠	١١٩,٧٠	١٩٢١٠	٢٠٣٤٩
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كرانش فيوتك ١٠ سم لزوم الحوائط لزوم الحمامات والغرف والبند يشمل اكسسوارات التعليق وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف .	م.ط	١٥٠	٥٠,٠٠	٥١,٣٦	٧٥٠٠	٧٧٠٤
أعمال الارضيات							

م.ع.الاعمال العامة
١٢/٥/٢٠٢٠



Page 6 of 9

البند	البيان	وحدة	الفئة	كمية المقايضة المجددة	كمية المقايضة الختامية	اجمالي المجدده	اجمالي الختامية
١٥	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدي من فخار المطلى صيني فرز أول مقاس ٦٠ و ٤٥x٠. علي أن يكون من أجود الأنواع (إيديال استاندر او ديوررافيت) او ما يماثلها والفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و الصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جاليتراب او عمود صرف وغير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٤٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٨٨٠٠	٨٨٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب حوض مطبخ استانلس امن أجود الأنواع (فرانك ساي او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التغذية و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش غير شامل الخلط و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤٥٠٠	١,٠٠	١,٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠
١٧	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة (٣٢ مم) من اجود الأنواع (B.R او الشريف او ما يماثلها) والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيعان و مشتركات وخلافه و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٧٠	١٥,٠٠	٢٢,٧٠	٤٠٥٠	٦١٢٩
١٨	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٢ " بسمك ٤ مم والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيعان و مشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠٠	١١,٠٠	١١,٠٠	٣٣٠٠	٣٣٠٠
١٩	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير بلاستيك gm او الشريف قطر ٦ " بسمك ٥ مم والفئة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرفايح من كيعان و مشتركات وخلافه من نفس نوعية المواسير و كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧٢٠	١٥,٠٠	٢٧,٨٠	١٠٨٠٠	٢٠٠١٦
٢٠	بالعدد توريد و تركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة سمارت او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٦٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١١٢٠	١١٢٠
٢١	بالعدد توريد و تركيب محبس بليه ١ بوصة قلب نحاس إيطالي ٢ لأكور من اجود الانواع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	عدد	٧٥٠	٢,٠٠	٢,٠٠	١٥٠٠	١٥٠٠
٢٢	بالعدد انشاء و توريد و تركيب غرفة تفتيش ٦٠*٦٠ سم و البند يشمل المبانى سمك ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي و العزل و المحاره من الداخل و غطاء (GRP 15A) البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة.	عدد	٥٧٥٠	٤,٠٠	٤,٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠
٢٣	بالعدد انشاء و توريد و تركيب غرفة جاليتراب PVC بمقاس ٣٠*٣٠ سم و البند يشمل المبانى و العزل و التجهيز لمسارات المياه داخل الغرفة و البند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة.	عدد	١٥٦٠	١,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠	٠
٢٤	بالعدد توريد و تركيب خلط حوض لحوض حمام الغرف جولد الثقيل او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٢٧٥٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠
٢٥	بالعدد توريد و تركيب خلط شجرة لحوض المطبخ جولد الثقيل او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٢٧٥٠	١,٠٠	١,٠٠	٢٧٥٠	٢٧٥٠
٢٦	بالعدد توريد و تركيب دش شامل الخلط و السماعه جولد الثقيل او ما يماثلها والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة	عدد	٣٣٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٦٦٠٠	٦٦٠٠
٢٧	بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضيه ٣ " والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة.	عدد	٧٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠

م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.

م. م. م. م. م.

Page 8 of 9

رئيس الاداره المركزية
مهندس /
ايمن محمد متولي

۱۰۰/۱۰۰
 ۱۰۰/۱۰۰

مهندس الشركة



حصر ختامي

عملية إنشاء أسوار حول قطعتي الأرض
المجاورة لوحدة صيانة البلدية (مشتل+مخزن)





عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

مهندس الشركة

[illegible]




رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاووزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل تربة احلال							
	ال سور ناحية الجراش							
	القواعد المشتركة (F1:F19)	١٩	٠,٥	٢,٤	٢,٢		٧٢,٩٦	
	القواعد الغير مشتركة	١٠٥	٠,٥	٢,٤	٢,٤		٣٠٢,٤٠	
	السور الخرساني							
	جزء A1+غرفة الامن	١	٠,٥	٩,٧٠	١٤,٥		٧٠,٣٣	
	جزء A2	١	٠,٥	٣,٠٠	٩,٧		١٤,٥٥	
	جزء A3	١	٠,٥	٣,٠٠	٥,٦٣		٨,٤٥	
	جزء A4	٠,٥	٠,٥	١,١٠	٣,٠٥		٠,٨٤	
	جزء A5	١	٠,٥	٣,٠٠	٩,٠٣		١٣,٥٥	
	البوابة	١,٠٠	٠,٥٠	٢,٠٠	٣,١٠		٤,٦٥	
	ال سور ناحية مبني الهيئة							
	اولا ال P.C							
	القواعد المشتركة (F1:F6)	٦	٠,٥	٢,٤	٢,٢		٢٣,٠٤	
	القواعد الغير مشتركة	١٩	٠,٥	٢,٤	٢,٤		٥٤,٧٢	
	السور الخرساني							
	جزء ١	١	٠,٥	٣,٠٠	٢٤,١٢		٣٦,١٨	
	جزء ٢	١	٠,٥	٣	٤٢,٣٩		٦٣,٤٤	
							٦٦٥,٠٩	
مهندس الشركة					مهندس الهيئة			
								

[illegible]

خزانة عادية

م. ط. ب. ٢

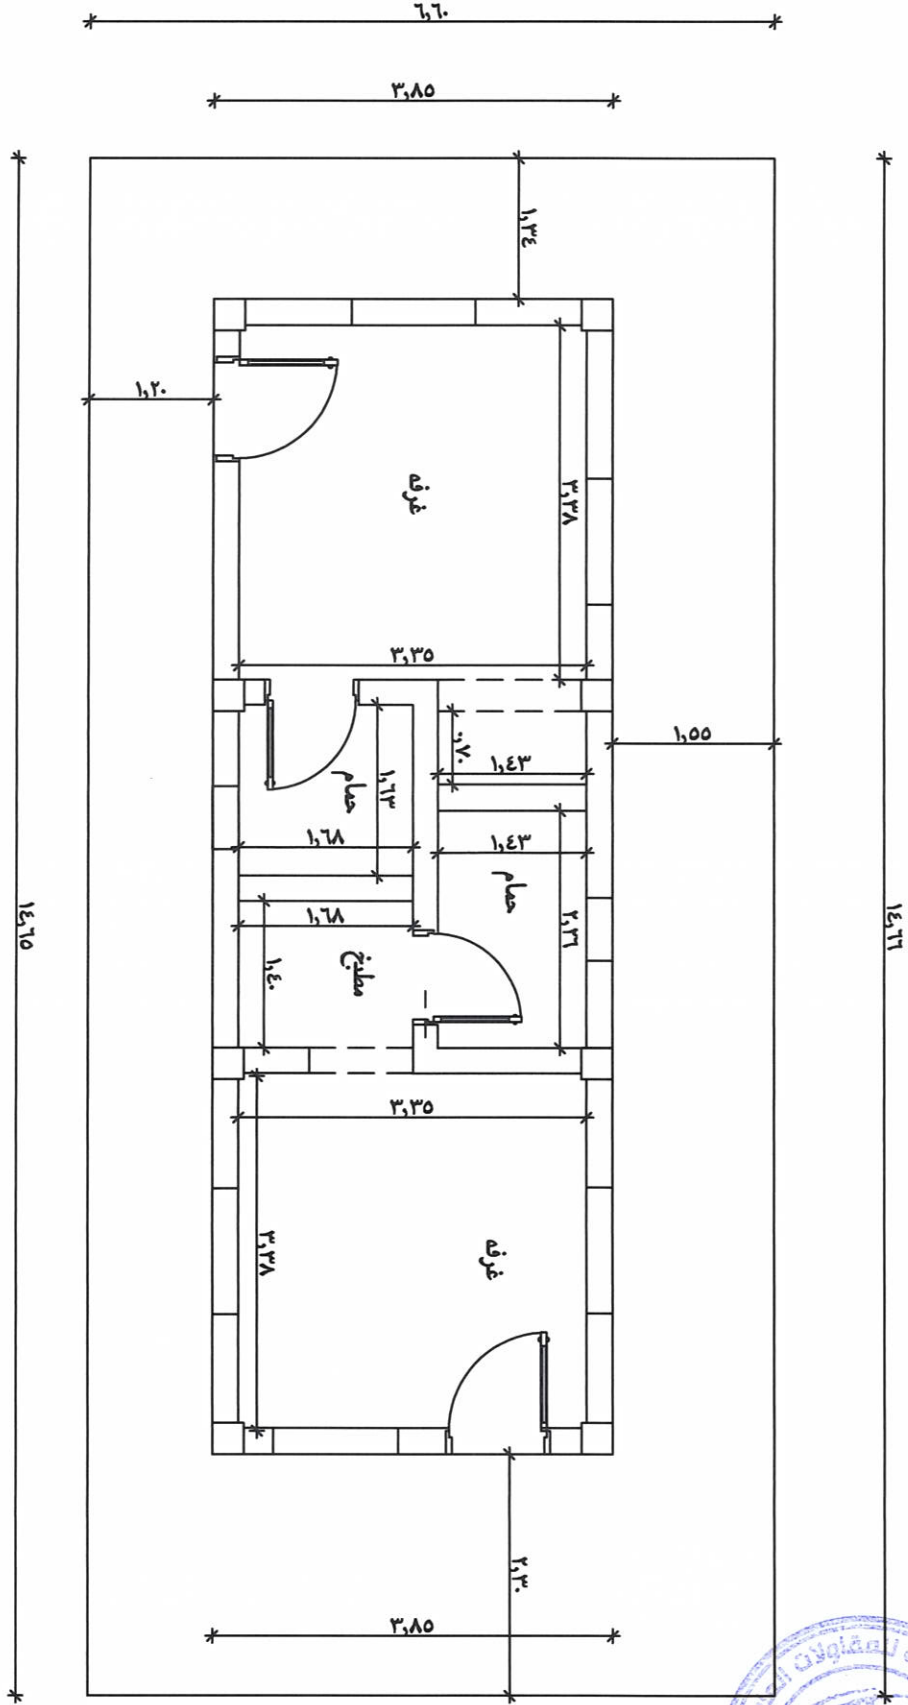

عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي		
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي			
٧	بالمتر المكعب توريد صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد والسملات									
	السور ناحية الجراش									
	ق ١	٩	٠,٥	١,٢٠	١,٦		٨,٦٤			
	ق ٢	٢	٠,٥	١,٠٠	١		١,٠٠			
	السمل س ١	١	٠,٦	٠,٢٥	١٥,١٧		٢,٢٨			
	السمل س ٢	١	٠,٦	٠,٢٥	٧,٠٦		١,٠٦			
	السمل س ٣	١	٠,٦	٠,٢٥	٥,٢٥		٠,٨٠			
	السمل س ٤	١	٠,٦	٠,٢٥	٧,٧		١,١٦			
	خصم الاعمدة ١ع	٧	٠,٦	٠,٢٥	٠,٤	٠,٤٣				
	خصم الاعمدة ٢ع	٤	٠,٦	٠,٤٠	٠,٤	٠,٣٨				
	السور ناحية مبني الهيئة									
	السور الخرساني									
	ق ١	٣٠	٠,٥	١,٢٠	١,٦		١٩,٢٠			
	السمل س ١	١	٠,٦	٠,٢٥	٢٤,٧٢		٢,٧١			
	السمل س ٢	١	٠,٦	٠,٢٥	٤٠,٧٢		٦,١١			
	خصم الاعمدة ١ع	٣٣	٠,٦	٠,٢٥	٠,٤	١,٣٨				
	غرفة الامن									
٩,١٨	ق ١	٨	٠,٥	١	١		٤			
	السملات									
	سمل ١ و ٢	٢	٠,٥	٠,٢٥	١١,٠٢		٢,٧٦			
	سمل (أ-ب-ج-د)	٤	٠,٥	٠,٢٥	٢,٢٥		١,٦٣			
	سمل A	١	٠,٥	٠,٢٥	١,٦٨		٠,٢١			
	سمل B	١	٠,٥	٠,٢٥	١,٤٣		٠,١٨			
	سمل C	١	٠,٥	٠,٢٥	٢,٣٦		٠,٤١			
	خصم الاعمدة ١ع	٨	٠,٥٠	٠,٢٠	٠,٢٠	٠,٣٦				
الإجمالي								٥٠,٥٨	٥٣,١٢	٢,٥٤
مهندس الشركة					مهندس الهيئة					
										





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة ميول							
	ميول السطح			٥,٠٥	١٢,٢٢		٦١,٧١	
							٦١,٧١	٦١,٧١
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 : ٥٢)

١١

ملاحظات	الأجمالي	وزن	طول	عدد اسياخ	القطر	الدرجة	رقم السيخ	بنود الأعمال	مسلسل
								مبنى الامن	
								<u>قواعد</u>	
	128.93	1.58	1.7	6	16	8	١	فرش	
	128.93	1.58	1.7	6	16	8	٢	عطاء	
	18.76	0.617	3.8	1	10	8	٣	سيخ الرباط ق ١	
	85.95	1.58	1.7	4	16	8	٤	اشياير الاعمدة	
								<u>السملات</u>	
								سملات محور (١) و (٢)	
	110.63	1.58	11.67	3	16	2	سفلى ٥		
	113.76	1.58	12	3	16	2	علوى ٦		
	12.23	1.58	1.29	3	16	2	علوى ٧		
	78.21	0.395	1.5	66	8	2	٨	الكثات	
	85.32	1.58	4.5	3	16	4	سفلى ٩	سملات محور (أب-ج-د)	
	102.38	1.58	5.4	3	16	4	علوى ١٠		
	37.60	0.395	1.4	17	8	4	١١	الكثات	
	10.10	1.58	2.13	3	16	1	سفلى ١٢	سمل A	
	5.20	0.888	2.93	2	12	1	علوى ١٣	سمل A	
	6.52	0.395	1.5	11	8	1	١٤	كانات	
	8.78	1.58	2.78	2	16	1	علوى ١٥	سمل B	
	5.01	0.888	1.88	3	12	1	سفلى ١٦	سمل B	
	5.93	0.395	1.5	10	8	1	١٧	كانات	
	21.85	1.58	4.61	3	16	1	علوى ١٨	سمل C	
	17.59	1.58	3.71	3	16	1	سفلى ١٩	سمل C	
	12.44	0.395	1.5	21	8	1	٢٠	كانات	6
	996.12							الاجمالي =	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

Handwritten signature

Handwritten signature



عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط


بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 : ٥٢)

١١


ملاحظات	الأجمالي	وزن	طول	عدد اسياخ	النظر	الكمية	رقم السيق	بنود الأعمال	مسلسل
	996.12	اجمالي ما سبق =							
								الاعمدة لغرفة الامن	
	243.70	1.58	4.82	4	16	8	٢١	١٤	
	147.89	0.395	1.2	39	8	8	٢٢	الكانات	
								السقف	
	237.98	0.888	4	67	12	1	٢٣	الفرش	
	348.27	0.888	2.65	74	12	2	٢٤	الكابولي	
	44.40	0.888	2.5	20	12	1	٢٥	العلوي علي الكمره الداخلية	
	88.80	0.888	5	5	12	4	٢٦	الثانوي كابولي	
								الغطاء	
	204.57	0.888	10.97	21	12	1	٢٧		
	44.76	0.888	2.4	21	12	1	٢٨		
	44.76	0.888	2.4	21	12	1	٢٩		
	213.12	0.888	12	5	12	4	٣٠		
	15.81	0.888	0.89	5	12	4	٣١		
								الكمرات	
	138.66	1.58	10.97	4	16	2	٣٢	ك-١	
	63.24	0.888	11.87	3	12	2	٣٣	ك-١	
	71.10	0.395	1.5	60	8	2	٣٤	الكانات	
								ك-١-ب-ج-د	
	93.54	1.58	3.7	4	16	4	٣٥		
	49.02	0.888	4.6	3	12	4	٣٦		
	47.40	0.395	1.5	20	8	4	٣٧		
								الكمره الداخلية	
	24.02	1.58	3.8	4	16	1	٣٥		
	8.35	0.888	4.7	2	12	1	٣٦		
	3125.49	الاجمالي =							

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





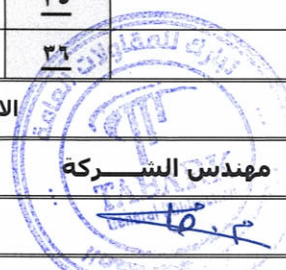

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعباط

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (37 ؛ ٥٢)									١١
ملاحظات	الأجمالي	وزن	طول	عدد اسياخ	القطر	الكثبة	رقم السيخ	بنود الأعمال	مسلسل
	3125.49	اجمالي ما سبق =							
	11.85	0.395	1.5	20	8	1	٣٧		
								قواعد ناحية الجراش	
	243.16	1.58	1.9	9	16	9	فرش ٣٩	سفلي ق ١	
	228.94	1.58	2.3	7	16	9	غطاء ٣٨		
	42.20	0.617	1.9	4	10	9	فرش ٤٢	علوي ق ١	
	51.09	0.617	2.3	4	10	9	غطاء ٤١		
	32.23	1.58	1.7	6	16	2	فرش ٤٤	سفلي ق ٢	
	32.23	1.58	1.7	6	16	2	غطاء ٤٥		
	4.20	0.617	1.7	2	10	2	فرش ٤٤	علوي ق ٢	
	4.20	0.617	1.7	2	10	2	غطاء ٤٥		
	29.99	0.617	5.4	1	10	9	ق ١-٤٠	سيخ الرباط ق ١	
	4.69	0.617	3.8	1	10	2	ق ٢	سيخ الرباط ق ٢	
	216.78	1.58	2.45	8	16	7	١٤	اشاير الاعمدة	
	34.81	0.888	2.45	8	12	2	٢٤		
	92.90	1.58	2.45	12	16	2	٣٤		
	102.19	1.58	16.17	4	16	1	سفلي	السملات جزء ١	
	109.15	1.58	17.27	4	16	1	علوي	السملات جزء ١	
	74.47	0.617	1.7	71	10	1		الكاتات	
	46.52	1.58	7.36	4	16	1	سفلي	السملات جزء ٢	
	53.47	1.58	8.46	4	16	1	علوي	السملات جزء ٢	
	41.96	0.617	1.7	40	10	1		الكاتات	
	33.81	1.58	5.35	4	16	1	سفلي	السملات ٣	
	40.76	1.58	6.45	4	16	1	علوي	السملات ٣	
	29.37	0.617	1.7	28	10	1		الكاتات	
	48.66	1.58	7.7	4	16	1	سفلي	سمل ٤	
	4735.11	الاجمالي =							
مهندس الهيئة					مهندس الشركة				
									



عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالعياط


بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 : ٥٢)

١١

ملاحظات	الأجمالي	وزن	طول	عدد اسياخ	القطر	الكثافة	رقم السبيخ	بنود الأعمال	مسلسل
	4735.11	اجمالي ما سبق =							
	55.62	1.58	8.8	4	16	1	علوي		
	41.96	0.617	1.7	40	10	1		الكانات	
	68.52	0.888	38.58	2	12	1	ملو سمل ١-٢-٣ = (٣٥,٥٨ = ٧,٧٠ + ٥,٣٥ + ٧,٣٦ + ١٥,١٧)		
								الاعمدة	
	56.83	0.888	4	8	12	2		١٤	
	49.36	0.617	1.6	25	10	2	٤٨	الكانات ١	
	27.77	0.617	0.9	25	10	2	٤٩	الكانات ٢	
	353.92	1.58	4	8	16	7		٢٤	
	140.37	0.617	1.3	25	10	7	٤٧	الكانات ١	
	90.70	0.617	0.84	25	10	7	٤٦	الكانات ٢	
	151.68	1.58	4	12	16	2		٣٤	
	49.36	0.617	1.6	25	10	2	٥٠	الكانات ١	
	45.66	0.617	1.48	25	10	2	٥١	الكانات ٢	
								حديد الطبانة	
	205.55	0.888	38.58	3	12	2	اجزاء ١-٢-٣ = (٣٥,٥٨ = ٧,٧٠ + ٥,٣٥ + ٧,٣٦ + ١٥,١٧)		
	132.53	0.617	1.2	179	10	1		الكانات	
								قواعد ناحية الهيئة	
	540.36	1.58	1.9	9	16	20	فرش ٣٩	سفلي ق ١	
	508.76	1.58	2.3	7	16	20	غطاء ٣٨		
	93.78	0.617	1.9	4	10	20	فرش ٤٢	علوي ق ١	
	113.53	0.617	2.3	4	10	20	غطاء ٤١		
	66.64	0.617	5.4	1	10	20	ق ٤٠-١	سيخ الرياض ق ١	
	681.30	1.58	2.45	8	16	22	١٤	اشاير الاعمدة	
	17.40	0.888	2.45	8	12	1	٢٤		
	168.87	1.58	26.72	4	16	1	سفلي	الشمالات جزء ١	
	8395.57	الاجمالي =							

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

"

مهندس الشركة



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحدة المنطقة المركزية بالبليدة

[illegible]

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

مهندس الشركة

١٥.٥

TABANEH
General Contracting

ومشون بمخازن العينة وابماده طبقا للطبيعة

مخطط الموقع
مخطط الموقع

المشروع	DATE	ISSUED	CHECKED	PREPARED

انشاء اسوار حول قطعتي
المجاورة لوحدة صيانة البلدية

المالك




الهيئة العامة للطرق والكبارى

المقاول

شركة تبارك للمقاولات


DRAWING NAME

11

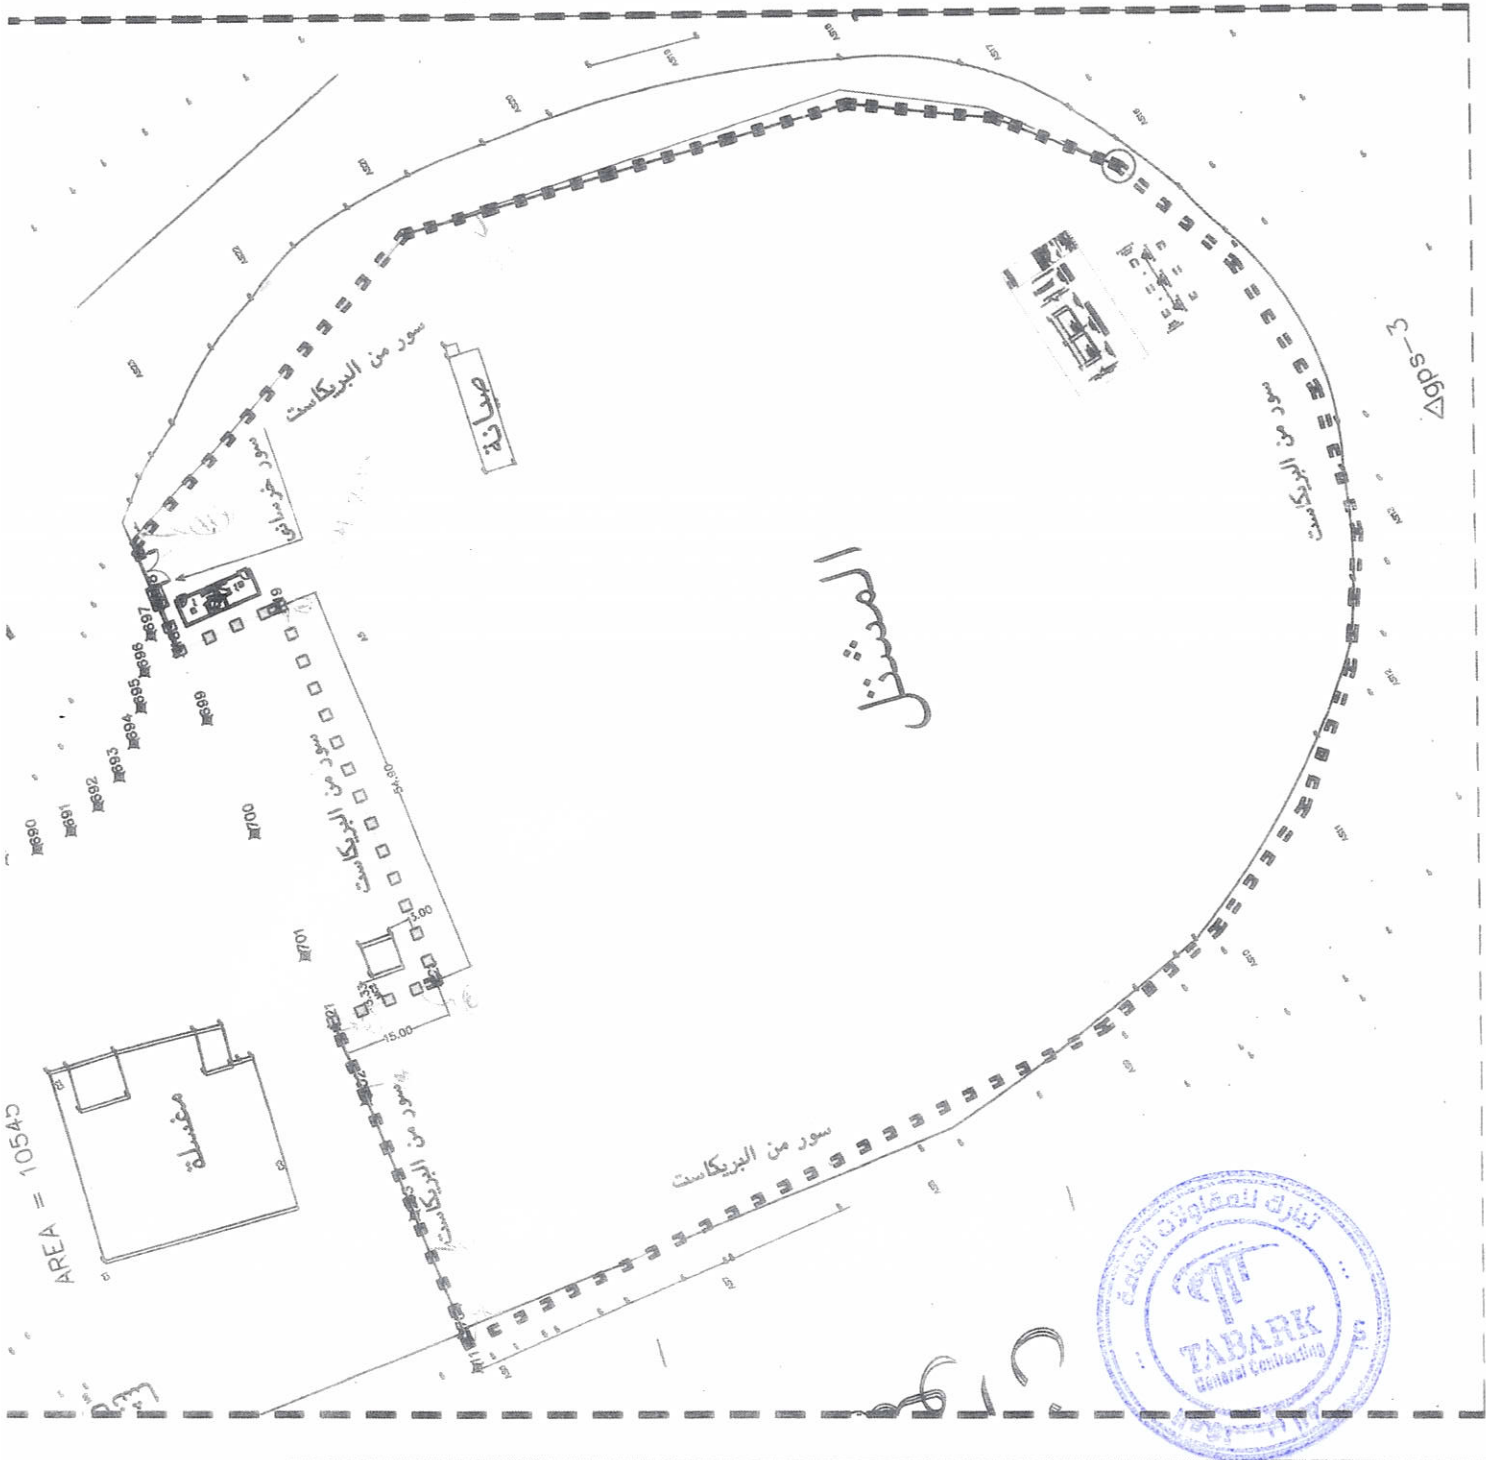

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي	
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي		
١٤	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الطقلي								
	مبني غرفة الامن								
	محور(٢-١)	٢	٢,٧٢	٠,٢٥	١١,٠٢		١٤,٩٩		
	محور(أ-ب-ج-د)	٤	٢,٧٢	٠,٢٥	٢,٢٥		٨,٨٤		
	الحوائط الداخلية								
	A	١	٢,١٠	٠,٢٥	١,٦٨		١,٢٠		
	B	١	٢,١٠	٠,٢٥	١,٤٢		١,١١		
	C	١	٢,٧٢	٠,٢٥	٢,٢٦		٢,٢٢		
	خصم فتحة محور ج	١	٢,٧٢	٠,٢٥	١,٤٢	٠,٩٧			
	خصم الاعمدة	٨	٢,٧٢	٠,٣٠	٠,٣	١,٩٦			
	خصم الابواب								
	ب ١	٢	٢,٢٠	٠,٢٥	٠,٨	٠,٨٨			
	ب ٢	٢	٢,٢٠	٠,٢٥	١	١,١٠			
	خصم الشبابيك								
	ش ١	٢	٠,٦٠	٠,٢٥	٠,٦٠	٠,١٨			
	ش ٢	٥	١,٢٠	٠,٢٥	١,٢٠	١,٨٠			
	السور ناحية الجراش								
		١	٤,١٥	٠,٢٥	١,١	١,١٤			
		٢	٢,٢٥	٠,٢٥	١,١	١,٧٩			
		١	٢,٢٢	٠,٢٥	١,١	٠,٨٩			
		١	٤,٤٢	٠,٢٥	١,١	١,٢٢	١,٤		
		١	١,٩٧	٠,٢٥	١,١	٠,٥٤	١,١٠		
		١	٤,٩١	٠,٢٥	١,١	١,٢٥			
		١	٢,٦٥	٠,٢٥	١,١	١,٠٠			
		١	٢,٢٥	٠,٢٥	١,١	٠,٨٩			
	الإجمالي							٢٧,٢٨	٢٠,٢٩
مهندس الشركة					مهندس الهيئة				
									



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية							
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان	
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي
١٤	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي						
	اجمالي ما سبق						
	السور ناحية مبني الهيئة	٧	٢,٢٥	٠,٢٥	٠,٤	٣٧,٢٨	٢٠,٣٩
		١	٢,٩٧	٠,٢٥	٠,١٢	٠,٠٩	٠,٤٠
		٦	٢,١٦	٠,٢٥	٠,١٢	٠,٥٧	
		٢	٢,٠٣	٠,٢٥	٠,١٢	٠,٢٧	
		١	٢,١٣	٠,٢٥	٠,١٢	٠,٠٩	
		١	٢,٢	٠,٢٥	٠,١٢	٠,١٠	٠,٩٠
							٠,٧٨
	الإجمالي					٤٠,٦٧	٢٢,٧٨
مهندس الشركة		مهندس الهيئة					

عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٦	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي							
	<u>مبنى غرفة الامن</u>							
	محور(١-٢)	٢	١,٤٠	٠,٢٥	١١,٠٢		٧,٧١	
	محور(أ-ب-ج-د)	٤	١,٤٠	٠,٢٥	٢,٢٥		٤,٥٥	
	سمل A	١	١,٤٠	٠,٢٥	١,٦٨		٠,٥٩	
	سمل B	١	١,٤٠	٠,٢٥	١,٤٢		٠,٥٠	
	سمل C	١	١,٤٠	٠,٢٥	٢,٣٦		١,١٤	
	خصم الاعمدة ١٤	٨	١,٤٠	٠,٣٠	٠,٣٠	١,٠١		
	السور ناحية الجراش							
		١	٤,١٥	٠,٢٥	٠,٣		٠,٣١	
		٢	٢,٢٥	٠,٢٥	٠,٣		٠,٤٩	
		١	٢,٢٢	٠,٢٥	٠,٣		٠,٢٤	
		١	٤,٤٣	٠,٢٥	٠,٣		٠,٣٣	
		١	١,٩٧	٠,٢٥	٠,٣		٠,١٥	
		١	٤,٩١	٠,٢٥	٠,٣		٠,٣٧	
		١	٢,٦٥	٠,٢٥	٠,٣		٠,٢٧	
		١	٢,٢٥	٠,٢٥	٠,٣		٠,٢٤	
	السور ناحية مبني الهيئة							
		٧	٢,٢٥	٠,٢٥	٠,٥		٢,٨٤	٠,٤٠
		١	٢,٩٧	٠,٢٥	٠,٧٨		٠,٥٨	
		٦	٢,١٦	٠,٢٥	٠,٧٨		٢,٧٠	
		٣	٢,٠٣	٠,٢٥	٠,٧٨		١,٧٧	
		١	٢,١٣	٠,٢٥	٠,٧٨		٠,٦١	٠,٧٨
		١	٢,٢	٠,٢٥	٠,٧٨		٠,٦٤	
	الإجمالي							
						١,٠١	٢٧,٠٥	٣٦,٠٤
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								

[illegible]




المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

مهندس الشركة



11.22

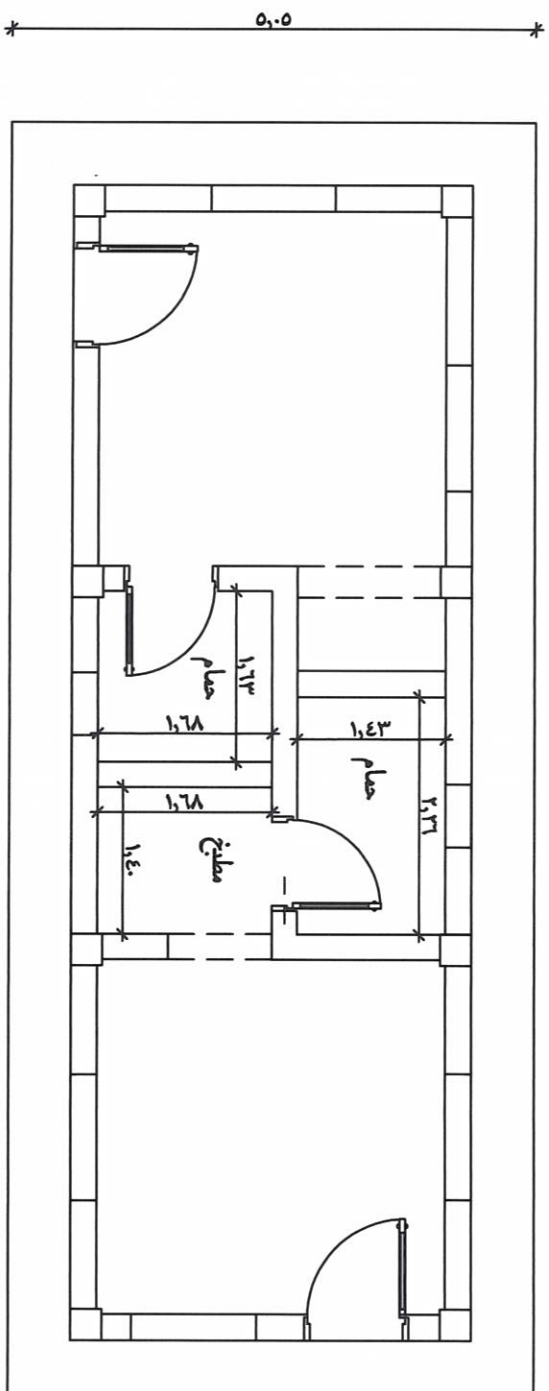

عزل الاسطح والحمامات والامطبخ



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارى لزوم السطح							
	السطح	١		٥,٠٥	١٢,٢٢		٦١,٧١	
							*	٦١,٧١
مهندس الشركة						مهندس الهيئة		



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط مزايكو							
	السطح	١		٥,٠٥	١٢,٢٢		٦١,٧١	
	وزره	٢	٠,٢	٥,٠٥			٢,٠٢	
		٢	٠,٢	١٢,٢٢			٧,٢٢	
							٧٢,٠٧	٧٢,٠٧
		مهندس الشركة		مهندس الهيئة				
								






المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل							
	غرفة ١							
	السقف	١	٢,٢٨	٢,٢٥			١١,٢٢	
	ح ١	١	٢,٢٨		٢,٩٠		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢	١,٢٠		١,٤٤		
	ح ٢	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢	
	خصم ب ١	١		١	٢,٢	٢,٢٠		
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٢	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٤	١,٠٠		٢,٢٥	٢,٩٠		٩,٧٢	
	خصم معبرة	١	١		٢,٦	٢,٦		
	سقف المطبخ	١	١,٦٨	١,٤٠			٢,٢٥	
	سقف حمام ١	١	٢,٣٦	١,٤٢			٢,٢٢	
	الكمرة	٢	١		٠,٢		٠,٦٠	
	باطن الكمرة	١	١		٠,٢		٠,٢٠	
	غرفة ٢							
	السقف	١	٢,٢٨	٢,٢٥			١١,٢٢	
		١	١,٤٢	٠,٧			١,٠٠	
	ح ١	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٢	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢	
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								







المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

[illegible]

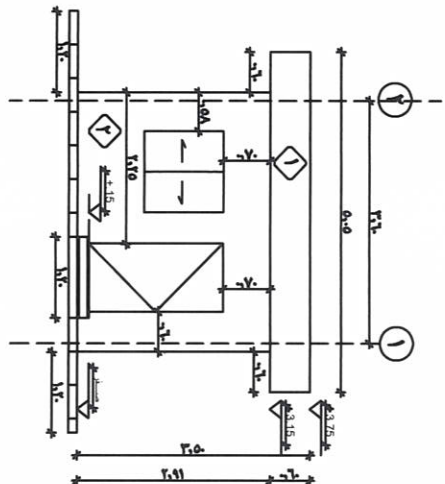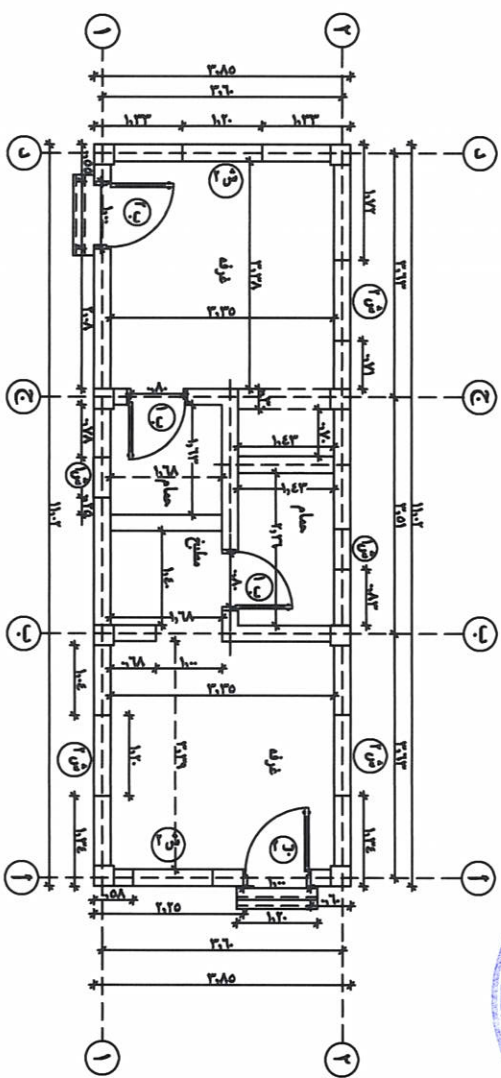

بایاض تخیلی داغلی



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبلدة

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية							
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاووزان	
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجية						
	اجمالي ما سبق						
	الطيان من اسفل	١	٤,١٥		٠,٢٨		٤٤٠,٣٨
		٢	٢,٢٥		٠,٢٨		١,٨٢
		١	٢,٢٢		٠,٢٨		٠,٩٠
		١	٤,٤٢		٠,٢٨		١,٢٤
		١	١,٩٧		٠,٢٨		٠,٥٥
		١	٤,٩١		٠,٢٨		١,٢٧
		١	٢,٦٥		٠,٢٨		١,٠٢
		١	٢,٢٥		٠,٢٨		٠,٩١
	جوانب الاعمدة	١٨	٢,٥		٠,٢٨		١٢,٦٠
		١٨	١,٦		٠,١٥		٤,٢٢
		٤	٤,١		٠,٤		٦,٥٦
	بين الطوبة والنص طوبة	١	٤,١٥		٠,١٢		٠,٥٠
		٢	٢,٢٥		٠,١٢		٠,٧٨
		١	٢,٢٢		٠,١٢		٠,٣٩
		١	٤,٤٢		٠,١٢		٠,٥٣
		١	١,٩٧		٠,١٢		٠,٢٤
		١	٤,٩١		٠,١٢		٠,٥٩
		١	٢,٦٥		٠,١٢		٠,٤٤
		١	٢,٢٥		٠,١٢		٠,٣٩
	السور ناحية مبني الهيئة						
	من الداخل والخارج	٢	٤٠,٦٥		٢,٦		٢٩٢,٦٨
		٢	٢٤,٧٢		٢,٦		١٧٧,٩٨
	الإجمالي						
	٩٤٧,٣٦	٩٤٧,٣٦	٠,٠٠				
مهندس الشركة				مهندس الهيئة			
							



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبيدة

مهندس الش

عملية انشاء اسوار حول قطعني الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		اجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي	
٣٣	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي							
	اجمالي ما سبق							١٠٣٣,٨٨
	مرمات في السور البريكاست							
	١	١	١,٢٤	٢,٢			٢,٩٥	
	٢	١	٢,٢	٢,٢			٥,٢٩	
	٣	١	٠,٢٥	١,٥			٠,٢٨	
	٤	١	٠,٦٥	٢,٢			١,٤٢	
	٥	١	٠,٣٠	١,٥			٠,٤٥	
	٦	١	٠,٣٠	١,٥			٠,٤٥	
	٧	١	٠,٣٠	١,٥			٠,٤٥	
	٨	١	٠,٣٠	١,٥			٠,٤٥	
	٩	١	٠,٣٠	١,٥			٠,٤٥	
	١٠	١	٠,٥٥	١,٩			١,٠٥	
	١١	١	٢,٣٠	٢,٢			٥,٢٩	
	١٢	١	٢,٣٠	٢,٢			٥,٠٦	
	مباني في السور الخارجي							
		١	٠,٤٥	١,٧			٠,٧٧	
		١	٠,٤٥	١,٧			٠,٧٧	
		١	٠,٩٠	٢,٢			٢,٠٧	
		١	٤,٥٥	٢,٢٥			١٠,٢٤	
	الإجمالي							١٠٧١,٤٠
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				
								





المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي	
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي		
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بيوية اسمنتية جرفياتو								
	غرفة الامن								
	الوجهة الامامية و الخلفية	٢	٣,٣٥		١١,٠٢		٧٣,٨٢		
	الدروة من الخارج الامامية و الخلفية	٢	٠,٧٥		١٢,٢٢		١٨,٣٢		
	الكابولي من اسفل	٢	٠,٦		١٢,٢٢		١٤,٦٦		
	الوجهة الجانبية اليمين و اليسار	٢	٣,٣٥		٣,٨٥		٢٥,٨٠		
	الدروة من الخارج	٢	٠,٧٥		٥,٠٥		٧,٥٨		
	اسفل الكابولي	٢	٠,٦		٥,٠٥		٦,٠٦		
	السور ناحية الجراش								
	من الداخل والخارج	١	١٥,١٨		٤,١		٦٣,٢٤	٣,٨٠	
		١	٧,٠٦		٤,١		٢٨,٩٥		
		١	٥,٣٥		٤,١		٣١,٩٤		
		١	٧,٧		٤,١		٣١,٥٧		
	من الداخل والخارج	١	١٥,١٨		٣,٨		٥٧,٦٨	٣,٨٠	
		١	٧,٣٥		٣,٨		٣٧,٩٣		
		١	٥,٣٥		٣,٨		٣٠,٣٢		
		١	٧,٧		٣,٨		٢٩,٣٦		
	الطبان من اعلي	١	١٥,١٨		٠,٤		٦,٠٧		
		١	٧,٣٥		٠,٤		٢,٩٤		
		١	٥,٣٥		٠,٤		٢,١٤		
		١	٧,٧		٠,٤		٣,٠٨		
	الإجمالي							٤٤٠,٣٨	٤٤٠,٣٨

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي	
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بيوية اسمنتية جرفياتو							
	اجمالي ما سبق							٤٤٠,٢٨
	الطبان من اسفل	١	٤,١٥		٠,٢٨		٤٤٠,٢٨	٤٤٠,٢٨
		٢	٢,٢٥		٠,٢٨		١,٨٢	
		١	٢,٢٢		٠,٢٨		٠,٩٠	
		١	٤,٤٢		٠,٢٨		١,٢٤	
		١	١,٩٧		٠,٢٨		٠,٥٥	
		١	٤,٩١		٠,٢٨		١,٢٧	
		١	٢,٦٥		٠,٢٨		١,٠٢	
		١	٢,٢٥		٠,٢٨		٠,٩١	
	جوانب الاعمدة	١٨	٢,٥		٠,٢٨		١٢,٦٠	
		١٨	١,٦		٠,١٥		٤,٢٢	
		٤	٤,١		٠,٤		٦,٥٦	
	بين الطوبة والنص طوبة	١	٤,١٥		٠,١٢		٠,٥٠	
		٢	٢,٢٥		٠,١٢		٠,٧٨	
		١	٢,٢٢		٠,١٢		٠,٢٩	
		١	٤,٤٢		٠,١٢		٠,٥٢	
		١	١,٩٧		٠,١٢		٠,٢٤	
		١	٤,٩١		٠,١٢		٠,٥٩	
		١	٢,٦٥		٠,١٢		٠,٤٤	
		١	٢,٢٥		٠,١٢		٠,٢٩	
	السور ناحية مبني الهيئة							
	من الداخل والخارج	٢	٤٠,٦٥		٢,٦		٢٩٢,٦٨	
		٢	٢٤,٧٢		٢,٦		١٧٧,٩٨	
	الإجمالي							٩٤٧,٣٦

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية ببوية اسمنتية حرفياتو							
	اجمالي ما سبق							٩٤٧,٣٦
	الطيان من اعلي	١	٤٠,٦٥		٠,٤		٩٤٧,٣٦	
		١	٢٤,٧٢		٠,٤		٩,٨٩	
	الطيان من اسفل	٧	٢,٢٥		٠,٢٨		٦,٣٧	
		١	٢,٩٧		٠,٢٨		٠,٨٣	
		٦	٢,١٦		٠,٢٨		٥,٣١	
		٣	٢,٠٣		٠,٢٨		٢,٥٥	
		١	٢,١٣		٠,٢٨		٠,٨٨	
		١	٢,٢		٠,٢٨		٠,٩٢	
	جوانب الاعمدة	٢٨	٢,٥		٠,٢٨		٢٦,٦٠	
		٢٨	١,٧		٠,١٥		٩,٦٩	
	بين الطوبة والنص طوبة	٧	٢,٢٥		٠,١٢		٢,٧٢	
		١	٢,٩٧		٠,١٢		٠,٣٦	
		٦	٢,١٦		٠,١٢		٢,٢٨	
		٣	٢,٠٣		٠,١٢		١,٠٩	
		١	٢,١٣		٠,١٢		٠,٢٨	
		١	٢,٢		٠,١٢		٠,٤٠	
		١		٤,٥٥	٢,٢٥		١٠,٢٤	
	الإجمالي							١٠٤٤,١١

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدة { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

مهندس الشركة



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدة { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوران		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي	
٢٧	بالعدد توريد وتركيب جرحوري صرف مطر							
	اعلي غرفه الامن							
		٢					٢,٠٠	



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبلدة

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة شوارع بخلية فوتوسيل							
		١					١,٠٠	
							١,٠٠	١,٠٠
							٠,٠٠	
	الإجمالي							

مهندس الهيئة

[Signature]

مهندس الشركة

[Signature]

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية								
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والااوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٥	بالعدد توريد و تركيب كشاف اناره طراز شوارع Watt ١٥٠ بدرجة حماية IP٦٥ السعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال حسب اصول الصناعة.							
	اعمده الاناره بالمتنشل	٣١					٣١,٠٠	
	بوابه المشتل من الداخل والخارج	٤					٤,٠٠	
	اعمده الاناره بجوار الوحدة القديمه	٥					٥,٠٠	
	السور الخرساني بجوار الوحدة القديمه	٣					٣,٠٠	



عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البليدة { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

مهندس الشـــــــــ



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

وحدة المنطقة المركزية بالعياط								
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
١ م	بالمتر المسطح انترلوك							
		١		١٤,٦٥	١,٥٥		٢٢,٧١	
		١		١٤,٦٥	١,٢		١٧,٥٨	
		١		٢,٣٠	٢,٨٥		٨,٨٦	
		١		١,٣٤	٢,٨٥		٥,١٦	
							٥٤,٣١	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								






المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]

برودة و انتربولوك

Handwritten signature

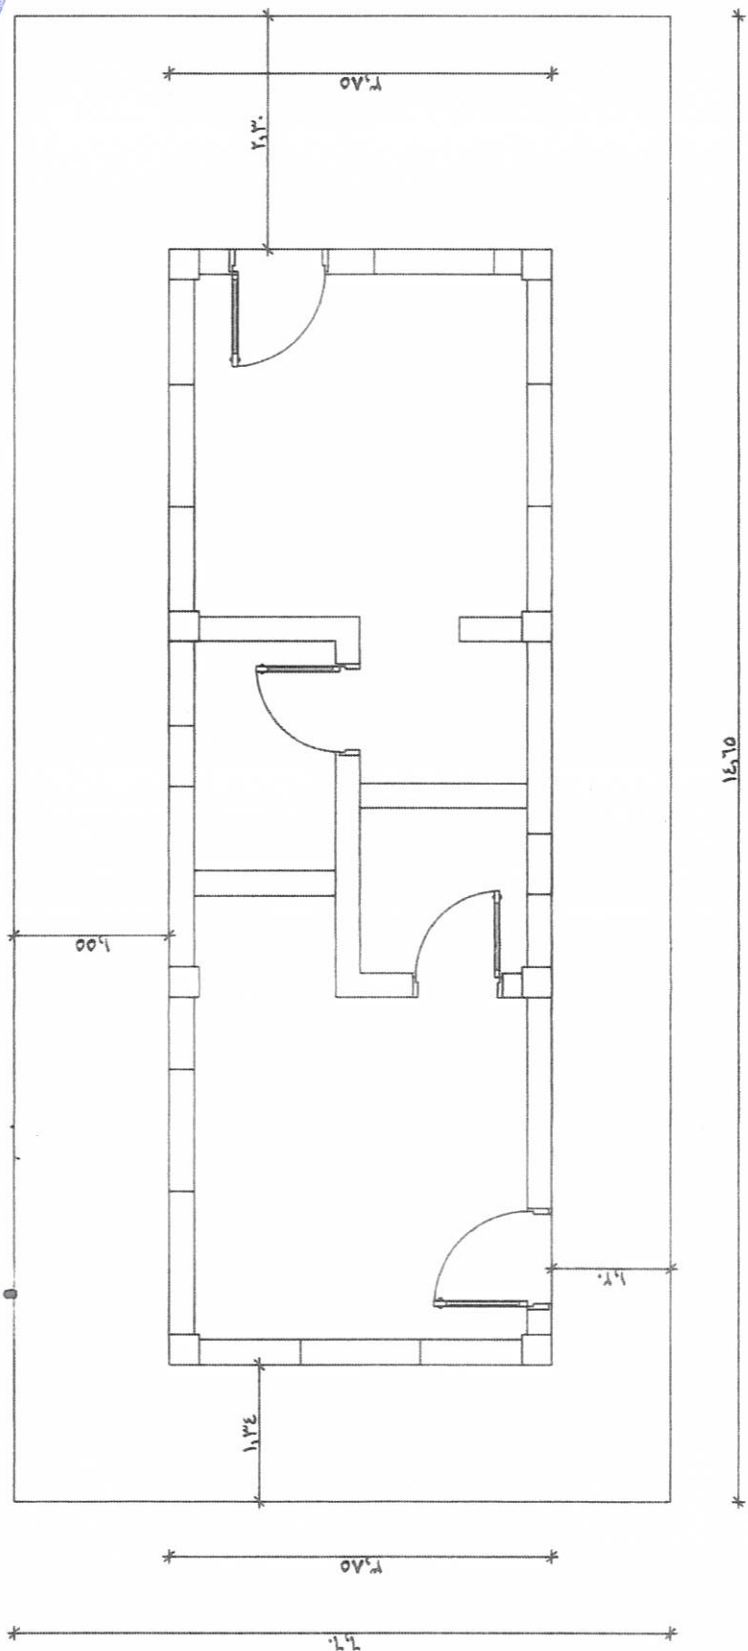



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعني الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٢ م	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الحوائط الداخلية							
	غرفة ١							
	السقف	١	٢,٢٨	٢,٢٥			١١,٢٢	
	ح ١	١	٢,٢٨		٢,٩٠		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢	١,٢٠		١,٤٤		
	ح ٢	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢	
	خصم ب ١	١		١	٢,٢	٢,٢٠		
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٢	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٤	١,٠٠		٢,٢٥	٢,٩٠		٩,٧٢	
	خصم معبرة	١	١		٢,٦	٢,٦		
	سقف المطبخ	١	١,٦٨	١,٤٠			٢,٢٥	
	سقف حمام ١	١	٢,٣٦	١,٤٢			٢,٢٢	
	الكمرة	٢	٠,٢		٠,٢		٠,١٨	
	باطن الكمرة	١	٠,٢		٠,٢		٠,٠٩	
	غرفة ٢							
	السقف	١	٢,٢٨	٢,٢٥			١١,٢٢	
		١	١,٤٢	٠,٧			١,٠٠	
	ح ١	١	٢,٢٨		٢,٩		٩,٨٠	
	خصم ش ٢	١	١,٢		١,٢	١,٤٤		
	ح ٢	١		٢,٢٥	٢,٩		٩,٧٢	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبليدة


[illegible]

John D.

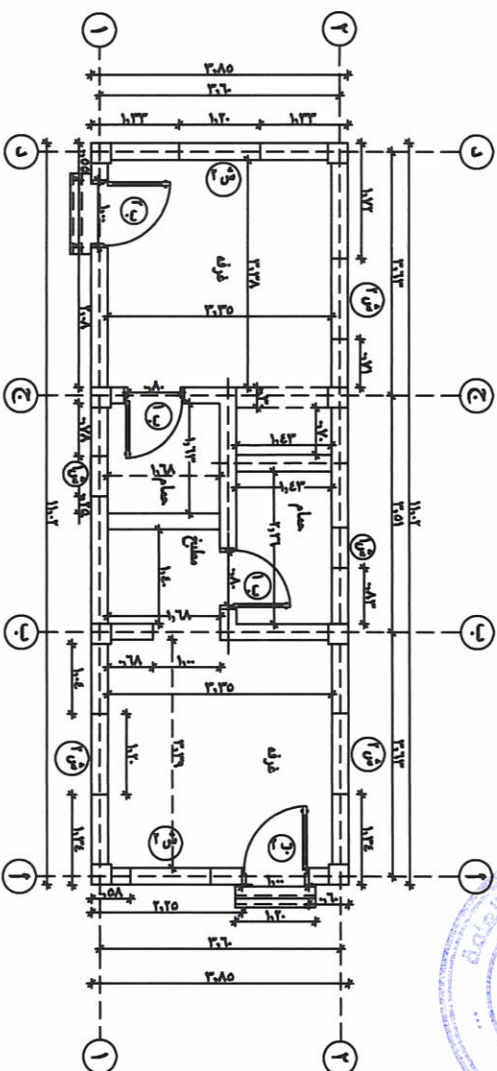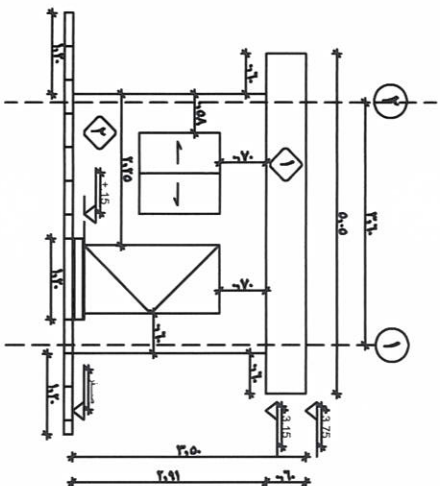



Handwritten signature or mark.

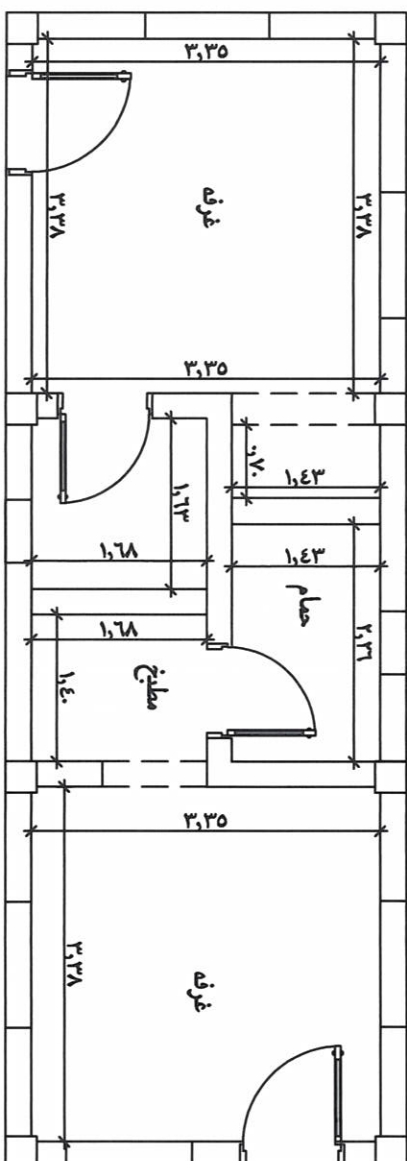

في و ت ل





عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
	بالمتر المسطح تركيب ارضيات سيراميك							
ه م	غرفة الامن							
	غرفة ١	١	٢,٣٥	٢,٣٩			١١,٣٦	
	معبرة باب المطبخ	١	١	٠,٢٥			٠,٢٥	
	حمام ١	١	٢,٣٦	١,٤٣			٢,٣٣	
	معبرة باب	١	٠,٨	٠,٢٥			٠,٢٠	
	حمام ٢	١	١,٦٣	١,٦٨			٢,٧٤	
	معبرة باب	١	٠,٨	٠,٢٥			٠,٢٠	
	مطبخ	١	١,٦٨	١,٤٠			٢,٢٥	
	غرفة ٢	١	٢,٣٥	٢,٢٨			١١,٣٣	
		١	١	١,٤٣			١,٤٣	
	معبرة باب	١	٠,٨	٠,٢٥			٠,٢٠	
الإجمالي								٢٢,٢٨ ٢٢,٢٨ ٠,٠٠ ٢٢,٢٨

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

[Signature]

A



مدير املاك ارضيات

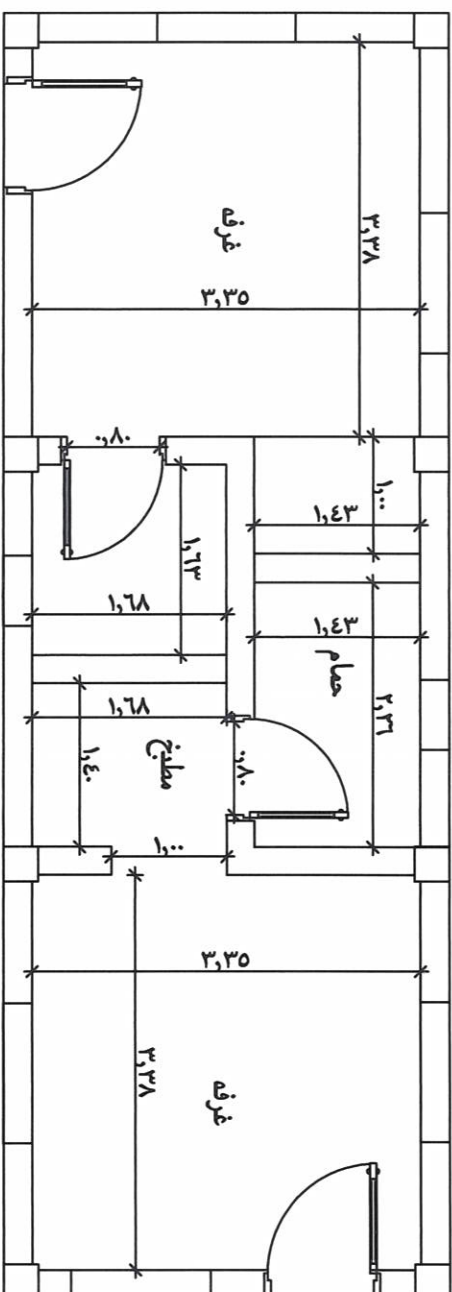

Handwritten signature/initials.




المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

[illegible]

Handwritten signature or mark.

سيراميك حوائط

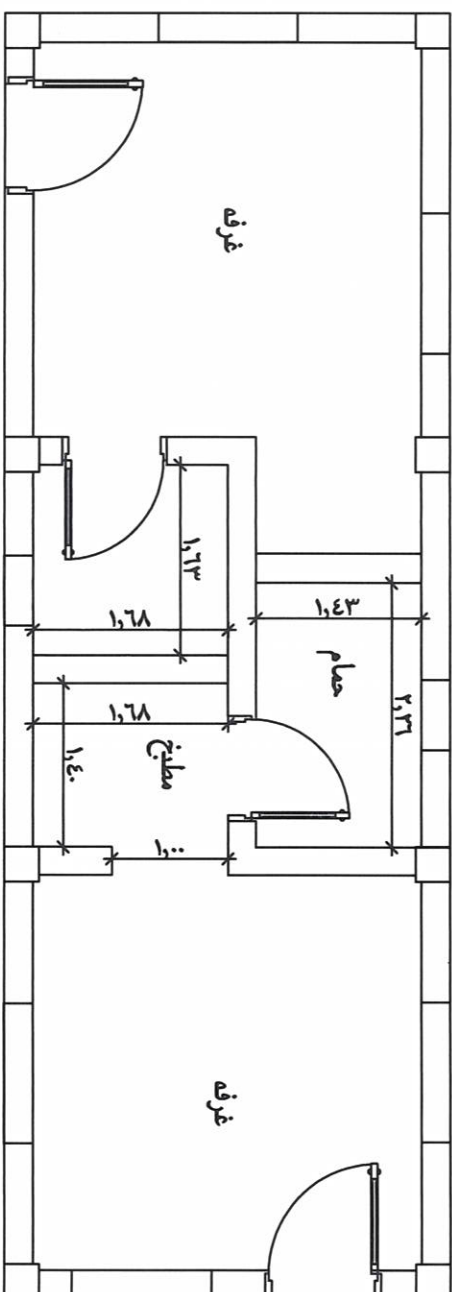



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
٧ م	بالمتر الطولي وزرّة ١٠ سم							
	غرفة ١							
	ح ٢ & ١	٢	٢,٢٨				٦,٧٦	
	ح ٢ & ٤	٢	٢,٢٥				٦,٧٠	
	خصم ب ٢	٢		١			٢,٠٠	
	غرفة ٢							
	ح ٢ & ١	٢	٤,٢٨				٨,٧٦	
	ح ٢	١		٠,٩			٠,٩	
	ح ٢ & ٤	٢	٢,٢٥				٦,٧٠	
	خصم ب ١	١		٠,٨			٠,٨٠	
	الإجمالي						٢٩,٧٠	٣٦,٠٠
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٨ م	بالمتر الطولى توريد و تركيب درج حيرانييت محلي							
	عند الغرف	٨			١,١		٨,٨	
	عند باب الافراد	١			١,٥		١,٥	
							١٠,٣٠	


مهندس الشركة

~~11/11/11~~ A 7



مخطط ٢٠٢

Handwritten signature or mark.

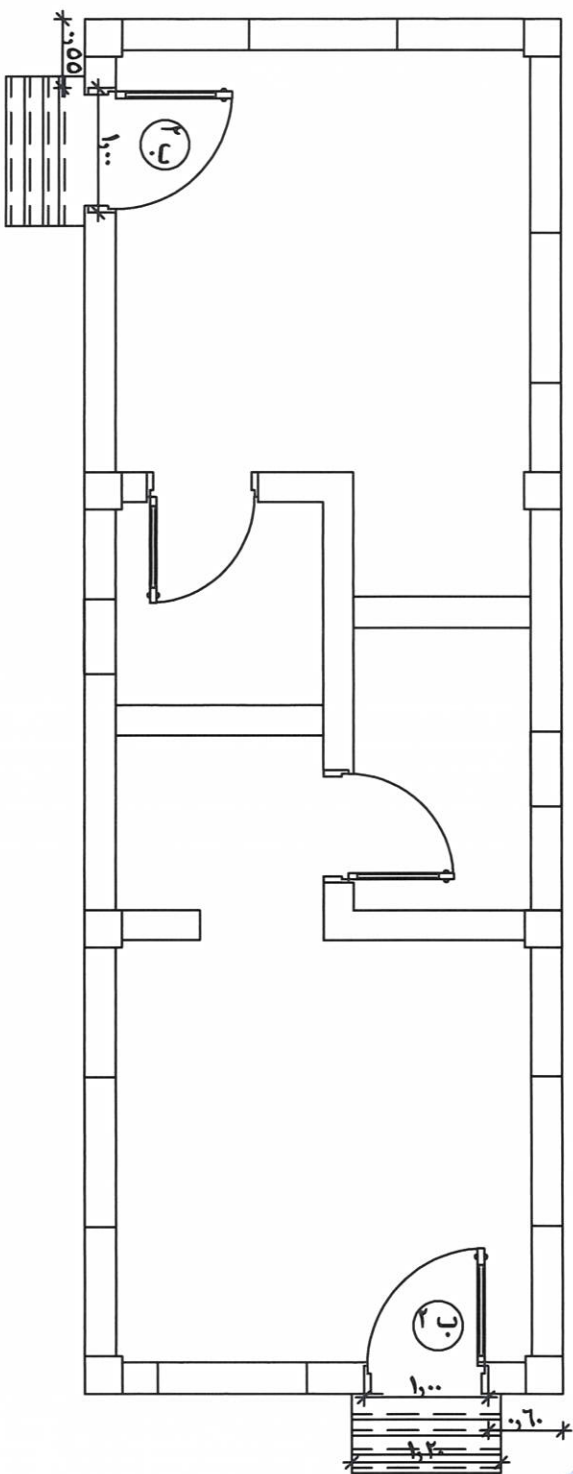



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٩ م	بالمتر الطولي توريد و تركيب عتب ابواب رخام							
		٢			١		٢,٠٠	
		٢			٠,٨		١,٦٠	
							٣,٦٠	
مهندس الشركة		مهندس الهيئة						
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البليدة { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط								
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٠ م	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد مشغول							
	شبايك حمام		١٢٠				١٢٠,٠٠	
	شبايك غرف						٠,٠٠	
							١٢٠,٠٠	
مهندس الشركة					مهندس الهيئة			

ميزان الوحدة المحلية بالبليدة

ميزان يسجل
الوحدة المحلية بالبليدة

التاريخ: ٩ / ١١ / ٢٠٢٢

الوقت: ١٠ م

رقم السيارة: ٢٢٢٢

الوزن الاول قائم: ١٢٠

الوزن الثانى فارغ:

الصافى:

الحاج / محمود زغلول : ٠١١١٨٠٣٠٠٧٤

الحاج / أحمد خطاب : ٠١١٤٩٣٥٠٦٦٦

الاستاذ / محمود غنيم : ٠١١٢١٨٦٩٥٧٢

الاستاذ / محمد رمضان : ٠١١١٩٢٢٧٩٤٥

العنوان: البليدة طريق مصر أسيوط الزراعى

الميزان يعمل ٢٤ ساعة






المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١١ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب عظم موسكي							
	الغرف	2	2.2	1			٤,٤٠	
	الحمام	٢	٢,٢	٠,٩			٣,٩٦	
							٨,٣٦	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								

24/11/2020

ابواب و شیشه‌ها

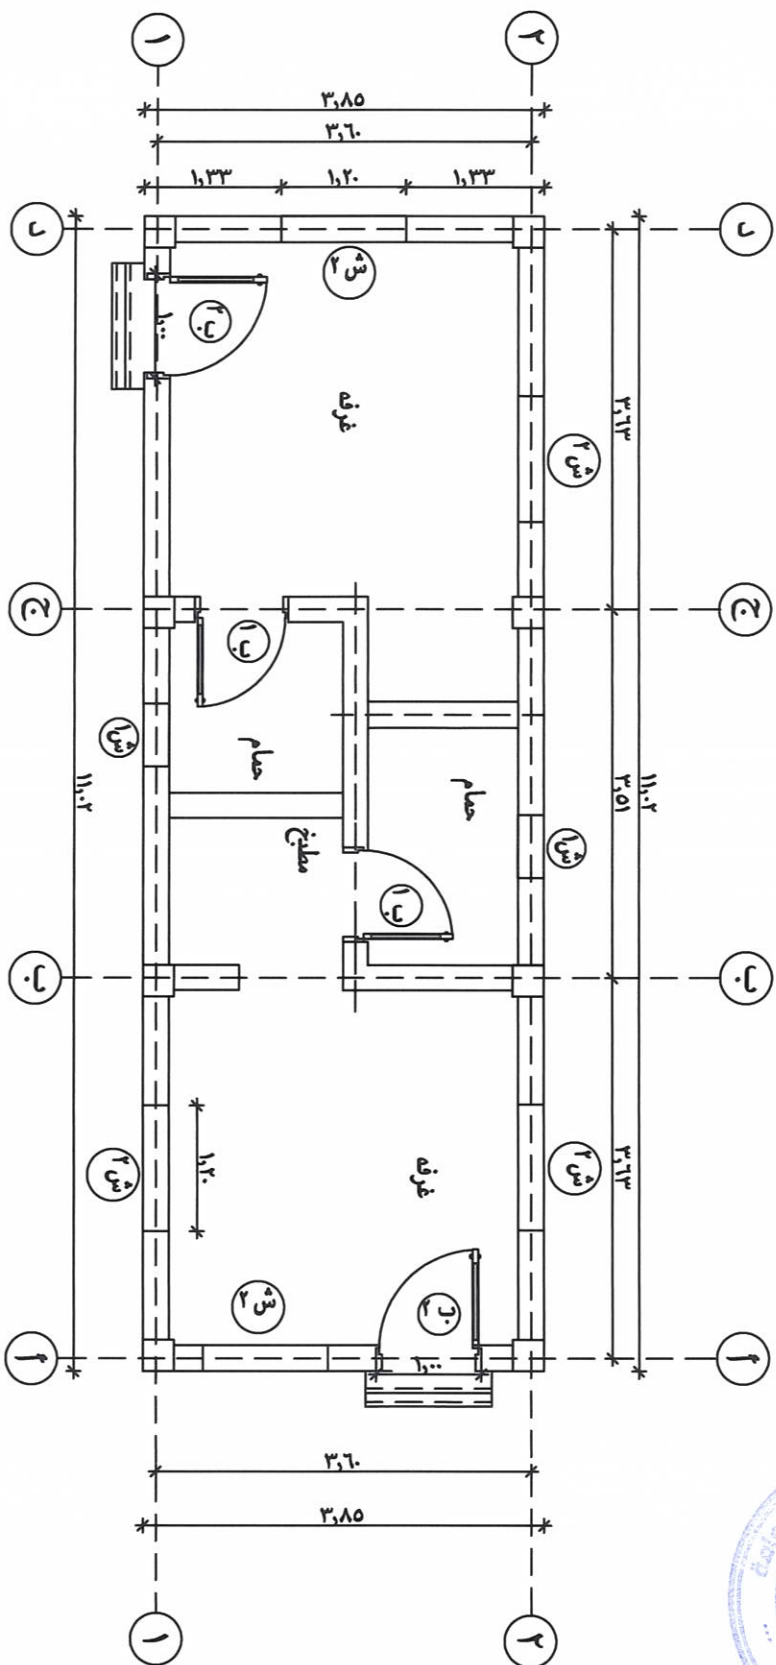



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٢ م	بالمتر المسطح شبايك الوميتال							
	العرف	٥	١,٢	١,٢			٧,٢	
	الحمام	٢	٠,٦	٠,٦			٠,٧٢	
							٧,٩٢	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خضم	جزئي	
١٣ م	بالمتر المسطح مرايات							
	مرايات الحمام	٢	٠,٨٠	٠,٨٠			١,٢٨	
							١,٢٨	
مهندس الشركة				مهندس الهيئة				



عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدة { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

[Handwritten signature]

A5





المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية

وحده المنطقة المركزية بالعياط

[illegible]



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعباط

مهندس الش



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٧ م	بالمتر الطولي مواسير ١ بوصة							
							٢٢,٧٠	
							٢٢,٧٠	
مهندس الشركة						مهندس الهيئة		



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٨ م	بالمتر الطولي مواسير ٢ بوصة							
		٢				٥,٥٠		١١,٠٠
								١١,٠٠
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط


[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

~~10/11/20~~ 10/11/20



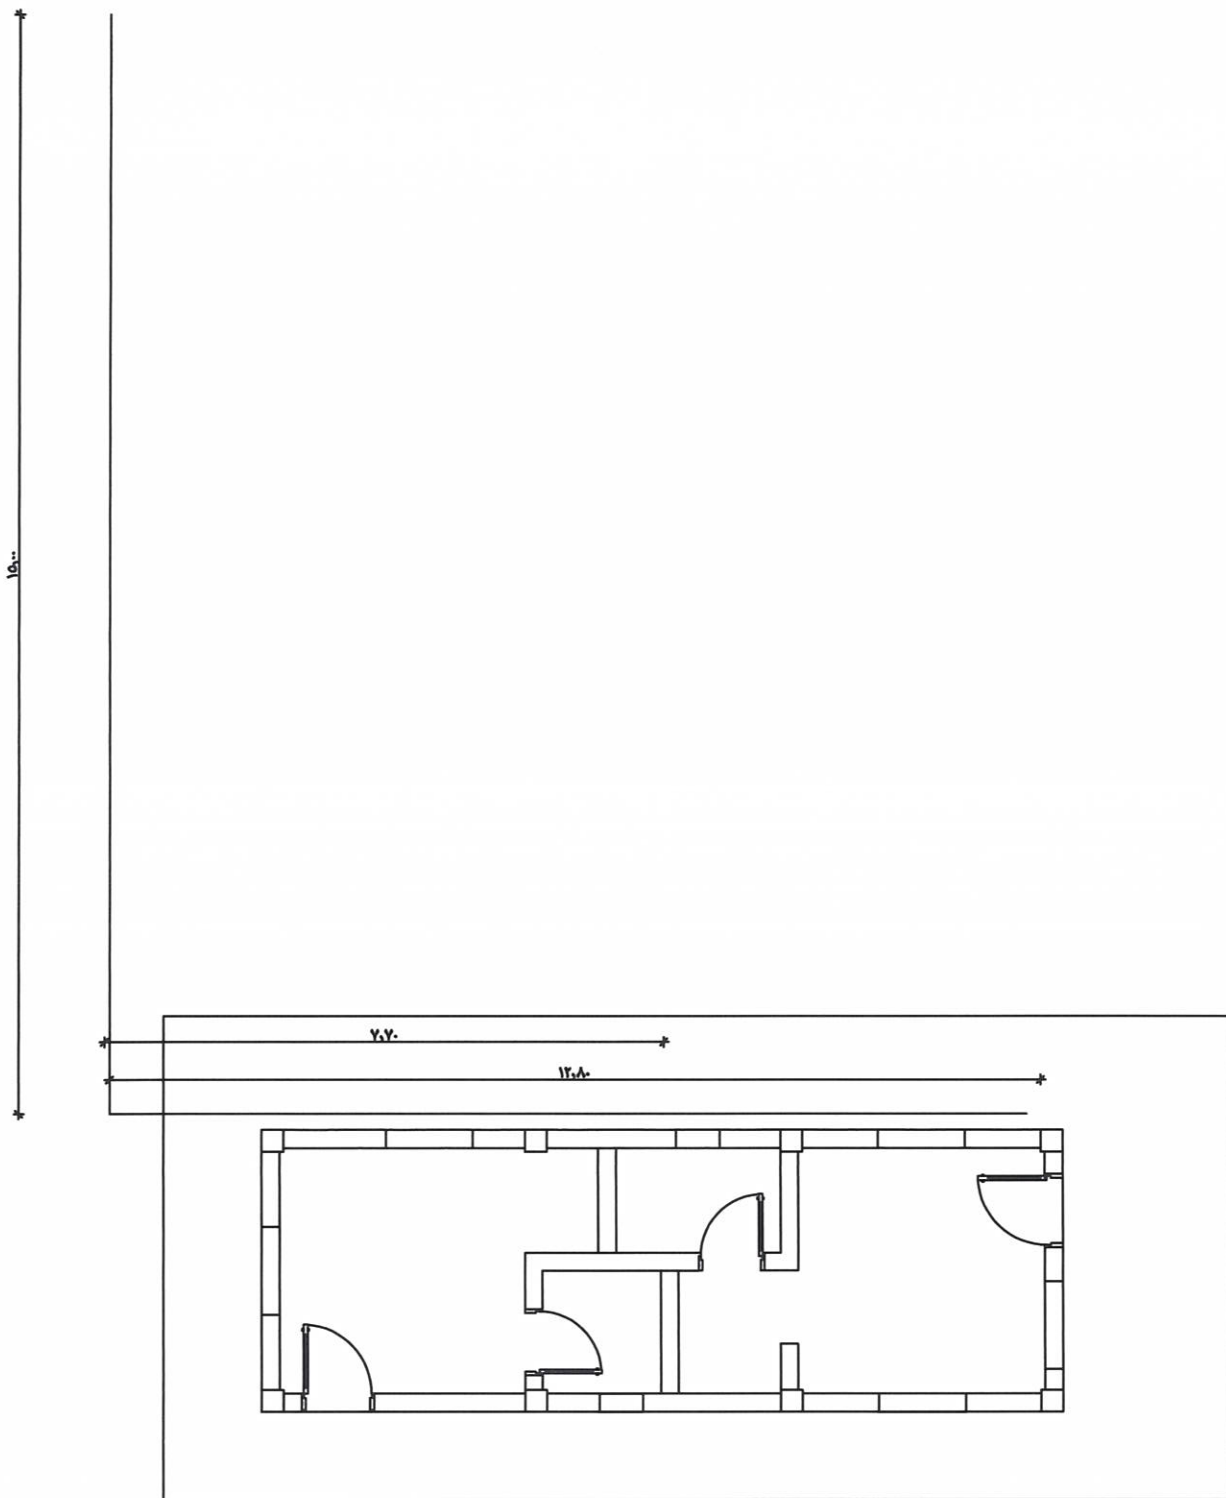

مواسير





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٠ م	بالعدد محبس دفن ٣/٤ بوصة							
		٢					٢,٠٠	
							٢,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢١ م	بالعدد محبس بلية ٢ لأكور							
		٢					٢,٠٠	
							٢,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٢ م	بالعدد غرفة تفتيش							
		٤					٤,٠٠	
							٤,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٤ م	بالعدد خلاط حوض							
		٢					٢,٠٠	
							٢,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٥ م	بالعدد خلاط حوض شجرة مطبخ							
		١					١,٠٠	
							١,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خضم	جزني	
٣٦ م	بالعدد دش للحمام							
		٢					٢,٠٠	
							٢,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
٢٧ م	بالعدد سيفون أرضية							
		٣					٣,٠٠	
							٣,٠٠	
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								





المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١م	بالعدد توريد و تركيب لوحة كهرباء فرعية (فينوس او ما يماثلها)							
		٢					٢,٠٠	
							٠,٠٠	

[illegible]



عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

مهندس السـ دركه




المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

وحده المنطقة المركزية بالعياط

 $\gamma A, \dots$

مهندس الشركة

[Handwritten signature]





عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدة { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالعياط

مهندس الشركة



وحده المنطقة المركزية بالبليدة

مهندس الشراك



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية


المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	خصم	جزئي	
١٦م	مفتاح إنارة سكة واحدة اتجاه واحد مقاوم للمياه							
	اوفيس غفير	١					١,٠٠	
	حمام الغفير	١					١,٠٠	
	حمام المهندس	١					١,٠٠	
								</



رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٧م	مفتاح أنارة سكتين (two gang).							
	مهندس	١					١,٠٠	
							٠,٠٠	١,٠٠
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								

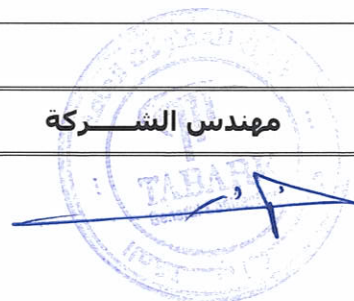

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			ارتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
٩م	وريد وتركيب واختبار بريزة شوكو لقمة واحدة ١٦ أمبير							
	غرفه الغفير	٦					٦,٠٠	
	غرفه المهندس	٦					٦,٠٠	
	حمام ١	٢					٢,٠٠	
	حمام ٢	٢					٢,٠٠	
	حمام اوفيس	٢					٢,٠٠	
	الإجمالي						١٨,٠٠ ٠,٠٠ ١٨,٠٠	١٨,٠٠
مهندس الشركة								
مهندس الهيئة								



المقاول العام :شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

وحده المنطقة المركزية بالبلدية								
رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			إرتفاع	عرض	طول	حجم	جزئي	
١٠م	توريد و تركيب وتوصيل واختبار وحدة إضاءة عبارة عن كشاف ٢ x ١٢٠ سم							
	غرفة المهندس	١					١,٠٠	
	غرفة الصغير	١					١,٠٠	
								</



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والااوران		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	حصم	جزئي	
١٢م	توريد وتركيب وحدة إضاءة من النوع الدائري بلمبة ليد ٣٦ وات							
	حمام الغفير	١					١,٠٠	
	حمام المدير	٢					٢,٠٠	
	الافيس	١					١,٠٠	
	خارج المبنى	٦					٦,٠٠	
								</





المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحدة المنطقة المركزية بالبلدية

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	حجم	جزئي	
١٤م	بالعدد توريد و تركيب شفاط ٣٠*٣٠ توريدو							
	حمام الغفير	١					١,٠٠	
	حمام المهندس	١					١,٠٠	
			</					



المقاول العام : شركة تبارك للمقاولات العمومية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية انشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }


وحدة المنطقة المركزية بالبلدية


رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٥م	بالعدد توريد و تركيب مانور مياه ١ حصان							
	للغرف	١					١,٠٠	



عملية إنشاء اسوار حول قطعتي الأرض المجاورة
لوحدة صيانة البلدية { مشتل + مخزن }

وحده المنطقة المركزية بالبليدة

رقم البند	بند الاعمال	عدد القطع	مقاسات			مساحات المكعبات والاوزان		أجمالي
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	جزئي	
١٦م	بالعدد توريد وتركيب سخان سعة ٥٠ لتر							
	حمام واوفيس الغفير	١					١,٠٠	
	حمام المهندس	١					١,٠٠	
	الإجمالي						٢,٠٠	٢,٠٠
مهندس الشركة			مهندس الهيئة					
								

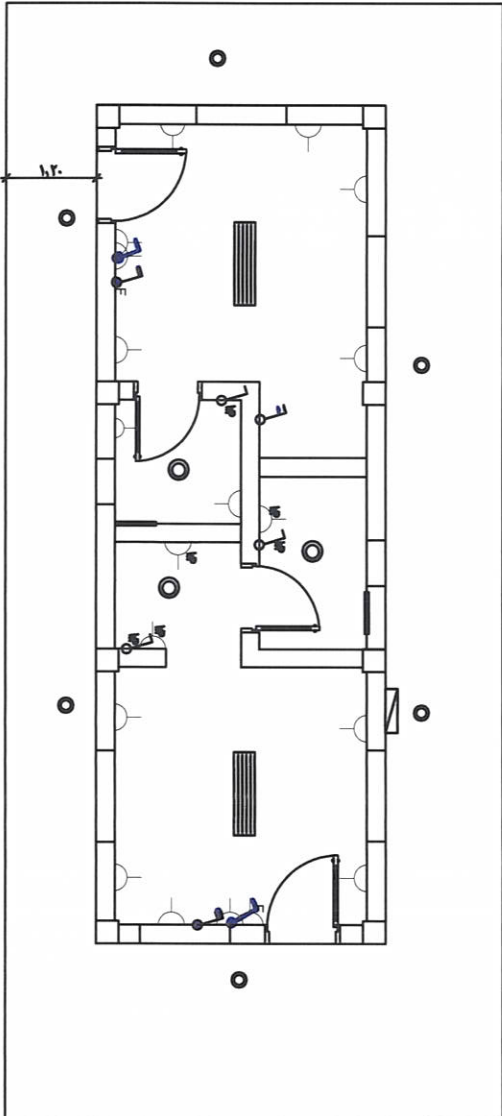

الوصف	الرمز
بريزة شوكة بقدره ١١ امير	١
بريزة شوكة بقدره ١١ امير مضاد للمياه	٢
مكتبة ورق بالارض بعدد ٢ بريزة شوكة بقدره ١١ امير + ١ مخرج تلفون + مخرج مطبوعات	٣
لوحة توزيع ١٨ خط	٤
مفتاح جرس	٥

الوصف	الرمز
كشاف ٢٠٠٠ بقدره ٣١ واط	٦
كشاف ١٢٠٠٢ بقدره ٣١ واط	٧
سبوت بقدره ١٨ واط	٨
وحدة اضواء دائرية ليد بقدره ٣١ واط	٩
مفتاح انارة احمادي ١٠ امير	١٠
مفتاح انارة احمادي ١٠ امير مضاد للمياه	١١
مفتاح انارة فلومي ١٠ امير	١٢
مفتاح انارة فلومي ١٠ امير مضاد للمياه	١٣
لوحة شوارع	١٤
كشاف واجهات ١٠٠ واط ٢٢٠ فولت	١٥
ابليك حوض	١٦
شفاط حمام او مطبخ	١٧

