

Contractor Company	AI-AHRAM 2020 CO. for General Contracting		Designer Company	(KK) Engineering Consulting Office							
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time							
			2023-10-27 MAR 012-1	08:00							
Received by GARB CONSULTANT	(KK)		MAR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
				329	EW	CS	28	10	23	08	00

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill Layer Total Quantity (45000 m ³)		
Location to be Used	Station (329+700 : 330+700)		
Sample only	Yes	Materials Type	Fill layers
Supplier Name	ELSEWY	Data Sheet provided	Yes attached
Reference in BoQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
Prequalification reference		Test Samples Results	
Reference Photos	No/Yes	Other	
Comments by: Eng. (KK)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)	
1-Quality test Result By Third Party Lab is Approved. 2-This Sample Representative (5000 m ³) only.		1- All tests were carried-out by third Party lab (CEL) 2-Results report attached and acceptable with the project specifications 3-Final approval is subject to above mentioned comments.	

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor				A
QA/QC *	(KK)			A
GARB**	Eng. Mohammed Fayad			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		13-11-2023	AWC

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 28/10/2023
Reporting Date : 13/11/2023
Reporting No. : 005
Sample No. : 05

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 28/10/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883
7. Organic Content ASTM D-2974


Note: The client to our laboratory brought the sample and the laboratory is not responsible for the way it is taken.

Signature /  

Company Name : 2020 الإهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 28/10/2023
Reporting Date : 13/11/2023
Reporting No. : 005
Sample No. : 05

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-C 136

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	100
25	95.8
19	91.2
12.50	77.3
9.50	70.6
4.75	57.4
2.36	51.6
2.00	46.5
1.18	43.1
0.600	39.8
0.425	35.4
0.300	28.1
0.150	22.4

Signature: 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي 02/11/2023
الدكتور المهندس/أحمد محمد/مهندس

الاهرام 2020 : Company Name

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Location : St. (329+700) : (430+700)

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 28/10/2023

Reporting Date : 13/11/2023

Reporting No. : 005

Sample No. : 05

**Materials finer than 75 μm (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μM (No.200)	13.5

مكتبة معاصر الإقتصاد والعلوم
الساحل الشمالي
الطرابلس - ليبيا

Signatur

Company Name : 2020
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 28/10/2023
Reporting Date : 13/11/2023
Reporting No. : 005
Sample No. : 05

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	23.4
Plastic Limit	18.9
Plasticity Index	4.5

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي 02
التوقيع: /...
[Signature]

Signature /...

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 28/10/2023
Reporting Date : 13/11/2023
Reporting No. : 005
Sample No. : 05

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs
Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a) (A-1-b)
2.00 mm (No.10).	46.5	Max 50 % -----
0.425 mm (No. 40).	35.4	Max 30 % Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	13.5	Max 15 % Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)		
Liquid Limit	23.5	-----
Plasticity index	4.5	Max 6 % Max 6 %

The test results are **Not Comply** with specifications limits

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي 02
التوقيع: المهندس/ محمد عبد الله محمد
Signature: /

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 28/10/2023
Reporting Date : 13/11/2023
Reporting No. : 005
Sample No. : 05

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

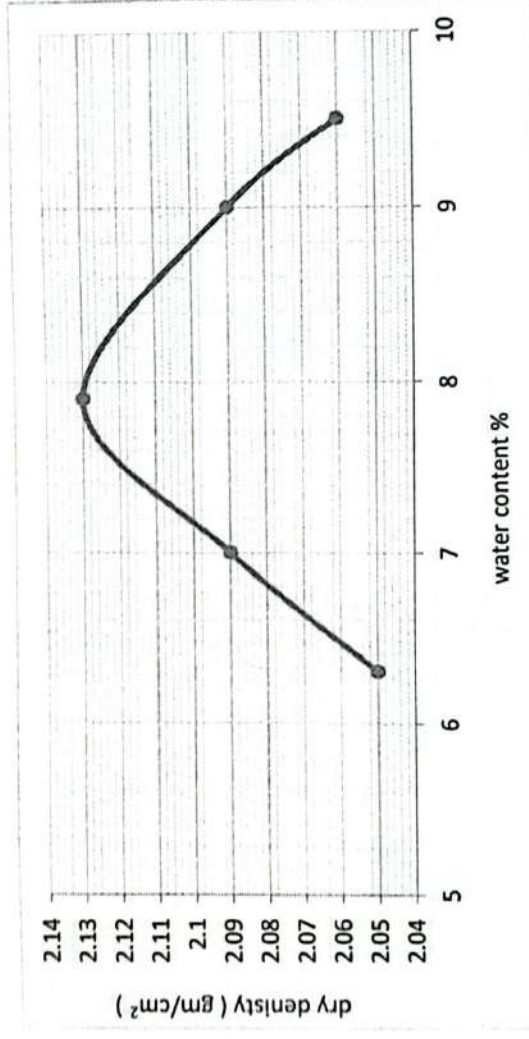

- Max dry density (gm/cm³) : 2.13
- Optimum moisture content % : 7.9

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي الجدي ٢٠٢٠
د. محمد توفيق عثمان - م. محمد توفيق عثمان

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 28/10/2023
Reporting Date : 13/11/2023
Reporting No. : 005
Sample No. : 05

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	1.03
1.27	0.050	1.53
1.91	0.075	1.80
2.54	0.100	2.16
3.18	0.125	2.36
3.81	0.150	2.64
4.45	0.175	2.82
5.08	0.200	3.08
5.71	0.225	3.27
6.35	0.250	3.42

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	31.2
	6.90	2.16	

Notes :


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.13 (gm /cm³) at 7.9 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 450 Kg

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
02
الرجاء الرجوع الى: شارع الملك الافضل. الزمالة. القاهرة

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 28/10/2023
Reporting Date : 13/11/2023
Reporting No. : 005
Sample No. : 05

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883

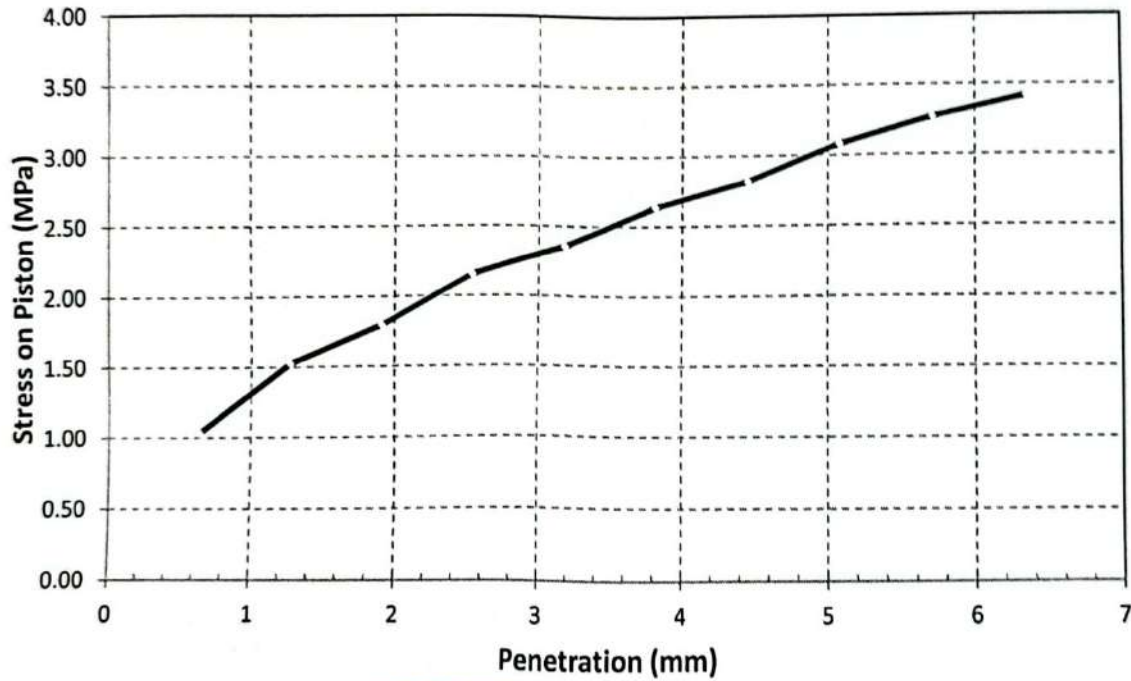

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي 02
Signature: [Handwritten Signature]

MATERIAL APPROVAL REQUEST

2020

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
(GABR)

2023-11-10

08:00

00

00

Contractor Company	Al-AHRAM 2020 CO. for General Contracting		Designer Company	(KK) Engineering Consulting Office	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time	
Received by GABR CONSULTANT	(KK)	Eng. Mohamed Zaki	2023-11-10 MAR 013-1	08:00	
			CI	C2	C3
			329	EW	C5
				11	11
				23	08
				00	00

CODE 1	51 to 521	01 to 53	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill Layer Total Quantity (50000 m³)		
Location to be Used	Station (329+700 : 330+700)		
Sample only	Yes	Materials Type	Fill layers
Supplier Name	ELSEWY	Data Sheet provided	Yes attached
Reference in BoQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (G21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
Pregualification reference		Test Samples Results	
Reference Photos	No/Yes	Other	
Comments by: Eng. (KK)			
1- Quality test Result By Third Party Lab is Approved.			
2- This Sample Representative (5000 m³) only.			
3- Results report attached and acceptable with the project specification			
3- Final approval is subject to above mentioned comments.			

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor		Eng. Alaa Abd-Allatif		A
A/OC *	(KK)	Eng. Mohamed Zaki		
ARB **	Eng. Mohammed Fayad			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			
Designer				

Alignment/Bridges: Culvert only

Company Name : 2020 ام 2020

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Location : St. (329+700) : (430+700)

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 11/11/2023

Reporting Date : 26/11/2023

Reporting No. : 006

Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 11/11/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883
7. Organic Content ASTM D-2974

Note: The client to our laboratory brought the sample and the laboratory is not responsible for the way it is taken.



Company Name : 2020 الإهرام

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Location : St. (329+700) : (430+700)

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 11/11/2023

Reporting Date : 26/11/2023

Reporting No. : 006

Sample No. : 01

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-C136

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	96.5
25	91.3
19	86.6
12.50	74.8
9.50	68.8
4.75	53.5
2.36	51.9
2.00	49.6
1.18	42.1
0.600	38.6
0.425	34.2
0.300	26.1
0.150	21.6

CEL
مكتب معمل الاستشارات الهندسية
الاساسية
Signature /
مكتب معمل الاستشارات الهندسية

Company Name : 2020م
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 11/11/2023
Reporting Date : 26/11/2023
Reporting No. : 006
Sample No. : 01

Materials finer than 75 µm (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 µM (No.200)	12.4

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
CEL
Signature /
الدكتور المهندس: طارق السيد السيد: المهندس: الدكتور:

Company Name : 2020م
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 11/11/2023
Reporting Date : 26/11/2023
Reporting No. : 006
Sample No. : 01

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	24.1
Plastic Limit	19.2
Plasticity Index	4.9

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاساسيات
Signature
توقيع المهندس / محمد التوفيق / مدير المكتب الفني / القاهرة

Company Name : 2020م
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 11/11/2023
Reporting Date : 26/11/2023
Reporting No. : 006
Sample No. : 01

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	49.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	34.2	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	12.4	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	24.1	-----	-----
Plasticity index	4.9	Max 6 %	Max 6 %

The test results are ☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

CEL
مكتب مهندسي الاستشارات الهندسية
الاسماء محمد الفضل
Signature

Company Name : الاهرام 2020
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 11/11/2023
Reporting Date : 26/11/2023
Reporting No. : 006
Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

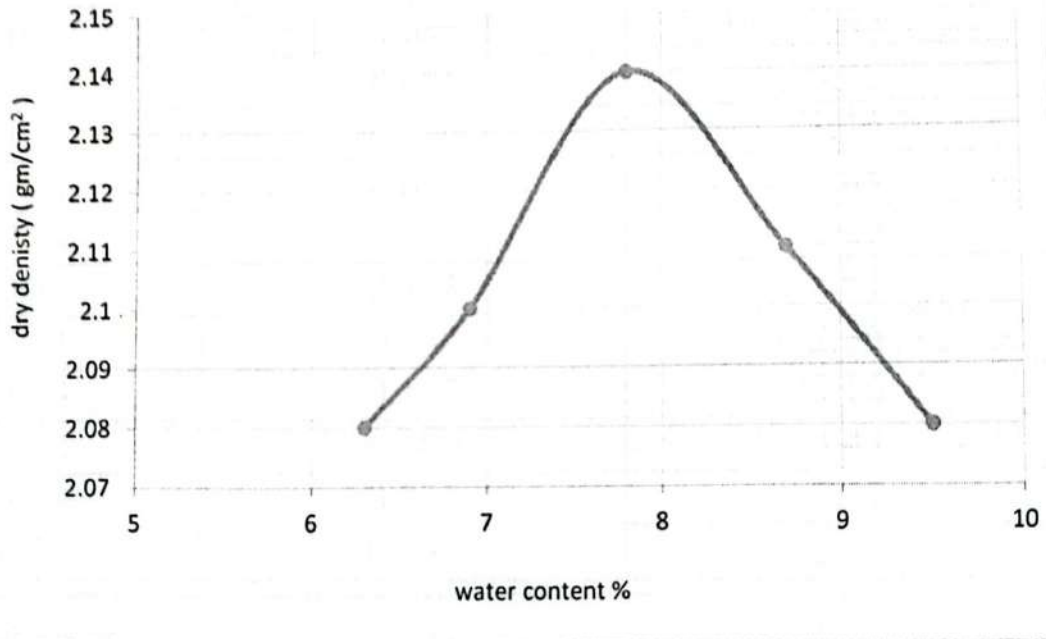

- Max dry density (gm/cm²) : 2.14
- Optimum moisture content % : 7.8

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي 02
Signature: [Signature]

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 11/11/2023
Reporting Date : 26/11/2023
Reporting No. : 006
Sample No. : 01

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	0.96
1.27	0.050	1.46
1.91	0.075	1.85
2.54	0.100	2.29
3.18	0.125	2.54
3.81	0.150	2.86
4.45	0.175	3.16
5.08	0.200	3.47
5.71	0.225	3.67
6.35	0.250	3.89

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	33.1
	6.90	2.29	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.14 (gm /cm³) at 7.8 % optimum water content.


3- Surcharge load 4.50 Kg.

الساحل الشمالي 02

Signature

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 11/11/2023
Reporting Date : 26/11/2023
Reporting No. : 006
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883

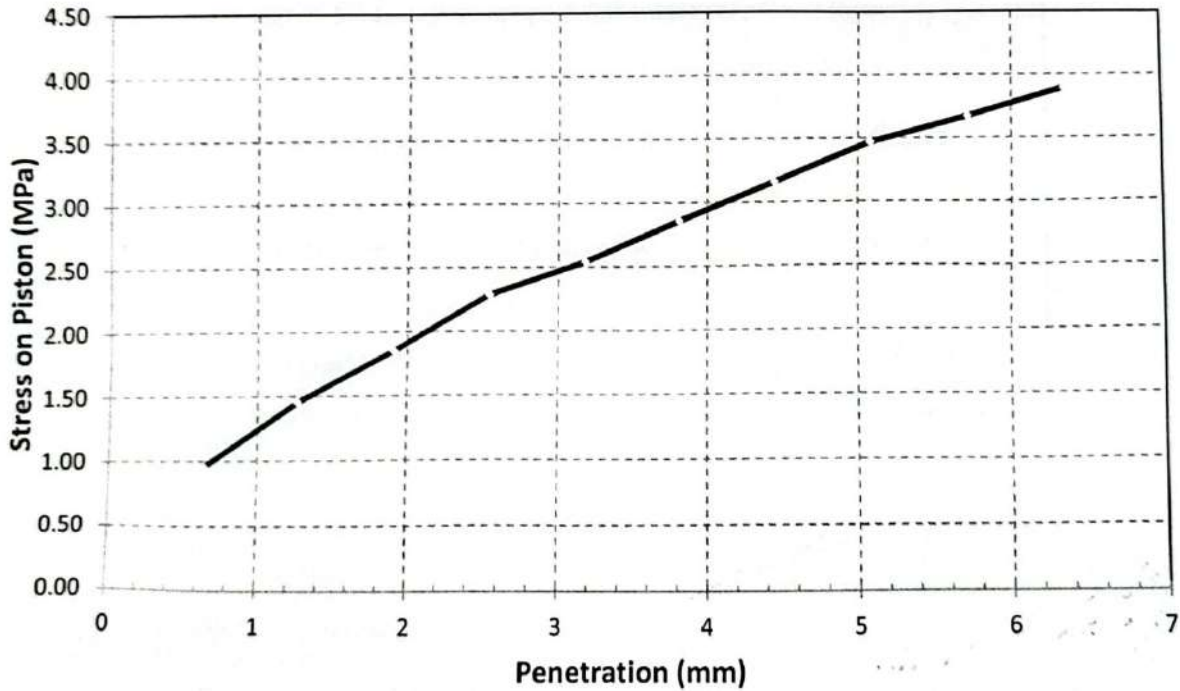

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
Signature
البريد الإلكتروني: info@cel.com. القاهرة

Company : الاهرام 2020
Project : Electric express train.
Delivery Date : 18/11/2023
Report Date : 26/11/2023
Sample Id : soil embankment
Report No. : 001

ACID-SOLUBLE CHLORIDE AND SULFATE IN SOIL SAMPLE

Test	Results
Total acid soluble chloride %	0.225
Total acid soluble Sulfate %	0.4459
Organic impurities %	0.0331



MATERIAL APPROVAL REQUEST



أ. هاشم 2020



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



الهيئة العامة للطرق والكباري



Contractor Company	Al-AHRAM 2020 CO. for General Contracting		Designer Company	(KK) Engineering Consulting Office						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time						
			2023-11-18	08:00						
			MAR 014- 1							
Received by GARB CONSULTANT	(KK)	Khaled Zaki	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
			329	EW	CS	19	11	23	08	00

CODE-1	S1 to S21	D1 to S3	Kp XXX Note
	Station Reference	Depot Reference	For Kilometer point only Start Km is used
	Work Activity		
	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill Layer Total Quantity (55000 m ³)		
Location to be Used	Station (329+700 : 330+700)		
Sample only	Yes	Materials Type	Fill layers
Supplier Name	ELSEWY	Data Sheet provided	Yes attached
Reference in BoQ		Specification	EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
Prequalification reference		Test Samples Results	
Reference Photos	No/Yes	Other	
Comments by: Eng. (KK)		Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)	
1-Quality test Result By Third Party Lab is Approved. 2-This Sample Representative (5000 m ³) only.		1- All tests were carried-out by third Party lab (CEL) 2-Results report attached and acceptable with the project specifications. 3-Final approval is: subject to above mentioned comments.	

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor				A
QA/QC *	(KK)	Khaled Zaki		A
GARB**	Eng. Mohammed Fayad			
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif			

* Designer

** Alignment/Bridges: Culvert only

Company Name : الازهرام 2020
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/11/2023
Reporting Date : 27/11/2023
Reporting No. : 007
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 19/11/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883
7. Organic Content ASTM D-2974

Note: The client to our laboratory brought the sample and the laboratory is not responsible for the way it is taken.



Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/11/2023
Reporting Date : 27/11/2023
Reporting No. : 007
Sample No. : 01

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-C 136

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.0
25	93.9
19	89.6
12.50	78.6
9.50	72.0
4.75	54.1
2.36	52.1
2.00	50.5
1.18	43.5
0.600	35.9
0.425	31.5
0.300	24.3
0.150	19.4

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي 02
Signature /
المركز الرئيسي: شارع الملك الأفضل، القاهرة - التكملة

Company Name : الاهرام 2020
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/11/2023
Reporting Date : 27/11/2023
Reporting No. : 007
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	13.5

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
Signature 02
شماره ٢٠٢٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
القاهرة - الزمالة

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/11/2023
Reporting Date : 27/11/2023
Reporting No. : 007
Sample No. : 01

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	26.3
Plastic Limit	21.8
Plasticity Index	4.5

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل
Signature
المركز الرئيسي: شارع الملك الأفصل، الزمالة - القاهرة

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/11/2023
Reporting Date : 27/11/2023
Reporting No. : 007
Sample No. : 01

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	50.5	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	31.5	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	13.5	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	26.3	-----	-----
Plasticity index	4.5	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

المعامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي 02
Signature:
المركز الرئيسي: ٢٠ شارع الجبل بالقاهرة - الزمالة - القاهرة

Company Name : الاهرام 2020
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/11/2023
Reporting Date : 27/11/2023
Reporting No. : 007
Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

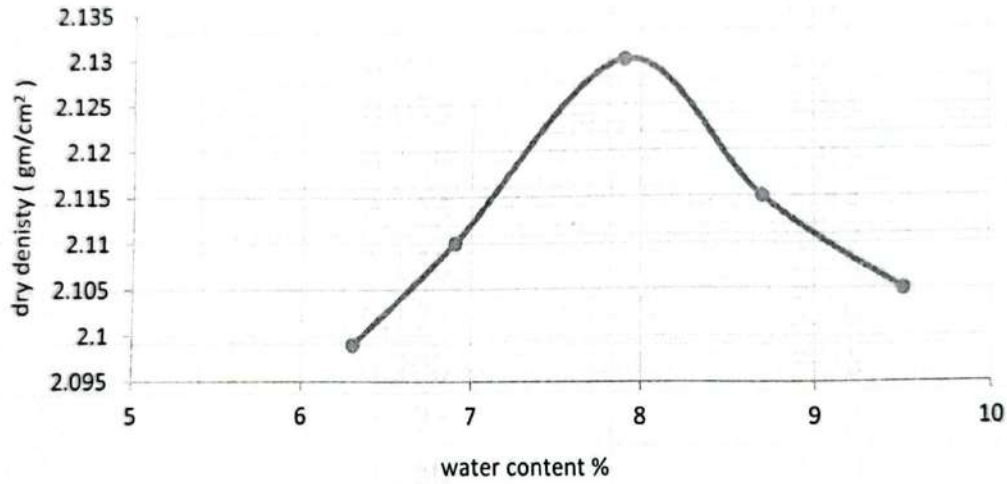

- Max dry density (gm/cm²) : 2.13
- Optimum moisture content % : 7.9

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
Signature
المركز الرئيسي: ٣ شارع الملك الأفضل، الزمالك - القاهرة

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/11/2023
Reporting Date : 27/11/2023
Reporting No. : 007
Sample No. : 01

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	0.55
1.27	0.050	1.17
1.91	0.075	1.63
2.54	0.100	2.05
3.18	0.125	2.55
3.81	0.150	2.81
4.45	0.175	3.10
5.08	0.200	3.26
5.71	0.225	3.42
6.35	0.250	3.60

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	29.8
	6.90	2.05	

Notes :


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.143(gm /cm³) at 7.9% optimum water content.

3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature: 

Company Name : 2020 الاهرام
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (329+700) : (430+700)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 19/11/2023
Reporting Date : 27/11/2023
Reporting No. : 007
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883

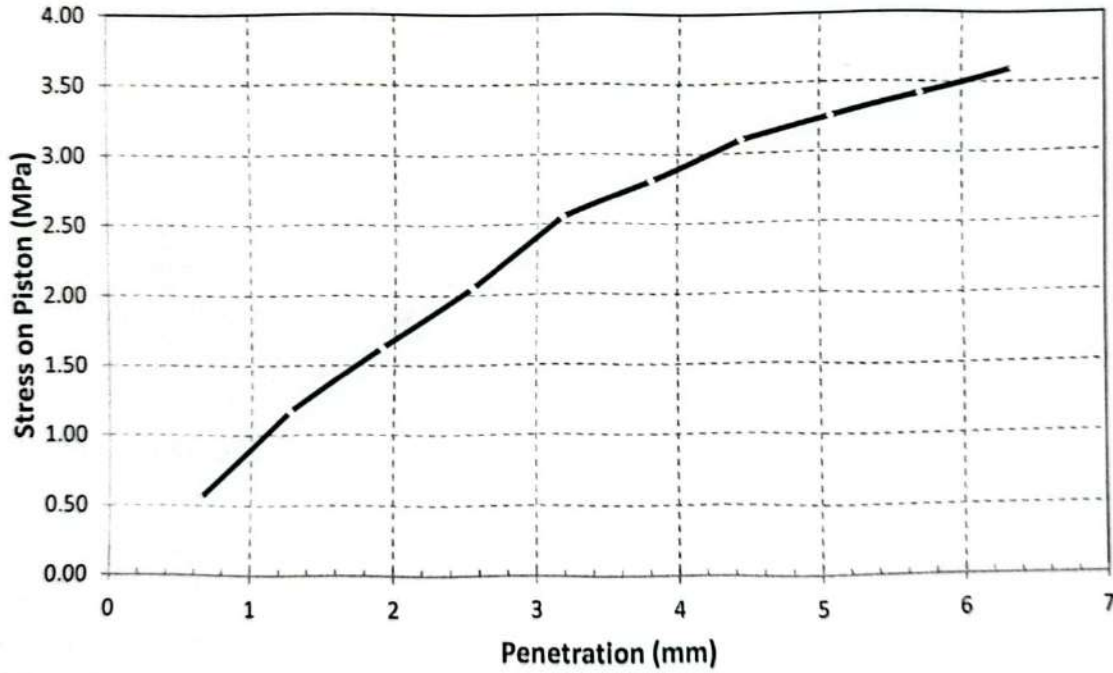

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الداحل الزمالي
Signature: [Handwritten Signature]
No. 27367231 - 27363093

أكثر من مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وستمائة وتسعة وأربعون جنينها فقط لا غير)

مهندسين البيئة

ملحوظہ : أسعار المواد بقدرکہ تحسب انشاؤں

الافرام 2020

ب. صفی : ۷۲۸ - ۲۷

...the ... of ...

الإستشاري الهندسي
K / خالد قنديل / السيد سيد

100

الشرعية المنقذة

حزبتي الأهرام 2020
ورصدنا الطريق



10

50

10

for

१. १००

٤١٥٥٤٤٤٤

الإدارة المركزية لبحوث الطرق

دفتر الشروط والمواصفات لسنة ٢٠٢٣

عملية : أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين)
قطاع برج العرب / العلمين
في المسافة من كم ٣٢٩+٧٠٠ إلى كم ٣٣٠+٧٠٠ بطول ١ كم
مرحلة أعمال تشكيل الجسور
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تاريخ المفاوضة: الساعة يوم / / ٢٠٢٣

عدد الصفحات التي يضمها دفتر () بما فيها عدد () رسومات

دفتر المواصفات القياسية
للهيئة العامة للطرق والكباري لسنة
١٩٩٠ يعتبر متمماً لهذا الدفتر.

رئيس الإدارة المركزية

لبحوث الطرق

مهندس /

"حسام بدر الدين"

مدير عام

صيانة الطرق

مهندس /

"منال عمر"

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

رئيس قطاع البحوث والمناطق

مهندس /

"محسن محمد زهران"

رئيس الإدارة المركزية

للمشتون المالية و الإدارية

عميد /

"أبوبكر أحمد حسن عكافي والنقل البري"

الإسلام ٢٠٢٠
٤٨٤ - ٥٢٧ - ٧٣٨ : ٢٩٧٠٩
س.ت



ملحوظة: جمانة ٢٠٢٣

- على المفاوض التوقيع والختم على كل صفحة من صفحات هذا الدفتر : ٤٨٤ - ٥٢٧ - ٧٣٨

س.ت : ٢٩٧٠٩

الشروط الفنية

أولاً: تجهيزات الموقع

- تجهيزات المقاول الموقعية

خلال أسبوع من تاريخ استلام الموقع يلتزم المقاول بإنشاء مكاتب لائقة لجهاز الاشراف والاستشاري مزودة بالأثاث والمكيفات و الحمام و البوفيه بمساحة لا تقل عن 60 متر مسطح وتكون مجهزة بكافة التركيبات والتوصيلات الكهربائية والصحية ومكيفات الهواء والفرش والاثاث المناسب وكذا اجهزة الحاسب الالى بالعدد المناسب وتوفير خدمة الانترنت ومصدر كهربى ٢٢٠ فولت طول اليوم ومصدر للمياه النظيفة الصالحة للشرب وخزان صرف صحى بالاضافة الى وجود كرفان متحرك و يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل بجميع الإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروع بمستوى هندسى وفنى طبقاً للتعاقد وبما يكفل العمل ٢٤ ساعة بنظام الورديات وتوفير جميع المهمات والمستلزمات التي تمكن جهاز الاشراف من السيطرة ومتابعة ومواصلة الأعمال بين المواقع المختلفة بالمشروع وفى حالة تقاعس الشركة عن توفير المستلزمات والمهمات اللازمة المشار إليها بعالية يتم خصم مبلغ ١٠٠٠ جنيه (فقط وقدره الف جنيهاً لاغير) يومياً.

و يلتزم المقاول باجراء الاختبارات اللازمة مع ضمان توصيل العينات واحضار النتائج في وجود طاقم الاشراف بأسلوب آمن بمعمل المنطقة المشرفة والمعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر ومعامل الجامعات والهيئات المختلفة وفى اى وقت يراه جهاز الاشراف والمهندس المشرف

- معمل الموقع

مبنى المعمل:

خلال ٢٠ (ثلاثون يوماً) من تاريخ توقيع العقد يقوم المقاول بإنشاء معمل اختبارات متكامل بالموقع او بمحطة الخلط وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة بجميع مرافقه (اثاث، معدات، أجهزة) وتزويده بالمياه والكهرباء طوال فترة المشروع لإستخدامه فى إجراء التجارب الموقعية وفقاً للتفصيل التالي:

- عدد ٢ مكتب و ٨ مقاعد على الأقل.
- مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ أمبير، وتكييف هواء وإضاءة كافية.
- طاولات وبنشات للعمل من الخشب أو الخرسانة.
- جهاز كمبيوتر أحدث إصدار بمشتملاته مع طابعة ليزر A4 وسكانر.
- مصدر كهرباء ٢٨٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقابس مناسبة لفنن التجفيف.
- أرضيات خرسانية للعمل بسبك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب.
- مصدر للمياه النظيفة وسعة تخزينية لا تقل عن ٧٠٠ لتر.
- وسائل إطفاء الحريق من طفايات والتي يجب ألا تقل عن ٥,٢ كم من سائل الإطفاء موزعة ومعلقة على الحائط فى مكان مناسب ويتم الكشف عليها وشحنها دورياً.
- مراوح طرد.
- ركائز لتثبيت الأجهزة عند اللزوم.
- حمام مائى لمعالجة عينات الخرسانة بمساحة متر مسطح وعمق ٦٠ سم من الخرسانة أو الطوب المنحدر أو أى مادة أخرى مناسبة.

الاختبارات:



يتم تجهيز معمل الموقع وتزويده بالأجهزة اللازمة بحيث تسمح بإجراء الإختبارات القياسية التالية وأية اختبارات أخرى ورد ذكرها بالمواصفات :



الأهرام ٢٠٢٠
ب.ض. : ٧٣٨ - ٥٢٧ - ٤٨٤
س.ت. : ٢٩٧٠٩

Soils		AASHTO/ ASTM
-	Mechanical Analysis of Soils	T 88
-	Determining the Liquid Limit and the Plastic Limit of Soils	T 89
-	Density of Soil In-place by the Sand-Cone Method	T 191
-	Sand Equivalent Test	T 176
-	Moisture Density Relations of Soils using a 10-pound Hammer and 18- inch Drop	T 180
-	California Bearing Ratio (CBR)	T 193

AGGREGATES		AASHTO/ ASTM
-	Mechanical Analysis of Aggregates	T 88
-	Unit Weight of Aggregate	T 19
-	Organic Impurities in Sand for Concrete	T 21
-	Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates	T 84
-	Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates	T 85
-	Resistance to Abrasion of Coarse Aggregate using Los Angeles Machine	T 96
-	Clay lumps and friable particles in aggregate	T 112



CONCRETE

Compressive Strength of Molded Concrete Cubes

Making and Curing Concrete Compressive and Flexural Strength Test Specimens in the Field T 23

Quantity of Water to be used in Concrete T 119

Slump of Portland cement Concrete T 126

Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory T 141

Sampling Fresh Concrete

وتزول ملكية المعدات والأجهزة جميعاً للمقاول بعد إنتهاء الأعمال وتسليم المشروع ويلتزم المقاول بتأمين كافة المتطلبات الموافقة عليها من قبل المهندس واللازمة لأخذ العينات واختبارها وتشغيل المعمل، ويكون المعمل بالقرب من مكتب المهندس أو أى مكان آخر يوافق عليه المهندس، ويتم تزويد المعمل بالفنيين والعمال المهرة ولا يتم إقصاء أى فنى سبق اعتماده للمعمل بالمعمل دون موافقة المهندس المشرف.


وسيتم إجراء كافة الإختبارات المعملية في معمل الموقع و المعامل المركزية بالهيئة وهما المرجع الوحيد لإختبارات الجودة للمشروع ، وفى حال تعذر ذلك فيمكن إجرائها بموافقة الهيئة بأية جهة حكومية تحددها الهيئة أو أية جهة أخرى مستقلة متخصصة ومعتمدة تحددها الهيئة في حال عدم إمكان الفحص في المراكز الحكومية في مصر أو خارجها. هذا و يتم إعتقاد معايير الخلطات و أجهزة المعمل بالموقع من قبل المعامل المركزية بالهيئة .

يقوم المقاول بتوفير مهندس مواد للقيام بالإختبارات المطلوبة طبقاً للعقد على ألا تقل خبرته عن ١٥ عاماً فى إختبارات المواد الترابية ومواد البناء ويكون لديه المؤهل المناسب، ويتم إعتقاد مؤهلاته من المهندس بالإضافة إلى عدد ٢ فنيين مهرة وأية عمالة أخرى لازمة لأخذ العينات وتشغيل المعمل.

مع عدم السماح ببدء العمل فى أى مرحلة من مراحل المشروع الا بعد قيام المقاول بتوفير وتجهيز كافة اجهزة المعمل اللازمة لاجراء الاختبارات المطلوبة لتلك المرحلة وفقاً للبرنامج الزمنى المعتمد .

٢- أجهزة المساحة

المقاول مسئول عن توفير وصيانة احدث الأجهزة المساحية اللازمة لإتمام الأعمال طوال فترة العقد وعليه تأمين محطة رصد متكاملة (Total Station) بكامل الملحقات وجهاز قياس مناسيب (ميزان رقمي) بكامل مشتملاتها، تكون مخصصة لاستخدام الإستشارى أو المهندس المشرف فى تدقيق الأعمال المساحية، والمقاول مسئول عن معايرتها دورياً وإستبدال أى منها فى حال تلفها للصيانة، طبقاً لحدث المواصفات وتوافق عليها الهيئة و تزول ملكيتها للمقاول بعد نهر الاعمال والاستلام الإبتدائى للمشروع



على المقاول في توفير العتد استعداداً لتأثيره عند (٢٠) لوحة مقبولة جند التي بالمقاسات التي تحددتها الهيئة والمشرقة على الموقع وعند نهايته بالاتجاه المعاكس و بالمواقع التي تحددتها الهيئة ، وتقتضين اللوحة اسم المشروع والمالك والمهندس والمقاول وتاريخ بدء

العمل ومدة التنفيذ ، وعلى المقاول الحصول على تصديق الجهات المعنية قبل تثبيتها ، كما يلتزم بإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها وفقاً لتعليمات المهندس ، وتخصص غرامة بواقع ٥٠٠٠ جنيه شهرياً على كل لوحة لا يتم تركيبها .

٥- البرنامج الزمني وبرنامج التوريدات والتدفقات النقدية للأعمال.


يقدم المقاول البرنامج الزمني حسب المبين بالمادة رقم ١٢ بالشروط العامة (من خلال مكتب أو مهندس متخصص ذو شهادات علمية في هذا المجال يعتمد من الهيئة) ويجب أن يكون تسلسل المهام بالبرنامج الزمني منطقياً ومتضمناً تفاصيل كافية لتوضيح الطريقة المقترحة في التنفيذ مع توضيح مدة التنفيذ لكل مهمة وبيان كيفية تداخل الأنشطة وإرتباط بعضها ببعض وذلك وتعرض الأنشطة بحيث توضح المدد الخاصة والتمويل المطلوب للتنفيذ. باستخدام برنامج (Primavera) أو (Microsoft Project) بتجهيز رسومات الورشة التفصيلية لبنود العمل المختلفة وفترات المراجعة والإعتماد ، ويتم تحديث هذا البرنامج شهرياً بواسطة المقاول واعتماده من المهندس ، علي أن يتم إرفاق البرنامج الزمني المعتمد مع أول مستخلص جاري وكذلك تقديم التحديثات للبرنامج الزمني المعتمد مع كل مستخلص جاري . وعلى المقاول أن يقدم للطرف الأول كذلك تقريراً مفصلاً من خلال مهندس المتخصص مع برنامج تنفيذ الأعمال (البرنامج الزمني) بمتابعة المشروع وتحديثه وتقدير للتدفقات النقدية بكل الدفعات التي يستحق الحصول عليها بموجب هذا العقد (Cash Flow) وذلك على فترات شهرية ونصف شهرية ، ويكون جدول الدفع بالصيغة التي يقبلها المهندس وبما يتوافق مع البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال ، كما يكون بالتفصيل الكافي ليتمكن المهندس من تقدير مدى توافق قيمة المدفوعات مع حجم الأعمال المنفذة ، ويجب أن يراعى عند تقديم البرنامج الزمني الأخذ في الاعتبار الأحوال الجوية وتقدير فترات التوقف للبنود طبقاً لطبيعة موقع العمل علماً أنه لن يتم احتساب مدد إضافية عن توقف الأعمال عن الظروف المناخية . و البرنامج الزمني المحدث والمعتمد من المهندس هو المرجعية لحساب المدد الإضافية وفروق الأسعار . سيقوم المقاول بالتعاقد على جميع خامات المشروع بفترة كافية قبل بدء تنفيذ البنود هذا و لن يتم احتساب مدد إضافية أو فروق أسعار عن المواد التي يتم تدبيرها نتيجة التعديلات للبرنامج الزمني للمشروع فيما عدا البتومين والسولار وحديد التسليح والاسمنت.

ثانياً : متطلبات الإنشاء

أ - تأمين سلامة المرور

يجب على المقاول أن يكون مدركاً أن الطريق المطلوب انشاؤه يتصل بطرق قائمة ذات حركة نقل ومرور ، ولذلك يجب عليه تقديم (من خلال مكتب أو مهندس متخصص معتمد من الهيئة) منهجية مفصلة توضح مقترحاته لتجنب الآثار السلبية على حركة وتدفق المرور أثناء تنفيذ مختلف أنواع الإنشاء وذلك من خلال إعداد خطط إدارة وتنظيم المرور التي يجب تطبيقها والإلتزام بها طوال فترة التنفيذ لتأمين أقصى درجة أمان لمستخدمي الطريق ولفريق العمل طبقاً للمواصفات العالمية ، ومستندات العطاء ، ودليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة ، ومتطلبات الجهات المعنية وكافة المتطلبات الواردة بفقرة " التنظيمات المرورية " من متطلبات الإنشاء والمقاول مسئول من تاريخ استلامه موقع العمل عن علاج أي عيوب يكون لها أثر سلبي على الحركة المرورية او تؤدي إلى حوادث تظهر بطول الطريق في سطح الرصف او الأكتاف الجانبية او الحواجز الجانبية او أي من عناصر الطريق .

ويجب أن يتم تنفيذ تلك الخطط بالتنسيق مع الهيئة والسلطات المعنية للمرور والجهات الأمنية والمهندس المشرف والحصول على كافة الموافقات المطلوبة على الخطة قبل بدء التنفيذ ، ويتم الإعلان عن الخطة المعتمدة على الطريق بمسافات كافية تضمن سلامة مستخدمي الطريق وفقاً للخطة المعتمدة وبحيث يتضمن الإعلان كافة التفاصيل من حيث الموقع وموعد البدء والمدة وحركة السرعة مع كروكي توضيحي وذلك على نفقة المقاول دون أية تكلفة إضافية على المالك . ويجب على المقاول تزويد فريق العمل بمهندس متخصص في أعمال السلامة المرورية لتخطيط وتصميم ومتابعة أعمال التخويلات المرورية وتوجيه حركة المرور في مناطق العمل ويطول الطريق بما يتوافق مع دليل وسائل التحكم المروري الصادر عن الهيئة وكافة الأنظمة المرورية المعمول بها بما يكفل السلامة التامة لمستخدمي الطريق والعاملين به أثناء



المشروع، ويتضمن المقاول مسئولية المادية والجسدية عن أي خسارة أو ضرر قد يقع على المنطقة في الطريق أو في الأماكن
العامية بالمشروع تقع بسبب خلالة بغير طلبات أو الامانة المرورية أو تقصيره في المداومة على استعمال وسائل التحكم
المروري وتأمين الحركة المرورية ليلا ونهارا. في كافة مواقع العمل بالمشروع ومهندس السلامة مسئول عن عمل كافة
التسيقات اللازمة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة للحصول على موافقتها على خطط تحويل المرور المؤقت واستصدار أية
تصاريح لازمة بهذا الخصوص ويتحمل المقاول أية تبعات مادية أو قانونية تنتج عن تقصيره في تأمين سلامة المرور وسوف
توقع غرامة مقدارها خمسة آلاف جنيه عن اليوم الواحد في حالة عدم قيام المقاول بعمل الاحتياجات اللازمة لتنظيم حركة
المرور بالموقع هذا بالإضافة الى حق الهيئة في توفير كافة وسائل تأمين سلامة المرور بموقع العمل على حساب المقاول دون حق
اعتراض منه ويلتزم المقاول بتوفير اطقم كاملة من ملابس تأمين السلامة لطاقم جهاز الاشراف ويتضمن ولا يقتصر على :-

- ١- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) خوذة امان .
- ٢- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) غطاء رأس خفيف مقوى بالبلاستيك وبها شريط عاكس ويلون مميز (برتقالي -
اصفر - ازرقي - رصاصي) .
- ٣- عدد ٢٠ (عشرون فقط لا غير) صديري واقي .
- ٤- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) جاكيت شتوي .
- ٥- عدد ٥ (خمسة فقط لا غير) حذاء امان بمقدمة صلب .

على ان تكون جميعها بخامات متميزة ويتم تسليمها لمخازن المنطقة المشرفة علي المشروع وتقديم الافادة المعتمدة بها مع
اول مستخلص جاري .

ب - السجلات



يجب على المقاول وعلى نفقته الخاصة الاحتفاظ طوال مدة سير الأعمال بسجلات لجميع التفاصيل لكل ما يتم تنفيذه،
وكذلك نتائج التجارب العملية وتقديم هذه السجلات في أي وقت للمهندس عندما يطلبها. يجب أن يحتفظ المقاول
بسجلات دائمة للموقع لتسجيل سير تنفيذ الأعمال، ويجب أن يجعل هذه السجلات متاحة دائما وأن يقدم نسخ منها في أي
وقت يطلب منه ذلك، ويجب أن تشمل البيانات المسجلة لكل يوم عمل وفقا لنموذج البيانات الذي يعتمد عليه المهندس وتتضمن
على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

- التاريخ.
- حالة الطقس.
- بدء وانتهاء الأعمال لكل مهمة.
- أسماء مقاولي الباطن وعدد العمالة التابعة له ونوع النشاط الحرفي وموقعه.
- تاريخ تسليم الرسومات والعينات ... إلخ وحالتها.
- تاريخ طلب التسليم وتاريخ التسليم (التوريد - التركيب - التصنيع - ... إلخ) لأي من البنود وحالتها.
- المعدات
- طاقم العمل

ج - أمن وصحة العاملين

يجب على المقاول توفير الأمن والراحة والنظافة والشروط الصحية للعمل والمبيت لجميع العاملين بالمشروع متضمنة العاملين
التابعين لمقاولي الباطن، ويجب توفير مهندس سلامة وقائية (أمن صناعي) مدرب تدريباً جيداً لمتابعة مستوى التأكيد على
إرتدائهم الأمان للعاملين و الزى المناسب (خوذة - حذاء - سترة امان ... إلخ) ، وإذا تبين أن مهندس الأمن غير مناسب لموقعه
فيجب على المقاول إستبداله بمهندس آخر يعتمد عليه المهندس.
ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات او التلفيات
الناتجة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.
ويبدأ التأمين بمجرد استلام الموقع مباشرة وحتى الانتهاء من اعمال الاستلام الابتدائي للعملية ويكون التأمين لعدد (٤) أفراد
بالمقاييس المبينة:-

مهندس (أو اثنين) وسبعون الف جنيه ()
مساعد مهندس او ملاحظ، فتح: ٢٠٠٠ (ثلاثون الف جنيه) للفرد.



عوامل أخرى، أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية، ولا يمكن للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابيه وتحت
وعلى المقاول أن يقدم بوليصة التأمين للهيئة فور استلامه لموقع العملية، ولا يمكن للهيئة أن تقوم بالتأمين على حسابيه وتحت
مستويلته دون أن تكون ملزمة بذلك.
ويجب على المقاول أن يقوم بالتأمين على ممثلي الهيئة وأفراد فريق المهندس المشرف ضد الوفاة والإصابات أو التلفيات
الناجمة عن أي حادث بسبب تنفيذ الأعمال طبقاً للشروط التعاقدية.

د - الوصول للموقع

المقاول مسئول عن تأمين سبل وطرق يوافق عليها المهندس لوصول معداته والعمالين إلى الموقع، ويشمل ذلك تأمين وصول
ممثلي الهيئة والمهندس أو من يمثلهم وكذلك السلطات الرسمية المعنية إلى مواقع الأعمال الجارية تنفيذها.

هـ - إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول عن إزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه أية مواقع
قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع،
ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس واعتماد الهيئة، كما يتكفل المقاول بتنظيف
حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس وبموافقته.

و - استلام المشروع واختبارات التشغيل

عند الانتهاء من الأعمال سيقوم المقاول بتقديم مقترح مع برنامج زمني للفحوصات المطلوبة للإستلام وكافة إختبارات
التشغيل لإعتمادها من المهندس قبل بدء أعمال الإستلام. عندما يحين موعد الإستلام الإبتدائي للأعمال المنتهية يقوم
المقاول وخلال مدة زمنية محددة بإصلاح أية عيوب، وفي حال تخلف المقاول عن تنفيذ هذه الإصلاحات خلال المدة المحددة
يحق للهيئة القيام بتنفيذ الإصلاحات المذكورة بمعرفتها وتخضم التكاليف مع المصاريف الإدارية المترتبة على ذلك من
المستخلص الختامي، على المقاول كذلك المحافظة على الأعمال المنتهية تنفيذها وتجنب وقوع أضرار بسبب الأحوال الجوية
أو أية أعمال أخرى، وأن يقوم ببرمجة أعماله بحيث يتم تنفيذ الطبقة السطحية أو أية تشطيبات في وقت مناسب بحيث لا
تتعرض لأي أذى أو تشويه بسبب الأعمال الأخرى.

ز - الكشف على الأعمال

على المقاول أن يقدم للمهندس كل ما يلزمه من بيانات ومعلومات عن موقع استجلاب المواد ومصادرها وطريقة إعدادها
حتى يتمكن من الكشف عليها واعتمادها، كما سيقوم المهندس المشرف بمراقبة والكشف على الأعمال خلال فترة
التنفيذ وفقاً لخطة الجودة المقدمة من المقاول والمعتمدة من المهندس وسيقوم بإجراء الإختبارات على المواد المستخدمة طبقاً
لمواصفات واشتراطات المشروع، ومن حق المهندس قبول أو رفض أية مواد أو معدات أو طريقة تنفيذ إذا رأى أنها غير مقبولة
أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المقاول تأمين كافة التسهيلات اللازمة للمهندس من أدوات ومعدات وطواقم فنية للقيام
بالكشف والفحوصات العملية. على أن تكون طلبات بدء واستلام الأعمال واعتماد المواد وفقاً للنماذج المرفقة ملحق رقم ٣.

ح - طلب الاستلام


لاستلام الأعمال الموقعية اليومية سيقوم المقاول بإبلاغ المهندس خطياً عن موعد الاستلام بعد تجهيز العمل، وسيقوم
المهندس بالرد بنتيجة الفحص وفقاً للنظام المحدد بوثائق العقد بهذا الخصوص، ويتحمل المقاول مسؤولية إعداد وتوريد
نماذج وطلبات الفحص وفقاً للنماذج الموحدة المعتمدة من الهيئة، ولن يسمح بالبدء بأي نوع من الأعمال دون موافقة خطية من
المهندس.

ط - المواصفات القياسية

تخضع جميع أعمال التنفيذ والمواد المستخدمة والتجارب والإختبارات العملية لزوم ضبط الجودة لإشتراطات ومتطلبات
المواصفات القياسية المذكورة بالبند رقم ١ من مستند المواصفات الفنية وعلى المقاول تأمين نسخة كاملة منها بالموقع.

ي - قياس الأعمال الإضافية بواسطة المقاول والمهندس

إذا تطلب الأمر أن يقوم المقاول بتنفيذ أو توريد أية أعمال يرى أن من شأنها أن تكون إضافية، يعتبرها أعمال إضافية أو
مستحدثة فينبغي عليه الحصول أولاً على أمر كتابي من المهندس معتمد من الهيئة ومن ثم يقوم بقياسها بحضور المهندس أو



في حالة عدم إمكانية التنبؤ بالمشاكل في وقت مبكر، يجب أن تكون هناك خطة بديلة في نفس وقت التنبؤ. في حالة عدم إمكانية التنبؤ بالمشاكل، يجب أن تكون هناك خطة بديلة في نفس وقت التنبؤ. في حالة عدم إمكانية التنبؤ بالمشاكل، يجب أن تكون هناك خطة بديلة في نفس وقت التنبؤ.

ك - المخططات التسقيمية

حسبما يكون ضروريا سيقوم المقاول بإعداد أية رسومات توضح التداخل والعلاقة بين مكونات المشروع والأماكن التي توضع بها لضمان عدم تعارض بعضها البعض أو تعارضها مع الخدمات القائمة وتأكيد أن كل من هذه المكونات يوضع في مكانه الصحيح.

ع - التصميمات

- على المقاول تقديم كافة الرسومات التفصيلية لجميع عناصر المشروع بكامل تفاصيلها (لوحات + نوتة حسابية) وذلك بعد اعتمادها من استشاري المشروع وقبل البدء في العمل للاعتماد من المنطقة المشرفة.

ل - التوثيق

المقاول مسئول عن توثيق الوضع القائم للمشروع كاملا و استخدامات الأراضي وكافة بنود الأعمال قبل المباشرة في التنفيذ وتغيير معالمها وذلك من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وترتيب هذه الوثائق وإعدادها بشكل مهني سليم من قبل متخصصين وفقا لما ورد تفصيلا بالفقرة خامسا بهذه الشروط الخاصة.

م - المواد المستخدمة

يجب أن تفي جميع المواد المستخدمة بكافة متطلبات الجودة والمواصفات المحددة بوثائق العقد وفي خطة ضبط الجودة المعتمدة ويجب أن تكون جميع المواد منتجة أو مصنعة بواسطة شركات معروفة، وتتطابق جودتها مع المواصفات القياسية الموافق عليها.

وأية مواد يقدمها المقاول كبديل لمواد موصوفة بوثائق العقد سيتم مقارنتها من ناحية النوع والوظيفة والجودة والأداء والشكل ويكون قبولها مرهونا بموافقة المهندس وإعتماد الهيئة، وتعتبر كافة المواد الموردة أو الأجهزة المستخدمة في الأعمال الدائمة ملكية خالصة للهيئة ويجب أن يوضح المقاول جميع التفاصيل من حيث النوع والمصنع الذي يجب أن يكون قادر على توريد قطع الغيار والدعم الفني اللازم طوال فترة الاستخدام.

ولن يتم اعتماد أية مواد للاستخدام بالموقع دون تقديم عينات لها مع كافة المعلومات ذات العلاقة وإجراء الاختبارات المطلوبة عليها، ويجب على المقاول نقل وتخزين المواد بصورة لا تعرضها لأي نوع من أنواع التلف أو تؤثر على خواصها وتخزن كافة المواد الموردة وفقا لتوصيات المورد، وعلى المقاول التنسيق مع الموردين في وقت مبكر لبرمجة عمليات توريد المواد بحيث لا تتسبب في أي تعطيل لعمليات الإنشاء ضمن برنامج التوريدات وضمن البرنامج العام المعتمد للمشروع.

أية مواد يتم استخدامها دون إذن كتابي أو موافقة المهندس ستكون على مسؤولية المقاول وقد تتعرض لعدم القبول وعدم الإدراج في الدفع وسيتم رفض أية مواد مخالفة ويكون المقاول مسئولا عن استبدالها دون أي تأخير أو معاملة.

ن - حماية الأعمال من أحوال الطقس



يجب على المقاول حماية الأعمال المنفذة والمواد المشونة من عوامل الطقس، وفي حالة تلف أي منها يقوم بإصلاحها أو استبدالها على نفقته طبقا لتوجيهات المهندس، وعلى المقاول عمل احتياطاته لمنع التأثير السلبي للعواصف الرملية على السطح النهائي للأعمال. وفي حالة حدوث أي تأثير سلبي تتم الإزالة أو المعالجة على نفقة المقاول الخاصة وفقا لتوجيهات المهندس، ولا يتم استكمال الأعمال في مناطق تأثرت سابقا بالعواصف الرملية دون الرجوع إلى المهندس المشرف.

ش - ملء الحفر والجسات

فور استكمال أي جزء من الأعمال، يقوم المقاول بملء أي حفر أو أماكن جسات هي ليست جزء من المشروع على نفقته بنفس نوع الطبقة، مع إزالة أية مواد لا يتم احتياجها في أعمال الإنشاء.

غ - الأعمال المؤقتة

يقوم المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المؤقتة اللازمة لاستكمال الأعمال، على أن يقدم المقاول خطة لها لاعتمادها قبل إجراءات تنفيذها، والمقاول مسئول عن أية تلفيات ناتجة عن هذه المنشآت المؤقتة، وعلى المقاول الحصول على موافقة



ثالثاً: التنظيمات المرورية

أ- التقيد بأنظمة المرور والسلامة

على المقاول التقيد بكافة أنظمة المرور فيما يتعلق بأعمال النقل والحمولات والأوزان وانتظار الشاحنات على الطريق السريع ورسوم المرور، ويعتبر سعر العقد مشمولاً بالالتزام بهذه الأنظمة. وعندما يكون هناك حاجة بموجب المواصفات أو حاجة العمل لوضع خطة التحكم لحركة المرور بسبب الأعمال أو بموجب ما تتطلبه الأنظمة المرورية أو بموجب توجيهات المهندس لضمان سلامة الأشخاص أو لعدم إعاقة حركة المرور على الطرق المتقاطعة يقوم المقاول وعلى نفقته إن لم تنص بنود العقد على غير ذلك بتوريد وتركيب كافة مستلزمات إدارة الحركة المرورية بما في ذلك إنشاء تحويلات مؤقتة وتثبيت حواجز خرسانية متحركة وضمان ثباتها وكافة أعمال الحماية والتخطيط والدهانات والعلامات الإرشادية والمقبات الإصطناعية والإقعام والبراميل البلاستيكية حسب متطلبات السلطات المعنية وباعتماد من المهندس، كما يتولى المقاول إزالة هذه الترتيبات عند انتهاء الحاجة إليها.

ب- مخططات تنظيم المرور المؤقتة

مع التوصيف الكامل لمراحل الإنشاء يقوم المقاول بإعداد رسومات ورشة تفصيلية (Shop Drawings) وأعمال التحويلات المؤقتة المطلوبة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ وفقاً لترتيب وأولويات برنامج العمل، ويتم تقديم هذه الرسومات للمهندس للموافقة قبل تقديمها لشرطة المرور أو الإدارات المعنية الأخرى للاعتماد، ويتحمل المقاول مسئولية الحصول على موافقة كافة هذه الإدارات والمهندس والمالك قبل الشروع في العمل.

ج- الحواجز المؤقتة والأقعام البلاستيكية

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة الحواجز الخرسانية المؤقتة والأقعام البلاستيكية ومستلزمات أمن وسلامة المرور الأخرى حيثما يلزم عند غلق الطريق كلياً أو جزئياً وكذلك إزالتها حين انتهاء الحاجة إليها أو عندما يكون العمل جارياً وذلك بهدف توجيه حركة المرور في مناطق تنفيذ الأعمال، كذلك يقوم المقاول بتقديم عينات منها للإعتماد من المهندس. يقوم المقاول كذلك بنقل وإعادة تركيب هذه الحواجز والأقعام حسب متطلبات تنفيذ الأعمال وتوالى مراحلها. كذلك يتم تزويد الحواجز المؤقتة بمصابيح إنارة صفراء متواصلة ثابتة (أو متقطعة) وميضية (وتوضع لتحديد جوانب التحويل لتحذير مستخدمي الطريق، ويجب تركيب هذه المصابيح بحيث تبين الحواجز بوضوح دون الاعتماد على أنوار السيارة.

د- أعمال السلامة المؤقتة

يلتزم المقاول بتوريد وتركيب وصيانة كل ما يلزم لتأمين أعمال الحفر والمرافق القائمة والخدمات والتحويلات المرورية لزوم تأمين سلامة وأمان الجمهور ومستخدمي الطريق والعاملين بالمشروع حسب تعليمات المهندس وباعتماد منه ويتم فكها وإزالتها عند انتهاء الحاجة إليها.


هـ- أعمدة الإنارة المؤقتة

في جميع الحالات سيكون على المقاول استخدام مولدات خاصة لتوفير مصدر تغذية بالكهرباء لإنارة التحويلات المؤقتة ومناطق العمل، وفي حال تطلب الأمر أو بطلب من المهندس يتم تزويد هذه التحويلات بأعمدة إنارة مؤقتة فعلى المقاول تنفيذ ذلك طبقاً لخطة تأمين سلامة المرور المعتمدة، ويتحمل المقاول مسؤولية تأمين مصادر الكهرباء اللازمة لتشغيل نظام الإنارة المؤقتة بما في ذلك الكابلات والمفاتيح والمستلزمات الأخرى حسب الأصول الفنية.

يقوم المقاول بإعداد الرسومات التفصيلية (Shop Drawings) المقترح وتقديمها للمهندس للإعتماد، كما يلتزم المقاول بالحفاظ على نظام الإنارة المؤقتة وصيانتها وتشغيله طيلة الفترة الزمنية اللازمة ومن ثم إزالته بعد انتهاء العمل وفقاً لتعليمات المهندس وموافقته.

و- حاملي الرايات

يلتزم المقاول بتعيين أشخاص مدربين في الأماكن التي يحددها المهندس تكون مهمتهم الوحيدة هي تحذير مستخدمي الطريق وتوجيه حركة المرور عند بداية وحول مناطق تنفيذ الأعمال، ويتم تزويدهم ببزات (رداءات) فسفورية عاكسة أثناء العمل لظهورهم وضمان سلامتهم.



١ - التقرير المبدئي :
يتم إعداد التقرير المبدئي من تاريخ توقيع العقد ، يقوم المقاول بتجهيز و تسليم أربعة نسخ من التقرير المبدئي ، ويحتوي على وصف دقيق
للطريق (المناسيب الطولية - المقاطعات العرضية - المنحنيات الرأسية والافقية - ...) وهكذا أماهكن انهيارات حسر الطريق
(دوائر الانزلاق) وتقديم خطة العمل وأعمال التجهيز والأعمال المؤقتة وبرنامج المشتريات وتوريد المواد وطريق العمل والبرنامج
الزمني المفصل وطريقة التنفيذ لمراحل المشروع المختلفة ، وكذلك خطة ضبط الجودة و خطة السلامة و الأمن الصفاى .
كما يلتزم خلال شهر من تاريخ توقيع العقد بتقديم دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع الى الهيئة او الجهات المانحة
للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع ويكون اجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والاسس والاحمال
النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة للمشروع وذلك كله طبقا لاحكام المادة (١٩) من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤
والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ .

يسلم مع التقرير المبدئى تقرير توصيف و توثيق الموجودات بالموقع المدعم بالتصوير المرئى (فيديو) ، والتصوير الفوتوغرافى
والذى يجب اعداده قبل البدء فى العمل كما هو مطلوب بالبند الخاص بتوثيق المشروع من متطلبات الانشاء ، ويشكل منتظم
يقوم المقاول بتحديث كافة هذه المعلومات وتقديمها للمهندس فى اوقات محددة أو حينما يطلب منه ذلك .
ويحق للهيئة توقيع غرامة قدرها ٥٠٠٠ جنيه عن كل يوم تأخير فى تقديم التقرير المبدئى .

ب - التقارير الشهرية والاسبوعية :

يقوم المقاول باعداد وتقديم عدد (٤) نسخة ورقية و عدد ٢ نسخة رقمية (تقرير عن تقدم الاعمال يتم تقديمه للمهندس وممثل
الهيئة ولوحدة متابعة المشروعات بالهيئة كل اسبوعين و يتضمن الاتى :

- جميع الاعمال المنفذة و الانشطة خلال الشهر المنصرم .
 - تقدم الاعمال المنفذة بالمقارنة مع برنامج العمل المعتمد و بيان التأخير (ان وجد) مع المبررات و خطة المقاول لمعالجة
هذا التأخير .
 - أى معوقات أو مشاكل خلال فترة اعداد التقرير .
 - تفاصيل زيارات المسئولين للموقع
 - بيان بالمعدات وفريق العمل .
 - تقرير نتائج اختبارات المواد و ضبط الجودة .
 - العمالة المستخدمة و اية تفصيلات بالوظائف الرئيسية .
 - خطة العمل للشهر التالى .
 - تحديث البرنامج الزمني للاعمال .
 - تقرير بالصور الفوتوغرافية و شرائط الفيديو لتسجيل ما يتم تنفيذه من أعمال .
- علي ان يتم ارفاق التقارير الاسبوعية والشهرية المعتمدة مع كل مستخلص جاري وفي حالة عدم تقديمها يتم توقيع
غرامة ١٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير الاسبوعى ومبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه فى حالة عدم تقديم التقرير
الشهرى .

ج - التقرير النهائى للمشروع :

فى خلال ٢٠ يوما من تاريخ شهادة اصدار اتمام الاعمال من قبل المهندس يقوم المقاول بتسليم (٤) أربع نسخ من تقرير المشروع
النهائى مع ادلة الصيانة (Maintenance and Operation Mannuals) . يتضمن التقرير كافة سجلات أعمال
الانشاء ، و رسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية ، و ضمانات أية أعمال موردة وكافة بيانات المشروع ،
و يتم تقديم كافة هذه البيانات و الرسومات بملفات منظمة وبالطريقة التى يوافق عليها المهندس لمراجعتها و الموافقة عليها
من قبل المهندس .

وتسوف يتم تسليم الرسومات حسب التنفيذ As Built Drawings التفصيلية من المقاول معتمدة وبخاتم المقاول
والاستشاري للأعتماد من المهندس المشرف وكافة جهات المرافق التى لها صلة بتنفيذ الاعمال و يتم تسليم (٥) نسخ ورقية
ورقمية على أقراص مدمجة على ان توضح هذه اللوحات جميع الاعمال وعناصر الطريق وتشمل التخطيط والقطاع العرضى



تحت إعداد الصور الفوتوغرافية وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة يلتزم المقاول بصفة دورية بإعداد وتجهيز صور فوتوغرافية يتم التقاطها من قبل فني متخصص أثناء وبعد التنفيذ لكافة

- اسم صاحب العمل
- اسم المهندس
- اسم المقاول
- رقم الصورة
- وصف وتعريف الصورة
- وقت وتاريخ أخذ الصورة

وتبقى النسخة الإلكترونية للصور الديجيتال (أو النيجاتيف) لحين انتهاء كامل المشروع مع تقديمها مع المستخلص الختامي ولن يتم الصرف الا في حالة تقديمها للمنطقة المشرفة علي المشروع ، كما يجب الا يتم عرض أي من هذه الصور والمستندات إلى أي من وسائل الاعلام إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

خامساً : توثيق المشروع

بخلاف الصور الفوتوغرافية وتصوير الفيديو المطلوب تقديمه مع تقارير الإنجاز الشهرية وبدون أي تكلفة إضافية فسيكون مطلوباً من المقاول اعداد ملفاً لتوثيق المشروع كاملاً بمراحله المختلفة بالتصوير المرئي (فيديو والصور الفوتوغرافية موضحاً عليها البيانات المطلوبة لصور التقرير الشهري.

ويكون التوثيق بالفيديو ابتداءً من استلام الموقع وحتى الإنتهاء من كافة الأعمال بحيث يتضمن الملف تصوير مناطق المشروع كاملة بالفيديو قبل بدء العمل لإظهار حالة ووضع الطريق ومشمولاته وكافة الموجودات وخاصة تلك التي قد تتأثر أو يتغير حالها من جراء تنفيذ الأعمال للرجوع إليها إذا لزم الأمر، ويتم تصوير نفس هذه المواقع بعد انتهاء الأعمال ويتم تركيب الصور بصورة ملائمة مع إعداد عرض حركي (Animation) لإظهار أعمال التطوير، ويتم تسليم عدد ٢ نسخ من ملف توثيق الموجودات بالموقع قبل بدء العمل مع التقرير المبدئي، ويسلم ملف التوثيق كاملاً مع الإستلام الإبتدائي للمشروع أو حينما يطلبه المهندس.

سادساً : إنهاء المشروع وإخلاء الموقع

المقاول مسئول وعلى نفقته بإزالة أية مخلفات نتيجة الأعمال وأن يقوم بتنظيف الموقع قبل تسليم أي عمل يتم الإنتهاء منه وأية مواقع قام باستخدامها وذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماده، ويقوم المقاول بإزالة المنشآت المؤقتة والمواد الزائدة وتنظيف الموقع، ولا يتم عمل المستخلص الختامي إلا بعد القيام بذلك طبقاً لتعليمات المهندس وإعتماد الهيئة ، كما يتكفل المقاول بتنظيف حرم الطريق وتثبيت وتهذيب الميول وتنظيف الموقع الذي يشغله وتسويته حسب تعليمات المهندس واعتماد الهيئة.

سابعاً : شمولية الأسعار

هذا العقد مبني على أساس الكميات المقاسة وفقاً لما يتم تنفيذه فعلياً بالموقع وسيتم الدفع عنها وفقاً للفتات المقدمة بالعرض المالي لبنود الأعمال الموصفة بقائمة الكميات المعتمد من الهيئة، وتعتبر الأسعار المقدمة من المقاول شاملة كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة وشاملة أي أعمال ذكر بأي من مستندات العقد أنها على نفقته أو يلتزم بها المقاول والتي يتحملها المقاول لإنجاز ونهـو الأعمال وفقاً للمواصفات والشروط الواردة بمستندات العقد بما فيها كافة الضرائب والتأمينات والدمغات والرسوم بمختلف أنواعها التي نظمها القانون ، ومن ضمن هذه التكاليف العناصر الأساسية التالية:



تتضمن تكاليف الأعمال والتجهيز تكلفة الإعداد للمعلومات المطلوبة، واستحداث مفاتيح المواد وأجهزة الاختبارات المطلوبة عليها، وكذلك أي اختبارات يتم داخل مصنع أو خارجها، والالتزام بالأعمال المتفرقة للقيام بها، والأعمال المساحية الأساسية، وعمل أية أبحاث تأسيسية، وتغطية الأعمال المؤقتة، وأنشاء وتجهيز مكاتب المقاول وممثلى الهيئة والمهندس المشرف، وكذلك تكاليف أعمال الصيانة لمكاتب الموقع لممثلى الهيئة وطواقم الإشراف طوال فترة التنفيذ، وتأمين الاتصالات وإعداد وتجهيز معمل الموقع، وإعداد وتجهيز وتشغيل محطات التشغيل من خلاطات وكسارات، وتوفير وتأمين المخازن والورش، والتزويد بالمياه والكهرباء، ونقل المعدات، ووسائل الانتقال وكافة التجهيزات الأخرى، كما تشمل تكلفة استصدار أية موافقات نظامية أو تصاريح وما يتبعها من رسوم، وتكلفة إعداد وتثبيت لافتات المشروع المحددة بالمواصفات وإعداد الرسومات والحسابات التصميمية ورسومات الورشة التفصيلية (Workshop Drawings)، وتوفير الأكواد والمواصفات المطلوبة، وأعمال الأمن والحراسة طوال فترة المشروع، وتتضمن التكلفة فك وإزالة المنشآت المؤقتة كالمكاتب ومخازن وسكن العمال ومحطات التشغيل والمعدات وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بموافقة المهندس، واعتماد المالك.

ب - تكلفة الإنشاء

المقاول مسئول عن كافة تكاليف الإنشاء وتشمل تكلفة تأمين العمالة والمواد والمعدات وتكلفة النقل والمحروقات وتكلفة إنشاء التحويلات المؤقتة وإزالتها بعد الإنتهاء منها، وتكاليف حماية الخدمات القائمة وفقاً لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتكلفة نقل المواد واختبار العينات بمعمل الموقع أو العامل المستقلة وكل ما يلزم لتحقيق متطلبات خطة الجودة المقدمة من المقاول ويتم اعتمادها من قطاع الجودة بالهيئة. هذا وسيكون المقاول ملزماً عن تقديم تفاصيل إضافية مع تحليل أسعار لتكلفة الإنشاء لجميع البنود الواردة بقوائم كميات تنفيذ حينما يطلب المهندس أو الهيئة ذلك.

ج - تكلفة الاصلاح وعلاج العيوب خلال فترة الضمان

المقاول مسئول عن كافة تكاليف أعمال الاصلاح وعلاج العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان والضمان وذلك إعتباراً من تاريخ الإستلام الإبتدائي، ويعتبر سعر العقد شاملاً تكلفة المواد والعمالة المتخصصة والمعدات وقطع الغيار المطلوبة خلال فترة الضمان.

د - تكاليف أخرى

المقاول مسئول وعلى نفقته القيام بالأعمال التالية:

- اختبارات المواد والأعمال المكتملة وفقاً لمتطلبات العقد.
- أعمال إزالة المخلفات وتسوية الموقع وتهذيب الميول.
- معالجة الأعمال غير المقبولة واستبدال المواد غير المطابقة (المرفوضة من المهندس أو الهيئة)
- أية تكاليف زائدة بسبب العمل يوم الجمعة أو العمل ليلاً أو في الإجازات الرسمية.
- أعمال ومهمات ومستلزمات الأمن (تكاليف الأسوار والحراسة والتأمين والتصاريح اللازمة لمباشرة العمل)
- تكلفة استصدار الضمانات البنكية.
- حماية المرافق والخدمات القائمة.
- إعداد الرسومات حسب المنفذ (As built) لبنود العمل المختلفة.
- بوالص التأمين بكافة أنواعها وفقاً لما نص عليه القانون وشروط العقد.

ثامناً : مدة العقد

يلتزم المقاول بتنفيذ وإتمام جميع الأعمال المبينة في العقد خلال مدة ٨ شهور ، وتسرى هذه المدة إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع كلياً أو جزئياً إلى المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل ممثل الهيئة والمهندس والمقاول .

تالياً : التزامات المقاول عن الأعمال الاستشارية

- في حالة زيادة مدة تنفيذ الأعمال عن مدة التعاقد يتحمل المقاول دفع اتعاب استشاري الهيئة خلال المدة الإضافية عن التعاقد في حالة التأخير بسبب المقاول.



مستفادة المعدة وسنة الصنع وحالتها الراغبة
التاريخ المتوقع لتواجد المعدات بأنواعها المختلفة بالموقع وفقاً لخطة عمل المقاول .
يتم تحديد الحد الأدنى للمعدات وتوقيتاتها بدقة فور استلام الموقع بمعرفة المهندس على ضوء جدول
الكميات والبرنامج الزمني) وما يحدده المهندس ملزم للمقاول ويحق للمهندس رفض أي من هذه المعدات
أو استبدالها أو زيادة عددها عن الحد الأدنى أو إحضار أية معدات أخرى إضافية قد يراها ضرورية
لاستكمال الأعمال ولا يتم خروج أي معدة من الموقع إلا بتصريح من المهندس
لا يتم السماح بالعمل في المشروع إلا بعد توفير الحد الأدنى للمعدات اللازم لتنفيذ كل مرحلة طبقاً
للبرنامج الزمني وهي حالة عدم التزام المقاول بتوفير الحد الأدنى للمعدات كما جاء اعلاه يتم خصم مبلغ
١٠٠٠ جنيه
(الف جنيه فقط لا غير) كقيمة متوسطة عن كل يوم تأخير في توفير المعدة الواحدة. ولا تعفي تلك
الخصومات المقاول من التزاماته المقررة بموجب العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.

تابع ملحق رقم ١
نموذج رقم (٢) فريق العمل

التخصص	عدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
١. مدير التنفيذ للطرق	١	١٠ سنة
٢. مدير المكتب الفني	١	٥ سنة
٣. مدير ضبط الجودة	١	٥ سنة
٤. مدير السلامة الوقائية	١	١٠ سنة
٥. مهندس تنفيذ طرق	١	٥ سنوات
٦. مهندس صيانة (ميكانيكا وكهرباء)	١	٥ سنوات
٧. مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	١	٥ سنوات
٨. مراقب تنفيذ / فني مواد	٢	٥ سنوات
٩. حاسب كميات	١	٥ سنوات
١٠. فني سلامة مرورية	٢	٥ سنوات
١١. مساح	٢	٧ سنوات

يتم حصول مهندسو التنفيذ والمواد والمساحين على الدورات التدريبية المناسبة لتخصصهم في مركز
التدريب التابع للهيئة العامة للطرق والكباري .
يحدد المهندس الحد الأدنى بموافقة المالك وفقاً لمتطلبات العمل والبرنامج الزمني



الأهرام ٢٠٢٠
ب.ض : ٧٣٨ - ٥٢٧ - ٤٨٤
س.ت : ٢٩٧٠٩

وحتى لو كان المبلغ ٥٠٠٠ جنيه (ألف جنيه فقط لا غير) يومياً في حال عدم تواجد مدير المشروع
بدون عذر يقبله المهندس ومبلغ ٥٠٠ جنيه (خمسمائة جنيه فقط لا غير) يومياً مكنية مديراً في
حال عدم تواجد أي من باقي فريق العمل ولا تعفي تلك الخصومات المقتول من التزاماته المقررة بموجب
العقد في حال تأخره عن تنفيذ الأعمال.



MP
الإسلام ٢٠٢٠
ب.ض : ٧٢٨ - ٥٢٧ - ٤٨٤
س.ت : ٢٩٧٠٩





محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الأول
(العين السخنة - العلمين) (قطاع برج العرب - العلمين) لتنفيذ أعمال تشكيل
الجسور المسافة من كم ٣٢٩+٧٠٠ الى كم ٣٣٠+٧٠٠ بطول ١,٠ كم
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الأهرام ٢٠٢٠

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٧) بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠

إنه في يوم/ الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٢- السيد المهندس / مارجريت مجدي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٣- السيد المهندس / حاتم حمدي الشافعي محمد مدير مشروع الشركة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٣/٨/٠١ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣- السيد / حاتم حمدي الشافعي محمد مدير مشروع الشركة

٢- السيد / مارجريت مجدي مهندس العملية

١- السيد / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس //

"هاني محمد محمود طه"



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع : القطر الكهربائى فائق السرعة قطاع (برج العرب - العميد) تنفيذ شركة الأهرام 2020 للمقاولات العامة و رصف الطرق القطاع من المحطة 329+700 الي 330+700 مرحلة أعمال تشكيل الجسور

رقم البند و بيانه : (1-3) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات

تنفيذ : منشأة الأهرام 2020

مقدار العمل السابق : 38783.2 م 3 كمية المقايضة 55,083.025 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
95.00	4.75	20	329+820	329+800	57	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى متمسك 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
95.00	4.75	20	329+820	329+800	58	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	59	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	60	
1135.20	5.16	220	330+080	329+860	61	
269.00	2.69	100	330+180	330+080	62	
168.00	2.80	60	330+240	330+180	63	
616.00	2.80	220	330+080	329+860	64	
280.00	2.80	100	330+180	330+080	65	
168.00	2.80	60	330+240	330+180	66	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	67	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	68	
616.00	2.80	220	330+080	329+860	69	
280.00	2.80	100	330+180	330+080	70	
168.00	2.80	60	330+240	330+180	71	
280.00	2.80	100	330+180	330+080	72	
224.00	2.80	80	329+780	329+700	73	
336.60	5.61	60	329+860	329+800	74	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	75	
224.00	2.80	80	329+780	329+700	76	
616.00	2.80	220	330+080	329+860	77	
602.80	2.74	220	330+080	329+860	78	
911.20	2.68	340	330+200	329+860	79	
224.00	2.80	80	329+780	329+700	80	
93.80	4.69	20	329+820	329+800	81	
890.80	2.62	340	330+200	329+860	82	
248.00	3.10	80	329+780	329+700	83	
168.00	2.80	60	329+860	329+800	84	
877.20	2.58	340	330+200	329+860	85	
214.40	2.68	80	329+780	329+700	86	
208.00	2.60	80	329+780	329+700	87	
156.00	2.60	60	329+860	329+800	88	
748.00	2.20	340	330+200	329+860	89	
200.00	2.50	80	329+780	329+700	90	
150.00	2.50	60	329+860	329+800	91	
150.00	2.50	60	329+860	329+800	92	
196.80	2.46	80	329+780	329+700	93	
162.00	2.70	60	329+860	329+800	94	
108.00	2.70	40	330+240	330+200	95	
156.00	2.60	60	329+860	329+800	96	
104.00	2.60	40	330+240	330+200	97	
187.80	3.13	60	329+860	329+800	98	
125.20	3.13	40	330+240	330+200	99	
12927.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					
51711.00	الاجمالي الكلى (م ³)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد حبيب
الأهرام 2020
ب. ق. ٧٢٨ - ٧٢٧ - ٤٨٤
س. ق. ٢٩٧٠٩

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع : القطر الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العميد) تنفيذ شركة الأهرام 2020 للمقاولات العامة و رصف الطرق القطاع من المحطة 329+700 الى 330+700 مرحلة أعمال تشكيل الجسور

رقم البند و بيانه : (1-3) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للتربة بنسبة 80%)

توقيع : منشأة الأهرام 2020

3م 31026.6

مقدار العمل السابق :

بيان الاعمال بالمقايسة		رقم الطلب	الموقع الكيلومتری		الابعاد (متر)		نسبة العلاوة 80%	الكمية
من	الى		طول	مساحة المقطع				
بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالعباد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك 95% بحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوه 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافه 2 كم .	329+800	329+820	20	4.75	80%	76.00		
	329+800	329+820	20	4.75	80%	76.00		
	329+800	329+820	20	4.75	80%	76.00		
	329+800	329+820	20	4.75	80%	76.00		
	329+860	330+080	220	5.16	80%	908.16		
	330+080	330+180	100	2.69	80%	215.20		
	330+180	330+240	60	2.80	80%	134.40		
	329+860	330+080	220	2.80	80%	492.80		
	330+080	330+180	100	2.80	80%	224.00		
	330+180	330+240	60	2.80	80%	134.40		
	329+800	329+820	20	4.75	80%	76.00		
	329+800	329+820	20	4.75	80%	76.00		
	329+860	330+080	220	2.80	80%	492.80		
	329+860	330+080	220	2.74	80%	482.24		
	329+860	330+200	340	2.68	80%	728.96		
	329+700	329+780	80	2.80	80%	179.20		
	329+800	329+820	20	4.69	80%	75.04		
	329+860	330+200	340	2.62	80%	712.64		
	329+700	329+780	80	3.10	80%	198.40		
	329+800	329+860	60	2.80	80%	134.40		
	329+860	330+200	340	2.58	80%	701.76		
	329+700	329+780	80	2.68	80%	171.52		
	329+700	329+780	80	2.60	80%	166.40		
	329+800	329+860	60	2.60	80%	124.80		
	329+860	330+200	340	2.20	80%	598.40		
	329+700	329+780	80	2.50	80%	160.00		
	329+800	329+860	60	2.50	80%	120.00		
	329+800	329+860	60	2.50	80%	120.00		
	329+700	329+780	80	2.46	80%	157.44		
	329+800	329+860	60	2.70	80%	129.60		
	330+200	330+240	40	2.70	80%	86.40		
	329+800	329+860	60	2.60	80%	124.80		
	330+200	330+240	40	2.60	80%	83.20		
	329+800	329+860	60	3.13	80%	150.24		
	330+200	330+240	40	3.13	80%	100.16		
	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)		10342.24					
	الاجمالي الكلي (م ²)		41368.80					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب م / خالد فتاح

مهندس الاستشاري
م / محمد خليل

مهندس الشركة

2020
ب. ق. ص. : ٢٣٨ - ٥٢٧ - ٤٨٢
٢٩٧٨٩٩

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - المعيمد) تنفيذ شركة الأهرام 2020 للمقاولات العامة و رصف الطرق القطاع من المحطة 329+700 الي 330+700 مرحلة أعمال تشكيل الجسور

رقم البند و بيانه : (1-3) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة مسافة النقل للرمال بنسبة 20%)

تسقيف : منشأة الأهرام 2020

مقدار العمل السابق : 7756.6 م3

الكمية	نسبة العلاوة 20%	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
		مساحة المقطع	طول	الى	من		
19.00	20%	4.75	20	329+820	329+800	57	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها استخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و سمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الاكتاف (تسوية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه لاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات لوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية الرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك 95% يحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة و التقصان . السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى سافة 2 كم .
19.00	20%	4.75	20	329+820	329+800	58	
19.00	20%	4.75	20	329+820	329+800	59	
19.00	20%	4.75	20	329+820	329+800	60	
227.04	20%	5.16	220	330+080	329+860	61	
53.80	20%	2.69	100	330+180	330+080	62	
33.60	20%	2.80	60	330+240	330+180	63	
123.20	20%	2.80	220	330+080	329+860	64	
56.00	20%	2.80	100	330+180	330+080	65	
33.60	20%	2.80	60	330+240	330+180	66	
19.00	20%	4.75	20	329+820	329+800	67	
19.00	20%	4.75	20	329+820	329+800	68	
123.20	20%	2.80	220	330+080	329+860	69	
56.00	20%	2.80	100	330+180	330+080	70	
33.60	20%	2.80	60	330+240	330+180	71	
56.00	20%	2.80	100	330+180	330+080	72	
44.80	20%	2.80	80	329+780	329+700	73	
67.32	20%	5.61	60	329+860	329+800	74	
19.00	20%	4.75	20	329+820	329+800	75	
44.80	20%	2.80	80	329+780	329+700	76	
123.20	20%	2.80	220	330+080	329+860	77	
120.56	20%	2.74	220	330+080	329+860	78	
182.24	20%	2.68	340	330+200	329+860	79	
44.80	20%	2.80	80	329+780	329+700	80	
18.76	20%	4.69	20	329+820	329+800	81	
178.16	20%	2.62	340	330+200	329+860	82	
49.60	20%	3.10	80	329+780	329+700	83	
33.60	20%	2.80	60	329+860	329+800	84	
175.44	20%	2.58	340	330+200	329+860	85	
42.88	20%	2.68	80	329+780	329+700	86	
41.60	20%	2.60	80	329+780	329+700	87	
31.20	20%	2.60	60	329+860	329+800	88	
149.60	20%	2.20	340	330+200	329+860	89	
40.00	20%	2.50	80	329+780	329+700	90	
30.00	20%	2.50	60	329+860	329+800	91	
30.00	20%	2.50	60	329+860	329+800	92	
39.36	20%	2.46	80	329+780	329+700	93	
32.40	20%	2.70	60	329+860	329+800	94	
21.60	20%	2.70	40	330+240	330+200	95	
31.20	20%	2.60	60	329+860	329+800	96	
20.80	20%	2.60	40	330+240	330+200	97	
37.56	20%	3.13	60	329+860	329+800	98	
25.04	20%	3.13	40	330+240	330+200	99	
2585.56		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)					الاجمالي الكلي (م ³)
10342.20							

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
أحمد محمد
ب. ض. : ٧٢٨ - ٥٢٧ - ٤٨٤
س. ت. : ٢٩٧٠٩

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العميد) تنفيذ شركة الأهرام 2020 للمقاولات العامة و رصف الطرق القطاع من المحطة
329+700 الي 330+700 مرحلة أعمال تشكيل الجسور
رقم البند و بياته : (1-3) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات (علاوة تحصيل رسوم وكارتات
الموازين والرسوم للوطنية للطرق)
توقيع : منشأة الأهرام 2020

38783.2 م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
95.00	4.75	20	329+820	329+800	57	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
95.00	4.75	20	329+820	329+800	58	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	59	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	60	
1135.20	5.16	220	330+080	329+860	61	
269.00	2.69	100	330+180	330+080	62	
168.00	2.80	60	330+240	330+180	63	
616.00	2.80	220	330+080	329+860	64	
280.00	2.80	100	330+180	330+080	65	
168.00	2.80	60	330+240	330+180	66	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	67	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	68	
616.00	2.80	220	330+080	329+860	69	
280.00	2.80	100	330+180	330+080	70	
168.00	2.80	60	330+240	330+180	71	
280.00	2.80	100	330+180	330+080	72	
224.00	2.80	80	329+780	329+700	73	
336.60	5.61	60	329+860	329+800	74	
95.00	4.75	20	329+820	329+800	75	
224.00	2.80	80	329+780	329+700	76	
616.00	2.80	220	330+080	329+860	77	
602.80	2.74	220	330+080	329+860	78	
911.20	2.68	340	330+200	329+860	79	
224.00	2.80	80	329+780	329+700	80	
93.80	4.69	20	329+820	329+800	81	
890.80	2.62	340	330+200	329+860	82	
248.00	3.10	80	329+780	329+700	83	
168.00	2.80	60	329+860	329+800	84	
877.20	2.58	340	330+200	329+860	85	
214.40	2.68	80	329+780	329+700	86	
208.00	2.60	80	329+780	329+700	87	
156.00	2.60	60	329+860	329+800	88	
748.00	2.20	340	330+200	329+860	89	
200.00	2.50	80	329+780	329+700	90	
150.00	2.50	60	329+860	329+800	91	
150.00	2.50	60	329+860	329+800	92	
196.80	2.46	80	329+780	329+700	93	
162.00	2.70	60	329+860	329+800	94	
108.00	2.70	40	330+240	330+200	95	
156.00	2.60	60	329+860	329+800	96	
104.00	2.60	40	330+240	330+200	97	
187.80	3.13	60	329+860	329+800	98	
125.20	3.13	40	330+240	330+200	99	
12927.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)					
51711.00	الاجمالي الكلي (م ²)					

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد خليل

2020

التوقيع /
