

محضر استلام موقع

مشروع: القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العنمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+ 000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية .

تنفيذ: شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/246) بتاريخ 2023/08/22

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2023/08/23 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس/ محمد حسني قياض
- 2- السيد المهندس /ابراهيم عبد الله الحناوي
- 3- السيد المهندس/علاء سلامة علي
- مدير عام المشروعات
- مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- مدير مشروع - شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2023/08/23 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- علاء سلامة علي

2- محمد حسني قياض

1- ابراهيم عبد الله الحناوي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى

مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"

بخصوص :- اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع
القطار الكهربائى السريع بطول ٠,٥ كم الاسكندرية
مقاوله :- شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

أمر تشغيل رقم (368) لسنة 2023

السادة / شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

بنر العبد قرية بالوظة بملك سلامة على علاوى شمال سيناء

تحيه طيبه وبعد ...
بالاشارة الى العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٤٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٢ الموقع بين الهيئة وشركتكم الموقره بشأن
تنفيذ العملية عالية باجمالى مبلغ ١١٠٠٠٠٠٠٠٠ (فقط وقدره احدى عشر مليون جنيه فقط لا غير)

ومدة التنفيذ (٨ شهور) من تاريخ استلام الموقع فى ٢٠٢٣/٨/٢٣

لذا :-

يرجى التفضل بالتوجيه نحو افراد مندوب عن الشركة للمرور على العملية و التوقيع على
المحضر الخاص بذلك مع مراعاة مايلي :-

- ضرورة موافقتنا ببوليصة التأمين على جهاز الاشراف على العملية من الهيئة قبل بدء التنفيذ
- بالفتات المبينه بكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية .
- تقديم برنامج زمنى لتنفيذ الأعمال طبقا لكراسة الشروط و المواصفات و قائمة الكميات .
- موافقتنا ببيان ...

- خطة تأمين مواقع العمل .

- خطة الجودة لتنفيذ الأعمال .

- الهيكل التنظيمى للمشروع (اسم / وظيفة) .

• هذا وسوف يقوم بالاشراف على تنفيذ هذه العملية :

السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوى

تحت اشراف

السيد المهندس / محمد حسنى فياض

مدير عام المشروعات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية) مرسى مطروح

سيد مهندس / هانى محمد محمود طه

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (1- 3) تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها
تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1281.60	6.408	200.00	495+700	495+500	القطاع الاول
1922.4	6.408	300.00	496+000	495+700	القطاع الثاني
1244.1	6.221	200.00	495+700	495+500	القطاع الثالث
1866.15	6.221	300.00	496+000	495+700	القطاع الرابع
1206.6	6.033	200.00	495+700	495+500	القطاع الخامس
1809.9	6.033	300.00	496+000	495+700	القطاع السادس
1169.1	5.846	200.00	495+700	495+500	القطاع السابع
1753.65	5.846	300.00	496+000	495+700	القطاع الثامن
12253.50	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
12253.50	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم النجلى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسور الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند وبيانه : (3 - 1) علاوة مسافة النقل 211 كم

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1281.60	6.408	200.00	495+700	495+500	القطاع الاول
1922.4	6.408	300.00	496+000	495+700	القطاع الثاني
1244.1	6.221	200.00	495+700	495+500	القطاع الثالث
1866.15	6.221	300.00	496+000	495+700	القطاع الرابع
1206.6	6.033	200.00	495+700	495+500	القطاع الخامس
1809.9	6.033	300.00	496+000	495+700	القطاع السادس
1169.1	5.846	200.00	495+700	495+500	القطاع السابع
1753.65	5.846	300.00	496+000	495+700	القطاع الثامن
12253.50	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
12253.50	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (1- 3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1281.60	6.408	200.00	495+700	495+500	القطاع الاول
1922.4	6.408	300.00	496+000	495+700	القطاع الثاني
1244.1	6.221	200.00	495+700	495+500	القطاع الثالث
1866.15	6.221	300.00	496+000	495+700	القطاع الرابع
1206.6	6.033	200.00	495+700	495+500	القطاع الخامس
1809.9	6.033	300.00	496+000	495+700	القطاع السادس
1169.1	5.846	200.00	495+700	495+500	القطاع السابع
1753.65	5.846	300.00	496+000	495+700	القطاع الثامن
12253.50	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
12253.50	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم المنلاوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية
رقم البند و بيانه : (1- 4) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار
الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1206.60	4.022	300.00	496+000	495+700	القطاع الاول
804.4	4.022	200.00	495+700	495+500	القطاع الثاني
1146.6	3.822	300.00	496+000	495+700	القطاع الثالث
764.4	3.822	200.00	495+700	495+500	القطاع الرابع
3922.00	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
3922.00	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (1- 4) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1206.60	4.022	300.00	496+000	495+700	القطاع الاول
804.4	4.022	200.00	495+700	495+500	القطاع الثاني
1146.6	3.822	300.00	496+000	495+700	القطاع الثالث
764.4	3.822	200.00	495+700	495+500	القطاع الرابع
3922.00	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
3922.00	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
الزليبي
5.9.2023

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (1- 4) علاوة مسافة النقل 180 كم

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1206.60	4.022	300.00	496+000	495+700	القطاع الاول
804.4	4.022	200.00	495+700	495+500	القطاع الثاني
1146.6	3.822	300.00	496+000	495+700	القطاع الثالث
764.4	3.822	200.00	495+700	495+500	القطاع الرابع
3922.00	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
3922.00	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م. / ابراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
الروبي
2023

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي
علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية
رقم البند وبيانه : (4 - 2) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير
الكسارات والمطابقة للمواصفات (sub ballast)
تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
876.00	2.920	300.00	496+000	495+700	القطاع الاول
584	2.920	200.00	495+700	495+500	القطاع الثاني
840	2.800	300.00	496+000	495+700	القطاع الثالث
560	2.800	200.00	495+700	495+500	القطاع الرابع
2860.00	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
2860.00	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
الرويني
5.11.2022

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي
علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (2- 4) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : 0 م 3

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
876.00	2.920	300.00	496+000	495+700	القطاع الاول
584	2.920	200.00	495+700	495+500	القطاع الثاني
840	2.800	300.00	496+000	495+700	القطاع الثالث
560	2.800	200.00	495+700	495+500	القطاع الرابع
2860.00	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
2860.00	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الصلوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
م / محمد خليل

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل في المسافة من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية

رقم البند و بيانه : (2-4) علاوة مسافة النقل 180 كم
تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
876.00	2.920	300.00	496+000	495+700	القطاع الاول
584	2.920	200.00	495+700	495+500	القطاع الثاني
840	2.800	300.00	496+000	495+700	القطاع الثالث
560	2.800	200.00	495+700	495+500	القطاع الرابع
2860.00	(اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية) 3م				
2860.00	(الاجمالي الكلي) 3م				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الصلوي

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم ٢٦١١ / ٢٠١٤ الصادرة بتاريخ ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٤ فرع : مدينة نصر

٢٤ / ١٢ / ٢٠١٤

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك اتباع توصيات الشركة وتنفذ المتطلبات القانونية والتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمستلزمات.

٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم وللأمانة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمتطلبات والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

(و) يكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد اسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (الملوّه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متكاملاً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكمل لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلف أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليته.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو إتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو خسائر أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقولة المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والمقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متكاملاً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٦ - (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧ - (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

- صندوق حملة الوثائق: هو مجموعة من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.

- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص لضمحلل لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاذ المالية للشركة.

- توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

- أجر المضاربة: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني.

هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعود أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠

موافقة هيئة الرقابة الشرعية:

تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي
يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- مفهوم نظام المضاربة: تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك: يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة

- الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع

٧ - شرط سقوط الحق:

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفي عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

٨ - إذا وجد سارياً وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلغيات أو المسؤوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدني المصري ١٠- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما يوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يقدم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية:

ثم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند. ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمينات الموضحة بالجدول.

وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأنقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:

(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أياً كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم، (د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكسد، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي قصور أو كسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

(ح) الخسائر والتلفيات للملغات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن: بالنسبة للبنود (١):

إجمالي قيمة عقد المقابلة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبنود (٢، ٣):

القيمة الاستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة. ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إنباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكنة إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلقات.

(ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة المخلقات وفي جميع الأحوال لابد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسؤولية المدنية قبل الغير:

لتلزم الشركة بتعويض المشترك وبحد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصح المشترك مسئولا عن دفعها قانوناً تعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشديد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير.

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المشترك.

(ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

ويشترط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تنفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلفيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مباني بسبب الذخبات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلفيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنشأ من أو تنتج عن مثل هذه التلفيات (مالهم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسؤوليات الناتجة عن:

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

(ب) الخسارة أو التلفيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

(ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات.

(د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة بتطبيق على القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى بإسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢- يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي: - تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

رقم : 2161/2023 اصدار



1239923

القسم الاول: الأضرار المادية	البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المقاولات (الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) -	-	-	-
1-1 قيمة العقد -	11,000,000.00 جم	يتحمل المشترك الـ 20% من اجمالي مبلغ التأمين.	-
2- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - غير مغطى	-	-	-
2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى	-	-	-
3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى	-	-	-
4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى	-	-	-
اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول	11,000,000.00		

الآخطار الطبيعية	حدود التعويض (1)	التحملات
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير	-	-
2- العواصف / الزوايح / الفيضانات / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير	البند المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسدية -	-	-	-
1-1 للشخص الواحد -	100,000.00	-	-
2-1 مهما كان عدد الأشخاص -	200,000.00	-	-
2- الأضرار المادية للممتلكات -	200,000.00	يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد ادنى 40,000 جم	-
اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم	400,000.00		

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

1239922

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام مباد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأشراط والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

رقم الوثيقة :	2161/2023 اصدار
اسم المشترك / او المشتركين :	شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة
العنوان :	بئر العبد قرية بالوطة بملك سلامة على علاوى - شمال سيناء
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	تأميناً على عقد رقم (2024/2023/246) أعمال الجسر الترابى لمسار القطر الكهربائى السريع الخط الأول (العين المسخنة - مطروح) قطاع (العلمين / فوكا) لتنفيذ المسافة من الكم 495,500 الى الكم 496,000 بطول 0.5 كم اتجاه اسكندرية.
موقع العمل :	اتجاه اسكندرية.
مدة التأمين :	يبدأ التأمين في : 2023/08/23 وينتهي في : 2024/08/22
أ - بالنسبة للأعمال :	تبدأ من : وتنتهي في :
ب - بالنسبة لأعمال الصيانة :	فقط أضع عشر مليوناً جنيه مصري
مبلغ التأمين :	11,000,000.00
القسم الاول :	الأضرار المادية
القسم الثاني :	المسؤولية المدنية قبل الغير



تحريراً في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف



تحريراً في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف
كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gailsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Aisafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
من 2

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندس : ٢٠ ش وادي النيل - الهندس - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / أ شارع المأمون ومحمود مدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gailsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Aisafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
من 2

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع الهندس : ٢٠ ش وادي النيل - الهندس - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / أ شارع المأمون ومحمود مدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط



1239925

يعتبر متمم لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرققة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .



رقم : 2161/2023 إصدار

1239924

حساب الاشتراك

962.00	جـ	الاشتراك الصافي
52.91	جـ	نصف الدفعة التمهيدية
26.10	جـ	الضريبة النوعية
50.33	جـ	مصاريف إصدار
5.77	جـ	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
1.92	جـ	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
0.96	جـ	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
1,100.00	جـ	اجمالي الاشتراك



تحرير في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف



تحرير في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط



1239927

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد (مرفق)



1239926

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما فى ذلك الدعامات وخلافة - فى حالة استخدامها فى اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق فى الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفورى و صالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافى من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفورى
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع فى الاماكن المغلقة او التى يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم و المتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكرهه علي العدد و التشوينات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح علي الخفراء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم و المتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوتيقه جميع اخطار المقاولين ان الوتيقه تغطى خطرى الحريق و السطو
شرط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تنفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامه للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعى
استثناء الممتلكات القائمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعدد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذ (مرفق)



تحريرا في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف



تحريرا في 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horja Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsa'a Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shoubin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
من 6

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horja Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsa'a Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shoubin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
من 5

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1239929

- (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (أعمال ينشأ عنها لهب) من أى نوع مثل :-
- عمليات الجلب ، التقطيع ، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
- استعمال البيتومين الساخن .
- أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
(8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على أن يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
(9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
(10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
(11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء أو التركيب أو أى اعمال ينشأ عنها لهب .
(12) تعيين مسبق امان بالموقع .
(13) تركيب نظام يعتمد عليه للانداز من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
(14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
(15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
(16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
(17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
قيمة كل وحدة تخزين : 175,000 جم .

1239928

المرفقات

- * تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع أخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
- * شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظاتها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقى عدوى و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقى هذه الأمراض المعدية .
- * شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
- * ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
- * ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه .
- * ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التى تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أى خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .
- * ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذة
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والإستثناءات و الاحكام و الإشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أى تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور و القواطع و الشدات و المصارف و القنوات و أعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى فى مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أى حادث محددا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها فى نفس الوقت.
- * ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق و الأمان من الحريق فى مواقع التشييد
انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الاحكام و الإشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار ، وذلك فقط باشتراك ما يلى :-
(1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية للصالحه للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل .
(2) ان يكون هناك خط ماسير مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
(3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق و طفايات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
(4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع ما يمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الانشاء .
(5) ان يتم اللجوء المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات وى فراغات اخرى بأسرع ما يمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التجهيز .
(6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .



تحريرها فى 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف



تحريرها فى 23/08/2023
تاريخ الطباعة 23/08/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم 2161/2023
الفرع : المركز الرئيسي

السيد/السادة/ شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2161 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/08/23 إلى 22/08/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 11000000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية.
كما نفيديكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وآثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عناية سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 23/08/2023



الاشتراك	962.00	:	م
نصف الدفعة النسبية	52.91	:	م
مصاريف الاصدار	50.33	:	م
الضريبة النوعية	26.10	:	م
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	5.77	:	م
اشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	1.92	:	م
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف	0.96	:	م
إجمالي الاشتراك	1,100.00	:	م

(فقط ألف و مائة جنيه مصري)



تحريرا في 23/08/2023

تاريخ الطباعة 23/08/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 48.10



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 01/02/2023
Reporting No. : 09
Sample No. : 09

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.6
25	84.1
19	79.6
12.50	63.4
9.50	54.8
4.75	46.5
2.36	44.0
2.00	42.1
1.18	38.4
0.600	31.0
0.425	29.1
0.300	20.0
0.150	13.8


CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل التجاري: ٢٧٣٦٧٢٣١
المركز الرئيسي: ٢٧٣٦٣٠٩٣

Signature: 

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 01/02/2023
Reporting No. : 09
Sample No. : 09

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	10.9

Signature 
رئيس المكتب
المركز الرئيسي : 3 شرق الملك الأفدي - الزمالك - القاهرة
011-27367231 - 27363093

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 01/02/2023
Reporting No. : 09
Sample No. : 09

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المسجل رقم 337-991-319
المرکز الإداري : 3 شارع الملكة الأميرة - الزمالة - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 01/02/2023
Reporting No. : 09
Sample No. : 09

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	42.1	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	29.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.9	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits


Signature
السيد محمد السيد
رئيس قسم الاختبارات
3 شارع الملكة الأميرة - الزمالك - القاهرة
27367231 - 27363093

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 01/02/2023
Reporting No. : 09
Sample No. : 09

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

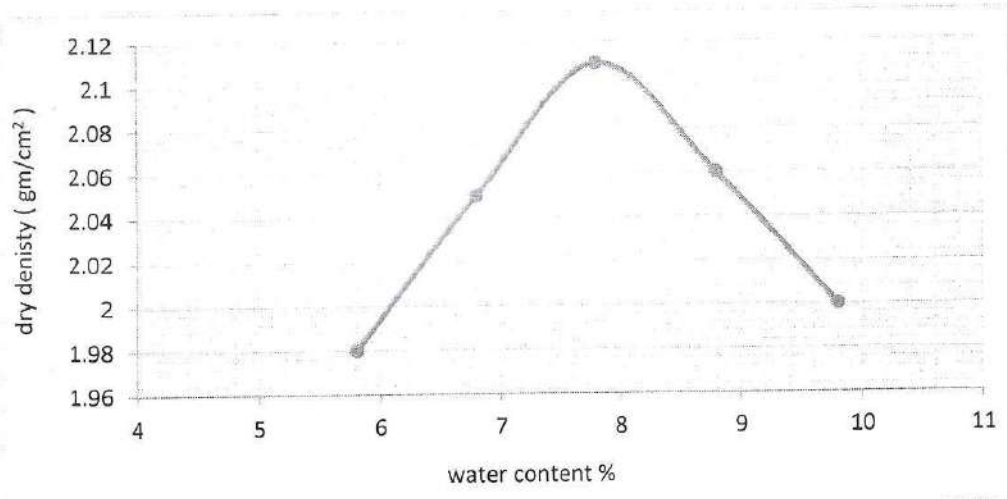

- Max dry density (gm/cm²) : 2.11
- Optimum moisture content % : 7.8

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
رقم الترخيص الهندسي: 277-994-249
المركز الفرعي: 3 شارع الملكة الأميرة - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Embankment
 Location : St. (495+500) : (496+000)
 Delivery Date : 25/01/2023
 Reporting Date : 01/02/2023
 Reporting No. : 09
 Sample No. : 09

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	1.80
1.27	0.050	2.00
1.91	0.075	2.21
2.54	0.100	2.49
3.18	0.125	2.74
3.81	0.150	2.99
4.45	0.175	3.25
5.08	0.200	3.50
5.71	0.225	3.68
6.35	0.250	3.78

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	36.0
	6.90	2.49	

Notes :


- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.11(gm /cm³) at 7.8% optimum water content.

3- Surety Load 4.50 Kg.

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
 الشياح الشمالي
 Signature : 218-99-66-66
 المركز الرئيسي : 3 شارع الملك الناصر - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 01/02/2023
Reporting No. : 09
-Sample No. : 09

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883

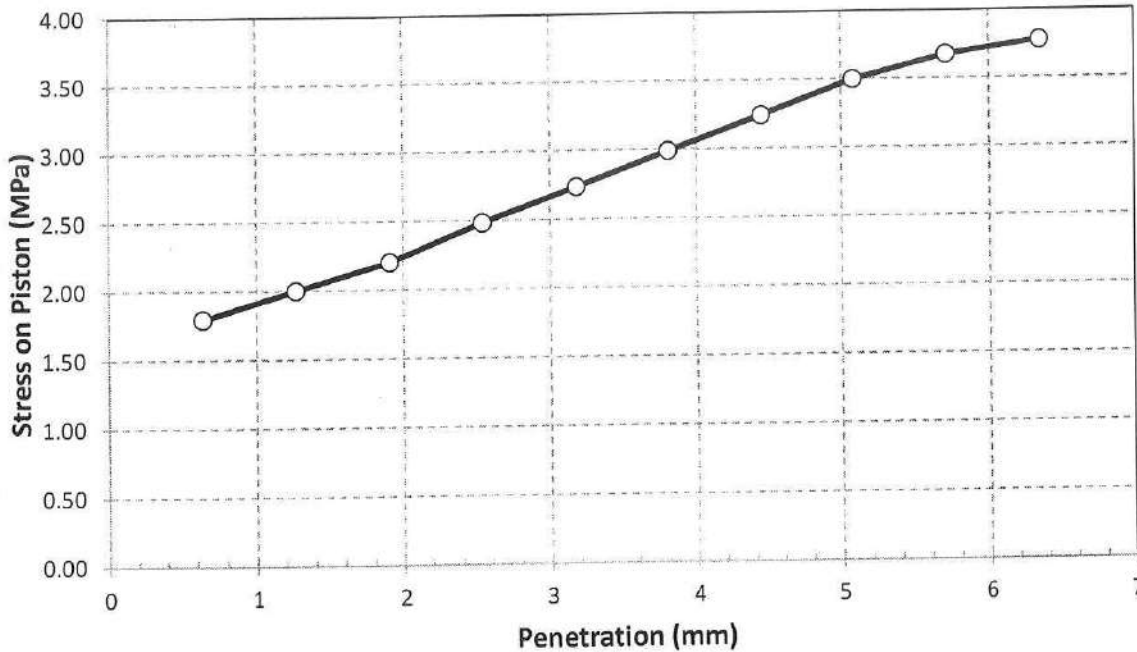

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature: *[Handwritten Signature]*
رقم التسجيل المزدوج: 537 - 991 - 219
المركز الرئيسي: 3 شارع الملك الفضل - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 05/02/2023
Reporting Date : 12/02/2023
Reporting No. : 10
Sample No. : 10

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 05/02/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557


Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
رقم التسجيل الفرعي: 218-951-537
المركز الرئيسي: 3 شرق القاهرة - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 05/02/2023
Reporting Date : 12/02/2023
Reporting No. : 10
Sample No. : 10

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.


Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.6
25	83.6
19	74.6
12.50	62.6
9.50	51.6
4.75	43.4
2.36	40.0
2.00	39.6
1.18	37.0
0.600	33.3
0.425	31.6
0.300	22.8
0.150	15.0

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature: 
رقم التسجيل الموحّد: 837 / 1991 م
البريد الإلكتروني: 3 شارع الملك الفاضل - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 05/02/2023
Reporting Date : 12/02/2023
Reporting No. : 10
Sample No. : 10

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	11.2

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
رقم التسجيل بوزارة: 218-0991-037
البريد الإلكتروني: 3 شارع الملكة الملكة - الزمالك - القاهرة 11436

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 05/02/2023
Reporting Date : 12/02/2023
Reporting No. : 10
Sample No. : 10

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
Signature / ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com - الموقع: www.cel-egypt.com

Company Name : شرق بورسعيد

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Location : St. (495+500) : (496+000)

Delivery Date : 05/02/2023

Reporting Date : 12/02/2023


Reporting No. : 10

Sample No. : 10

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
Group Classification	(A-1-b)		
2.00 mm (No.10).	39.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	31.6	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.2	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature: 
 15-981-537
 3 شارع الملك ابي الفضل - الزمالة - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 05/02/2023
Reporting Date : 12/02/2023
Reporting No. : 10
Sample No. : 10

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

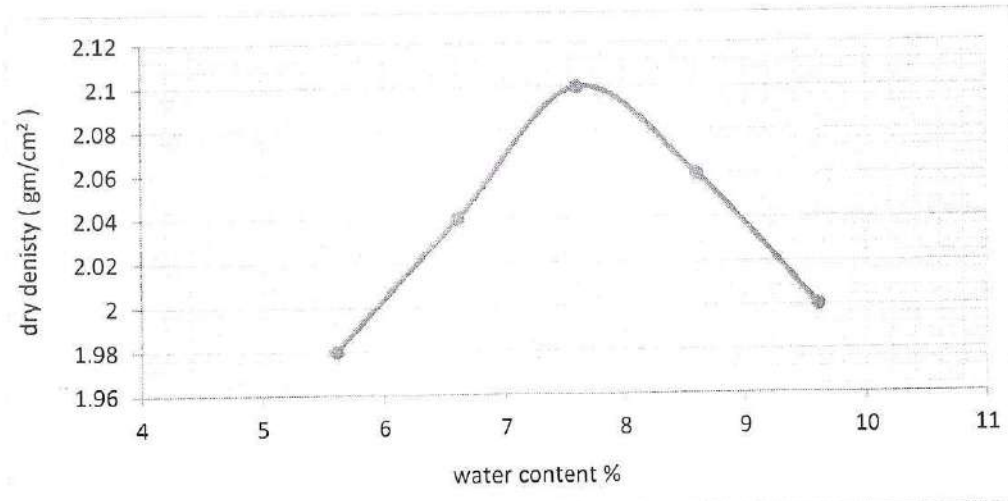

- Max dry density (gm/cm²) : 2.10
- Optimum moisture content % : 7.6

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
السياسة
Signature
المركز الرئيسي : شارع الملك اوفدال - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 05/03/2023
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Prepared Subgrade delivered on 20/02/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
4. Proctor Test according to D-1557
5. CBR according to ASTM D-1883
6. Los Anglos according to ASTM C-131.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الاستشاري: الدكتور/ محمد/ الشاذلي
رئيس قسم التحليلات الكيميائية
العنوان: شارع الملك فيصل - القاهرة
الهاتف: 27367231 - 27363093

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 05/03/2023
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Results of sieve analysis according to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
125	100	100	100
100	100	90	100
75	100	75	100
50	100	--	--
37.5	98.5	50	100
25	86.4	--	100
19	71.4	20	75
12.5	65.1	--	--
9.5	49.7	15	60
4.75	36.7	--	--
2.00	27.4	0	35
0.425	16.2	0	--
0.075	8.7	0	12

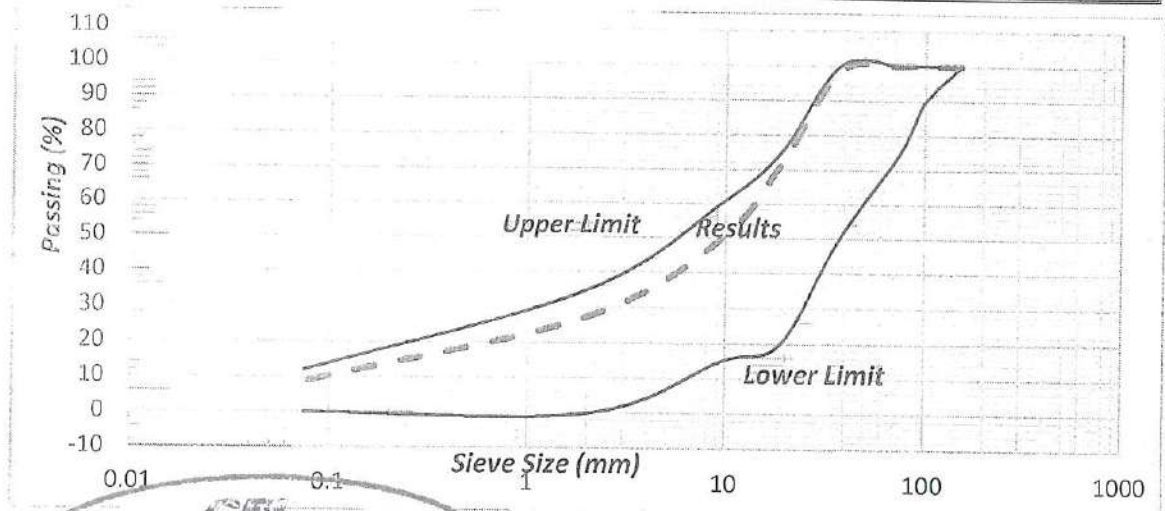

The test results are () Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits.

Signature: _____

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 05/03/2023
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	8.7

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الدكتور /
رقم التسجيل رقم ١٢٣٧ - ١٢٣٧ - ١٢٣٧
البريد الإلكتروني : ١٢٣٧@cel-egypt.com - ١٢٣٧@cel-egypt.com

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 05/03/2023
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Results of liquid limit and plasticity index of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP



 مكتبة مجلس الاستشارات الوطنية

 الجمهورية العراقية

 وزارة التعليم والبحث العلمي


 رقم التوثيق الوطني: 2024-0001

 التاريخ: 2024-0001

 Signature /

Company Name	: شرق بورسعيد
Project	: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample	: Prepared Subgrade.
Location	: St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date	: 20/02/2023
Reporting Date	: 05/03/2023
Reporting No.	: 11
Sample No.	: 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

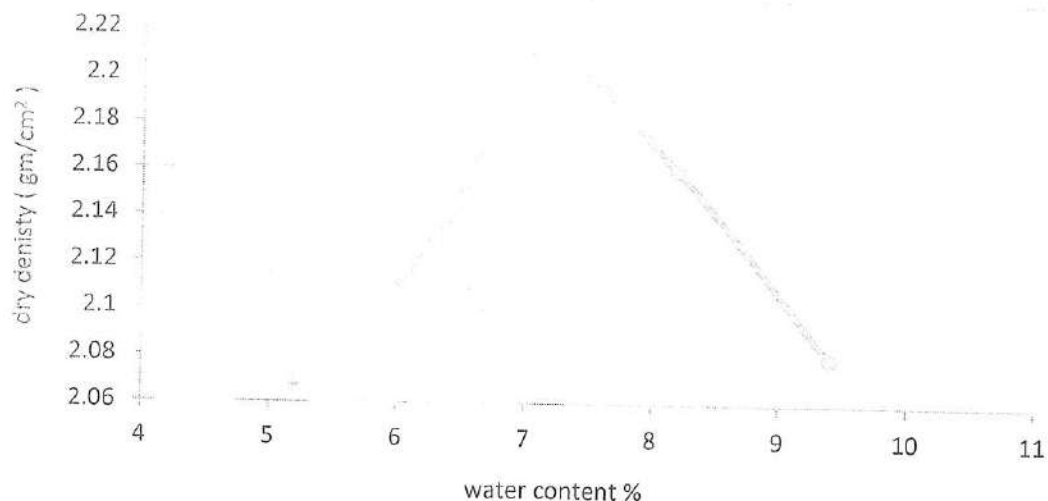

Max dry density (gm/cm ²)	: 2.21
Optimum moisture content %	: 7.1

Signature /
 رقم التسجيل المبدئي: ١٣٧٠-١٣٦٩-٣٩٠
 المركز الرئيسي: ١ شارع الملك فيصل - الرياض - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 05/03/2023
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	3.63
1.27	0.050	3.98
1.91	0.075	4.41
2.54	0.100	4.74
3.18	0.125	5.07
3.81	0.150	5.50
4.45	0.175	5.87
5.08	0.200	6.36
5.71	0.225	6.69
6.35	0.250	7.13

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	68.9
	6.90	4.74	


Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.21 (gm /cm³) at 7.1 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 05/03/2023
Reporting No. : 11
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883

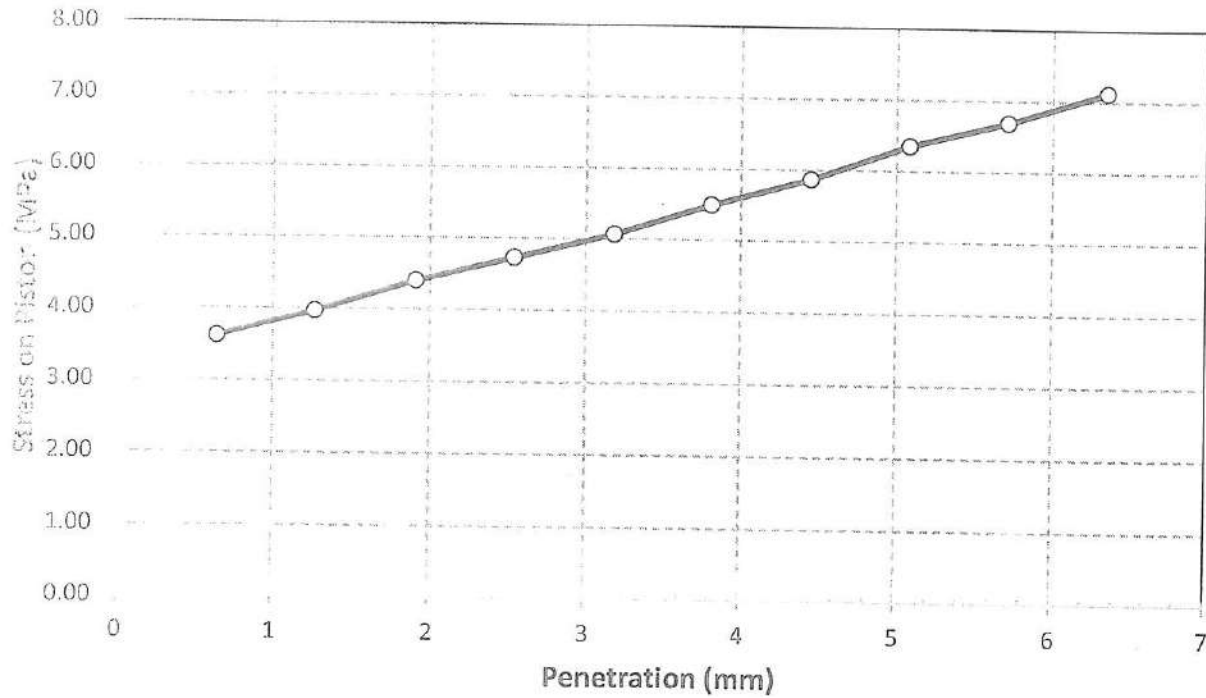

Signature / 
CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
رئيس قسم الاختبارات : ٥٣٧ - ٥٣٨
مهندس : ٥٣٧ - ٥٣٨
مهندس : ٥٣٧ - ٥٣٨

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 03/08/2023
Reporting Date : 13/08/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Sub-Ballast delivered on 03/08/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Proctor test according to ASTM D-1557.
5. Specific Gravity & Absorption according to ASTM C-127 & D 6473.
6. CBR according to ASTM D-1883
7. Los Anglos according to ASTM C-131.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /

Company Name : شرق بورسعيد

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Sub-Ballast

Location : St. (495+500) : (496+000)

Delivery Date : 03/08/2023


Reporting Date : 13/08/2023

Reporting No. : 12

Sample No. : 01

Results of sieve analysis according to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
63.5	100	100	100
50	100	100	100
38	97.9	90	100
25	79.8	55	85
19	72.4	40	75
12.5	65.4	--	--
9.5	43.7	26	50
4.75	31.4	15	35
2.00	21.8	9	25
0.425	11.4	3	16
0.075	5.4	0	7

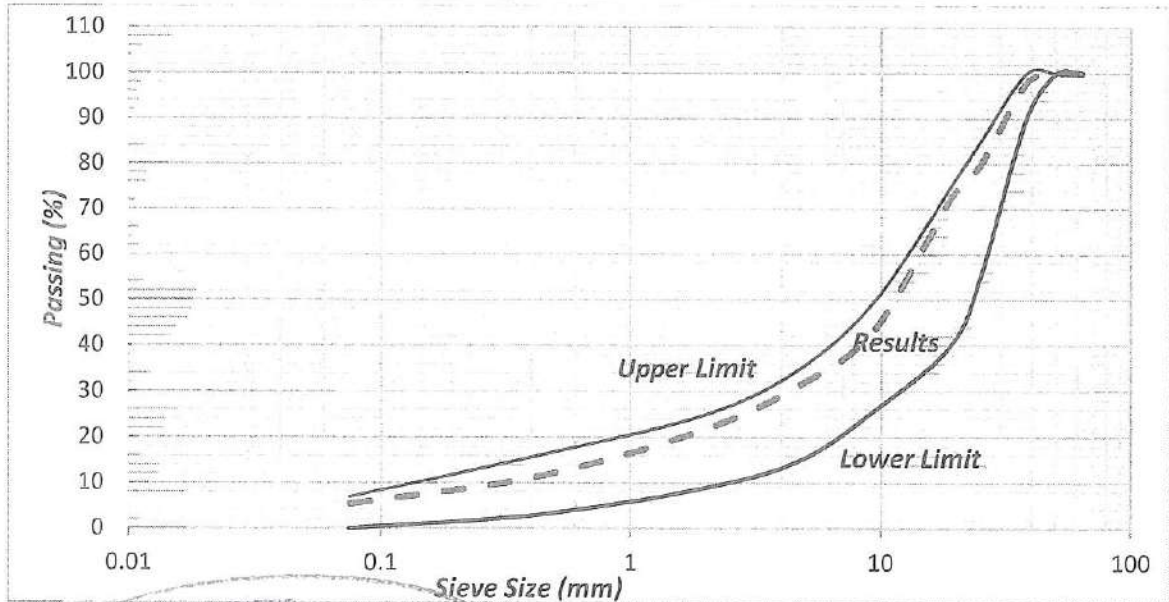

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits.

Signature /

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 03/08/2023
Reporting Date : 13/08/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 01

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	5.4

Signature /

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 03/08/2023
Reporting Date : 13/08/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 01


Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 03/08/2023
Reporting Date : 13/08/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

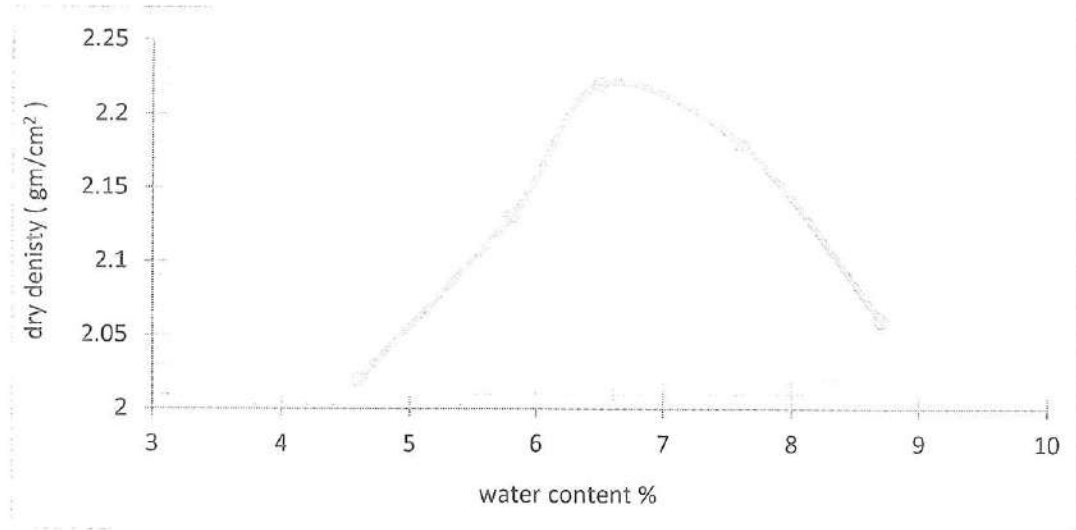

- Max dry density (gm/cm²) : 2.22
- Optimum moisture content % : 6.5

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
أحمد محمد
رئيس قسم الاختبارات
الهندسية

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 03/08/2023
Reporting Date : 13/08/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 01

Results of Specific Gravity and Absorption
of Course Aggregate
ASTM C127 & D 6473

Test	Results
Bulk Specific Gravity (OD)	2.51
Bulk Specific Gravity (SSD)	2.56
Apparent Specific Gravity.	2.59
Absorption %	2.54

Note:

- (OD) Refer to Oven Dry.
- (SSD) Refer to Saturated Surface Dry.

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الهندسة المدنية
رقم ترخيص المهندس ٢١٥-٢٠١٠
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 03/08/2023
Reporting Date : 13/08/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 01


Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	4.16
1.27	0.050	4.82
1.91	0.075	5.42
2.54	0.100	6.02
3.18	0.125	6.38
3.81	0.150	6.72
4.45	0.175	7.04
5.08	0.200	7.36
5.71	0.225	7.68
6.35	0.250	8.13

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	87.5
	6.90	6.02	


Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.22 (gm /cm³) at 6.5 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature / 

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (495+500) : (496+000)
Delivery Date : 03/08/2023
Reporting Date : 13/08/2023
Reporting No. : 12
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883

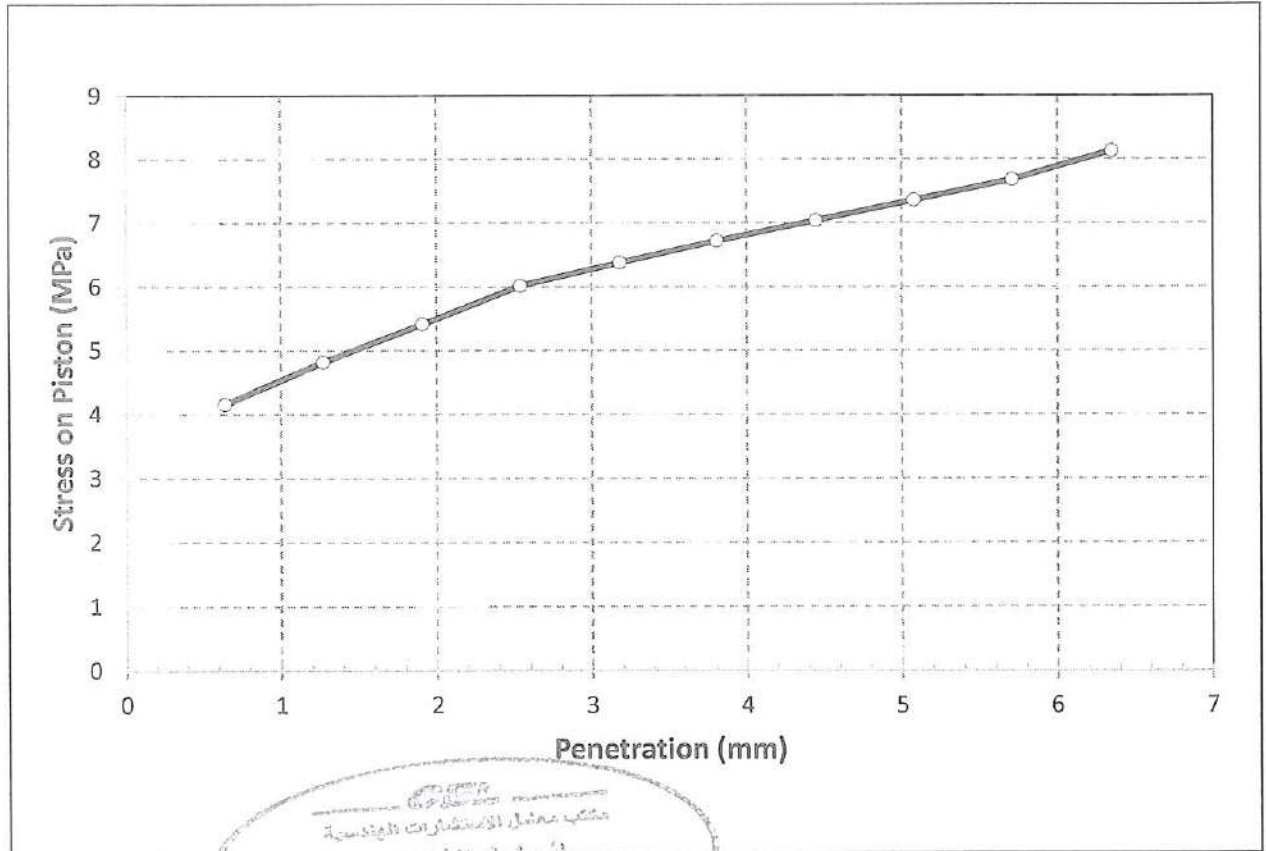

Signature:
