

**محضر استلام
الموقع**



SAMCO National Construction Co
سامكو الوطنية للتشييد



محضر إستلام موقع

إيماءاً إلى العقد رقم (١٢٠٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م

لعملية: تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ (بالأمر المباشر).

أنه في يوم الأحد الموافق ١٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤ وبحضور كلام من:

مدير عام مشروعات المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء.

مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري.

مهندس الإشراف عن الهيئة العامة للطرق و الكباري .

عن مكتب نائب مدير ديزاين (الاستشاري العام).

عن شركة سامكو الوطنية للتشييد.

١. المهندس/ أحمد عراقى

٢. المهندس/ محمد شحات محمد

٣. المهندس/ علي ابراهيم علي العربي

٤. المهندس/ محمد نابه هاشم

٥. المهندس/ محمد منير مراد

بالمرور المشروع عاليه وجد أنه لا يوجد عوائق ظاهرية تعيق العمل. وعليه، يتم إستلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك ،،،

التوفيقات :

١- المهندس/ أحمد عراقى

٢- المهندس/ محمد شحات محمد

٣- المهندس/ علي ابراهيم علي العربي

٤- المهندس/ محمد نابه هاشم

٥- المهندس/ محمد منير مراد

رئيس الإدارة المركزية



م / أحمد الطحان

المقاييسة

الجزء الثالث عشر - قوائم الكميات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقاييس مشروع محطة التوزيعات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى администратي و ملحقاته)



الوصف	الإجمالي
اجمالي الأعمال الإعتيادية	٦٦,٣٩٦,٧٧٤
اجمالي أعمال الطرق	٧,٩٧١,٧..
اجمالي الأعمال المعدنية	١١٥,١٩٠,٦٣٥
اجمالي أعمال المباني والتشطيبات	٩٦,٢٠٥,٤٠٠
اجمالي أعمال الالكتروميكنيك	٧٢,٧٥١,٦٩٤
الإجمالي العام	٢٤٨,٧٣١,٠٠٣

ليرة عشرة وسبعين وأربعين مليوناً وسبعيناً وواحد وستون ألفاً وثلاثة جنيه فقط لا غير

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الذى تم تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٠٣ لسنة ٢٠٠٣



بيانات المشروع					
النوع	الكمية	الوحدة	القيمة	النوع	الكمية
أعمال الاعتيادية				أعمال التكسير والزالة	
١				١	
١٦٠٠	٧٥	٢٢٠	٢م	١.١	بالметр المكعب تكسير خرسانة عادي ونقل المخلفات إلى المقالب المغومة وتلوى العمل نهاراً وليلة والبيت شامل بما جمهمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالметр المكعب مائتان وعشرون)
٣٣٠٠	١٥٠	٢٢٠	٢م	١.٢	بالметр المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسرع يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب المغومة وتلوى العمل والبيت شامل بما جمهمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك (بالметр المكعب مائتان وعشرون)
				٢	أروم والإخلال :
٦٧٥,٠٠	٤٠	١٠٠٠	٢م	٢.١	بالметр المكعب حفر في أرض الموقع الماء في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التنسك والصخرية) بالمعنى المطلوب لزوم الأساسات بواجهات يقل عن ١٥ - كجم/سم٢ طبقاً للمتوسط الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفتنة تشمل نقل ناتج الحفر والمخلفات إلى المقالب المغومة لمسافة ٥٠ .٠ متر من محور الطريق طبقاً لأيام الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لشروطه والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠ - متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة (بالметр المكعب خمسة عشر ألف)
٧,٤٩٠,٠٠	١٢١	٦٠٠٠	٢م	٢.٢	بالметр المكعب تزويد وردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسرع يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سـم مع الرش بالماء والمدك جيداً باستخدام الآلات الميكانيكي للوصول إلى الماء كفالة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح المغلوبي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (بالметр المكعب ستون ألف)
٥٠٠٩٢,٠٠	٤٦٣	١١٠٠	٢م	٣	أعمال الغرسات :
١,٨٣٧,٤٤	١٨٥٦	٩٩	٢م	٣.١	بالметр المكعب خرسانة عادي للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلانلي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥ - كجم/م٢ واجهاد لا يقل عن ٢٠ - كجم/سم٢ والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لشروطه والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف (بالفتر المكعب تسعماة وتسعون)
٤,٨٣٥,١٧	٤٣٧٦	٢٠٣٥	٢م	٣.٢	بالفتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلانلي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠ - كجم/م٢ واجهاد لا يقل عن ٣٥ - كجم/سم٢ والسرع لا يشمل حديد التسليح (بالفتر المكعب ألف و خمسة وثلاثون)
٣٢٧,٨٨٨	٤٣٧٦	١٣٨	٢م	٣.٣	بالفتر المكعب خرسانة مسلحة أساسات الخزان مع استخدام اسمنت بورتلانلي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠ - كجم/م٢ واجهاد لا يقل عن ٣٥ - كجم/سم٢ والسرع يشمل مادة مانع صلبة الحديد ومادة مانع الفتانية ولا يشمل حديد التسليح (بالفتر المكعب مائة وثمانين وثلاثون)
٣,٩٦,١٠٠	٤٠٦	١١٠	٢م	٤.٣	بالفتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والأعمدة والعواوين الخرسانية السائنة مع استخدام اسمنت بورتلانلي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٠ - كجم/م٢ واجهاد لا يقل عن ٣٥ - كجم/سم٢ على أن يتم إضافة المواد الازمة للوصول للأجهاد المطلوب ومن الشرح والسرع لا يشمل حديد التسليح (بالفتر المكعب ألف و مائة)



مقدمة مشروع محطة الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
النوع	الكمية	الوحدة	البيان	الرقم	
٦٩٤,٠٤٧	٣٥١	١٨٧	٢م بالفتر المكتب خرسانة مسلحة لزوم بلاطات وحوافظ لخزان المياه مع استخدام استمنت بورتلوك عادي ومحنتي استمنت لايزيد عن ٤ كجم/م٢ وجهاز لا يقل عن ٣٥ كجم/سم٢ على أن يتم اضافة المواد الازمة للوصول للجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسرفر مادة ماتع صنايع حديد ومادة مانع النقاذه ولا يشمل حديد السليج. (بالفتر المكتب مادة و سبعة وثمانون)	٥.٢	
٩٦٧,٦٠٠	٢٥٨	٢٢٠	٢م بالفتر المسطح توريد و عمل فرينة خرسانة عادي سmek . اسم اسفل انترلوك الاسمية والبلاطة الارضية تسبب الاصدام الموضعة بارسومات التقنية بحيث لا يدخل المحنتي الاستمنت للخرسانة عن ٢٥ كجم من الاستمنت بورتلوك عادي لكل متر المكتب من الخرسانة وان تحاذي الخرسانة زنة لا تقل عن ٢ كجم/سم٢ والسرفر يشمل أعمال ريش ودمك التربة لascel الخرسانة وأعمال الحنك وتسوية السطح الملوبي للخرسانة و اعمال معايجه الخرسانة مع عمل الاختبارات الازمة للخرسانة وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاما طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (بالفتر المسطح ألغان و ملائنان)	٦.٣	
١٥,٧١١,٩٠٠	٦٦٢	٢٥٣٠	٢م بالفتر المسطح توريد و عمل تزييف خرسانة مسلحة بالفاير سmek . اسم بوشم عمل شبكة حديد تسليح اآسياح قطر ١٢ مم في التجاوز على أن تثبت شبكة الحديد على بعد ٤ سم من سطح الخرسانة . ويجب الا يقل المحنتي الاستمني عن ٣٠ كجم استمنت بورتلوك عادي للمتر المكتب من الخرسانة على السرفر يشمل أعمال ريش ودمك التربة وفرض منع سفل الخرسانة و يتم تنفيذ أعمال الحنك الميكانيكي حيثما يتم تنفيذ سماكة وتسوية السطح الملوبي للخرسانة وفقاً لذاته وتحفظ اذاته لتنفيذ المطلب (هاردن) على أن تحقق الخرسانة زنة لا تقل عن ٢٥ كجم/سم٢ ، ويتم عمل وصلات التكامل ميكانيكي واصفاف زادة لتنقية السطح (هاردن) على أن تحقق تتجاوز ٤ م وعمق ٥ سم وعرض ٤ سم ، كما يتم عمل وصلات التكامل المرضية والقطولية على مسافة لا تزيد عن ١٢ م بكمال عمق البلاطة وعرض ٢ سم ، وتمثلاً للمواصل بعد الصب بمادة مطااطبة ، والسرفر لا يشمل حديد السليج والسرفر يشمل الهاوك وكل ما يلزم لنها العمل نهوا كاما طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (بالفتر المسطح خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة)	٧.٣	
١٢,٥٩٣,٣٩٩	٣٠٢٢٣	٤١٣	طن بالطن توريد وتركيب ورصف التسلیح (٦٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسرفر يشمل القطع طبقاً للرسومات ويشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتركيب وقطع وشكيل ورفع الحديد والسرفر يشمل هالك حديد لا يزيد عن ٥% والسرفر شامل كل ما يلزم لنها العمل كاما طبقاً لأسهل الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنها العمل كاما طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (باطن ابريمانة وثلاثة عشر)	٨.٢	
٢,٢٧٣,٤٠٠	٥٩	٢٨٥٠	٢م أعمال العزل : بالفتر المسطح توريد شبات من البولي ايثلين سmek .. كيميكرون (vapour barrier) (استمنت الاساسات و سفل الدكات من الخرسانة المادية كما يتضمن البند كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (بالفتر المسطح ثمانى وثلاثون ألف وخمسة)	٩.١	
٢١٩٧٧	٥١	١٢٧٠	٢م بالفتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجههن لlasasas و جمع الاجراء المفتوحة والبند يشمل جميع الادوات والخامات الازمة لدعان طبقة المرين على أن يتم تقديم المواصفات الفنية للماء المستخدمة للاعتماد من طلاق الاشراف قبل البدء في التنفيذ ودفع جميع الكاراترات المطلوبة وكل ما يلزم لنها العمل كاما طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (بالفتر المسطح ثمانية الاف وثلاثون ألف وخمسة)	٩.٤	
٥٠,٨٢٠	٤٢١	٢٢٠	٢م بالفتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لفقيه ضد الرطوبة ورشح المياه للحوافظ المساجة من لفاف بيتومنية سmek لمم من نسج بيتومني متجانس وخالي من الشوالات والتقويب ومساحة بألياف البوليستر يتم فريدها وتصق كاملاً مسطحةها باستخدام لهب المشاوي بدء دهان الأرضي بالبوليمر الخاص بهذه النوعية من الماء العازل والبند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (بالفتر المسطح مائتان وعشرون)	١٠.٤	
١٠,١٣٤٠	٤٢١	٢٢٠	٢م بالفتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة ضد الرطوبة ورشح المياه للحوافظ الخرسانية للخزان والحوافظ الساندنة من الخارج من لفاف بيتومنية سmek لمم من نسج بيتومني متجانس وخالي من الشوالات والتقويب ومساحة بألياف البوليستر يتم فريدها وتصق كاملاً مسطحةها باستخدام لهب المشاوي بعد دهان الأرضي بماء الماء العازل ومحمل على البند طبقة من الكرتون تعامل كطبقة حماية لطبقة العزل والبند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة . (بالفتر المسطح لربعمائة وأربعين)	١١	

الخطوة الفنية
الخطوة الفنية
الخطوة الفنية

بيانات المشروع						الموقع	النوع	القيمة	الكمية	الفئة	الاجمالي
SAMCO	ESE	الاستشاري الديني	N.D.	الاستشاري المعماري	ND DESIGNS ARCHITECTS URBAN PLANNERS	السائبان : الهيئة العامة للطرق والكباري	النيل	٢٣٠	٤٠	٦٥	٦٥٠
المقايسة مشروع محطة التوزيعات الكهربائية بعدين شرم الشيخ بالطريق الدائري (العيني الائاري و ملحقاته)											
عزل خزان المياه:	٩										
٩ عزل افقي للأرضيات والأسطح ضد الرطوبة ورشف المياه.											
بالنيل المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة أفقية ضد الرطوبة ورشف المياه والمادة العازلة لها خاصية حماية الأرضيات من الرطوبة ورشف المياه وتسريرها للأسطح المطلوب عزلها وذلك بين الخرسانة العادي والخرسانة المسحلية للاسات الخزان والطبلة العازلة من الماء. يتم فردها ولصق كامل بيتوبيولي متجلس وختالي من الشوالب والثقوب ومسلحة بالياف البوليستر يتم فردها ولصق كامل بيتوبيولي متجلس البلاشوري بعد دهان الأرضيات بالبوليمر الخامس بهذه النوعية من المولد العازلة والبند محل عليه عمل لبامة سمنتية بسمك ٢ سم بمحتوى أستينتي ٢٥ كجم/م٢ دل على الطبلة العازلة مضاف إليها مواد إيبوكسيه سمع نفاذه للماء مع تسوية سطح البايسا بالبروة ويشمل البند كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات الصناعية وأصول الصناعة.											
المعروفة بـ رايستيرار [صال (دون فصل) المادة العازلة التي بين الخرسانة العادي والخرسانة المسحلية للاسات مع العزل الرأسي للحوالط الخارجية لخزان المياه.											
(بالنيل المسطح مائتان وعشرون)											
عزل داخلى للخزان:-	٧										
بالنيل المسطح توريد وعمل واختبار نظام عزل أسمى مانع النفاذه للتسليف والترشيح للخزانات الخرسانية باستخدام مونة أسمنتية مثل (Masterseal 521) أو ما يماثلها لزوم العزل الناشرى لخزان مياه الحريق الأرضية وحوالط واسقف) ولفته تشمل المعاشرة والإختبارات الازمة وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة.											
(بالنيل المسطح أربعمائة وثمانية عشر)											
عزل الطولى توريد وتركيب وثبتت (water stop) من شرائح مائة مائة للنفاذه بارتفاع ٢٥ سم ويتم تركيبه في الحوالط عند اتصال سطح القاعدة المسحلية بالحاطن السائد بين شبكي تسليف الحالط السائد بكتابات خاصة وعلى أن يتم توريد الوروبرستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والبند يشمل كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة.	٦										
(بالنيل الطولى مائتان وعشرون)											
إجمالي الأعمال الاعتدادية	٦٥٠										
أعمال الطريق	٦٥٠										
بالنيل المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار العصبة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليه فوقها عن ٨٠% ولازيد نسبة الماء الذي يحيط بها جهاز لوس الغلوس عن ٦٤% ولازيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين واستخدام ذات التسوية الحديثة على الأيزيد سهل الطبقة بعد تمام الدفعة عن ٢٠ سم ورثها بالبايه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمعلم الجيد بالهرسات للوصول إلى أعلى كثافة جافة قصوى (الارتفاع عن ٩٥% من الكثافة المعملية ولفته تشمل إجراء التجارب المعملية والتحليلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المستخدمة والبند بجميع متطلباته طبقاً للعينية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١										
مسافة النقل ٢٠ كم . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشترفة عن المحاجر . يتم احتساب علاوة ١.٢ جنية لكل كم بالإضافة إلى النقصان .	٢										
(بالنيل المكعب خمسة الآف وخمسمائة)											
١,١٠٠,٠٠٠	٢٠٠	٥٠٠	٣٠	٣٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٦٦,٣٩٦,٧٧٤
٢٧٠	١٣٧٠	٤٠	٤٠	٤٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠	٦٧٤,١٢٥



نائب مدير المكتب
الجيوفيزيقي
الجيوفيزيقي

بيانات المشروع				
النوع	الكمية	الوحدة	القيمة	الملاحظات
١٢٣,٥٠٠	٩,٤	متر مربع	١٣٧٥٠	<p>٤- كجم / متر طبقة زانج الكسرات والصفيحة المعدنية بـ ٧٠٠٠ المتر المربع طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعمدة في الموقع ورش طبقة لاصق من الخرسانة الماء لـ ٦٠٠ المتر المربع طبقاً للأعمال المتأخرة والبند يشمل جميع العمليات المعمدة في الموقع بما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(بالเมตร المسطح ثلاثة عشر ألف و سبعمائة و خمسون)</p>
٢,١٧٢,٥٠٠	١٥٨	متر مربع	١٣٧٥٠	<p>٥- كجم / متر طبقة زانج الكسرات والصفيحة المعدنية بـ ٧٠٠٠ المتر المربع طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعمدة في الموقع ورش طبقة لاصق من الخرسانة الماء لـ ٦٠٠ المتر المربع طبقاً للأعمال المتأخرة والبند يشمل جميع العمليات المعمدة في الموقع بما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(بالเมตร المسطح ثلاثة عشر ألف و سبعمائة و خمسون)</p>
٢,٠٠٧,٥٠٠	١٤١	متر مربع	١٣٧٥٠	<p>٦- كجم / متر طبقة زانج الكسرات والصفيحة المعدنية بـ ٧٠٠٠ المتر المربع طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعمدة في الموقع ورش طبقة لاصق من الخرسانة الماء لـ ٦٠٠ المتر المربع طبقاً للأعمال المتأخرة والبند يشمل جميع العمليات المعمدة في الموقع بما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(بالเมตร المسطح ثلاثة عشر ألف و سبعمائة و خمسون)</p>
١,٤٢٥,٠٠٠	١٤٠	متر مربع	١٣٧٥٠	<p>٧- كجم / متر طبقة زانج الكسرات والصفيحة المعدنية بـ ٧٠٠٠ المتر المربع طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعمدة في الموقع ورش طبقة لاصق من الخرسانة الماء لـ ٦٠٠ المتر المربع طبقاً للأعمال المتأخرة والبند يشمل جميع العمليات المعمدة في الموقع بما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(بالเมตร المسطح ثلاثة عشر ألف و سبعمائة و خمسون)</p>
٧٥,٤٠٠	١٢٨	متر مربع	٥٥٠	<p>٨- كجم / متر طبقة زانج الكسرات والصفيحة المعدنية بـ ٧٠٠٠ المتر المربع طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعمدة في الموقع ورش طبقة لاصق من الخرسانة الماء لـ ٦٠٠ المتر المربع طبقاً للأعمال المتأخرة والبند يشمل جميع العمليات المعمدة في الموقع بما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(بالเมตร المسطح خمسة و خمسين)</p>
٧٣,٧٠٠	١٢٦	متر مربع	٥٥٠	<p>٩- كجم / متر طبقة زانج الكسرات والصفيحة المعدنية بـ ٧٠٠٠ المتر المربع طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعمدة في الموقع ورش طبقة لاصق من الخرسانة الماء لـ ٦٠٠ المتر المربع طبقاً للأعمال المتأخرة والبند يشمل جميع العمليات المعمدة في الموقع بما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(بالเมตร المسطح خمسة و خمسين)</p>
٧٤,٢٠٠	٤٤	متر مربع	٥٥٠	<p>١٠- كجم / متر طبقة زانج الكسرات والصفيحة المعدنية بـ ٧٠٠٠ المتر المربع طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعمدة في الموقع ورش طبقة لاصق من الخرسانة الماء لـ ٦٠٠ المتر المربع طبقاً للأعمال المتأخرة والبند يشمل جميع العمليات المعمدة في الموقع بما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(بالเมตร المطول خمسة و خمسين)</p>
١٤,٤٩٥	١٧,٢٥	متر مربع	١١٢	<p>١١- كجم / متر طبقة زانج الكسرات والصفيحة المعدنية بـ ٧٠٠٠ المتر المربع طبقاً للمواصفات والرسومات التفصيلية المعمدة في الموقع ورش طبقة لاصق من الخرسانة الماء لـ ٦٠٠ المتر المربع طبقاً للأعمال المتأخرة والبند يشمل جميع العمليات المعمدة في الموقع بما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>(بالเมตร المطول ألف و مائة)</p>

مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
الإجمالي	الفلدة	الكمية	الوحدة	البلد	
٢٤,٣٦٠	١١٤	٤٢٠	م	١١ المتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على لباد سك لا يقل عن ٣٥ سم كرون على أن يتم اعتماد البروبات طبقاً للمواصفات AASTO M249 والتي تتضمن ٢٪ من مادة الريزن - ١٪ من انتباتوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات الفنية للهيئة العامة للطرق والكباري وتعميمات المهندس المشرف. (المتر المسطح مائة وعشرون)	٢
٥٠,١٦٠	٢٢٨	٤٢٠	م	١٢ المتر المسطح أعمال التخطيط بالبوبو الساخنة بنظام البنت Extruder بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقاً للمواصفات الفنية للمهندس المشرف. (المتر المسطح مائة وعشرون)	١٢
٧,٩٧١,٧٠٠				إجمالي أعمال الطرق	
الأعمال المدنية					
				- جميع بود الأعمال شاملة التوريد والتراكيب والأكسسوارات وتمتد الكاتالوجات والميقات قبل التوريد والتركيب، طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعميمات المهندس المشرف.	
٤٠,٣٢١,٣٦٠	٨٦٤٨٠	٥٨٢	طن	١٣ بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من القطعات الـ ST.37 Hot Rolled وقطعات 8.U.S 8.U.S 5 ومواد ST.52 وموسر B A500Gr.B ويتم تشكيل المنابر الإنشائية بآلي وتنبيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المناقير لعمل التقليب وعمل الترميم للقطعات ويشمل أيضاً الحمامات مع اختيار جميع الحمامات المستخدمة لتشكيل الأطارات المعدنية بواسطة Magnetic test or Penetration liquid test وتقديم شهادة تفيد أن جميع الدمامات طبقاً للمواصفات الفنية للحمام وكل ما يلزم لثبيت الجوازات باستخدام الكلامي وتقوية الرقايب على أكمل وجه، وعلى العمال تقديم الرسومات التفصيلية(الشوب دريف) للأعداد قبل بدء في التصنيع وحصر الكهرباء طبقاً لها هو وارد بالرسومات التفصيلية والبلد لا يشمل وزن الماسورة واللحام حيث يتم احتسابها بجدول الكهرباء طبقاً للنسب المقررة في مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ويتم استخدام جميع المعدات والأداles والتوجهات اللازمة لتنليل وتركيب القطعات المدنية وكل ما يلزم فهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعميمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل الصاج الممر. (بالطن خمسة وإناث وثمانون)	
٤,٥٤٨,٠٠٠	٢٠٨٠	١١٠٠	م	١٤ المتر المسطح دهان قاوم للحرق لمدة ساعتين حماية لزوم الأعدمة بدنهات الحريق الافتراضية (intumescent fire painting) طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف. (بالเมตร المسطح أربعة الآف و مائة)	
٦,٢٩٩,٠٠٠	١١٤٤	٥٥٠٠	م	١٥ بانثر المسطح دهان قاوم للحرق لمدة ساعتين حماية لزوم الكرات بدنهان الحريق الاسمونية (cementitious fire painting) طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف. (بالметр المسطح خمسة الآف و خمسة)	
١٤,٨٧١,٠٠٠	٤٤٩٠	٤٤٠٠	م	١٦ المتر المسطح توريد وتركيب تتبيله للجداول الفراغي Space Truss عباره عن ثلاث طبقات يتم تثبيتها بالموقع على المنشآت والطبقات الثلاث كما يلى:- المطلبة الأولى : الواح صاج ميغلايل ديك (Galvanized steel metal deck of thk. of 1.0 mm) المطلبة الثانية : الواح من الصوف الصخري Rock wall سك ٥٠ مم وكفايته ٥٠ كجم/م من انتاج شركة Glass rock او شركة 120CAM او ما يعادلها المطلبة الثالثة : الواح من Standing seam من خام الالومنيوم عرض ٤٠٠ مم وسمك ١,٠ مم والسر يتحمل كافة أعمال الحديد والصلب والماسير المجلفة ذاتية الشفط وتنخل الألواح في الاتجاهين طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف. (بالметр المسطح أربعة الآف و أربعمائة)	
٤٠,٩٨٧,٨٠٠	٧٥٤٠	٤٠٧٠	م	١٧ المتر المسطح تصميم وتصنيع توريد وتركيب جداول فراغي (Space truss) بوحدة مدبوبة لا تقل عن ٣,٠ m x3.0m، بظام نقاط التجمع الكروية والسر يشمل جلفة المنابر الإنشائية على الساخن والثخو باستخدام بور الكروستانيك مقاسات وسمك المنابر الإنشائية طبقاً للتصميم الإنشائي المعتمد والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف. (بالметр المسطح أربعة الآف و سبعمائة)	
١٠٠,١٤٠		٤٢٠	متر	١٨ المتر الطولي توريد وتركيب مجاري مطر من الصاج المجلد سك ١ مم والسر يشمل زيادة طول قطاع السجرى لعمل الدخان المناسب (٢٠ سم على الأقل) لمنع تسرب المياه وبين حفن سليمكون شفاف في أماكن التخلخلات والوصلات وطبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف. (المتر الطولي ثلاثة وثلاثون)	



بيانات مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)						
النوعية	الكمية	الوحدة	القيمة	النوعية	الكمية	النوعية
بالเมตร الطولي توريد وتثبيت حلقات من الصاج سمك ١ مم لزوم تثبيت الـ (Standing seam) طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٨٥	متر	٢٨٥	٤٨٥	متر	٣٦٥,٣٢٥
(بالметр الطولي ثلاثة و خمسة و ثمانون) أهمالي الأصل المعتمدة						١١٥,١٩٠,٦٣٥
أعمال المبني و التشطيبات						
بالเมตร المكعب توريد وعمل مباني سمك ٢٥ سـم من الطوب الطفلي بمونة تحتوي على ٣٠ كجم اسمـنـت / متر مكعب رمل و البند محـمـلـ عـلـيـ كلـ مـاـيلـزـ لـهـوـ الـأـعـمـالـ طـبـقـاـ لـلـمـوـاصـفـاتـ الفـنـيـةـ وأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ	١٩١.	م³	١٩٢	١٩١.	م³	٢٠٤,١٢٠
(بالـمـكـعـبـ مـاـلـةـ وـلـانـ وـلـانـ وـلـانـ) الـدـولـومـاـيـتـ بـمـوـنةـ تـحـتـويـ عـلـىـ ٣٠ كـجـمـ اـسـمـنـتـ / مـتـرـ مـكـعـبـ رـمـلـ وـبـنـدـ مـحـمـلـ عـلـيـ كـلـ مـاـيلـزـ لـهـوـ الـأـعـمـالـ طـبـقـاـ لـلـمـوـاصـفـاتـ الفـنـيـةـ وأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ	١٩٣١	م³	٧٧.	١٩٣١	م³	١,٤٨٩,٨٧٠
(بالـمـكـعـبـ سـبـعـمـائـةـ وـسـبـعـونـ) بالـمـكـعـبـ تـورـيدـ وـتـنـفـيـذـ مـبـانـيـ سـمـكـ ١٢ـ سـمـ منـ الطـوبـ الـأـسـمـنـيـ لـعـصـمـتـ الصـبـعـ منـ حـصـوـةـ مـنـ كـسـرـ	٢٢٢	م³	٢٨٥.	٢٢٢	م³	١,٢٣٩,٧٠٠
الـدـولـومـاـيـتـ بـمـوـنةـ تـحـتـويـ عـلـىـ ٣٠ كـجـمـ اـسـمـنـتـ / مـتـرـ مـكـعـبـ رـمـلـ وـبـنـدـ مـحـمـلـ عـلـيـ كـلـ مـاـيلـزـ لـهـوـ الـأـعـمـالـ طـبـقـاـ لـلـمـوـاصـفـاتـ الفـنـيـةـ وأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ	٢٠٠	م³	٢٢٠	٢٠٠	م³	٥٣,١٠٠
(بالـمـكـعـبـ مـاـلـةـ وـلـانـ وـلـانـ وـلـانـ) الـمـسـطـحـ طـبـقـاـ عـلـىـ الـشـرـاسـةـ خـفـيـةـ الـوـزـنـ يـمـتـصـ مـنـ مـنـسـنـتـ ١ـ سـمـ ،ـ بـمـاـ فـيـ ذـلـكـ جـمـيـعـ التـثـبـيـتـاتـ	٢٠٠	م³	٢١٥٥	٢٠٠	م³	٤٩٠,٠٠٠
الـلـازـمـ ،ـ وـالـخـوـ ،ـ وـالـأـعـدـ وـالـمـلـحـاتـ ،ـ وـالـبـنـدـ يـشـمـلـ كـلـ مـاـيلـزـ لـهـوـ الـأـعـمـالـ طـبـقـاـ لـلـمـوـاصـفـاتـ	١٠٠	م³	٢٥٣٠	١٠٠	م³	٣٩٢,١٥٠
الـفـنـيـةـ وأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـطـبـقـاـ لـلـتـفـاصـيـلـ الـتـنـمـيـةـ	١٦٦	م³	٦٦٠	١٦٦	م³	٤٣,٧٢٠
أعمال البلاط						
بالـمـكـعـبـ تـورـيدـ وـتـنـفـيـذـ بـبـاـشـ نـفـشـنـ لـلـحـواـلـطـ الدـاخـلـيـ وـدـرـوـرـ السـطـحـ مـنـ الدـاخـلـ بـسـمـ مـتوـسطـ ٢ـ سـمـ						
وـالـفـنـهـ تـشـمـلـ طـرـطـشـهـ المـعـوـيـهـ لـلـحـواـلـطـ الدـاخـلـيـ وـالـفـنـهـ تـشـمـلـ طـرـطـشـهـ المـعـوـيـهـ						
مـتـرـ مـكـعـبـ رـمـلـ وـطـبـقـاـ الـبـطـانـهـ وـالـفـهـارـهـ بـسـمـ ٥٠ـ سـمـ باـسـتـخـدـمـ مـوـنـهـ مـكـوـنـهـ مـنـ ٤٥ـ ٣٠ـ كـجـمـ اـسـمـنـتـ / مـتـرـ						
مـكـعـبـ رـمـلـ عـلـيـ انـ تـخـدـمـ بـالـمـعـاهـدـ جـيـداـ مـعـ عـلـمـ مـاـيلـزـ مـنـ بـرـوجـ وـأـوـنـارـ لـلـوـزـنـ الـأـفـيـ وـالـرـاسـيـ وـخـلـالـهـ وـالـفـنـهـ						
تـشـمـلـ تـورـيدـ وـتـبـيـتـ سـلـكـ بـقـلـاوـهـ مـجـفـنـ لـاـ يـقـلـ سـمـكـهـ عـنـ ١ـ سـمـ عـنـ مـنـاطـقـ اـتـصـالـ الـمـبـانـيـ بـالـعـاصـمـيـ						
الـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـأـصـوـلـ الصـنـاعـةـ						
(بالـمـكـعـبـ الـفـانـ خـمـسـمـائـةـ وـلـانـ وـلـانـ) الـمـكـودـ الـمـصـرـيـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ وـ						
الـصـنـاعـةـ						
(بالـمـكـعـبـ سـمـائـةـ وـسـبـعـونـ) أـعـالـمـ الـدـهـانـاتـ						



مقاييس مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)					
النوع	الكمية	الوحدة	النحو	المقدار	الاجمالي
11- عزل الكشاف	١٤٣٠	م²	١٨٠	٢٩٧,٦٠٠	<p>بالمتر المسطح توريد وتنفيذ دهانات الحوائط الداخلية باللون والتشطيب المطلوب على ان يختار ويمتد عيناتها ووانها ونوعه التشطيب (متوسط / خشن / مط / لامع) المهندس وذلك من الدهانات الجاهزة من مستحلب غليظ القوام قابل للتسبيل من انتاج شركة يوتون (JOTUN) او ما يختارها على ان تكون الخامات المستخدمة من النوع الذي لا يتأثر بالعامل الجوي و تكون ذات امكانيات كبيرة في اعطاء اسطuge زخرفيه معتمدة الاشكال ومناسبه لجمع الاحوال الجوية وعدم تغير اللون طول المدة حسب تعليمات الشركة المنتجة شاملة الوجه المطهري والبند يشمل مالاجه اي تمثيلات او شرخ شعره ان وجدت في الحوائط وذلك باستخدام مواد غير قابله للاكسماش قبل تنفيذ اعمال الدهانات والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر المسطح الفق لاريمانة ونلاتون)</p>
12- عزل الماء	٩٦٠	م²	١٨٠	١١٨,٨٠٠	<p>بالمتر المسطح توريد وتنفيذ دهانات الحوائط الخارجية باللون والتشطيب المطلوب على ان يختار ويمتد عيناتها ووانها ونوعه التشطيب (متوسط / خشن / مط / لامع) المهندس وذلك من الدهانات الجاهزة من مستحلب غليظ القوام قابل للتسبيل من انتاج شركة يوتون (JOTUN) او ما يختارها على ان تكون الخامات المستخدمة من النوع الذي لا يتأثر بالعامل الجوي و تكون ذات امكانيات كبيرة في اعطاء اسطuge زخرفيه معتمدة الاشكال ومناسبه لجمع الاحوال الجوية وعدم تغير اللون طول المدة حسب تعليمات الشركة المنتجة شاملة الوجه المطهري والبند يشمل مالاجه اي تمثيلات او شرخ شعره ان وجدت في الحوائط وذلك باستخدام مواد غير قابله للاكسماش قبل تنفيذ اعمال الدهانات والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر المسطح الفق لاريمانة وستون)</p>
13- عزل الكسيفات	١٩٧٠	م²	٧٠٠	١١١,٢٥,٠٠٠	<p>عنة معتمدة لزوم الواجهات الخارجية طبقا للاعتماد والدراسات الانسانية المعتمدة وفي الاماكن المحددة في الرسومات الهندسية من عينه معتمدة شامل الزجاج والتثبيت والفاصل والابواب والشبابيك والاسكسوارات باعتماد تصميم الشاصية والهيكلات والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر المسطح الف ل تماملاة وسبعون)</p>
14- عزل الكسيفات	٢٠٣٠	م²	١٠١٢٥	٢٥,٦٦٦,٢٠	<p>بالمتر المسطح تصنيع و توريد وتركيب هيكل معدني مكون من اعمدة ثلاثة مكورة بارتفاعات حتى ٢٠ م و كذلك كابولي حديدي مزدوج بطول حتى ١١,٦ م مشدود من الخلف بركلات من الحديد المعدول و مثبت على الأرض عن طريق بالهات و اكتوارات مفتوحة في القاعدة الخرسانية الخاصة به والبند لا يشمل الاعمال العدنية و يتضمن التقطيع بخطاء من خامة HDPE باللون المطلوب و جمع اسكسوارات التركيب و دهانات الغريل من مادي ٩٩٠١ Intergard , ٢٦٩ Interthane او الاواني والراويف و يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر المسطح الفان خمسة وثلاثون)</p>
15- عزل الكسيفات	١٦٥٠	م²	٤٠٠	٦,٤٠٠,٠٠٠	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب CNC ALUMUNUM CLADDING كما هو موضح بالرسومات المعمارية ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار عيناتها المهندس المشرف والبند شامل التثبيت والاسكسوارات والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر المسطح الف ستمائة وخمسون)</p>
16- عزل الكسيفات	١٤٣٠	م²	٢٠٧٤	٢,٣٨,٠٨٢	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب ALUMUNUM CLADDING كما هو موضح بالرسومات المعمارية ويتم التركيب في الاماكن التي يحددها ويختار عيناتها المهندس المشرف والبند شامل التثبيت والاسكسوارات و البند يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر المسطح الف واريمانة وللاتون)</p>
17- عزل الأرضيات	١٥٩٥	م²	٣٩٦٠	٦,٨٠٨,٨٠٠	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب PVC WOOD PANELS كما هو موضح بالرسومات المعمارية لزوم الواجهات الداخلية باللون والقطاعات المعتمدة من الاستشاري والبند شامل التثبيت والاسكسوارات وكل ما يلزم لنها العمل كاملا طبقا للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر المسطح الف خمسة وخمسة و سبة و تسون)</p>

مقدمة مشروع محطة التوزيعات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)							
النوع	الكمية	الوحدة	البيان				
الإجمالي							
١٩٤٤,٨٠	١٠٤٠	١٨٧٠	٢م	١٥	كود تشطيب (PORCELAIN TILES 0.60 X 0.60 M) بالเมตร المسطح توريد وتركيب بلاط بورسلين من إنتاج الجوهرة باللون المطلوب مقاس ٦٠٠*٦٠٠ وستستخدم مواد الإسمنت والرمل وماهاد لصق من شركة معتمدة بالنسبة للمحدث والمطلوب طبقاً للمواصفات الفنية على فرشة من الرمل النظيف ويتم التركيب في الأماكن التي يحددها وبختار الوانها المهندس وتعتمد العينة قبل التوريد وذلك طبقاً لاصول الصناعة كما تشمل الفتنة سقيه الحمامات بعدها سقيه معتمد باللون المطلوب بمادة سقيه معتمدة باللون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية والمهندسين المشرف والمراقبة الفنية وأصول الصناعية (بالметр المسطح ألف وثمانمائة وسبعين)		م
١١٣,٣٠	٥١٥	٢٢٠	٢م	١٦	كود تشطيب (CERAMIC TILES 0.40 X 0.4 OM) بالметр المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك مقاس ٤٠٠*٤٠٠ او طبقاً للعينة المعتمدة لزوم ارضيات الحمامات والمخازن تستخدم منه الإسمنت والرمل بالنسبة للمحدث والمطلوب طبقاً للمواصفات الفنية على فرشة من الرمل النظيف ويتم التركيب في الأماكن التي يحددها وبختار الوانها المهندس وتعتمد العينة قبل التوريد وذلك طبقاً لاصول الصناعة كما تشمل الفتنة سقيه الحمامات بعدها سقيه معتمد باللون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعية (بالметр المسطح مائتان وعشرون)		م
٢٤٣,٧٥	٥١٥	٥٥٠	٢م	١٧	كود تشطيب (CERAMIC TILES 0.40 X 0.4 OM) بالметр المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك مقاس ٤٠٠*٤٠٠ او طبقاً للعينة المعتمدة لزوم حوائط الحمامات شامل مواده استثناء والرمل وماهاد لصق من شركة معتمدة بالنسبة للمحدث والمطلوب طبقاً للمواصفات الفنية ويتم التركيب في الأماكن التي يحددها وبختار الوانها المهندس وتعتمد العينة قبل التوريد وذلك طبقاً لاصول الصناعة كما تشمل الفتنة سقيه الحمامات بعدها سقيه معتمد باللون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نحو كاملاً طبقاً للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف (بالметр المسطح خمسة وخمسون)		م
٢٤٩,٤٠	١٠٦٠	٤٤٠	٢م	١٨	كود تشطيب (EPOXY PAINT) بالметр المسطح توريد وصب دهانات ابويوكسي بالشكل واللون المعتمدة طبقاً للرسومات الهندسية والبنية تشمل اعمال تسوية الارضيات والجلي ودهان البرايمير وعمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعية (بالметр المسطح لرسمالة واربعون)		م
٨٥٠,٠٠	٧٥٠	٢٢٠	٢م	١٩	أعمال الرخام بالметр الطولي توريد وتركيب درج السلم (الناتئه سميكة ٤ سم) من عينة DOUBLE BLACK متعدد لزوم السالم والبند يشمل توريد وتركيب بلايس رخام من نفس النوع بطول ٤ سم وكذلك يشمل تالونه والتركيب مع التشطيب طبقاً للرسومات (بالметр الطولي للارتفاع وتلاتون)		م
٢,٢٨٨,٠٠	٤١٩٠	٥٥٠	٢م	٢٠	بالметр المسطح توريد وتركيب رخام اسود اسياني سميكة ٢ سم لزوم الارضيات وستستخدم مواد الإسمنت والرمل زماده لصق من شركة معتمدة بالنسبة للمحدث والمطلوب طبقاً للمواصفات الفنية على فرشة من الرمل النظيف ويتم التركيب في الأماكن التي يحددها وبختار الوانها ومقاساتها المهندس وتعتمد العينة قبل التوريد وذلك طبقاً لاصول الصناعة كما تشمل الفتنة سقيه الحمامات بعدها سقيه معتمد باللون المطلوب وعمل كل ما يلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية واصول الصناعية (بالметр المسطح خمسة وخمسون)		م
٢,٤٣٢,٠٠	١٣٠٠	٢٦٦٠	٢م	٢١	بالметр المسطح توريد وتركيب رخام ابيض ابيض سميكة ٢ سم لزوم الارضيات وستستخدم مواد الإسمنت والرمل وماهاد لصق من شركة معتمدة بالنسبة للمحدث والمطلوب طبقاً للمواصفات الفنية على فرشة من الرمل النظيف ويتم التركيب في الأماكن التي يحددها وبختار الوانها ومقاساتها المهندس وتعتمد العينة قبل التوريد وذلك طبقاً لاصول الصناعة كما تشمل الفتنة سقيه الحمامات بعدها سقيه معتمد باللون المطلوب (بالметр المسطح ثمان وسبعين)		م
٢,٣٥٣,٥٠	٤٢٩٠	٤٢٩٠	٢م	٢٢	بالметр المسطح توريد وتركيب رخام ابيض ابيض سميكة ٢ سم لزوم تجليد الجولف بالاماكن الموضحة بالرسومات والفتنة تشمل التركيب الميكانيكي على شاسيه معدني من الحديد المغلف المهنون الكروستاني والكلات من الاستانلس سيل وملء المؤاميل بالفوم والسيلكون ومحمل عليه كافة مستلزمات التركيب كطبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة (بالметр المسطح خمسة وخمسون)		م



بيانات المشروع					
النوع	الكمية	الوحدة	القيمة	الملاحظات	الرقم
أعمال السقف المعلقة					
كود تثبيط GYPSUM BOARD :-					
بالنطاط المسطوح توريد وتركيب أسلف مملئه من الواح الجبس سلك ١٢ مم من المشطوف الاحرف لزوم الاسقف الداخلية ويتم تركيبها على المناسب التي يحددها المهندس والاسفلت من انتاج شركه KNAUF او ما يماثلها من عينه تعتقد قبل التوريد وتركيب في الاماكن المحددة لها بالرسومات وبحسب تليميتس المهندس ويتم التركيب طبقاً لتعليميات الشركة المنتجة وذلك بواسطه دلائل من الحديد المجلفن تثبت بالأسفلت الغرساني مع عمل الكمرات CELLINGS METAL PROFILES الغير ظاهره من الصاج المغلف من القطاعات الخاصة بها العمل والمنتجة والمعتمده من الشركة المنتجه في الاتجاهين وفي محيط المساف حسب القطاعات والمسافات التي تحددها الشركة المنتجه وتتحمل الفتح تركيب (TRIMS) ظاهره حول الحوالط بقطاع من الالومونيوم المدهون بالاتمام بوبه الفرن وكل ما يلزم من قطع الاتصال وسامير الربط الصاج والجبس كل حسب موضعه واشرطة الحمامات والمجنون وخلاله مخابر التكيف والاصحي ان وجدت وكل ذلك التشكيل حسب الشكل الموضح بالرسومات وان يتم عمل تجويف لوحدات الاضاءه المستمرة ان وجدت مع تحديد النهايات الراسيه في الاماكن الظاهره بالواح الجبس وكل ما يلزم لنحو البند طبقاً لاصول الصناعة مع ضرورة عمل عينه يعتمدها المهندس المشرف (بالنطاط المسطوح ستمالة وستون)	٤٥				
أعمال الزجاج وأبواب السيورن					
كود تثبيط GYPSUM TILES :-					
بالنطاط المسطوح توريد وتركيب أسلف مملئه من الواح الجبس سلك ١٢ مم من المشطوف الاحرف مقاومة الرطوبة سلك ١٢ مم ومقاس البلاطة ٩٠٠ - ٦٠٠ - ٣٠٠ مم المشطوف الاحرف من انتاج شركه KNAUF وما يتم لها من عينه تعتقد قبل التوريد وتركيب في الاماكن المحددة لها بالرسومات وبحسب تليميتس المهندس ويتم التركيب طبقاً لتعليميات الشركة المنتجه وذلك بواسطه دلائل من الحديد المجلفن تثبت بالأسفلت الغرساني مع عمل الكمرات CELLINGS METAL PROFILES الغير ظاهره من الصاج المغلف من القطاعات الخاصة بها العمل والمنتجة والمعتمده من الشركة المنتجه في الاتجاهين وفي محيط المساف القطاعات التي تحددها الشركة المنتجه وتتحمل الفتح تركيب (TRIMS) ظاهره حول الحوالط بقطاع من الالومونيوم المدهون بالاتمام بوبه الفرن وكل ما يلزم من قطع الاتصال وسامير الربط للصاج والجبس كل حسب موضعه واشرطة الحمامات والمجنون وخلاله مخابر التكيف والاصحي ان وجدت وكل ذلك التشكيل حسب الشكل الموضح بالرسومات وان يتم عمل تجويف لوحدات الاضاءه المستمرة ان وجدت مع تحديد النهايات الراسيه في الاماكن الظاهره بالواح الجبس وكل ما يلزم لنحو البند طبقاً لاصول الصناعة مع ضرورة عمل عينه يعتمدها المهندس المشرف (بالنطاط المسطوح مائتان وعشرون)	٤٦				
أعمال الزجاج وأبواب السيورن					
كود تثبيط GYPSUM BOARD :-					
بالنطاط المسطوح توريد وتركيب قواطع من الالومونيوم و الزجاج السيورن سلك ١٠ مم ذو سطح شفاف لزوم الواجهات التجارية والمكاتب والبند يشمل شاسيه اكسسوارات التركيب من السنانس استيل وكذاك اعمال الابواب وكل ما يلزم من اكسسوارات وخدوات وقطع خاصة للرسومات وخلافه من السنانس استيل لنحو الاعمال على الوجه الاكمي وطبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتليميتس المهندس المشرف (بالنطاط المسطوح للائمة وللاندون)	٤٧				

الطبعة العامة المطبوعة
من قبل دائرة الادارة والتخطيط
والنقل



بيانات المشروع					
العنوان	النوع	الكمية	الوحدة	المقدار	التفاصيل
العنوان: الشركة الوطنية سامكو	النوع: الأبواب	الكمية: ٦٣٠٠٠	الوحدة: عدد	٦٣٠٠٠	بالعدد توريد وتركيب باب PHOTOCELL مترادف من الزجاج لزوم أبواب المدخل كما هو موضح بالرسومات الهندسية بأيامد الزجاج ٢,٣٠٠ متر أو البند يشمل كل ما يلزم من الأكسسوارات وخدوات وخلافه فهو لاعمال على الوجه الأكمل وطبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالعدد خمسة)
العنوان: الشركة الوطنية سامكو	النوع: الأبواب	الكمية: ٤٠٠,٤٠٠	الوحدة: عدد	٤٠٠,٤٠٠	بالمتر المربع توريد وتركيب أبواب خشبية كبس يمطرطن ورسوات من الموسي وقشرة (ماهوجني - قرو - جنر) مدهون دهان است باللون المطلوب تورد كاملة بالحلقون وفقاً للنماذج والإهداء المبني على الرسومات من فهو الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والبند يشمل جميع الأكسسوارات اللازمة للتركيب وكذلك عمال الحلق الزفر من خشب الموسي كبس باللوحات ولزوم غرف الخدمات والحمامات والدهان است و لاكي طبقاً للرسومات والتصميمات وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالمتر المربع ثمانى وثمانون)
العنوان: الشركة الوطنية سامكو	النوع: الأبواب	الكمية: ١٠٠٩٩,٩٠٠	الوحدة: عدد	١٠٠٩٩,٩٠٠	أعمال الأبواب المعدنية المتر المسطح توريد وتركيب أبواب معدنية WITH LOUVERS مكون من شاسيه مكون من علب ومحوظ معدنية وتجليد صاج من الجھتين ومهندون بدهان اللكروستانيك باللون المطلوب و شامل الأكسسوارات اللازمة لزوم غرف الخدمات طبقاً للبروم والأدوار المتكررة طبقاً للرسومات والبند شامل مما جمهه طبقاً للتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لأصول الصناعة (بالمتر المسطح ستة و ستون)
العنوان: الشركة الوطنية سامكو	النوع: الأبواب	الكمية: ١١٥,٧٦٠	الوحدة: عدد	١١٥,٧٦٠	أعمال الأبواب المعدنية بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب شبائك من قطعات الألزومنيوم الملون مطليه الكتروستانيك باللون المطلوب (قطعات PS كبيرة) طبقاً للرسومات ومحمل على البند زجاج باللون المطلوب سمك ٦ مم وطبقاً للنماذج المعتمدة والسر يشمل توريد وتركيب جميع الأكسسوارات والحلوق والخدوات والمفصلات والأكريليك وكم يلزم ل فهو العمل فهو نهوا كاماًلا طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والرسومات الهندسية التوضيحية (بالمتر المسطح مائة و عشر)
العنوان: الشركة الوطنية سامكو	النوع: الأبواب	الكمية: ٣٠٠,٣٠٠	الوحدة: عدد	٣٠٠,٣٠٠	أعمال الزجاج والألمنيوم بالمتر الطولي توريد وتركيب هاندلزيل من STAINLESS STEEL 304 وارتفاع لا يزيد عن ١٠٠ سم كما موضح بالرسومات المعمارية والفتحة تشتمل تركيب زجاج ميكرويت سمك ١٠ مم ويتم التركيب في الأماكن التي يحددها ويختار عيناتها المهندس وكل ما يلزم ل فهو البند زجاج باللون المطلوب مع حمالة عمل عليه يعتمد لها المهندس قبل التوريد باللون والملمس المطلوب وكل ما يلزم ل فهو العمل فهو نهوا كاماًلا طبقاً للكود المصري وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات الفنية وأصول الصناعة (بالمتر الطولي للألماتة و ثلاثة)
العنوان: الشركة الوطنية سامكو	النوع: الأبواب	الكمية: ٢٥,٧٥٠	الوحدة: عدد	٢٥,٧٥٠	أعمال HPL بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب HPL للحمامات سمك ١٢ امم من عينة معتمدة شامل التثبيت والفاصل والأكسسوارات وكافة ما يلزم واعتماد العينات من المهندس المشرف طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والرسومات الهندسية التوضيحية (بالمعدل لمجيء عشر)
العنوان: الشركة الوطنية سامكو	النوع: الأبواب	الكمية: ١٧,٩٤٠	الوحدة: عدد	١٧,٩٤٠	أعمال الألاتات والدعالية بالمعدل توريد وتركيب لوحات استنادية لزوم الموقع العام مكونة من عمود من الفير جلاس بارتفاع ٣ متر وقاعدة حديد ٣x25x25 سم ومزود بقاعدة ديكورية كما بالرسومات المعتمدة وشبلونة حديد باللون الأسود يمدون دلفنة ٢٥٠٤x٢٥٠٤ سم وعد ٤ جوبيط مقاس ١٨x٤٠٠ سم مجلفن شامل الصاملة والدور والبند شامل مما جمهه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (بالمعدل ستة)
بيانات المشروع					

مقاييس مشروع محطة الاتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري وملحقاته)

العنوان	النقطة	الكمية	الوحدة	القيمة
٥٩,٤٠٠	١٣٥.	٦٦	م²	<p>بالندر المسطح توريد وتركيب سريرها من البلاط المنقى سمك ٢ م ازور العجلات مشطوف الحرف بالبازر عرض ٢ سم من الفلاح جوش او سفن جوبيان او ما يسمى بـ زفاف توريد وتركيب طبقاً لجودة نعمة تعدد من الاستثنائي وطبقاً للوائح التفصيمية والتتفتالية مع نهر اليند نهراً كملأ طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف</p> <p>(بالندر المسطح اوريكة وابريون)</p>
٥١٩,٧٥٠	١٣٥	٧٨٥٠	م³	<p>كحد نشطوب (Curb Stone) توريد وتركيب بربورات طرحة للجذار بمقاسات ٥٠٠٣٠٠٠ سم</p> <p>بالندر الطولى توريد وتركيب بربورات طرحة للجذار بمقاسات ٥٠٠٣٠٠٠ سم</p> <p>في الأسنان المحددة بحدائق التشييد والأماكن التي يعتمد بها المهندس المشرف وعمل كل ما يلزم لدور الأعمل فيها ثاماً وكملأ طبقاً للمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف وأصول الصناعة وحصل على اليند دهن الاجراء الشاهرا من الربورات ببروة مختلفة وبكلرين المقلين بمدينة المشروع (الثانية الافت وشاملة ومسمن متر طولي)</p>
٦٧٩٣,٣٠٠	٢٦٢	١٧٦٠	م²	<p>بالندر المسطح توريد وتركيب بلاط متلألئ انفراروك بالألوان المطلوبة الفصمة ميكانيكا بالكلبس الهيدروليكي من تطبيقات من تغير واحد طبقاً للجنة والمقاييس واللون المطلوب على أن تكون لها قدرة عالية لمقاومة الباري والاحتكاك وتركيب على فرشة من الرمل المشطوف ولذلك محلل علىها السفينة وتم الاعمل طبقاً لتطبيقات المهندس المشرف والبند يشمل جميع الخدمة والمعدات والمصلحات اللازمة لانهاء الاعمال على فوجه الاكم الافتتحة طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة</p> <p>(بالندر المسطح بجمة عشر ثالثة و مائة)</p>
٧٨٦,٠٠٠	٩٠	١٦٣٠	م³	<p>بالندر المسطح - توريد وتركيب بازلت أسود وأصفر غديم ونائم سمك ٧ سم تلمس بمحنة لستانية ويتم التفتق</p> <p>طبقاً لدراسات التفاصيل والمقدمة المستمد بالموقع ويتم لدور العمل طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف</p> <p>(بالندر المسطح ثالثة واربعة وثلاثون)</p>
٧٠٦,٠٠٠	٨٠	٤٨٠	م²	<p>عمل الزراعات</p> <p>بالندر المسطح عمل حجارة طبيعية بقياس ١٠ من عينة ممتدة شامل طبقة الرمل حسب أصول الصناعة وعمل كل ما يلزم لدور الأعمل نهراً ثاماً وكملأ طبقاً للمواصفات الفنية وتطبيقات المهندس المشرف وأصول الصناعة</p> <p>(بالندر المسطح ثمانية وعشرون وثمانة)</p>
٩٩٠,٠٠٠	٧٥	١٣٢٠	عدد	<p>بالندر - توريد وزراعة اورقية دم الغزال (حراء) في ١١ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد طرحة الازمة للزراعة مع نهر اليند نهراً كملأ طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(بالندر ثلاثة عشر ثالثة و مائة)</p>
٥٩٤,٠٠٠	١٥	١٤٢٠	عدد	<p>بالندر - توريد وزراعة اورقية بطيء في ١٦ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد للزراعة</p> <p>الازمة للزراعة مع نهر اليند نهراً كملأ طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(بالندر ثلاثة عشر ثالثة و مائة)</p>
٤٣٥,٦٠٠	٢٢	١٣٢٠	عدد	<p>بالندر - توريد وزراعة اورقية مزمرة داخل قصاري من الغبار والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد للزراعة</p> <p>الازمة للزراعة مع نهر اليند نهراً كملأ طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(بالندر ثلاثة عشر ثالثة و مائة)</p>
١٩٨,٠٠٠	٧٠	١٩٠	عدد	<p>بالندر - توريد وزراعة دورن تاليفوني في ١١ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد للزراعة</p> <p>الزراعية مع نهر اليند نهراً كملأ طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(بالندر ستة الاف و سنتنة)</p>
٤٤٧,٠٠٠	٧٠	٩٩٠	عدد	<p>بالندر - توريد وزراعة الاتيترا جلبو في ١١ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد للزراعة</p> <p>الزراعية مع نهر اليند نهراً كملأ طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(بالندر ستة الاف و سنتنة)</p>
١٨٧,٠٠٠	١٠٠	١٨٧٠	عدد	<p>بالندر - توريد وزراعة ورد ناري (بلبلنا) روز داخل قصاري من قفل والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد</p> <p>الزراعية للزراعة مع نهر اليند نهراً كملأ طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف .</p> <p>(بالندر ثالث و شمسة و سبعون)</p>
٣٩٩,٠٠٠	٧٠	١٧٤٠	عدد	<p>بالندر - توريد وزراعة ثبات حربوك مفتلة مثل (طوبية بيتونيا ...) داخل قصاري والبند شامل التوريد</p> <p>والزراعة وتوريد للزراعة الازمة للزراعة مع نهر اليند نهراً كملأ طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف</p> <p>(بالندر ثالث و شمسة و سبعون)</p>

النحوه المائية لتصنيع و التركيب
النحوه المائية لتصنيع و التركيب



نائب ديزاينر
مهندسوں معماريون





المقاول، الشركة الوطنية سامكو

الاستشاري الالكتروني
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERINGNADDESIGN ARCHITECTS & URBAN
PLANNERSالى مجلس إدارة الشركة العامة للطرق والكباري
ال والله يا اهلا

مقاييس مشروع محطة التوزيعات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)

الرقم	النحو	الكمية	الوحدة	القيمة	الاجمالي
٤٨	بالعدد - توريد وزراعة نبات جارونيا عامر انواع داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد الفان و سبعمائة وخمسون)	٤٠	٢٧٥٠	عدد	١١٠,٠٠٠
٤٩	بالعدد - توريد وزراعة نخل سينكس داخل منضد خشب ارتفاع الساق من ٥٠ إلى ٧٠ سم خشب داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد مائة خمسة وستون)	٦٥٠	١٦٥	عدد	١٠٠٧٢,٠٠٠
٥٠	بالعدد - توريد وزراعة نخل اركيك صفاره داخل قصيرة ٥٠ به تفرعات لا تقل عن ٥ أذرع ارتفاع من ١,٥ متر الى ٢ متر داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد مائة خمسة وستون)	١٢٩٠	١١	عدد	١٨٨,٧٦٠
٥١	بالعدد - توريد وزراعة نبات لاكتافيلوم أبيض في ٣٨ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد مائة خمسة وستون)	٧٥٠	١٦٥	عدد	١٢٣,٢٥٠
٥٢	بالعدد - توريد وزراعة نبات لاكتافيلوم أبيض في ١٨ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ألف و مائة)	٦٥	١١٠	عدد	٧١,٥٠٠
٥٣	بالعدد - توريد وزراعة نبات تروبيموهي هري قصيرة ٥٠ ارتفاع ٣٠ إلى ٤٠ م داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ستة وستون)	١٨٠٠	٦٦	عدد	١٣٨,٨٠٠
٥٤	بالعدد - توريد وزراعة نبات تروبيموهي هري قصيرة ٥٠ ارتفاع ٣٠ إلى ٤٠ م داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد اربعة وأربعين)	٢٦١٠	١١	عدد	١٢٥,٨٤٠
٥٥	بالعدد توريد وزراعة نبات كولورين قصيرة ١٦ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ألف وثمانمائة وسبعين)	٦٥	١٨٧٠	عدد	١٢١,٥٠٠
٥٦	بالعدد توريد وزراعة نبات جازونيا مستوردة ألوان قصيرة ٥٠ داخل قصاري والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد تمامة وخمسة وعشرون)	٨٠٠	٨٢٥	عدد	١١٢,٥٠٠
٥٧	بالعدد توريد وزراعة نخل ملوك ارتفاع ٣٠ إلى ٤٠ م داخل منضد خشبي والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد أحدي عشر)	٢٥٠٠٠	١١	عدد	٧٧٥,٠٠٠
٥٨	بالعدد توريد وزراعة نخل بلح زغول ارتفاع ٣٠ إلى ٤٠ م والبند شامل التوريد والزراعة وتوريد التربة اللازمة للزراعة مع نهو البند فهو كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. (بالعدد ثمان وعشرون)	٩١٠٠	٧٨	عدد	٧٥١,٨٠٠
	اجمالي أعمال المبني والإنشائيات				٩٦٤,٥٢٠

الأعمال الإلكترونية

الأعمال الكهربائية	أعمال التوزيع	الرقم
	توري وتركيب لوحة عمومية طراز EDP-GEN مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٥٠ ٢٠٠ و قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٠٠٠ أمبير وقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ١١٠ أمبير حسب الرسمات والمواصفات. (بالعدد واحد)	١-١

بيانات مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)						
الإجمالي	النوع	الكمية	الوحدة	المقدار	الوصف	الملاحظات
٩٥,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	١	عدد	٤٠٠٠	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٥٠ أمير و ٣ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٠٠ أمير و ٢ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ١ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠٠٠	(بالعدد واحد)
١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١	عدد	٦٣	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ١ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠٠٠	(بالعدد واحد)
٥٦,٨٦٢	٥٦,٨٦٢	١	عدد	٦٣	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ١ قاطع دائرة MCB ثالثي القطب بقدرة ٤٠٠٠	(بالعدد واحد)
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١	عدد	٦٣	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ١ قاطع دائرة MCB ثالثي القطب بقدرة ٤٠٠٠	(بالعدد واحد)
٧٤,٠٥٢	٧٤,٠٥٢	١	عدد	٤٠	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمير و ٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٤٠	(بالعدد واحد)
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٢	عدد	٢٢	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٢ أمير و ٦ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٢٢	(بالعدد واحد)
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١	عدد	٦٣	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ١٢ قاطع دائرة MCB ثالثي القطب بقدرة ٦٣	(بالعدد النان)
٧٧,٠٠٠	٧٧,٠٠٠	١	عدد	٤٠	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمير و ٥ قاطع دائرة MCB ثالثي القطب بقدرة ٤٠	(بالعدد واحد)
٣٩,٣٦٧	٣٩,٣٦٧	١	عدد	٦٣	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ٢ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣	(بالعدد واحد)
٦٨,٠٥٨	٦٨,٠٥٨	١	عدد	٤٠	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمير و ٢ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠	(بالعدد واحد)
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١	عدد	٦٣	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ٩ قاطع دائرة MCB ثالثي القطب بقدرة ٦٣	(بالعدد واحد)
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١	عدد	٤٠	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمير و ٦ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٤٠	(بالعدد واحد)
٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١	عدد	٦٣	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ١٤ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٦٣	(بالعدد واحد)
١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١	عدد	٢٥٠	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٥٠ أمير و ٣ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٢٠٠	(بالعدد واحد)
٧٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١	عدد	٤٠	مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠ أمير و ٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٤٠	(بالعدد واحد)

مقاييس مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
الإجمالي	النوع	الكمية	الوحدة	البند	
٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	١	عدد	٢١-١ مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ٧ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٤٣ أمير حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد واحد)	٤
١١٤,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٢	عدد	٢١-٢ ١١٤,٠٠٠ مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٣ أمير و ٧ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٤٣ أمير حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد ثلاثة)	١٨-١
٢٧٩,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	١٥	عدد	٢١-٣ ٢٧٩,٠٠٠ PP.SH2 مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٣٢ أمير و ٤ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٣٢ أمير حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد خمسة عشر)	١٩-١
٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	١	عدد	٢١-٤ ٣٥,٠٠٠ PP.CL مذودة بقاطع دائرة MCCB أحادي القطب بقدرة ٤٠ أمير و ٦ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٤٠ أمير و ٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ١٦ أمير حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد واحد)	٢٠-١
٩٣,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	٢	عدد	٢١-٥ ٩٣,٠٠٠ MCC1 مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٣ أمير و ٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٤٣ أمير حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد ثلاثة)	٢١-١
١٤٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٢	عدد	٢١-٦ ١٤٠,٠٠٠ DP-PUMP1 مذودة بقاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ٤ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٦٣ أمير و ٢ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ٢٠ أمير و ٣ قاطع دائرة MCB أحادي القطب بقدرة ١٦ أمير حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد الثناء)	٤٤-١
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١	عدد	٢١-٧ ١٢٥,٠٠٠ EDP-SMOKE مذودة بـ ٢ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠٠ أمير و ٣ قاطع دائرة MCCB ثلاثي القطب بقدرة ٤٠٠ أمير حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد واحد)	٤٣-١
٨,٧٧٩	٨,٧٧٩	١	عدد	٢١-٨ ٨,٧٧٩ توريد وتركيب لوحة طراز (LBS) سعة ٤٥ أمير تركب بجوار وحدة UPS . (بالمدد واحد)	٤٤-١
٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١	عدد	٢٠-٣ ٨٠,٠٠٠ توريد وتركيب لوحة توزيع (ولاعة) حسب الرسومات والمواصفات ومن إنتاج شركة شيلبر أو أراب أو ما ينتمي لها وخاصة بزيارة الموقع العام، ومحمل على البند كل ما يخصها من الخلايا الضوئية ويصنع جسم اللوحة من الصاج المقاومة للموائل الجوية IP-54، ومحمل أيضاً على البند ما يخصه من أعمال التركيب والتوصيل والاختبار وخلافه وكل ما يلزم لإنتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد واحد)	٤٥-٣
١١٥,٠٠٠	١١٥,٠٠٠	١	عدد	٢١-٩ ١١٥,٠٠٠ توريد وتركيب لوحة A.T.S A.T.S خاصة بتنمية لوحة الطوارئ العمومية كاملة بمتناوح التحويل الآوتوماتيكي ٢٠٠ أمير رفيع (لوحة اقطاب) حسب الرسومات والمواصفات ودرجة الحماية الميكانيكية لها IP-55 . ومحمل على البند كل ما يخصه من أعمال التركيب والتوصيل والاختبار وخلافه وكل ما يلزم لإنتمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد واحد)	٤٣-١
٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	١	عدد	٢ ٧٥٠,٠٠٠ توريد وتركيب وحدة توليد كهربائية سعة ٢٥٠ ك.ف، جهد ٣٨ فولت من أجود الأنواع مثل كمنز أو كثيلر أو ماما بمتناهاها ومحمل على البند كذلك القاطع الرئيسي به وجزئيات الوقود البوتومية (داخل المولد) والثانوي وكذلك السخانات الازمة لتجهيزه للدخول على الحمل مباشرة وجميع التجهيزات الخاصة بقدرة المولد من الكهوف ومسارات مواسير الوقود ومسار شكمان المادم حتى سطح المبني حسب الرسومات والمواصفات. (بالمدد واحد)	٢
١٧٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	١	عدد	٢ ١٧٠,٠٠٠ وحدة UPS توريد وتركيب وحدة UPS اللازمة قدرة ١٠ ك.ف، من أجود الأنواع وتكون الوحدة قادرة على تنفيذ الشبكة لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة ومحمل على البند كل ما يلزم لتركيب والتوصيل والاختبار وخلافه حسب الرسومات والمواصفات (بالمدد واحد)	٢
مخارج الإنارة الداخلية					



مقاييسه مشروع محطة الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
النوع			المقدار		
الإجمالي	النوع	الكمية	الوحدة	المقدار	
٦٥٠,٠٠		١,٣٠	عدد	٢٧٠	١٤٠
	٢٧٠	٣٠	عدد	٣٠٠	٣٠٠
١١٢,٥٠		١,٦٠	عدد	٣٥٤	٧٠٦
	٣٥٤	٣٥٤	عدد	٣٥٤	٣٥٤
٧٨٠,٠٠		٤,٠٠	عدد	٣٥٩	٥
	٣٥٩	٣٥٩	عدد	٣٥٩	٣٥٩
١١٧,٠٠		٧,٠٠	عدد	٣٦٣	١٥
	٣٦٣	٣٦٣	عدد	٣٦٣	٣٦٣
٤٨,٠٠		٧,٠٠	عدد	٣٦٤	٢٠
	٣٦٤	٣٦٤	عدد	٣٦٤	٣٦٤
٢٠,٠٠		٠,٠٠	عدد	٣٦٥	٢٠
	٣٦٥	٣٦٥	عدد	٣٦٥	٣٦٥
٤٧٦,٠٠		٧,٠٠	عدد	٣٦٧	٢٠
	٣٦٧	٣٦٧	عدد	٣٦٧	٣٦٧
٧٥٠,٠٠		٥,٠٠	عدد	٣٦٨	٢٠
	٣٦٨	٣٦٨	عدد	٣٦٨	٣٦٨
٦٩,٠٠		١,٥٠	عدد	٣٦٩	٢٠
	٣٦٩	٣٦٩	عدد	٣٦٩	٣٦٩
٤٧,٠٠		١,٥٠	عدد	٣٧٠	٢٠
	٣٧٠	٣٧٠	عدد	٣٧٠	٣٧٠
٩٤,٠٠		١٠,٠٠	عدد	٣٧١	٢٠
	٣٧١	٣٧١	عدد	٣٧١	٣٧١
١١,٠٠		٢,٠٠	عدد	٣٧٢	٢٠
	٣٧٢	٣٧٢	عدد	٣٧٢	٣٧٢
١٤,٠٠		٢,٠٠	عدد	٣٧٣	٢٠
	٣٧٣	٣٧٣	عدد	٣٧٣	٣٧٣
٢٢٠,٠٠		٤,٠٠	عدد	٣٧٤	٢٠
	٣٧٤	٣٧٤	عدد	٣٧٤	٣٧٤
١٨,٠٠		٢,٠٠	عدد	٣٧٥	٢٠
	٣٧٥	٣٧٥	عدد	٣٧٥	٣٧٥
٢٢٠,٠٠		٤,٠٠	عدد	٣٧٦	٢٠
	٣٧٦	٣٧٦	عدد	٣٧٦	٣٧٦
٢٢٠,٠٠		٤,٠٠	عدد	٣٧٧	٢٠
	٣٧٧	٣٧٧	عدد	٣٧٧	٣٧٧
٢٢٠,٠٠		٤,٠٠	عدد	٣٧٨	٢٠
	٣٧٨	٣٧٨	عدد	٣٧٨	٣٧٨
٢٢٠,٠٠		٤,٠٠	عدد	٣٧٩	٢٠
	٣٧٩	٣٧٩	عدد	٣٧٩	٣٧٩
٢٢٠,٠٠		٤,٠٠	عدد	٣٨٠	٢٠
	٣٨٠	٣٨٠	عدد	٣٨٠	٣٨٠

مقاييس مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)				
النوع	الكمية	الوحدة	المقدار	الملاحظات
توريـد و تركـيب مخرج إثارة بالاـرض بـكابلـات الـومـنـيوم قـطـاع (١٦٤) مـم ٢ خـاصـة بـالـمـنـاطـق الـخـضـرـاء وـمـحـمـل عـلـىـ الـبـنـدـ ماـلـيـزـ منـ أـعـالـىـ التـوـصـيلـ وـالـتـركـيبـ وـالـموـاسـيـرـ وـالـعـلـبـ وـخـلاـفـهـ وـكـلـ ماـلـيـزـ لـاتـمامـ الـعـلـمـ عـلـىـ الـوـجـهـ	٦٠٠٠	٢٦	عدد	٣-٦
(بالـمـلـدـ سـمـةـ وـعـشـرونـ)				
توريـد و تركـيب عمود إثارة شـارـعـ طـراـزـ LP1 عـبـارـةـ عـنـ عـمـودـ إـثـارـةـ مـنـ الـحـدـيدـ الـمـلـفـنـ بـأـرـقـاعـ ٨ـ مـترـ كـاملـ	٩٤٠٠٠	٤٠٠٠	٢٧	٣-٧
بـكـشـافـ لـيدـ بـقـدرـةـ ١٠ـ وـاتـ وـدوـ مـعـالـمـ حـمـاـيـةـ لاـ يـقـلـ عـنـ IP-67ـ وـمـحـمـلـ عـلـىـ الـبـنـدـ الـقـاعـدـ الـخـرـاسـانـيـ				
الـخـاصـيـةـ بـالـمـعـمـودـ وـكـلـ الـبـنـدـ الـدـائـرـيـ الـفـرعـيـ بـتـقـلـيـدـ الـكـشـافـ بـسـلـكـ قـطـاعـ (٢٧٣) مـم ٢ـ نـحـاسـ وـكـلـ ذـلـكـ قـاطـعـ				
الـحـمـاـيـةـ سـمـةـ ١٦ـ اـمـيـرـ اـحـادـيـ مـنـ الـنـوـعـ MCBـ وـكـلـ ماـلـيـزـ لـاتـمامـ الـعـلـمـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـاـكـمـ				
(بالـمـلـدـ سـمـةـ وـعـشـرونـ)				
توريـد وـ تركـيبـ عمـودـ إـثـارـةـ شـارـعـ طـراـزـ LP2 عـبـارـةـ عـنـ عـمـودـ إـثـارـةـ يـلـدـاعـينـ مـنـ الـحـدـيدـ الـمـلـفـنـ بـأـرـقـاعـ ٨ـ مـترـ كـاملـ	٢٣٠٠٠	٢٢٠٠٠	١٥	٣-٨
كـاملـ بـكـشـافـ لـيدـ بـقـدرـةـ ١٠ـ وـاتـ وـدوـ مـعـالـمـ حـمـاـيـةـ لاـ يـقـلـ عـنـ IP-67ـ وـمـحـمـلـ عـلـىـ الـبـنـدـ الـقـاعـدـ الـخـرـاسـانـيـ				
الـخـاصـيـةـ بـالـمـعـمـودـ وـكـلـ الـبـنـدـ الـدـائـرـيـ الـفـرعـيـ بـتـقـلـيـدـ الـكـشـافـ بـسـلـكـ قـطـاعـ (٢٧٣) مـم ٢ـ نـحـاسـ وـكـلـ ذـلـكـ قـاطـعـ				
الـحـمـاـيـةـ سـمـةـ ١٦ـ اـمـيـرـ اـحـادـيـ مـنـ الـنـوـعـ MCBـ وـكـلـ ماـلـيـزـ لـاتـمامـ الـعـلـمـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـاـكـمـ				
(بالـمـلـدـ خـمـسـةـ عـشـرونـ)				
توريـد وـ تركـيبـ وـحدـةـ إـثـارـةـ طـراـزـ ES-EARTH SPIKE (IP67ـ منـ حـرـيـةـ حرـقـ)ـ عـبـارـةـ عـنـ عـمـودـ إـثـارـةـ تـرـكـبـ بـالـاـرـضـ	٥٩٠٠	٤٠٠٠	٢٦	٣-٩
الـنـوـعـ المـرـزـودـ بـلـصـيـاتـ لـيدـ بـقـدرـةـ (١٥ـ)ـ وـاتـ وـدوـ مـعـالـمـ حـمـاـيـةـ لـأـمـيـرـ اـحـادـيـ .ـ وـتـرـكـيبـ وـالـاخـتـارـ				
وـكـلـ ماـلـيـزـ لـاتـمامـ الـعـلـمـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـاـكـمـ طـقـاـ طـقـاـ لـرـسـومـاتـ وـالـمـوـاصـفـاتـ الـبـنـدـ يـشـملـ تـورـيدـ وـتـرـكـيبـ الـكـشـافـ				
فـقطـ				
(بالـمـلـدـ سـمـةـ وـعـشـرونـ)				
مقاييس الحكم				
توريـد وـ تركـيبـ مـفـتاحـ لـأـمـيـرـ (١٦ـ اـمـيـرـ - ٢٥٠ـ فـولـتـ)ـ لـلـتـحـكـمـ فـيـ إـثـارـةـ مـنـ اـجـودـ الـإـنـوـاعـ .ـ وـمـحـمـلـ عـلـىـ الـبـنـدـ	٧٦٠٨٠	١٠٢٠٠	٦٤	٣-١٠
الـطـبـةـ خـاصـيـةـ بـهـ وـالـقـلـمـهـ وـالـشـاشـيـهـ وـالـوـجـهـ الـخـارـجيـ طـراـزـ لـاجـرـانـدـ أوـ بـيـشـيـتوـ لـاـيـتـ أـوـماـ بـيـلـلـهـماـ وـكـلـ الـدـائـرـةـ				
الـفـرعـيـ بـمـوـصلـاتـ نـحـاسـ (٢٧٣)ـ مـم ٢ـ وـكـلـ ماـلـيـزـ لـتـوـصـيلـ وـكـلـ ماـلـيـزـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـاـكـمـ				
(بالـمـلـدـ أـرـبـعـةـ وـسـتـونـ)				
كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـكـلـ الـمـفـتاحـ مـنـ الـنـوـعـ المـقاـمـ لـلـعـوـامـ الـجـوـيـ	٦٠٠٠	١٠٠٠	٤	٣-١١
(بالـمـلـدـ أـرـبـعـةـ)				
توريـد وـ تركـيبـ مـفـتاحـ لـلـاـنـ (١٦ـ اـمـيـرـ - ٢٥٠ـ فـولـتـ)ـ لـلـتـحـكـمـ فـيـ إـثـارـةـ مـنـ اـجـودـ الـإـنـوـاعـ .ـ وـمـحـمـلـ عـلـىـ الـبـنـدـ الـعـلـبةـ	٧٠٠٠	١٠٣٠٠	٦	٣-١٢
الـخـاصـيـةـ بـهـ وـالـقـلـمـهـ وـالـشـاشـيـهـ وـالـوـجـهـ الـخـارـجيـ طـراـزـ لـاجـرـانـدـ أوـ بـيـشـيـتوـ لـاـيـتـ أـوـماـ بـيـلـلـهـماـ وـكـلـ الـدـائـرـةـ				
الـفـرعـيـ بـمـوـصلـاتـ نـحـاسـ (٢٧٣)ـ مـم ٢ـ وـكـلـ ماـلـيـزـ لـتـوـصـيلـ وـكـلـ ماـلـيـزـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـاـكـمـ				
(بالـمـلـدـ خـمـسـةـ)				
كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـكـلـ الـمـفـتاحـ مـنـ الـنـوـعـ المـقاـمـ لـلـعـوـامـ الـجـوـيـ	٤٨٠٠	١٠٩٠٠	٣	٣-١٣
(بالـمـلـدـ دـلـالـهـ)				
توريـد وـ تركـيبـ مـفـتاحـ لـلـاـنـ (١٦ـ اـمـيـرـ - ٢٥٠ـ فـولـتـ)ـ لـلـتـحـكـمـ فـيـ إـثـارـةـ مـنـ اـجـودـ الـإـنـوـاعـ .ـ وـمـحـمـلـ عـلـىـ الـبـنـدـ الـعـلـبةـ	٣٦٠٠	١٠٨٠٠	٤	٣-١٤
الـخـاصـيـةـ بـهـ وـالـقـلـمـهـ وـالـشـاشـيـهـ وـالـوـجـهـ الـخـارـجيـ طـراـزـ لـاجـرـانـدـ أوـ بـيـشـيـتوـ لـاـيـتـ أـوـماـ بـيـلـلـهـماـ وـكـلـ الـدـائـرـةـ				
الـفـرعـيـ بـمـوـصلـاتـ نـحـاسـ (٢٧٣)ـ مـم ٢ـ وـكـلـ ماـلـيـزـ لـتـوـصـيلـ وـكـلـ ماـلـيـزـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـاـكـمـ				
(بالـمـلـدـ ثـلـاثـانـ)				
كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـكـلـ الـمـفـتاحـ مـنـ الـنـوـعـ المـقاـمـ لـلـعـوـامـ الـجـوـيـ	١٤٠٠٠	٧٠٠٠	٧	٣-١٥
(بالـمـلـدـ سـيـمـةـ)				
مخارج الباريز واللوى				
توريـد وـ تركـيبـ مـخـرـجـ بـرـيـزـ عـادـيـ (POLE (3) ١٦ـ اـمـيـرـ - ٢٢٠ـ فـولـتـ)ـ مـنـ الـنـوـعـ الشـوكـوـ الـمـسـتـدـيرـ وـمـحـمـلـ عـلـىـ	١٢٢٠٠	٧٠٠٠	٤٤	٣-١٦
الـبـنـدـ الـعـلـبةـ وـالـقـلـمـهـ وـالـشـاشـيـهـ وـالـوـجـهـ الـخـارـجيـ طـراـزـ لـاجـرـانـدـ أوـ بـيـشـيـتوـ لـاـيـتـ أـوـماـ بـيـلـلـهـماـ وـكـلـ الـدـائـرـةـ				
مـوـاسـيـرـ P.V.Cـ الـمـفـاـمـوـرـةـ الـلـحـرـقـ الـخـاصـيـةـ بـالـدـائـرـةـ الـفـرعـيـةـ لـلـبـرـيـزـ (٣)ـ مـم ٢ـ وـكـلـ ذـلـكـ الـدـائـرـةـ				
لـمـعـوـمـةـ مـنـ الـلـوـحةـ إـلـىـ بـيـلـلـهـاـ بـمـوـصلـاتـ نـحـاسـ قـطـاعـ (٤)ـ مـم ٢ـ وـكـلـ ذـلـكـ أدـوـاتـ الـتـثـيـبـ وـالـاخـتـارـاتـ				
حـسـبـ الرـسـومـاتـ وـالـمـوـاصـفـاتـ.				
(بالـمـلـدـ سـمـةـ وـارـمـونـ)				
كـالـبـنـدـ السـابـقـ وـكـلـ الـمـفـتاحـ مـنـ الـنـوـعـ ٢٢٠ـ فـولـتـ حـسـبـ الرـسـومـاتـ وـالـمـوـاصـفـاتـ.	١٧٨٨٠	٤٠٠٠	١٧٢	٣-١٧
(بالـمـلـدـ مـائـةـ وـاحـدـ وـسـيـمـونـ)				

بيانات المشروع					
الرقم	العنوان	النوع	الكمية	الوحدة	القيمة
١	كابلات السبايك ولكن البرزة ثنائية (١٦ أمير - ٢٢ فولت) خاصة بـ UPS من النوع المستدير المغوف (شوكو) المزود بطرف ارضي بلون مختلف ومن النوع FRENCH STANDARD حسب الرسومات والمواصفات.	عدد	٢,٥٠٠	٤٢	١٠٠,٠٠٠
٢.١	(بالعدد ثنان و زيمون)				
٢.٢	كابلات السبايك ولكن البرزة ثنائية (١٦ أمير - ٢٢ فولت) خاصة لمجفف الأرضي ومحمل على البند المذكرة المعمومة من المخرج إلى اللوحة الخاصة بها بأسلاك (٤x٣) وكذلك الموسير المقاومة للحرق وكل ما يلزم للتتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات	عدد	٣,٠٠٠	١٠	٣٠,٠٠٠
٢.٣	(بالعدد عشرة)				
٢.٤	توريد وتتركيب مخرج قوي (١٦ أمير - ٢٢ فولت) خاص بـ نظم التيار الخفيف ومحمل على البند موسير P.V.C المقاومة للحرق الخاصة بالدائرة المعمومة بموصلات تجارية قطاع (٤x٣) مم ٢ وكذلك أدوات التثبيت والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات.	عدد	٣,٤٠٠	١	١٧,٨٠٠
٢.٥	(بالعدد اربعة)				
٢.٦	البند السابق ولكن البرزة (٣٢ أمير - ٢٢ فولت) تركب على الحال من النوع الصناعي (صاروخ) المقاوم للعوامل الجوية والمزود بطرف ارضي شاملة دائرة المعمومة بـ أسلاك قطاع (٤x٣) مم ٢ نحاس حسب الرسومات والمواصفات.	عدد	٤,٠٠٠	٤	١٣,٠٠٠
٢.٧	(بالعدد خمسة)				
٣	بيانات الفصل				
٣.١	توريد وتتركيب DISCONNECT SWITCH سعة (٢٥ أمير - ٢٢ فولت) المستخدم لوحدات التكيف والاحتياطات ومحمل على البند المفتاح والعلبة الخاصة به وكل ما يلزم للتوصيل والتتركيب والاعتبار طراز لاجراند او MK متوفى بلمبة بيان ومحمل على البند التوصيل من المفتاح إلى الجهاز شاملة دائرة المعمومة حسب الرسومات والمواصفات .	عدد	٩,٠٠٠	٨١	٦٦٩,٠٠٠
٣.٢	(بالعدد واحد وثمانون)				
٣.٣	توريد وتتركيب DISCONNECT SWITCH سعة (٤٥ أمير - ٢٨ فولت) حسب الرسومات والمواصفات لـ بـ يشمل المفتاح فقط ولا يتضمن اي موصلات او موسير.	عدد	٧,٠٠٠	٧٨	٥٣,٠٠٠
٣.٤	(بالعدد ثمان وعشرون)				
٣.٥	كابلات السبايك ولكن DISCONNECT SWITCH سعة (٨٠ أمير - ٣٨ فولت) حسب الرسومات والمواصفات البند يشمل المفتاح فقط ولا يتضمن اي موصلات او موسير.	عدد	٩,٢٠٠	٩	١٩,٨٠٠
٣.٦	(بالعدد ثمانة)				
٤	بيانات الكابلات والموصلات الكهربائية				
٤.١	توريد وتتركيب كابلات الجهد المنخفض من الألومنيوم ممزوجة بـ PVC ومتلقة بـ PVC جهد (٦٠٠/١٠٠٠ فولت) والسعر يشمل جميع التركيبات وـ مـ الكـابـلات داخـلـ موـاسـيرـ فيـ سـيـ أوـ حـوـاـمـلـ كـابـلات طـبقـاـ لـ الرـسـوـمـاتـ بـ مـسـاحـةـ مـقطـعـ (٤x٤) مـمـ ٢ـ الـوـمـبـيـوـنـ ومـحملـ عـلـىـ الـبـنـدـ ماـ يـخـصـهـ مـنـ أـعـمـالـ التـوصـيلـ والتـركـيبـ وـ حـوـاـمـلـ كـابـلاتـ وـ كـابـلاتـ جـهـدـ وـ كـابـلاتـ جـهـدـ لـ اـتـامـ الـعـمـلـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـأـكـلـ الـبـنـدـ لـ اـتـامـ حـوـاـمـلـ كـابـلاتـ وـ لـ الـمـوـاسـيرـ وـ لـ الـعـدـيـاـتـ الـخـرـاسـانـيةـ	مـ طـ	٤٠	٣,٣٠٠	١,٤٩٠,٠٠٠
٤.٢	(بالเมตร الطولي ثلاثة الآف وثلاثمائة)				
٤.٣	توريد وتتركيب كابلات الجهد المنخفض من الألومنيوم ممزوجة بـ XLPE PVC ومتلقة بـ PVC جهد (٦٠٠/١٠٠٠ فولت) والسعر يشمل جميع التركيبات وـ مـ الكـابـلات داخـلـ موـاسـيرـ فيـ سـيـ أوـ حـوـاـمـلـ كـابـلات طـبقـاـ لـ الرـسـوـمـاتـ بـ مـسـاحـةـ مـقطـعـ (٤x٤) مـمـ ٢ـ الـوـمـبـيـوـنـ ومـحملـ عـلـىـ الـبـنـدـ ماـ يـخـصـهـ مـنـ أـعـمـالـ التـوصـيلـ والتـركـيبـ وـ حـوـاـمـلـ كـابـلاتـ وـ كـابـلاتـ جـهـدـ لـ اـتـامـ الـعـمـلـ عـلـىـ الـوـجـهـ الـأـكـلـ الـبـنـدـ لـ اـتـامـ حـوـاـمـلـ كـابـلاتـ وـ لـ الـمـوـاسـيرـ وـ لـ الـعـدـيـاـتـ الـخـرـاسـانـيةـ	مـ طـ	٣٠	٢,٧٥٠	٨٧٥,٠٠٠
٤.٤	(بالเมตร الطولي الفان وسبعينه وخمسون)				
٤.٥	كابلات السبايك ولكن كـابـلاتـ جـهـدـ علىـ الـوـجـهـ الـأـكـلـ الـبـنـدـ لـ اـتـامـ حـوـاـمـلـ كـابـلاتـ وـ لـ الـمـوـاسـيرـ وـ لـ الـعـدـيـاـتـ الـخـرـاسـانـيةـ	مـ طـ	٤٠	٢٢	١٣٢,٠٠٠
٤.٦	(بالเมตร الطولي الفان وسبعينه وخمسون)				
٤.٧	كابلات السبايك ولكن كـابـلاتـ جـهـدـ علىـ الـوـجـهـ الـأـكـلـ الـبـنـدـ لـ اـتـامـ حـوـاـمـلـ كـابـلاتـ وـ لـ الـمـوـاسـيرـ وـ لـ الـعـدـيـاـتـ الـخـرـاسـانـيةـ	مـ طـ	٤٠	٢,٧٥٠	١,٢٣٧,٥٠٠

مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (العيني الإداري و ملحقاته)					
النحو	الكمية	الوحدة	القيمة	الفلة	الاجمالي
٦ كابل الساقيف ولكن كابل قطاع (٢٥٠x٢٥٠) مم ٢ الومنيوم ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي ثلاثة الاف وثلاثمائة)	٦٥٠	م . ط	٣,٣٠٠	١,٨١٥,٠٠٠	
٧٠١ كابل الساقيف ولكن كابل قطاع (٥٠x٤٧٠) مم ٢ الومنيوم ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي الفان ومائتان)	٦٠٠	م . ط	٤,٢٠٠	١,٣٢٠,٠٠٠	
٧١٠ كابل الساقيف ولكن كابل قطاع (٣٠x١٢٠) مم ٢ الومنيوم ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي ثلاثة الاف ومائتان وخمسون)	٦٥٠	م . ط	٣,٨٥٠	٢,٠٠٧,٥٠٠	
٨٠١ توري وتوكيب موصلات الجهد المنخفض من النحاس معزولة بمادة PVC لزوم الأرضي الخاص بالكابلات والسرور يشمل جميع الترتيبات وحد الكابلات داخل كابلات طبقاً للرسومات بمساحة مقطع ٦ مم ٢ نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وحوامل الكابلات وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي ثلاثة الاف ومائتان وخمسون)	١٠٠	م . ط	٢,٧٥٠	٢٧٥,٠٠٠	
٩٠١ كابل الساقيف ولكن موصل أرضي قطاع ١٠ مم ٢ نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي ثلاثة الاف وثلاثمائة وثلاثون)	١٢٥	م . ط	٣٢٠	٤١,٢٥٠	
٩٠١٠ كابل الساقيف ولكن موصل أرضي قطاع ١٦ مم ٢ نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي ثمانية الاف ومائتان وخمسون)	١٥٠	م . ط	٨,٢٥٠	١,٤٣٧,٥٠٠	
١١٠١ كابل الساقيف ولكن موصل أرضي قطاع ٢٥ مم ٢ نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي ثمانية الاف ومائتان وخمسون)	١٧٥	م . ط	٢,٨٥٠	٩٧٣,٧٥٠	
١٢٠١ كابل الساقيف ولكن موصل أرضي قطاع ٤٠ مم ٢ نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي ثمانية الاف ومائتان وخمسون)	٢٠٠	م . ط	٢,٧٥٠	٥٥٤,٠٠٠	
١٢١٠ كابل الساقيف ولكن موصل أرضي قطاع ٧٦ مم ٢ نحاس ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التوصيل والتركيب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل البند لا يشمل حوامل الكابلات ولا المواسير ولا العدديات الخرسانية. (بالметр الطولي الفان ومائتان)	٢٢٠	م . ط	٢,٣٠٠	٤٨٤,٠٠٠	
١١ شبكة المعلومات والتليفونات توري وتوكيب مخرج بروتوكول معلومات/تليفونات (Data/Telephone) ومحمل على البند كل ما يلزم من المطلب والمواسير فقط .٦٠٠ و كذلك الكابلات من النوع CAT6 من المخرج و حتى راك التجمع الخاص بالدور والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاختبارات وكذلك كابلات Drop Card للربط مع أجهزة الحاسوب وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل. (بالعدد ثلاثة وخمسون)	١٠١	عدد	١٠١	٢١٢,٠٠٠	
١٢١ توري وتوكيب بروتوكول معلومات/تليفونات (Data/Tele) من النوع RJ45 كاملة بالوجه الخارجي والبند يشمل كل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاختبارات وكل ما يلزم لاتمام العمل علىوجه الأكميل. (بالعدد ثلاثة وخمسون)	٥٣	عدد	٥٣	١٣٧,٨٠٠	
١٣١ توري وتوكيب راك فرقى خاص بشبكة المعلومات والتليفونات طرز DR-1 يحتوى على الآلى: ١ عدد SWITCH POE للشبكات بستة ٤A مخرج يشتمل عدد SFP+ ٢ عدد SWITCH للسلعات بستة ٤A مخرج يشتمل عدد SFP+ ٣ عدد PATCH PANEL سعة ٤A مخرج يشتمل عدد T ٤ عدد PATCH PANEL سعة ٤A مخرج من النوع (CAT-6) ٥ عدد FIBER OPTIC - DUBLEX PATCH CORD بتنفس عدد المخارج البالش باىل PATCH CORD FIBER OM4	٢٠٠	عدد	٢٠٠	٢٠٠	

تفصيل عدد المخارج البالش باىل PATCH CORD FIBER OM4

Page 10 of 46



المقاول: الشركة الوطنية سامكو

الاستشارات الهندسية
ECONOMIC & SAFE
ENGINEERING

NASDESIGN ARCHITECTS URBAN
PLANNERS

مقدمة مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
الإجمالي	الفلدة	الكمية	الوحدة	البند	
١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١	عدد	<p>والراك مزود بوحدة POWER SUPPLY ومروحة تهوية ومحمل على البند كابلات الربط الداخلية Patch Cord بين المسوينش والباتش بايل على ان تكون من نفس نوعية الكابلات ومخارج الكمبيوتر FACE PLAT حسب الرسومات ومحمل على البند كل ما يلزم ل تمام العمل على الوجه الأكمل مع مراعاة ان يكون الراك بسمة داخلية كافية لاستيعاب اضافة سويتشات وباتش بايل اخرى بحيث تكفي لاستيعاب بيع المخارج الموجودة حاليا.</p> <p>(بالعدد واحد)</p>	٤-١١
				<p>توري وتركيب رايك فايبر خاص بشبكة المعلومات والتليفونات طراز DR-2 وطراز DR-3 يحتوي على الآلي:-</p> <p>عدد ١ SWITCH POE للتليفونات بستة ١٦ مخرج يشمل عدد ٢ SFP+ عدد ١ SWITCH للعلومات بستة ١٦ مخرج يشمل عدد ٢ SFP+ عدد ٢ مخرج يمثل عدد ٢ مخرج من النوع (CAT-6) عد ١ PATCH PANEL بستة ١٦ مخرج من النوع A عد ١ PATCH PANEL بستة ١٦ مخرج من النوع FIBER OPTIC - DUBLEX PATCH CORD CAT6 بنفس عدد المخارج الباتش بايل PATCH CORD FIBER OM4</p>	٤-١١
٢٢٤,٠٠٠	١١٢,٠٠٠	٧	عدد	<p>والراك مزود بوحدة POWER SUPPLY ومروحة تهوية ومحمل على البند كابلات الربط الداخلية Patch Cord بين المسوينش والباتش بايل على ان تكون من نفس نوعية الكابلات ومخارج الكمبيوتر FACE PLAT حسب الرسومات ومحمل على البند كل ما يلزم ل تمام العمل على الوجه الأكمل مع مراعاة ان يكون الراك بسمة داخلية كافية لاستيعاب اضافة سويتشات وباتش بايل اخرى بحيث تكفي لاستيعاب بيع المخارج الموجودة حاليا.</p> <p>(بالعدد الثمان)</p>	٤-١١
٧٧,٠٠٠	٢٠٠	٢٢٠	متر	<p>توري وتركيب كابل فايبر جلاس سعة ٤ كور (MULTI MODE - OM4) و محمل على البند ما يخصه من اعمال التوصيل والتركيب والاكسسوارات (SFP+) وكل ما يلزم ل تمام العمل على الوجه الأكمل (بالเมตร الطولي مائتان وعشرون)</p>	٤-١١
١١٠,٠٠٠	٥٠٠	٢٢٠	متر	<p>توري وتركيب كابل فايبر جلاس سعة ٨ كور (MULTI MODE - OM4) و محمل على البند ما يخصه من اعمال التوصيل والتركيب والاكسسوارات (SFP+) وكل ما يلزم ل تمام العمل على الوجه الأكمل (بالметр الطولي مائتان وعشرون)</p>	٤-١١
٣٧٣,٠٠٠	٨٠٠	٢٢٠	متر	<p>توري وتركيب كابل فايبر جلاس سعة ١٢ كور (MULTI MODE - OM4) و محمل على البند ما يخصه من اعمال التوصيل والتركيب والاكسسوارات (SFP+) وكل ما يلزم ل تمام العمل على الوجه الأكمل (بالметр الطولي مائتان وعشرون)</p>	٤-١١
				<p>توري وتركيب الراك الرئيسي الخاص بشبكة الكمبيوتر يحتوي على الآلي:-</p> <p>عدد ١ CORE SWITCH بستة ٤٨ مخرج power supply WITH SFP+(10g) المزود بمخارج FIBER OPTICS عدد ٢ مخرج ٤A مخرج من النوع FIBER OPTIC PATCH PANEL عدد (١) ٤A مخرج من النوع VOICE PATCH PANEL (١)</p>	٤-١١
٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١	عدد	<p>ويكون الراك مزود بوحدة POWER SUPPLY ومروحة تهوية ومحمل على البند كل ما يلزم ل تمام العمل على الوجه الأكمل حسب الرسومات والمواصفات.</p> <p>(بالعدد واحد)</p>	٤-١١
				<p>السترال العمومي PABX</p>	٤-١١
٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	١	مقطورة	<p>توري وتركيب سترال (PABX) بستة ١٠ خط خارجي الى ٦٠ خط داخلي (Digital) حسب الرسومات والمواصفات وداخل صندوق معلق ملائج الكتروستاتيكيا . كامل بجميع ملحقاته مختبر في مكانه وكل ما يلزم من عمليات التركيب والتوصيل وخلافه</p> <p>(بالقطوعية واحد)</p>	٤-٩-١١
٧,٠٠٠	٤,٠٠٠	١	عدد	<p>توري وتركيب عدة تليفون مميز بشاشة من النوع IP و من نفس نوعية السترال</p> <p>(بالعدد ستة)</p>	٤-٩-١١
٢١٦,٠٠٠	٤,٠٠٠	١	عدد	<p>توري وتركيب عدة تليفون عادي بشاشة من النوع IP و من نفس نوعية السترال</p> <p>(بالعدد ثمان واربعون)</p>	٤-٩-١١

بيانات المشروع						
العنوان	النوع	الكمية	الوحدة	الوصف	الملاحظات	الرقم
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٢,٥٠٠	٧٥	تزويد تركيب مخرج بروز ايربال على الحاط حسب الرسومات ومحمل على البند الكابلات المحورة من النوع RG-6 من المخرج الى علبة التجميع الخاصة بنظام الاربال المركزي بالدور او الربط بالشبكة حسب الرسومات والمواصفات	(بالعدد خمسة وعشرون)	٤-١٢
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	١,٣٠٠	٧٥	تزويد تركيب بروز ايربال طرز لاجراند او بيشيو لايت او ما يماثله تركيب على الحاط ومحمل على البند العلبة والفلچه والشاسيه وكذلك القطاع الخارجي طرز لاجراند او بيشيو لايت او ما يماثله	(بالعدد خمسة وعشرون)	٤-١٢
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	١٥,٠٠٠	١	تزويد تركيب كابلات محورة من النوع RG-11 لربط المحطة المركزية بأماكن التجمع بالأدوار ومحمل على البند كل ما يلزم من أسلاك ومواسير وبوطات وكل ما يلزم للتوريد والتركيب طبقاً للمواصفات الفنية وأصول التساعة.	(بالقطوعية واحدة)	٤-١٢
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	-	-	تزويد وتركيب المحطة المركزية الخاصة بالنظام في المبني من أجود الأنواع الامامية المستمدة مثل WISI - TERIAK - FTE لم يتمائهم تكون من الأجزاء الموضحة فيما يلي والتعمق على سبيل المثال لا الحصر:-	- مجموعة Splitters + Tap Offs	٤-١٢
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٢٥,٠٠٠	٢	RG-6 , RG-11 عدد ٢ وحدة كابينة إستقبال رقمي مزدوج بعده A كروت كل كارت يستقبل عدد ٢ باقة فضائية شامل كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات	- الكابلات المحورة نوعية RG-6 ، RG-11	٤-١٢
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	١٨٠,٠٠٠	١	وحدة COMBINER+ POWER SUPPLY - على (٣) طرق إستقبال ١٨٠ سم كابل بالـ LNB	- وحدة COMBINER+ POWER SUPPLY	٤-١٢
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٢٥,٠٠٠	١	بريل إستقبال U/VHF - ايربال إستقبال BROADBAND	- بريل إستقبال U/VHF	٤-١٢
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٢٥,٠٠٠	١	وعلى المقاول تزويد وتركيب نظام فعال وتحقيق وصول الاشارة لجميع المخارج بما لا يقل عن ٧ دبى سيل شامل جميع أدوات التثبيت والتركيب طبقاً للمواصفات العامة حتى لو اختلفت أعداد مكونات الشبكة فهو المسئول عن تسليم شبكة تعمل بكفاءة تامة	(بالقطوعية واحدة)	٤-١٢
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	١٨٠,٠٠٠	١	تزويد وتركيب لوحة التحكم في إنذار الحرائق من النوع المعنون الرقمي سمة LOOP-4 حسب الرسومات مزودة بوحدة AUTO DAILER وشاملة البطاريات والشاحن والطاولة وخلافه ومحمل على البند ما يخصه من أعمال التركيب والتوصيل والاختبار وخلافه وكل ما يلزم لإتمام العمل على وجه الأكمل	(بالعدد واحد)	٤-١٣
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	١,١٤٠,٠٠٠	١١٤	تزويد وتركيب مخرج إنذار حرائق بالسلف او على الحاط (كافش - سارنة - كسر) ومحمل على البند المواسير من المخرج الى الآخر او الى علبة التجميع الخاصة بإنذار الحرائق من النوع EMT وفى حالة المواسير المدفونة فى الغرسانة تكون UPVC مقاوم للحرائق ، وكذلك الكابلات (٢,٥x٢,٥ سم) مقاومة للحرائق من النوع الشيلد ١٠-٥ درجة وكذلك على التوصيل وتجميع خطوط الإنذار	(بالعدد واحد وعشرون)	٤-١٣
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٢٠٤,٠٠٠	٥١	تزويد وتركيب كافش دخان ضوئي معنون SMOKE DETECTOR من أجود الأنواع ذو حساسية عالية للدخان ويمكن التحكم في حساسيته حسب ما هو مطلوب لكل منطقة إنذار ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات.	(بالعدد واحد وخمسون)	٤-١٣
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٧٧,٠٠٠	٥	كل بند السابق ولكن الكافش متعدد من النوع MULTIFUNCTION DETECTOR .	(بالعدد خمسة)	٤-١٣
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٦٥,٠٠٠	١٥	تزويد وتركيب Manual station (مفتاح ضاغط من النوع كسر الزجاج معنون) لإنذار الحرائق DOUBLE ACTION ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات	(بالعدد خمسة عشر)	٤-١٣
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٢١,٥٠٠	٧	تزويد وتركيب وحدة إنذار صوت بفلاتر بضوء متوجه منخفضة الصوت للإنذار عن الحرائق ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات	(بالعدد سبعة)	٤-١٣
المنطقة: شرق الشیخ زاید بالطريق الدائري (العین الاداری و ملحقاته)	البنية	٩٤,٠٠٠	A	تزويد وتركيب وحدة إنذار صوت بفلاتر بضوء متوجه عالية الصوت للإنذار عن الحرائق ومن النوع مقاوم للغامض الجوية ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات.	(بالعدد ثمانية)	٤-١٣

مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)					
الرقم	البيان	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
٩-١٣	كالبند السابق ولكن وحدة تحكم MONITOR MODULE .	عدد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠
٩-١٢	كالبند السابق كاشف دخان معنون من النوع الخطى BEAM DETECTOR (مرسل و مستقبل) من أجود أنواع وذو حساسية عالية للدخان ويمكن الحكم في حاسيسه حسب ما هو مطلوب لكل منطقة إنذار ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات . (بالعدد ستة عشر)	عدد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠
٩-١١	توريد تركيب مخرج ساعة سقف أو مخرج وحدة تحكم بالصوت على الحالط ومحمل على البند المأمور من المخرج إلى الآخر او إلى عملية التجميع الخاص بالنظام الصوتي من النوع المقاوم للحرق وكذلك الكابلات (٢.٥*٢.٥ مم٢) من النوع الشيلد المقاوم للحرق وكذلك على التوصيل وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأكل حسب الرسومات والمواصفات (بالعدد ثمان وستون)	عدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤٤,٠٠٠
٩-١٠	النظام الصوتي	عدد	١٢	٧,٠٠٠	٩٨,٠٠٠
٩-١١	توريد وتركيب مخرج ساعة سقف قدرة ١ وات شاملة الغطاء Fire dome box ماركة توأمو بويير أو ما يماثلها ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات . (بالعدد ثلاثة عشر)	عدد	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
٩-١٢	توريد وتركيب معاشر معلقة قدرة ١٢ وات من النوع المقاوم للموامل الجوية ماركة توأمو بويير أو ما يماثلها ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات . (بالعدد اربعين)	عدد	٤٤	٧,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠
٩-١٣	توريد وتركيب وحدة تحكم في الصوت ومحمل على البند كل ما يلزم للتركيب والتوصيل والاختبارات حسب الرسومات والمواصفات . (بالعدد احدى عشر)	عدد	١١	١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠
٩-١٤	توريد وتركيب الرال الخاص بالنظام الصوتي ويحتوي على الآل : عدد ٣ مكبر قدرة (٢٤٠) وات . وحدة ميكسر صوتي digital equalizer - مشغل اسطوانات (عدد ٥ اسطوانة) - وحدة (AM/FM) راديو ذات جودة عالية متزوج بالابروال ومزود بدخل USB - وحدة (FM) رقمي ذات جودة عالية متزوج بالابروال ومزود بدخل لاسلكي . عدد (٢) ميكروفون ملحي مزودة بوحدة توزيع المناطق لعدد ٤ مناطق وعدد (٢) ميكروفون لاسلكي . رال معدن متزوج منفذ بوحدة تفتيتية POWER SUPPLY وموحة تهوية شامل تجهيزات الكهرباء الخاصة به . وحدة الرسائل الصوتية المسجلة والخاصة بالربط مع نظام إنذار الحريق بعده ٢ لفة على الأقل . يتحمل على البند جميع التوصيل والاختبار والتثبيت وكل ما يلزم لاتمام العمل على الوجه الأكل . على المقاول تقديم دراسة الصوتيات بالبدرو و كذلك المقاول مسؤول عن وصول الإشارة عند كل ساعة بوضوح ويكون النظام من إنتاج شركة فيليبس لو بويير أو ما يماثلها (بالمقطوعية واحد)	عدد	١	١٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
١٠	نظام المراقبة الفيديو IP-CCTV	عدد	٨	٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
١٠-١٥	توريد وتركيب مخرج كاميرا داخلية بكتابات CAT6 UTP وكذلك الموسير PVC المقاومة للحرق قطر ٢٥ مم من المخرج وهي مكان تجميع النظام ومحمل على البند مخرج المعلومات وكابلات drop cord وما يخصه من علب الاتصال وخلافه . (بالعدد ثمانية)	عدد	١١	٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠
١٠-١٥	توريد وتركيب مخرج كاميرا خارجية بكتابات CAT6 UTP وكذلك الموسير من النوع EMT من المخرج وهي مكان تجميع النظام ومحمل على البند مخرج المعلومات وكابلات drop cord وما يخصه من علب الاتصال وخلافه . (بالعدد أحدى عشر)	عدد	١٢	٤,٠٠٠	١٠٤,٠٠٠

بيانات مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)					
الإجمالي	الفذة	الكمية	الوحدة	النوع	
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٨	عدد	توريٍ وتركيب كاميرا ألوان لليلة تركب داخل المبني من النوع (IP/POE) وتكون مواصفاتها :-	٤.١٥
٢٧٩,٠٠٠	٢٠٠٠٠	١١	عدد	توريٍ وتركيب كاميرا ألوان ثانية من النوع المقاوم للموائل الجوية تركب بالدور البروم والمبعي بالخارج من النوع (IP/POE) وتكون مواصفاتها :-	٤.١٦
٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١	عدد	توريٍ وتركيب رايك معدني (MCR) خاص بشبكة المراقبة التلفزيونية يركب بالدور البروم حسب الرسومات بمتغير على الأفق :-	٤.١٧
٢٣٥,٠٠٠	٢٣٥,٠٠٠	١	عدد	٢ شاشة LED عرض ملونة ٤٢ بوصة توضع بمنطقة الحكم . ١ وحدات NVR سعة ٣٢ PORT وبسعة تخزين ٦٠ يوم على الأقل (Raid-S) وتحمل على البند كل ما يلزم لإنفاذ العمل على الوجه الأكمل من معدات أو إكسسوارات وكابلات ربط قير ملاس وخلافه وكذلك شبكة الكابلات CAT5 و للموازار UPVC وoric و وكل ملزوم حسب الرسومات والمواصفات ويكل ب برنامج تشغيل النظام VMS و جميع التراخيص الخاصة بالكاميرات وخلافه (Software & License) (بالملحوظة واحدة)	٤.١٨
٩٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢	عدد	توريٍ وتركيب لوحة نظام الحكم في دخول العاملين (ACCESS CONTROL) كاملة بمتطلباتها يعمل بنظام الكروت الذكية والسرور يشمل كل ما يلزم لإنفاذ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد الثاني)	٤.١٩
٦٠,٠٠٠	٢,٥٠٠	٩٠	عدد	توريٍ وتركيب مخرج لنظام الحكم في الدخول ومحمل على البند ما يلزم من الموسير والكابلات والبوابات والباب وخلافه والسرور يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد عشرة)	٤.٢٠
١٤,٧٠٠	٤,٨٠٠	٤	عدد	توريٍ وتركيب قارئ الكروت الذكية والسرور يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد اربعه)	٤.٢١
١٢,٨٠٠	٣,٧٠٠	٤	عدد	توريٍ وتركيب القفال الذكي ومزودة بخاصية القفل الآوتوماتيكي للأبواب والسرور يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد اربعه)	٤.٢٢
١١,٠٠٠	١,٧٥٠	٢	عدد	توريٍ وتركيب زر طلب الخروج والسرور يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد اربعه)	٤.٢٣



بيانات المشروع					
الرقم	المقدمة	الوحدة	القيمة	اللغة	الاجمالي
١.١١	تزويد وتركيب الكروت الذكية بطاقة دائمة مزودة بصورة تحقق شخصية الاسم والرقم المسلح والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات. (بالعدد للإثبات وللأتوبيسات)	عدد	٢٢	٣,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
١.١٢	تزويد وتركيب نظام أرضي بحيث لا تزيد مقاومته عن ٢ أوم خاص باللوحات المومية على أن تكون مكوناته قنطرة أو لوحة من النحاس الأصفر ومحمل على البند ما يلزم من أعمال الحفر والردم والمواسير والموصلات النحاسية منه وإلى اللوحة وغير التقنيات الخرسانية وكل ما يلزم حسب الرسومات والمواصفات. (بالنقطة الواحدة)	نقطة	١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
١.١٣	تزويد وتركيب نظام أرضي بحيث لا تزيد مقاومته عن ٢ أوم خاص بالمولد الكهربائي على أن تكون مكوناته قنطرة أو لوحة من النحاس الأصفر ومحمل على البند ما يلزم من أعمال الحفر والردم والمواسير والموصلات النحاسية منه وإلى اللوحة وغير التقنيات الخرسانية وكل ما يلزم حسب الرسومات والمواصفات. (بالنقطة الواحدة)	نقطة	١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
١.١٤	تزويد وتركيب نظام أرضي بحيث لا تزيد مقاومته عن ٥ أوم خاص بالبابيكيرية والأنابيب ستابلس ستيل أوتوماتيكية بالكامل مقاس ٩ سم على الأقل (بالنقطة الواحدة)	نقطة	١	٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
١.١٥	تزويد وتركيب مصد بالزوكار خاص بالراكب ماركة ميسوبوسي شيندلر-تيسن كروب أو ما يماثله على أن يتم تزويد جميع المعدات بالكامل من الخارج بالمواصفات التالية:- عدد (٢) وفقات بابيكيرية وأنابيب ستانلس ستيل أوتوماتيكية بالكامل مقاس ٩ سم على الأقل نظام التحكم VVF - نظام تعلق ١:١ مباشر - السرعة ١/٢ ث - رخصة الكابينة من الجرينت الخشن أو الرخام أو القينيل حسب اعتماد الاستشاري - نظام التجمي - الكابينة من ستانلس ستيل بالكامل. - الحوله ٧٠٠ كجم مقاس الباب لا يقل عن (2100×2000) سم. مقاس الكابينة لا يقل عن $(1400 \times 1200 \times 2200)$ سم أو أكبر سعه للكابينة ممكن تركيبها داخل الباب. شامل جميع الكابلات الموجودة في الكابينة مثل [دونج-جرس، إنبار - إنترن، ضوء طوارئ، مروحة تهوية - سرارة - بطاقة للطوارئ] - مفتاح VIP - سارة ضوئية وخلاقه] وضافة ما هو غير موجود. جهاز طوارئ ببطاريات لتوصيل الكابينة لأقرب عنبر عند إنقطاع التيار. يتم وضع إشارة طوارئ داخل بذر المصد. مكانة الربط على نظام إنذار الحريق بابيكيرية وأنابيب ستانلس ستيل بالكامل المصد مجهز بفتح طوارئ لرجل الإطفاء وتحمل على البند جميع أعمال التركيبات ولوحات التحكم والأختبارات اللازمة وكافة الأكسسوارات المطلوبة إنتهاء العمل على الوجه الأكملي طبقاً للرسومات والمواصفات وعلى المقاول معاينة الموقع والوضع الحالي قبل البند بالتنفيذ معه نافذة للجهات مع إعادة تقديم الرسومات التنفيذية اللازمة والكتالوجات للمكونات الواجب تركيبها للاعتماد قبل التنفيذ. (بالعدد واحد)	نقطة	١	١,٨٥٠,٠٠٠	١,٨٥٠,٠٠٠
١.١٦	تزويد وتركيب واختبار وتشغيل حواجز كابلات الكهرباء كاملة المصنوعة من الصلب المجلن وآلات التثبيت ومستلزمات التركيب والتحميم والجلنات الخاصة بكابلات الدخول والخروج ومحمل على البند جميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لإتمام العمل على وجهه الأكملي طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية. (بالเมตร الطولي المسمى ورسيمه وبريمون)	متر	١٠٠	١٠٠	٦٦٨,٢٠٠

مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)					
الإجمالي	الفلنة	الكمية	الوحدة	البند	
٢٩٨,٥٠	A00	٣٨٧	مٌٽ	٤-١-١٩ ١٠-٠٠ مم (بالเมตร الطولى للأتمالة و سبة وثمانون)	٤
٢٦٢,٦٥٠	٩٥٠	٣٨٧	مٌٽ	٤-١-١٩ ١٠-٠٠ مم (بالเมตร الطولى للأتمالة و سبة وثمانون)	٤
١١٦,٣٥٠	١,٠٠٠	١١٢	مٌٽ	٤-١-١٩ ١٠-٠٠ مم (بالเมตร الطولى مائة وثلاثة عشر)	٤
٧١٤,٧٠٠	١,١٥٠	٢٧٨	مٌٽ	٤-١-١٩ ١٠-٠٠ مم (بالเมตร الطولى مائتان و ثمان وسبعون)	٤
٢٩٩,٧٠٠	١,٢٥٠	٢٢٢	مٌٽ	٤-١-١٩ ١٠-٠٠ مم (بالเมตร الطولى مائتان و ثمان وعشرون)	٤
٢٣٣,٠٠٠	١,٥٠٠	٢٢٢	مٌٽ	٤-١-١٩ ١٠-٠٠ مم (بالเมตร الطولى مائتان و ثمان وعشرون)	٤
٧٠٨,٨٠٠	١,٣٠٠	٤٤٢	مٌٽ	٤-١-١٩ ١٠٠-١٠٠٠ مم (بالเมตร الطولى أربعمائة و ثلاثة واربعين)	٤
٢-١٩ تزويد وتركيب واختبار وتشغيل سلالم حواصل الكابلات (CABLE LADDERS) المصنوعة من الصلب المجلفن ومحمل على البند جميع الأكسسوارات وأدوات التثبيت ومستلزمات التركيب والتحميل والجلنات الشائعة بكلابلات الدخول والخروج ومحمل على البند جميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لإنعام العمل على الوجه الأكمل طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية.					
٧٠٨,٨٠٠	١,٣٠٠	٤٤٢	مٌٽ	٤-٢-١٩ ١٠-٠٠ مم للتركيب داخل DUCT Main LV & Elec DUCT لرقصة و ثلاثة واربعين)	٤
٤-١-١٩ تزويد وتركيب واختبار وتشغيل حواصل كابلات التيار الخفيف كاملة المصنوعة من الصلب المجلفن وأدوات التثبيت ومستلزمات التركيب والتحميل والجلنات الخاصة بكلابلات الدخول والخروج ومحمل على البند النطاء و جميع الأكسسوارات وكل ما يلزم لإنعام العمل على الوجه الأكمل طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية.					
٧١٧,٤٠٠	٧٠٠	A07	مٌٽ	٤-٤-١٩ ١٠٠-١٠٠٠ مم (بالเมตร الطولى قيامالة وثلاثة وثمانون)	٤
أعمال الأعمال الكهربائية أعمال غرفة طلمبات وخزانات مياه الشرب ومكافحة الحرائق Mechanical Works					
١ المطلوب عليه تزويد وتركيب واختبار كافة التوصيلات الصحية والكهربائية والميكانيكية والإعمال المدنية المتعلقة بالتوصيلات الصحية والميكانيكية وقواعد الطلمبات ومحابس الدخول والخروج وعدم الرجوع الخاصة بالهزائن الأرضية (خزان مياه الشرب وأعمال مكافحة الحرائق عدد ٢ بئر) ومحابس الماء الخاصة بالخط الرئيسي لشبكة الحريق وشبكة التغذية لمياه الشرب وغرفة الطلمبات ومحابس الماء على الخزان والمدارات والسرور يشمل عمل جميع محاوسير تغذية الخزان داخل وخارج الفراقة ومحابس والماء والفالون والتسيل وعدادات قابس الضغط وعداد ماء والعوامات الكهربائية والميكانيكية وكابل تغذية لوحات الطلمبات وأغطية الخدمة بأيام ٤٠٠ و ٤٠٠ جرييات العرض من المستلزمات تسليم وسلام الخدمة من المستلزمات تسليم ١٥-٠٠-٠٨ جرييات العرض من المستلزمات تسليم وسلام الخدمة من المستلزمات تسليم ٣١٦ داخل غرفة الخزائن ومن الحديد الزهر داخل غرفة الطلمبات ومحابس الماء وشبكة إنارة جدول ٣١٦ داخل غرفة الخزائن ومن الحديد الزهر داخل غرفة الطلمبات ومحابس الماء وشبكة إنارة غرفة بجميع الوائم والأجهزة والأكسسوارات حسب الرسومات والمواصفات والسرور يشمل تزويد وتركيب جميع المهمات الموجدة والأعمال الميكانيكية الخاصة بغرفة الطلمبات ومحابس الماء تغذية الخزانات وعلى المقاول مراجعة وعما يهم من أعمال الناء الصعب واستكمال الأعمال طبقاً للمواصفات، والسرور يشمل جميع الوائم والأكسسوارات اللازمة لنهو العمل بهواً تماماً و كاملاً حسب الرسومات والمواصفات (بالمنظوري واحد)					
٢ طلمبات أعمال مكافحة الحرائق Firefighting Pump					





ESE

ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERINGNASDESIGN ARCHITECTS & URBAN
PLANNERS

ال والله: الهيئة العامة للطرق والنقل

المسؤول: الشركة الوطنية ساسكو

ملخصة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (الميناء البحري و ملحقاته)

النوع	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالي
بالملقطوعية توريد وتركيب وتجربة وتشغيل محطة طلمبات الحريق والسرير يشمل عمل جميع التوصيلات الخاصة بخطوط السحب والطارد والاختبار والقياس وتوريد وتركيب جميع الصمامات الميكانيكية والكهربائية (محابس الدخول والخروج وعدم الرجوع لكل طلمية والعادم ومخفض الضغط PRV ومحابس OS&Y Tamper switch) لك محبس ومنين السريان على خط الطرد ومحابس خط الطرد ومحابس وعداد الاختبار والوصلات المرنة والمخففات وشبكة التبرير ومواسير الحساسات ومحابس عدم الرجوع الخاصة بها مع ربط شبكة التبرير وصرف خط الحساسات على جرييات الصرف او الجالبيات او نقاط الصرف الرئيسية من طريق مواسير ذات نهاية متعددة تجميع ومحابس الهوية) وجهازقياس القياس والاختبار والقطع والتوصيلات والمفعحة مكونة من:		١,٨٠٠,٠٠	١,٨٠٠,٠٠	
- عدد (١) طلمبة كهربائية تصرف ٧٠ غالون/ دقيقة وراغع مانومترى ٣٠				
- عدد (١) طلمبة جوئي للحريق تصرف ٥ جالون/ دقيقة وراغع مانومترى ١٠٠				
- عدد (١) طلمبة ديزيل تصرف ٧٥ غالون/ دقيقة وراغع مانومترى ٣٠				
- السير يشمل توريد وتركيب الوحدات الكهربائية والكترون معتمدة FM/UL مع ربط إنذار المحطة مع لوحة إنذار المبنى المعمى طبقاً للمواصفات الكهربائية الخاصة بالمشروع.				
- المجموعية معتمدة UL / FM				
(بالملقطوعية واحد)				
طلمبات أعمال مياه الشرب Water Supply Pump				
بالملقطوعية توريد وتركيب والطارد وتجربة وتشغيل محطة رفع مياه الشرب والسرير يشمل عمل جميع التوصيلات الخاصة بخطوط السحب والطارد وتوريد وتركيب جميع الصمامات الميكانيكية والكهربائية (محابس الدخول والخروج وعدم الرجوع لكل طلمية) وأجهزةقياس القياس والاختبار والمفعحة مكونة من:		١,٠٠,٠٠	١,٠٠,٠٠	
- عدد (٢) خزان تمويضي سه الواحد ١٠٠ لتر والسرير يشمل توريد وتركيب الوحدات الكهربائية والكترون من نوع ال Type Tested لتضليل مجموعة الطلمبات شاملة جميع الحفارات اللازمة للطلمبات من مجموعة الديليات الخاصة بالحماية ضد زيادة إنذار او زيادة او انخفاض الجهد وكذلك مجموعة الحفارات ضد انخفاض الفاصلات او فصلهم (Phase Failure, U/O Voltage, Phase Sequence, Relay) وكل ما يلزم لعمل الحفارة				
الثانية للوحة وتكون من النوع المقاوم للعامل الجوي IP-65 ويجب اعتمادها من الاستشاري قبل التوريد والتركيب وكذلك هيدرات السحب والطارد ومحابس الدخول والخروج وعدم الرجوع وتركيب البيرد بجمع الشunts والاكسوارات وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.				
(بالملقطوعية واحد)				
طلمبات غاطسة Submersible Pump				
بالملقطوعية توريد وتركيب واختبار مجموعة رفع مياه الشرف من البناء طلمبات غاطسة- لرفع مياه الشرف من البناء مكونة من عدد ٢ طلمبة رفع غاطسة تصرف الواحدة ٢ ثانية وراغع مانومترى ١٥ ثانية ويشمل البند عدد ٤ عمادات كهربائية والتي تتحكم في تشغيل المضخات حسب مستوى الماء الموجودة في البناء وكذلك الإنذار في حالة ارتفاع شفوب الماء، كما يشمل السير توريد وتركيب الوحدات الكهربائية والكترون من نوع ال Type Tested لتضليل مجموعة الطلمبات شاملة جميع الحفارات اللازمة للطلمبات من مجموعة الديليات الخاصة بالحماية ضد زيادة إنذار او زيادة او انخفاض الجهد وكذلك مجموعة الحفارات ضد انخفاض الفاصلات او فصلهم (Phase Failure, U/O Voltage, Phase Sequence, Relay) وكل ما يلزم لعمل الحفارة		٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	
الثانية وتكون من النوع المقاوم للعامل الجوي IP-65 ويجب اعتمادها من الاستشاري قبل التوريد والتركيب وكذلك جميع المحابس " قفل + عدم ارتداد " وتركيب البيرد بجمع الشunts والاكسوارات وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.				
(بالملقطوعية واحد)				
طلمبات حريق Fire Extinguisher				
بالمعد توريد وتركيب إسطوانة مكافحة حريق بودرة بدوية معتمدة الأغراض A-B-C-D-E سعة ٦ كجم وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الازارة العامة للحماية المدنية، على ان تكون يبعد لقياس الضغط وطرد موجة بيشهوري وسرير البند يشمل القاعدة مائدة للكشاف وجميع اللوازم والثبيت والتحايل والإكسسوارات وكل ما يلزم لنحو العمل حسب الرسمومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.		١,٣٠	١,٣٠	
(بالبدل واحد)				



مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (العنى الإداري و ملحقاته)						
الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	القيمة	المقدمة	م
١,٥٠٠	١,٥٠٠	١	عدد	٦ كجم	بالمدد توريد وتركيب طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون CO2 سعة ٦ كجم وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن إدارة العامة للحماية المدنية، على أن تكون بمداد لقياس الضغط وخرطوم توجيه بيشوري، وسمر البند يشمل القاعدة مانعة للصداً وجمع الوازم والثبيت والتحاميل والإكسسوارات وكل مايلزم فهو العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتليميـات المهندس المشرف على التنفيذ (بالمدد واحد)	٤٥
١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١	عدد	٤٥ كجم	بالمدد توريد وتركيب واختبار إسطوانة على عمل سعه ٤٥ كجم فوم بخرطوم توجيه لا يقل عن ٦ م بيشوري، توجيه، توطع جانب الغرف الموجود بها خزانات الوقود كما هو مبين بالرسومات كاملة بالمحاسن والمدند وسمر البند يشمل جميع الوازم والإكسسوارات الازمة وكل مايلزم فهو العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتليميـات المهندس المشرف على التنفيذ (بالمدد واحد)	٢٥
٢٥٩٩٨٠					اجمالى اعمال غرفة طلبات وخزانات مياه الشرب ومكافحة الحريق	
عمال مكافحة الحريق						
١- شرطيات خاصة						
الشركة المنشئة مسؤولة عن تقديم الرسومات التفصيلية والتتنفيذية Work shop drawings قبل البدء بأى عمالة، وذلك للأعتماد من استشاري المشروع مع الأخذ في الاعتبار التنسيق العام مع الأعمال الأخرى ومتطلباتها وعمل جميع أعمال التنسيق الازمة بينها وإخراج رسومات نهاية للأعمال بالكامل للمراجعة والإعتماد من الاستشاري.						
٢- الشركة المنشئة مسؤولة عن تقديم الرسومات التفصيلية A5 built drawings موضحاً بها تفاصيل التركيب ومتطلبات التشكيل والصباغة، مع تبليط البطاقات التعريفية وتليميـات الاستخدام والتشكل والصباغة طبقاً لتعليمات وأعتماد استشاري المشروع.						
٣- جميع معدات الحريق تكون معتمدة UL LISTED & FM APPROVED على المقاولتحقق من أن جميع الأعمال تم طبقاً للمعطيات الطبيع المدنى، وكذلك الكود المصرى لمكافحة الحريق والكود العالمي للحريق 20 , NFPA_13 , NFPA_12 , NFPA_14 , NFPA_10 , NFPA_13 , NFPA_12 , NFPA_10 , NFPA_2001 & NFPA_5000.						
٤- المقاول مسؤول عن تقديم حسابات هيدروليكيه لنظام اطفاء الحريق للأعتماد من الاستشاري قبل التنفيذ طبقاً للمعطيات والاسسارات المعتمدة.						
٥- الشركة المنشئة مسؤولة عن تقديم لجميع المستندات المطلوبة والإعتماد من إدارة الحماية المدنية التابع لها المشروع.						
٦- تنفيذ جميع الاعمال طبقاً للكود المصرى والكود العالمي، والمواصفات الفنية المطلوبة ومتطلبات الدفاع المدني وجميع البيوود تشمل على التوريد والتركيب والاختبار والتسليم لكافة الأجهزة شاملة جميع الإكسسوارات والأجهزة والمعدات الازمة وكل ما تحتاجه من أعمال إنشائية وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والرسومات الخاصة بالمشروع ونوجيـات المهندس المشرف.						
٧- مواسير الحريق يتم اختبارها طبقاً للكود لمدة ساعتين وتكون من الحديد الاسود غير الملحوظ سيملس جدول ٤٠.						
٨- على المقاول تقديم ٣ كتالوجات لجميع المعدات والاجهزـه والخدمات للاستشاري للأعتماد قبل التوريد.						
٩- جميع الاعمال الخاصة بشبكـه الحريق تشمل التوريد والتركيب والاختبار والضمان والصيانـه لمدة سنه.						
١٠- يتم الرجوع إلى بيان الماركات المعتمدة وقائمة الموردين والمصنعين المعتمدة من قبل الاستشاري والجهـه المالـكـه.						
١١- جميع الكميات تقريـبة ويتم المحاسبـة على ما ينـفذ عـلـى الطـبـيـعـه.						
١٢- أوائل العين الإداري.						
١- عمال شبكة مواسير اطفاء الحريق بالمهـه Firefighting Pipes						
١-١- مواسير حديد سيملس						

الجهـه المالـكـه

الجهـه المالـكـه





ESE

الاستداماني الآمني
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERINGRABDESIGN ARCHITECTSURBAN
PLANNERSمتحدة للمهندسين
الاسلامية، الهيئة العامة للمهندسين والكتاب

مقاييس مشروع محطة التوزيعات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)

الرقم	النوع	العنوان	الفرقة	النقطة
				(black seamless steel - SCh.40) بالستر الطولي توريد وتتركيب مواسير لشبكة مكفحة الهرق -
				الخاصة بالصراuds وشبكة الهرق بداخل الأنوار (روس او تكراري) تركب ملته على العروات وعمرولة حداً اقصى الطروبة بالأنوار كمسن من الخارج للواسير المطلة ووصلات الأجهزة المفترزة او الملاة من العروات من الخارج شرائح الطولي اينما ذاتية لقص لصالح تركيب % ٥٠ التالية الونعة عندما تفترز هذه الواسير العروات او الاستف او الارضيات يجب ان تمر داخل مواسير حديد/ساج حصل اكبر منها بمقابل مرة ونصف قطر المسورة بجمع مشتملاتها من قطع مخصوصة تحمل منطبقاً لا يقل عن ٢٠ جوي يتضمن اللحام او اللصاف التهوية (Standard PN-16) وافتخار الشبكة بالكمال على ٣٠ جوي لستة ٤٤ سماحة ودوره كللة بالقطع الخاصة والتثبيت من نوع حصل على اعتماد UL او FM ، ووصلات تسد (expansion joint) او البند ايضاً يصل تمهات وكواخ وطلاء المطوري وليند يصل طبقات لاصفي لاصفي وعلمه قصت الشبكة بسلرول كثوارية المطوري وليند يصل طبقات تحدى التساق لتمتع ، والملصقات (الاستكرار) بالإضافة مع جميع الحلقات الصوروية الأخرى والصعر يصل كل سايلز لاهي العمل نوراً ناماً و كلاماً حسب الرسمات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتثبيت وتطبيقات المهندس المشرف على التنفيذ.
				Interpipe - Ukraine Grooved for piping systems 65 mm dia. and larger
١-١				مواسير قطر ٢٥ مم (بالستر الطولي لف وسته وعشرون)
٢-١-٢				مواسير قطر ٣٢ مم (بالستر الطولي مثلاً وستي وعشرون)
٢-١-٣				مواسير قطر ٤٠ مم (بالستر الطولي مثلاً وستي وعشرون)
٢-١-٤				مواسير قطر ٤٨ مم (بالستر الطولي مثلاً وستي وعشرون)
٢-١-٥				مواسير قطر ٥٠ مم (بالستر الطولي السترة وثلاثة)
٢-١-٦				مواسير قطر ٦٥ مم (بالستر الطولي ستة وستي وعشرون)
٢-١-٧				مواسير قطر ٧٥ مم (بالستر الطولي ستة وسته واربعون)
٢-١-٨				مواسير قطر ٩٠ مم (بالستر الطولي ستة وستي وعشرون)
٢-١-٩				مواسير قطر ١٠٠ مم (بالستر الطولي ستة وستي وعشرون)
٢-١-١٠				مواسير قطر ١٥٠ مم (بالستر الطولي لستة وستي وعشرون)
٢-١-١١				مواسير حديد مجلفن
				بالستر الطولي توريد وتتركيب ولختيار وصلب مواسير من الحديد المجلن الغير ملحوم طولها شلطة من مجموعه وفة البند تتصل القطع والوارم جدول ٤٠ واعمال التشطيب والاهرمية وأعمال التطبيق وتقديم عينة للاستشاري للالاختبار قبل التسليم والتوريد ونهي العمل نوراً ناماً وكلاً "شقاً" للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتثبيت وتطبيقات المهندس المشرف على التنفيذ Interpipe - Ukraine
٣-١				مواسير قطر ٣٢ مم (بالستر الطولي اربعه عشر)
٣-٢				مواسير قطر ٤٠ مم (بالستر الطولي اربعون)
٣-٣				ящيك مكفحة الهرق FIRE HOSE CABINETS
٣-٤				كلبنة مكفحة الهرق ٢٥ مم + ١٥ مم (FHS 65mm+25mm)



النقطة العامة للطريق والتثبيت



المقاول: الشركة الوطنية ساسكو

الاستشاري الديماسي
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERINGالاستشاري المعماري
NADDESIGNS ARCHITECTS-BURBAN
PLANNERS

المسئولة العامة للماء والري والكهربائي

مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

الرقم	الوحدة	الكمية	القيمة	النوع	الاجمالي
٢٨٠٠٠٠	عدد	٦٠٠٠٠	٤٠٠٠		<p>بالعدد توريد وتركيب وتوسيط وإختبار وتشغيل كابينة حريق مصنوعة من الصاج وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية وطبقاً للرسومات التصميمية والبند يشمل كل المثبتات الداخلية للكابينة بكرة خرطوم حريق ذات قطر ٢٥ مم يطول ٣ متر للاستخدام المائي ومحابس الصيانة ذات قطر ٤٠ مم خارج الكابينة ومحبس مخفف للضغط في حالة زيادة الضغط من ٦.٩ بار ومحبس ١٥ مم (landing valve c/w couplings) وخرطوم حريق ١٥ مم الخاص بفريز الحماية المدنية يطول ٣ متر ومحابس الصيانة ذات قطر ٦٥ مم خارج الكابينة والمدارات الأفقية والتحاميل والتوصيلات اللازمة بالمعدود الرطب وتحوي الكابينة على ملصق الحريق (purpose nozzle) الخاص محبس ١٥ مم طبقاً للمعايير والرسومات التصميمية وجميع مثبتات الكابينة، والسر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل "ثواباً" و"كاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p> <p>Bavaria - Egypt (بالعدد ستة سبة)</p>
٤٠٠٠٠	عدد	٧٥٠٠	٧٥٠٠		<p>٢ Fire Extinguisher</p> <p>بالعدد توريد وتركيب إسطوانة مكافحة حريق بودرة يدوية متعددة الأغراض A-B-C-D-E سعة ٦ كجم وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تكون بعجلة لقياس الضغط وخرطوم توجيه بشبورة وسرع البند يشمل القاعدة مائمة للصنايا وجميع اللوازم والثبيت والتحاميل والإكسسوارات وكل ما يلزم لنهو العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p> <p>Bavaria - Egypt (بالعدد ستة عشر)</p>
٤١٠٠٠	عدد	٣٠٠	٣٠٠		<p>٢-٢ ZONE CONTROL VALVE</p> <p>بالعدد توريد وتركيب طفاية حريق ثاني الأكسيد الكربون CO2 سعة ٦ كجم وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الإدارة العامة للحماية المدنية، على أن تكون بعجلة لقياس الضغط وخرطوم توجيه بشبورة وسرع البند يشمل القاعدة مائمة للصنايا وجميع اللوازم والثبيت والتحاميل والإكسسوارات وكل ما يلزم لنهو العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p> <p>Bavaria - Egypt (بالعدد ستة)</p>
٤٠٠٠٠	عدد	٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠		<p>٢-٣ SPRINKLERS</p> <p>بالعدد توريد وتركيب وإختبار وتشغيل وحدة تحكم قطر ٧٥ مم تشمل على محبس Y ومحبس عدم ارتفاع ومحبس اختبار وصرف برجاج مين تصرف المياه TEST & DRAIN VALVE WITH SIGHT GLASS (Water Flow Switch & Tamper Switch) قطر ٢٢ مم ووحدة مراقبة الضغط ووحدة مين سريان المياه (Water Flow Switch & Tamper Switch) ويتوصيل على منظومة إنذار الحريق والسر يشمل جميع اللوازم والإكسسوارات اللازمة ونهو العمل "ثواباً" و"كاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p> <p>(بالعدد اثنان)</p>
٤٠٠٠٠	عدد	٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠		<p>٢-٤ SPRINKLERS</p> <p>بالعدد توريد وتركيب وإختبار وتشغيل وحدة تحكم قطر ١٠٠ مم تشمل على محبس Y OS & Y ومحبس عدم ارتفاع ومحبس اختبار وصرف برجاج مين تصرف المياه TEST & DRAIN VALVE WITH SIGHT GLASS (Water Flow Switch & Tamper Switch) قطر ٥٠ مم ووحدة مراقبة الضغط ووحدة مين سريان المياه (Water Flow Switch & Tamper Switch) ويتوصيل على منظومة إنذار الحريق والسر يشمل جميع اللوازم والإكسسوارات اللازمة ونهو العمل "ثواباً" و"كاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p> <p>(بالعدد واحد)</p>
٤٤٠٠٠٠	عدد	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠		<p>٢-٥ SPRINKLERS</p> <p>بالعدد توريد وتركيب وإختبار وتشغيل وحدة تحكم قطر ١٥٠ مم تشمل على محبس Y OS & Y ومحبس عدم ارتفاع ومحبس اختبار وصرف برجاج مين تصرف المياه TEST & DRAIN VALVE WITH SIGHT GLASS (Water Flow Switch & Tamper Switch) قطر ٥٠ مم ووحدة مراقبة الضغط ووحدة مين سريان المياه (Water Flow Switch & Tamper Switch) ويتوصيل على منظومة إنذار الحريق والسر يشمل جميع اللوازم والإكسسوارات اللازمة ونهو العمل "ثواباً" و"كاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p> <p>(بالعدد اثنان)</p>




المقاول: الشركة الوطنية سامكو

الاستشاري الالكتروني
ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERINGالاستشاري المعماري
NABOOSHNS ARCHITECTS-BURJAN
PLANNERSالصالحة، رئيسة الامة للطرق، والكتابي
الصالحة، رئيسة الاماية للطرق، والكتابي

مقاييس مشروع محطة الأخوبيست الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)

النوع	الكمية	الوحدة	البيان	الرقم
الإجمالي				
١٢٤,٤٠٠	٤٠٠	٢٠٦	بالمدد توريد وتركيب رشاش حريق (K 5.6) (Pendent/Concealed 68°C (K 5.6)) مستورد قطر مخرجة ٥،٥ بوصة ومن عبة معتمدة من UL - FM والسر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل "نها" تاماً وكاملًا حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمدد ثلاثة وستة)	١٥
٩,٠٠٠	٧٥٠	٢٢	بالمدد توريد وتركيب رشاش حريق (K 5.6) (Upright 68°C (K 5.6)) مستورد قطر مخرجة ٥،٥ بوصة ومن عبة معتمدة من UL - FM والسر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل "نها" تاماً وكاملًا حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمدد النان وعشرون)	٢٠
٢٠٢,٥٠٠	٥٥٠	٣٧٠	بالمدد توريد وتركيب رشاش حريق (K 8) (Upright 68°C (K 8)) مستورد قطر مخرجة ٥،٥ بوصة ومن عبة معتمدة من UL - FM والسر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل "نها" تاماً وكاملًا حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمدد ثلاثة وسبعون)	٢٠
			VALVES	٣
			بالمدد توريد وتركيب واختبار محبس OS & Y GATE VALVE (WithTamber Switch) على منظومة إنذار الحريق والسر يشمل جميع الأوانم والأكسسوارات الازمة ونهو العمل "نها" تاماً وكاملًا حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	
٣٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	محبس قفل قطر ٧٥ مم (بالمتر الطولي خمسة)	١٦
٤,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠	محبس قفل قطر ١٥٠ مم (بالمتر الطولي خمسة)	٢١
			Air Vent محبس هواء	٤
٢٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٠	بالمدد توريد وتركيب محبس تفريغ هواء أوتوماتيكي قطر ٢٥ مم يركب في نهاية عمود الحريق كامل بجمعه مشتملة من محبس كرة قطر ٢٥ مم وخراشه FM/UL مع جمع الملحقات الضرورية الأخرى حسب المواصفات والرسومات التفصيمية واستكمال كافة مابلزم طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات مهندس الإشراف. Valmatic - U.S.A & Giacomini - Italy (بالمدد عشرة)	
			طفيات نظام الاطفاء التقليدي (التسليط الموضعي) Fire Trace	٥
٢٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٠	توريد وتركيب وحدة اطفاء تقليدي ٧ كجم موطبي تعمل بنظام FM200 FM/UL اعتماد UL تشمل أنبوبة الاستشعار المصننة من مادة بوليمرية مرنة والجهاز مزود بباب خاص يدخل تقليانيا عند تسرب الماء فقط من داخل الأنابيب مع الربط بنظام إنذار الحريق تشمل أسطوانة الحفظ صالحة لاطفاء حرائق الدهون مزودة برس وصمام الأمان يصل تقليانيا مع وجود سارة إنذار وجميع الملحقات الضرورية الأخرى مع تقديم الحسابات الهيدروليكية لظام الاطفاء للمراجعة والإعتماد قبل البدء في التوريد وتنفيذ الأعمال، والسر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل "نها" تاماً وكاملًا حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالمدد خمسة)	
			نظام الاطفاء التقليدي بالغاز Fire Suppression System اطفاء الحريق بنظام غاز FM200	٦
			بالمدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لنظام (FM200) (FM/UL) وسر البند يشمل هروبة توصيل وربط نظام الاطفاء الأول مع نظام إنذار الحريق ومع وحدات التكبير الخاصة بالفرزة للنصل في حالة الاطفاء وتكون الغرف المقطورة بهذا النظام مزرونة بالكامل عن أي منطقة حولها بحوالى متران تصل للسلف لمنع سرب الغاز خارج محبط الغرفة المحدة وتوريد وتركيب الإسطوانات خارج الغرفة التي يتم إطفاءها وكذلك وحدات التحكم مع تبرير تركيبها في مكان يسهل الوصول إليه بدون عوائق وجميع الأكسسوارات المطلوبة بالظام وكل ما يلزم لنهو العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. يجب على المقاول تقديم الحسابات الهيدروليكية لظام الاطفاء للمراجعة والإعتماد قبل البدء في التوريد وتنفيذ الأعمال على أن يراعى عند حسب حجم الغرفة أن إيقاع الشرف يقاد من ظهر بلاط أرضية الغرفة وتحت مسحوب بطاقة البلاطة المسحلة لسف المرفأة.	





المناولة: الشركة الوطنية سامكو

ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERINGHAD DESIGNS ARCHITECTSURBAN
PLANNERS

الصالحة: الهيئة العامة للطرق والجسور

مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المهني الإداري و منحاتها)

العنوان	النوع	الكمية	القيمة	النحو
				كما يشمل سعر اليد الاترöm بتنمية ما يأتي من أصل:
				- تقديم المسابقات الهيدروليكيه متعددة من الشركة المصانعه / الموردة
				- تفتيشات التبروجون واختبار وزن
				- توريد وتركيب وختبار كرافتش حراري كامل بالقائمه والعين أعلى وأسفل سقف المستشار
				- توريد وتركيب وختبار رشائلت أعلى دخل ضروري كامل بالقائمه والعين أعلى وأسفل سقف المستشار
				- توريد وتركيب وختبار جرس حريق بقوة ١٠ دسيبل
				- توريد وتركيب وختبار لوحه نكم ٢ منطقة Two Loop Zone
				- توريد وتركيب وختبار زر بتفتح بطلق الفاز بشعل العطاء
				- توريد وتركيب وختبار زر بطلق الفاز دبويا بشعل الضوء
				- توريد وتركيب وختبار شبكة مواسير تربيع قماز والمفرج
				- توريد وتركيب وختبار شبكة الاصالك والواسير طبقاً للمواصفات التقنية وثورة المعروفة
				- توريد وتركيب جرانيارة ودوريد وتركيب وختبار صغير ميكانيكي
٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	١	عدد	كلائد الساق ولكن لزوم توريد وتركيب وختبار نظام -٣ ARCHIEVE EOOM FM200 غرفة بالدور
				الأرضي حجم الغرفة ٧٠ م٢ وسمة الإسطوانة ٤٠ كجم (حجم اسطوانة تغيري)
				سعر اليد يشمل كل ما يلزم لدور الاصال طبقاً للمواصفات التقنية و اصول الصناعة و التنفيذ (بالمقدار الواحد)
٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	١	عدد	كلائد الساق ولكن لزوم توريد وتركيب وختبار نظام -٣ ARCHIEVE EOOM FM200 غرفة بالدور
				الأرضي حجم الغرفة ٧٠ م٢ وسمة الإسطوانة ٤٠ كجم (حجم اسطوانة تغيري)
				سعر اليد يشمل كل ما يلزم لدور الاصال طبقاً للمواصفات التقنية و اصول الصناعة و التنفيذ (بالمقدار الواحد)
٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	١	عدد	كلائد الساق ولكن لزوم توريد وتركيب وختبار نظام -٣ CONTROL ROOM FM200 غرفة بالدور
				الأول حجم الغرفة ٣٣٧ م٢ وسمة الإسطوانة ٢٠ كجم (حجم اسطوانة تغيري).
				سعر اليد يشمل كل ما يلزم لدور الاصال طبقاً للمواصفات التقنية و اصول الصناعة و التنفيذ (بالمقدار الواحد)
٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	١	عدد	كلائد الساق ولكن لزوم توريد وتركيب وختبار نظام -٣ DATA ROOM FM200 غرفة بالدور الاول حجم
				الغرفة ٢٢٨ م٢ وسمة الإسطوانة ١٢٥ كجم(حجم اسطوانة تغيري).
				سعر اليد يشمل كل ما يلزم لدور الاصال طبقاً للمواصفات التقنية و اصول الصناعة و التنفيذ (بالمقدار الواحد)
				ثنائية الموقن العدن
				صال شبكة مواسير اطفاء الحريق بالدور
				مواسير حديد سيفون
				بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير شبكة مكافحة الحريق - SCh.40 (black seamless steel - SCh.40) الخاص بالصادر وشبكة قلوزيع داخل الابواب (روس او الكرات) تركب مقطه على الحوطة وملزولة جداً ضد الطروبة بالابواب كمس من الخارج للمواصيف المطلة ومضف الابواب صفريه او المفتوحة من الحوالتين من الخارج شريح قولي فينتين دائمه الصنف لفكان بتركيب ٥% الشبكة الواحدة عددها تختلف هذه المواسير - المفرغه او الامتداد او الارضيات يجب ان تمر داخل مواسير حديد/صاج محلب اكبر منها يمتلك مره ونصف قطر الشفورة بجمع مشتقاتها من طبق معصوصه تحصل مشطا لاقي من ٢٠ جري بنظم الحلم لرفلشنس توصيه (Standard PN-16) وختبار الشبكة بالكامل على اجهزة اسامة وتوريد كلية بالقطع الخامس والتثبيت من نوع حصل على اعتماد UL FM ، ووصلات التصد (expansion joint) و اليد اوصى بشغل تهوف وتركاع وطلاء المواسير بطريقين من البريم وثلاث طبقات لاكي لاصم وحلبة الضبيل الشبكة بالمواد الكيماوية المطلوبة وفقط يشمل مسلسلات تجهيز الشفورة السليم ، والمواصفات (الأستكران) الاسماء مع جميع الملاحظات الصارورى الأخرى وسعر يشمل كل ما يلزم لدور العمل فهو "تسا" و "كتلا" حسب المرصوصات والمواصفات التقنية واصول الصناعة وتنفيذ وتمويل وتأهيل المهندس المشرف على التنفيذ.
٤,٩٠٠	٤٥٠	١٦	متر	مواسير قطر ٦٥ مم (بالمتر الطولى لوحدة عشر)
٧,٨٥٠	٥٢٥	١٦	متر	مواسير قطر ٦٥ مم (بالمتر الطولى لوحدة عشر)
١٢,٦٠٠	٩٠٠	١٦	متر	مواسير قطر ٦٥ مم (بالمتر الطولى لوحدة عشر)
٩٠,٠٠٠	١,٥٠٠	٤	متر	مواسير قطر ١٠٠ مم (اربعون متر طولى) (٣-١٤٢)

بيان العائد للطرق والجسور




بيانات مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)						
الإجمالي	القمة	الكمية	الوحدة	البند		
٢١,٠٨٠	٢,٤٤٠	١٤	متر		مواسير قطر ١٥ مم (بالเมตร الطولي اربعين عشر)	٣-١٠٣
					مواسير بولي إتيلين ضغط عالي	٣-١٠٤
					بالنهر الطولي توريد وتركيب مواسير لشبكة مكافحة الحريق - (HDPE) من البولي إتيلين عالي الكثافة ضغط تتحمل ١٦ بار شاملة القطع المخصصة بأنواعها من الأوعية ووسائل ومشتقات وخلافة كاملة بجمعى مشتملاتها طبقاً للمواصفات المرفقة تتفتح تحت الأرض (منقوشة) عمق لا يقل عن ١ متر زورق الحريق والسرور ومحمل على سعر بنود المواسير الحفر والردم بالرمل النظيف طبقاً للمواصفات المرفقة أسلف المواسير وتغليف المواسير بالرمل النظيف والمنقول الطابق للمواصفات بسمك . - قسم فوق الراسم العلوي والسفلي للطاقة وردم بعد ذلك من ناتج الحفر على طبقات سبك . - قسم وفلمن عبة للاستشاري للاعتماد قبل التنفيذ والتوريد وهو العمل "نحو" تاماً وكاملأ" طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتليميـات المهندس المشرف على التنفيذ.	٣-١٠٥
١٩٥,١٠	١,٠٢	٤٤٣	متر		مواسير قطر ١١ مم (بالنهر الطولي اربعين ثلاثة و اربعين)	٣-١٠٦
٧٤٧,٥٠	١,٦٠	١٦٥	متر		مواسير قطر ١٦ مم (بالنهر الطولي مائة خمسة و ستون)	٣-١٠٧
					كتاف مكافحة الحريق (FHC 65mm) (بالنهر احدى عشر)	٣-١٠٨
٤٤,٠٠	٤٠,٠٠	١١	عدد		بالعدد توريد وتركيب وتوسيع وإختيار وتغليف كتافه حريق مصنوعة من الصاج وفقاً للمواصفات الفنية الصادرة عن الادارة العامة للحماية المدنية وطبقاً للرسومات التصميمية في شبكة الموقع العام يركب عازف الحاطط محبس ١٥ مم (landing valve c/w couplings) وخرطوم حريق ٢٥ مم الخاص بغيري الحماية المدنية بطول ٢٠ متراً ومحابس الصيانة ذات قطر ١٥ مم خارج الكابينة والصواعد والمدارات الأفقية والصالحات والتوصيات اللازمة للمعدود الرطب وتحتوى الكابينة على مسنس الحريق (purpose nozzle) الخاص بمحبس ٦٥ مم طبقاً للتوصيات والرسومات التصميمية وجميع مشتملات الكابينة، والسرور يشمل كل ما يلزم لنحو العمل "نحو" تاماً وكاملأ" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتليميـات المهندس المشرف على التنفيذ.	٣-١٠٩
					غرفة محابس (بالنهر احدى عشر)	٣-١١
					غرفة محابس (٦٠,٩)	٣-١٢
					OS & Y GATE VALVE بالعدد إنشاء غرفة من الطوب بارتفاع (٦٠,٩) لتركيب محابس القفل (With Tamper Switch) ويتم التوصيل على منظومة إنذار الحريق الخاصة بشبكة الحريق للموقع العام طبقاً للرسومات والسرور يشمل أعمال الحفر والردم ويشمل سعر القطاء من الزهر للغرفة والسرور بشرط توفره وتركيب محبس قفل من الزهر بفلالاشات تجمع كما تشمل فلة البند جميع التوصيات والمشتقات والقطع الخاصة والوصلة المرنة ويشمل السرور دهان الغرفة من الداخل باللونة الأستمنية والرمل على طبقتين وخدمة الطهارة الجيدة بالمحارة واستبدال الزجاج من جميع الإتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الغرسنة الأستمنية حول حلزون الزهر مع بياضه باللونة الأستمنية كما يشمل سعر البند أعمال الحفر والردم كاملاً وعمل كل ما يلزم لنحو العمل "نحو" تاماً وكاملأ" طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتليميـات المهندس المشرف على التنفيذ، يشمل محبس على النحو التالي:	٣-١٣
٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	١	عدد		محبس قطر ١٠٠ مم (بالنهر واحد)	٣-١٤
٧٥,٠٠	٧٥,٠٠	١	عدد		محبس قطر ١٥٠ مم (بالنهر واحد)	٣-١٥
					غرفة محابس (٨٠,٥)	٣-١٦
					OS & Y GATE VALVE بالعدد إنشاء غرفة من الطوب بارتفاع (٨٠,٥) لتركيب محابس القفل (With Tamper Switch) ويتم التوصيل على منظومة إنذار الحريق الخاصة بشبكة الحريق للموقع العام طبقاً للرسومات والسرور يشمل أعمال الحفر والردم ويشمل سعر القطاء من الزهر للغرفة والسرور بشرط توفره وتركيب محبس قفل من الزهر بفلالاشات تجمع كما تشمل فلة البند جميع التوصيات والمشتقات والقطع الخاصة والوصلة المرنة ويشمل السرور دهان الغرفة من الداخل باللونة الأستمنية والرمل على طبقتين وخدمة الطهارة الجيدة بالمحارة واستبدال الزجاج من جميع الإتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الغرسنة الأستمنية حول حلزون الزهر مع بياضه باللونة الأستمنية كما يشمل سعر البند أعمال الحفر والردم كاملاً وعمل كل ما يلزم لنحو العمل "نحو" تاماً وكاملأ" طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتليميـات المهندس المشرف على التنفيذ، يشمل محبس على النحو التالي:	٣-١٧

مقاييس مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)						
الرتبة	الوحدة	الكمية	القيمة	الفئة	الإجمالي	
٤	محبس قطر .١٠ م + محبس قطر .١٥ مم ١-٢-١٧ (بالعدد واحد)	١	٤٠,٠٠٠	عد	٤٠,٠٠٠	
٥	محبس قطر .١٥ م + محبس قطر .٢٠ مم ٢-٣-١٧ (بالعدد واحد)	١	٨٠,٠٠٠	عد	٨٠,٠٠٠	
٦	طقميات نظام الاطفاء التلقائي (التسجيل الموضعي) Fire Trace					
٧	توريه وتركيب وحدة اطفاء تلقاء ٢ كجم موضعي تعمل بغاز FM200 [عتماد FM/BA] لشمل انوية الاستئمار المصممة من مادة بوليامير مرن والجهاز مزود بباب خاص يدخل تلقائيا عند تدريب الضغط من داخل الانبوب مع الربط بنظام إنذار الحريق تشمل أسطوانة الضغط صالحه لاطفاء حرائق الكهرباء بروحة يراس وصمام الامان يدخل تلقائيا مع وجود سارية إنذار وجميع الملحقات الضرورية الأخرى مع تقديم الحسابات الهيدروليكية لنظام الاطفاء للمراجعة والإعتماد قبل البدء في التوريد وتنفيذ الأعمال، والسر يشمل كل ما يلزم نهوض العمل "تاماً وكاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقييد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد خمسة)					
٨	وصلة الحماية المدنية Siamese Connection					
٩	بالعدد توريه وتركيب وربط وصلة حريق جافة سيممير حافظة (2 مدخل) تحتوي على محبس عدم ارتداد قطر .١٠ م (SWING TYPE) ولا يدور سريع بـ خطوط الحريق وطبقات الفلق والسلال وجميع اللوازم والإكسسوارات ممتدة FM/BA وهو العمل "تاماً وكاملاً" حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقييد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. Giacomini - Italy					
١٠	حنفيه حريق برميلية Fire Hydrant					
١١	نظمة الاطفاء التلقائي بالغاز Fire Suppression System اطفاء الحريق بنظام غاز CO2					
	بالعدد توريه وتركيب واختبار وتشغيل نظام (CO2) [عتماد UL/FM] وسرد البند يشتمل ضرورة توسيع وربط نظام الاطفاء الآلي مع نظام إنذار الحريق ومحركات التكيف الخاصة بالغرفة للحصول في حالة الإطفاء، وتكون الغرف المطلقة بهذا النظام ممزوجة بالكامن عن أي منطقة حولها بحوالى متر نصل للسلف لمنع تسرب الغاز خارج حبيط الغرفة المحددة وتوريه وتركيب الإسطوانات خارج الغرفة التي يتم إطفاؤها وكذلك لوحات التحكم مع ضرورة تركيبها في مكان يسهل الوصول إليه بدون عوائق وجميع الإكسسوارات المتعلقة بالنظام وكل ما يلزم نهوض العمل حسب الرسومات والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقييد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. ويجب على المقاول تقديم الحسابات الهيدروليكية المعتمدة من الشركة المصنعة / الموردة لنظام الاطفاء المراجحة والإعتماد قبل البدء في التوريد وتنفيذ الأعمال على أن يرافق عند حجم الغرفة أن إرتفاع الغرفة يقلص من ظهر بلاط أرضية الغرفة وهي منسوب بطبقة البلاطة المسلحة لسف الغرفة.					



بيانات مشروع محطة الكهرباء بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	البيان	
<p>كما يشتمل سعر البدل الإلتزام بتنفيذ ما يلى من أعمال:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقديم المسابات الهيدروليكية معتمدة من الشركة المصنعة / الموردة - اختبارات البتروجين واختبار وزن - اختبار الخطأ - توريد وتركيب واختبار موافز - توريد وتركيب واختبار كاشفات دخان حراري كامل بالقاعدة والمين - توريد وتركيب واختبار رشاشات أعلى - توريد وتركيب واختبار مواسير من الحديد الأسود المسلمين - توريد وتركيب واختبار سربات حريق بقوة ١٠٠ ديبسيبل - توريد وتركيب واختبار جرس حريق بالفطر ٦ بوصة - توريد وتركيب واختبار لوحه تحكم ٢ منطقة - توريد وتركيب واختبار ذر إيقاف إطلاق النار بدويها يشمل الغطاء - توريد وتركيب واختبار شبكة الأسلام والمواسير لربط بين اللوحة والحمامات ولوحة المومدة - توريد وتركيب واختبار المضخ والمجرف الميكانيكى 					
٩٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١	عدد	كالبدل السابق ولكن لزوم توريد وتركيب واختبار نظام الـ CO2 لنفحة المولد وحجم الفراقة في حدود ١٠٠ متر مكعب بمقدار ٣ اسطوانة سعة كل واحدة ٤٥ كجم - يشمل كل ما سبق	١١
٩٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١	عدد	كالبدل السابق ولكن لزوم توريد وتركيب واختبار نظام الـ CO2 لنفحة الجهد المنخفض وحجم الفراقة في حدود ١٠٠ متر مكعب بمقدار ٣ اسطوانة سعة كل واحدة ٤٥ كجم - يشمل كل ما سبق	١٢
٧٧١,٥٥				لهمالي احتمل غرفة طلمبات وفزانات مياه الشرب ومكثفة الحريق	
الاعمال الصناعية					
<p>١- شرطات خاصة</p> <p>الشركة المتفقة مسؤولة عن تقديم الرسومات التشغيلية والتفصيلية Work shop drawings قبل البدء بأى عمليات، وذلك للاعتماد من استشاري المشروع مع الأخذ في الاعتبار التنسق الشامل مع الأعمال الأخرى مثل توحات ماكينات التكسير والطلبيات الميكانيكية وأعمال الكهرباء وأعمال الحريق والستف المستعار ومتطلباته وعمل جمع أعمال التنسق الازمة بينها وإخراج رسومات نهاية للأعمال بالكاملا للمراجعة والإعتماد من الاستشاري.</p> <p>٢- الشروط العامة</p> <p>الشركة المتفقة مسؤولة عن تقديم الرسومات النهائية AS built drawings موضحاً بها تفاصيل التركيب وتنفيذات التثليل والصيانة، مع تثبيت البطاقات التعميرية وتليميات الاستخدام والتثليل والصيانة طبقاً لتصليمات واعتماد استشاري المشروع.</p> <p>٣- جميع الأعمال تنفيذها طبقاً للكود المصري والمواصفات الفنية العالمية - وجمع البدل تشمل على التوريد والتركيب واختبار والتسلیم كافة الأجهزة شاملة جميع الأكسسوارات والأجهزة والمعدات اللازمة وكل ما تحتاجه من أعمال إنشائية وطبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والرسومات الخاصة بالمشروع وترجميات المهندس المشرف.</p> <p>٤- السعر يشمل تكلفة عمل شبكة التغذية بالماء البارد والساخنة من الصواعد وهي كل جهاز باقتدار مناسبة أو طبقاً للرسومات حسب الاستخدام من البولى بروپيلين على أن يكون المدخل لكل فرع من منسوب أعلى السقف العلوي أو من المنور لم عمل نزلات خاصة لكل جهاز على حدة في حالة الدخول من السقف العلوي مع توفير جهاز زاوية متصلة لكل جهاز شامل كل الأدوات والمشدات والتهابات والعلويات...الخ مع تقديم شهادات اختبار معتمدة لكبس شبكة المواسير من الشركة المنتجة عند طلب تسليم الشبكات للإشتراك.</p> <p>٥- السعر يشمل تكلفة عمل مواسير صرف من كافة الأجهزة وهي أعمدة الصرف أو المعدات الرئيسية أو السيفونات الأرضية من مواسير PVC باقتدار مناسبة لعمل كل جهاز أو طبقاً للرسومات مع عمل مبول مناسبة شاملة المواسير بكافة وصلاتها، والسعر يتضمن عمل عداد قياس متصل للحياة المستخدمة للمشروع سواء مياه الشرب أو الحريق أو التكسير وعمل التفريغ للأجهزة المستخدمة وكل ما يلزم لإتمام الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتليميات المهندس المشرف على التنفيذ.</p> <p>٦- جميع مواسير الصرف ذو ضغط تشغيل ٦ جوي للمدفنون و ١٠ جوي للمقلق ويلزم اعتمادها قبل التوريد طبقاً لمقاييس الموردين المعتمدة.</p> <p>٧- ملحقات المواسير منقطع، تهابات، مشدات من نفس إنتاج نوع المواسير.</p> <p>٨- يتم تركيب محابس فصل (زاوية) متصلة لكل جهاز صحي من مرحاض أو حوض واحد على الخط البارد وواحد على الخط الساخن .</p>					

بيانات المشروع				
العنوان	النوع	الكمية	الوحدة	القيمة
مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)				
الإجمالي	النوع	الكمية	الوحدة	القيمة
١	الأعمال الصحية الواردة والموضحة بالمقاييس طبقاً لقائمة الموردين المعتمدة من الاستشاري والمالك وعليه يجب على المقاول تقديم عينات لكل التركيبات والتجهيزات الصحية للمراجعة والإعتماد قبل التوريد والتتركيب وتنفيذ الأعمال.			
٢	جميع الأجهزة الصحية التي يتم تركيبها تكون مطابقة لقائمة الموردين المعتمدة بالموعد وباللون الذي يحدده السادة الاستشاري العام واستشاري الأعمال الصحية والمالك.			
٣	جميع التركيبات تلتزم بمتطلبات المحاسبة على ما يليق على الطبيعة.			
	بولي. الصبغي الإداري			
٤	الأجهزة الصحية Sanitary Fixtures			
٥	مراحيض المرحاض WC			
٦	بالعدد توريد وتتركيب وتجهيزه وتشغيل المرحاض المرحاض S/P من الصبغي طبقاً لمدينة المعتمدة بالشطة طة الداخلية والخارجية وذو صمام مانع التفريغ باللون والموعد الذي يحدده المهندس الاستشاري المعماري ويشمل التثبيت والتراكيب والسدلips البلاستيك من النوع التقليد المزدوج وصندوق الطرد، وبشكل البند ومجلات المعرف اللازمة إلى الأعمدة الرأسية أو المنشآت الرئيسية بالدور أو المكان المختار وإلى غرفة التفتيش للأجهزة بالدور الأرضي وكذلك التصدب بالالية من الأعمدة الرأسية أو المنشآت الرئيسية كما يشمل البند توريد وتتركيب رفقة من الصبغي الملون ومحابس الزاوية وخلاقه والبند بجمعه مشتملاته مما جمهمه وكل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٧,٠٠٠	١٦	٣٠
٧	(بالعدد ستة عشر)			
٨	مراحيض معافق WC-1			
٩	بالعدد توريد وتتركيب وتجهيزه وتشغيل المرحاض خاص لنوى الاحتياجات الخاصة بصناديق طرد باللون والموعد الذي يحدده المهندس الاستشاري المعماري والبند مشتمل على المقعد ومحبس زاوية مطلي بالكروم مقاس ١٥ مليمتر وحامل مانديبل الحمام، المرحاض يجب أن يكون مجهزاً بدش داخلي من النوع العرن والبند يشمل دش خارجي والسدلips البلاستيك من النوع التقليد المزدوج والسمسر يشمل توريد وتتركيب دش ذراع مستقيم ٦ سم بيت القبا أو راسياً تما الاحتياجات ومسند ذراع مفصل ٨ سم رأس الحركة صنفون من الحديد المقطعي بطبقية من الوليبيدي، وجميع وصلات الموارد اللازمة إلى مواسير التفتيش والصرف الرئيسية والبند بجمعه مشتملاته مما جمهمه وكل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٩,٠٠	٢	٣٠
١٠	(بالعدد ثنان)			
١١	حوض غسل أبيض داخل قبرصة LAV			
١٢	بالعدد توريد وتتركيب وتجهيزه وتشغيل حوض غسل أبيض يركب داخل قبرصة - رخامة أو ما يقاله ولا يشمل الأعمال المدنية - من إنتاج ديجورافيت أو إيمال مانندارد ولكفة تحمل توريد وتتركيب وتجهيزه وتشغيل غاطط المياه والطابق من عينة معتمدة من الاستشاري ومحابس الزاوية وسبعون نوك كوبية يركب من أسفل القرصه ويخرج للمياه الفاضلة وجميع توصيات التفنيه المركبة داخل الوحدة وهي الأعمدة الرأسية أو الموارد العمومية بالدور وجميع مشتملاته مما جمهمه وكل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٧,٠٠	١٦	٣٠
١٣	(بالعدد ثمانية عشر)			
١٤	حوض غسل أبيض معافق LAV-1			
١٥	بالعدد توريد وتتركيب وتجهيزه وتشغيل حوض غسل أبيضي نصف ركبة خاص لنوى الاحتياجات الخاصة كامل بخلط مياه مطلي بالكروم ارتفاع ١٥ سم ومحبس زاوية مقاس ١٥ مليمتر مطلي الكروم ومخزن للمياه الفاضلة وسبعون نوك يركب نصف ركبة معلق وجميع القطع الخاصة المتعلقة بمواسير الصرف والتغليف ...إلاع وسمسر يشمل توريد وتتركيب مسند ذراع مستقيم ٦ سم بيت القبا أو راسياً تما الاحتياجات ومسند ذراع مفصل ٨ سم رأس الحركة صنفون من الحديد المقطعي بطبقية من الوليبيدي وجميع وصلات الموارد اللازمة إلى مواسير التفتيش والصرف الرئيسية والاكسيسوارات والبند بجمعه مشتملاته مما جمهمه وكل ما يلزم لنهاه العمل طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	٩,٠٠	٢	٣٠
١٦	(بالعدد ثنان)			
١٧	Mixer خلاط			



مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
النوع	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالي	
البند					
١٢٠٠٠	عدد	٤	٣٠٠٠	١٢٠٠٠	بالمدد توريد وتركيب وتجزئه وتشغيل خلاط غسيل أبيض للمياه الساخنة والماء البارد ذو قلب سيراميكي بدرج واحد للتحفظ في الماء شامل جميع توصيات التقنية ومحابس الراوية والملحقات الخاصة بالتنشيط، والبند يحوي مثمناته مما جديه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتمليمات المهندس المشرف على التنفيذ. [بالمدد اربعة]
١-١	مواسير الماء الباردة والساخنة				
٩٠٠٠	عدد	٠	٩٠٠٠	٩٠٠٠	بالمدد توريد وتركيب مهولة شاملة لشبكة الماء الخاص بها من إنتاج دبورليفت أو بروبان ستاندرد وكذلك محول على الشبكة جميع توصيات التصريف والتغذية المركبة داخل الدورة وعلى الأعتمدة الرئيسية والأعمال تتصل على توريد وتركيب كافة الأكسسوارات اللازمة وأعمال التعليق والتثبيت بالحانط، والبند يحوي مثمناته مما جديه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتمليمات المهندس المشرف على التنفيذ. [بالمدد خمسة]
٢	مواسير بولي بروپيلين				
٨,٥٨٤	متر	٥٨	١٦٨	٨,٥٨٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وإختبار وتمليط مواسير من البولي بروپيلين خاصة لمياه الشرب PN16 تركب على الحالط او مثقلة بالأسقف او مدفونة بالأرضيات، وسر البند يشمل التعامل بجوانب ومواسير المثقلة تحت البلاط يتم عمل طبقة من الرمال النظيفة أسلف وأعلى الماسورة والتثبيت بالقطن الخاص، وأعمال الحفر والردم بالرمال النظيفة إن نطلب الأمر ذلك للمواسير المحفورة تحت الأرض والبند كامل بجميع المثبتات والقطع الخاصة والتثبيت، بالإضافة إلى جميع المثبتات مما جديه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتمليمات المهندس المشرف على التنفيذ. [الملاحة : المواسير الداخلية للحمامات والمناطق الرطبة غير محملة على هذا البند ومحملة على بند الأجهزة الصحية للحمامات والمناطق الرطبة.]
٢-١	مواسير قطر ٢٥ مم (٤/٢")				
٢-٢	مواسير قطر ٣٤ مم (١")				
٢-٣	مواسير قطر ٤ سم (١,٥")				
٢-٤	مواسير قطر ٥٠ مم (٢")				
٢-٥	مواسير قطر ٦٢ مم (٢,٥")				
٢-٦	مواسير قطر ٧٥ مم (٣")				
٢-٧	مواسير قطر ٩٠ مم (٣,٥")				
٢-٨	مواسير قطر ١٠٥ مم (٤")				
٢-٩	مواسير مياه دافن				
٩,٠٠٠	عدد	٢	٧٠٠	٩,٠٠٠	بالمدد توريد وتركيب وإختبار محبس دفن من نفس نوع المواسير تركب على خطوط تغذية المياه داخل الحالط وسر البند يشمل جميع المثبتات والإكسسوارات والماء البارد ذو قلب سيراميكي بدرج واحد للتحفظ في الماء شامل جميع مثمناته مما جديه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتمليمات المهندس المشرف على التنفيذ.
١-١-٢	محبس قطر ٢٥ مم				
٢-١٠	اعمال محابس مياه مملحة				
					بالمدد توريد وتركيب محابس مملحة من نفس نوع المواسير تركب على خطوط تغذية المياه ذو سرطان أو قصدير على أن يتم تركيب عدد ٢ لاكور قبل وبعد المحبس كامل بجميع المثبتات والإكسسوارات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتمليمات المهندس المشرف على التنفيذ.



مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)					
الإجمالي	الفلو	الكمية	الوحدة	البند	
٠,٠٦٤	١,٩٨٨	٢	عدد		٣-٢-٣ محبس قطر ٢٥ مم (٤/٤") (بالعدد لاثة)
٢١,٣٩٠	٢,١٣٩	١٠	عدد		٣-٢-٣ محبس قطر ٣٢ مم (١") (بالعدد عشرة)
٥,٧٥١	٢,٨٧٧	٢	عدد		٣-٢-٣ محبس قطر ٤٠ مم (١,٥") (بالعدد النان)
٢٦,٨٥٣	٢,٨٣٦	٧	عدد		٣-٢-٣ محبس قطر ٥٠ مم (١,٦") (بالعدد سبعة)
٩,٧١٢	٤,٨٥٦	٢	عدد		٣-٢-٣ محبس قطر ٦٣ مم (٢,٥") (بالعدد النان)
٣٧,٣٤٩	٣٧,٣١٥	٢	عدد		٣-٢-٣ محبس قطر ٧٥ مم (٣") (بالعدد لاثة)
٢٤,١٣٤	١٧,١٧	٧	عدد		٣-٢-٣ محبس قطر ٩٠ مم (٣,٥") (بالعدد النان)
					٣-٢-٣ عمل محسس الهواء
١٩,٥٠٠	٢,٩٠٠	٠	عدد		٤-٢-٣ بالعدد توريد وتركيب وختبار وتجربة محبس نفخ هواء قطر ٢٥ مم مزود بمحبس كروي (BALL VALVE) يركب في آخر عمود التغذية كامل بجميع مشتملاته وصفر يشمل اعمال التثبيت كامل بجميع المشتملات والاكسوارات وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نحو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتثبيت وتحليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد خمسة)
					٥ سخان المياه الكهربائي Electric Water Heaters
١٠,٠٠	٢,٠٠	٠	عدد		٥ توريد وتركيب سخان كهربائي كامل بالوصلات الكهربائية ومواسير المياه الباردة والساخنة والحمل يشمل الثبيت والمحابس والقطع الخاصية وسائل الحماية الكهربائية والميكانيكية والمخازن (البنادق الداخل) استثنى سليل وكافة ما يلزم للتشغيل، طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التصميمية، حسب أصول الصناعة.
٢٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	٤	عدد		٥-١ سخان مياه كهربائي سعة ١٠ لتر (بالعدد خمسة)
					٥-٤ سخان مياه كهربائي سعة ٣٠ لتر (بالعدد تسعة)
					٥ مواسير الصرف Drainage
					٥ مواسير الصرف ضغط ٦ بار
					٦ بالเมตร الطول توريد وتركيب وختبار مواسير من البلاستيك UPVC ضغط جوي ٦ بار لزوم الصرف والعمل تركب على الحالط أو مفرونة داخل الحالط أو تحت الحالط وسمر البند يشمل القطع وأعمال التثبيت تشمل جوانب والثبيت بمنطبق خرسانية لمواسير أسفل البلاط، طبقاً للمواصفات على أن تكون المواسير من ال النوع الذي يركب بطريقة الجوانب وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نحو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتثبيت وتحليمات المهندس المشرف على التنفيذ. ملاحظة : المواسير الداخلية للحمامات والمناطق الرطبة غير محمولة على بند البند ومحملة على هذه البند ومحملة على بند الأجهزة الصحية للحمامات والمناطق الرطبة.
١,٦٥٣	٢٠٨	٧	متر		٦-٥ سما جميمه مواسير بلاستيك PVC ب قطر ٥٠ مم (٢") (بالเมตร الطول سبعة)
٤٠,٠١٧	٢٦١	١٧٢	متر		٦-٥ سما جميمه مواسير بلاستيك PVC ب قطر ٧٥ مم (٣") (بالเมตร الطول مائه و الثنان وتلواتون)
٧٨,٧٠٠	٤٧٧	١٦٥	متر		٦-٥ سما جميمه مواسير بلاستيك PVC ب قطر ١١ مم (٤") (بالเมตร الطول مائة خمسة و ستون)
٤٧٩,٧٩٣	٨٧٢	٥٢٨	متر		٦-٥ سما جميمه مواسير بلاستيك PVC ب قطر ١٦ مم (٦") (بالเมตร الطول خمسة و ثمان وعشرون)
٣٨,٦٩٤	١٩٤٦	٢٧	متر		٦-٥ سما جميمه مواسير بلاستيك PVC ب قطر ٢٠ مم (٨") (بالเมตร الطول سبعة وعشرون)
					٦ معلومات الأرضية Floor Drain & Area Drain




بيانات الشركة المقاولة						
الشركة المقاولة: SAMCO		الشركة المقاولة: ESE		الشركة المقاولة: ND		الشركة المقاولة: القبة العامة للطرق والجسور
بيانات المشروع						
الاسم	العنوان	النوع	الكمية	الوحدة	المقدار	الหมายات
بيانات المشروع						
الإجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	المقدار	الหมายات	
١٥,٠٠٠	٢٧	٢٠	عدد	٧٥	٦٠٠ جمجمة قطر مخرج ٧٥ مم (٣) (بالعدد عشرون)	توريد وتركيب وإختبار وتسلیم بالوعات الأرضية ذات جسم مصنوع من ال PVC ومشتملة على عازل مائي لا يقال ازفاغه عن ٥ ملليمتر. بالوعة الأرضية يجب أن تكون مشتملة على غطاء مطلي بالكراميك بارتفاع ١٥ ملليمتر. الغطاء يجب أن يكون مجهز بفتحة دائرة مقلووطة ملائمة للوصول ذات غطاء متحرك مقلووطة . جسم بالوعة الأرضية يجب أن يكون مجهزاً بحاوسنة ملائمة وبنفس اطار حاوسنة ال PVC . قطر العاوسنة الخارجية من بالوعة الأرضية يجب أن يكون ٧٥ ملليمتر . البند مشتمل على أعمال المواسير والقطع الخاصة إلى العاوسنة الرئيسية أو القائم الرأسى وجميع الأكموازات اللازمة حسب الرسومات والمواصفات
١١,٤٠٠	٢٧	٢٠	عدد	٧٥	٧٠ جمجمة قطر مخرج ٧٥ مم (٢) (بالعدد عشرون)	بيان طبة تسليك أرضية
٦٩٠	١٩٥	٤	عدد	٧٥	٦٠ جمجمة قطر مخرج ٧٥ مم (٣) (بالعدد اربعة)	بالمدد توريد وتركيب طبة تسليك أرضية FCO من البلاستيك (U.P.V.C) تركب في نهاية الخط والسرور يشمل غطاء نيكل غير قابل للصدأ، والبند يجمع مشتملاته مما جمجمة وكل ما يلزم لنها أعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.
١,٩٢٠	٧١٠	٦	عدد	٧٥	٥٠ جمجمة قطر مخرج ١١٠ مم (٤) (بالعدد ستة)	Trench Drain صجري صرف
٢٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١١	متر	٧٥	٦٠ جمجمة هاوية قطر مخرج ٧٥ مم (٣) (بالعدد اثنا عشر)	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجرى زهر أرضية مخرج ٧٥ مم بهررض ٧٥ سم من النوع التقليدي مصنوعة من الحديد الصلب المدنهون بدهان الإلوكوسي طبقاً لمعايير المعمدة وسعر البند يشمل مراجعة الميول والمناسيب والتركيب والتشطيب وعمل كل ما يلزم لنها العمل نهوا كاماً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.
٤٤٠	١٩٠	٤	عدد	٧٥	٥٠ جمجمة هاوية قطر ٧٥ مم (٣) (بالعدد اربعة)	طبة تهوية سطح
٩٩٠	١٢٠	A	عدد	٧٥	٤٠ جمجمة هاوية قطر ١١٠ مم (٤) (بالعدد ثمانية)	بالمدد توريد وتركيب وإختبار هاوية من البلاستيك (UPVC) لزوم غطاء أعمدة الصرف والمعلم والتقوية والمعطر وسعر البند يشمل التوريد والتركيب والتصنيع والبند يجمع مشتملاته مما جمجمة وكل ما يلزم لنهاه الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.
٣٩,٠٠٠	١,٥٠٠	A	عدد	٧٥	٣٠ جاليريا مقاس ٣٠٠٣٠ سم (بالعدد ثمانية)	جاليريا
٧٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢	عدد	٧٥	٦٠ جمجمة قطر التقليد ٦٠ مم (بالعدد اربعة)	حفر التفتيش Inspection Chamber



مقاييس مشروع محطة الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)				
الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	البيان
٤٨,٠٠٠	٧,٥٠٠	٦	عدد	غرف التفتيش : ٩٠٠ سم (بالعدد ستة)
٤٧,٥٠٠	٩,٥٠٠	٠	عدد	غرف التفتيش : ١٢٠٠ سم (بالعدد خمسة)
				عمال غرف التهدئة Slow down chamber
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١	عدد	بالعدد توريد وتركيب وإنشاء غرفة تهدئة بامتداد ١٢٠٠ سم، مبني حواطتها بالطوب الأسماني المصمت والعمل على قاعدة من الخرسانة العازلة بالوصل والإبعاد المبنية بالكود المصري لتركيبات الأعمال الصناعية والمواصفات القياسية ويشمل البند توريد وتركيب غطاء من النوع التفليز نفر مزدوج بالحاج ويشمل السرير الدلهمان بالبيتومين الحراري من الداخل والخارج والقطعان من الداخل بالمونوليتية والرمل على طبقتين وخدمة الصهارة الجيدة بالمحارة واستئثار الزوايا من جموع الاتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الخرسانة الأسمانية حول حلق النهر مع بياضه بالمونوليتية ويكون منسوب المخرج ٥٠٠ سم أسلفل ملسووب الدخول وعمل الفرقة من الداخل ١٢٠٠ وتركيب كوع ٤٥ على نهاية «أسورة دخول الفرقة» كما يشمل سعر البند أعمال الحفر والردم كاملاً وعمل كل ما يلزم لنحو العمل نحو كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتتفيد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ. (بالعدد اربعة)
				عمال صرف التكيف HVAC Drain
٤٤,٠٠٠	٧٥	٥٩٤	متر	مواسير بلاستيك (UPVC)
١٠,٥٣٠	١٦٠	٦٦	متر	ما جيميه مواسير بلاستيك UPVC قطر ٣٢ مم (١) (بالمتر الطولي خمسة أربعة وخمسون)
				ما جيميه مواسير بلاستيك UPVC قطر ٥٠ مم (٢) (بالمتر الطولي ستة وستون)
				طبقات التسلیک
٢,٢٩٠	٧٠	٤٧	عدد	بالعدد توريد وتركيب طبقة تسلیک من البلاستيك UPVC تركب في نهاية الخط وتحمر يشمل كل ما يلزم لإنها العمل على أكمل وجهة والبند بجمع مشتملاتها بما جيميه وكل ما يلزم لنحو الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتتفيد وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.
٢٠٠	١٤٠	٤	عدد	قطار ٣٢ مم (١) (بالعدد سبعة واربعون)
				قطار ٥٠ مم (٢) (بالعدد اربعة)
				نقطة: الموقع العام
				الأجهزة الصحية Sanitary Fixtures
١٠,٥٠٠	١٠,٥٠٠	١	عدد	برحاض الأرضي WC (بالعدد واحد)

حوض غسيل أيدي-2 LAV



مقدمة مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)					
النوع	الوحدة	الكمية	الفلترة	القيمة	الإجمالي
٤٠١٤ بابوا فلم SH	عدد	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤٠١٥ حوض غسيل أواقي KS	عدد	١	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠
٤٠١٦ ماسير المياه الباردة والساخنة Cold & Hot Water Pipes	عدد	١	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠
٤٠١٧ مواسير بول بروبلين	عدد	١	٢٣,٨٠٨	٢٣,٨٠٨	٢٣,٨٠٨
٤٠١٨ مواسير قطر ٢٣ مم (١")	متر	٦٦	١٩٢	١٩٢	١٩٢
٤٠١٩ مواسير قطر ٢٠ مم (٢,٥")	متر	٧١٠	١,٣٠٤	١,٣٠٤	١,٣٠٤
٤٠٢٠ مواسير قطر ١٦ مم (٤")	متر	٥٧٢	١,٨٧٣	١,٨٧٣	١,٨٧٣
٤٠٢١ المحاسب Valves	فدان	٣	٣	٣	٣
٤٠٢٢ محاسب مياه فدان	فدان	٣	٣	٣	٣



مقاييس مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)						
النوع	الوحدة	الكمية	الفلزة	القيمة	الإجمالي	
بالعذر توبرد وتركيب وإختبار محبس دفن من نفس نوع المواسير تركب على خطوط تغذية المياه داخل الحالات وسرع البند يشمل جميع المشتملات والإكسسوارات والبند بجميع مشتملاته مما جبيه وكل ما يلزم ل فهو الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	محبس قطر 25 مم	٢	عدد	٧٠٠	١,٤٠٠	
عمال محابس مياه سلة	محبس قطر 25 مم (بالعذر اثنان)	٢	عدد	٧٠٠	١,٤٠٠	
بالعذر توبرد وتركيب محابس مملحة من نفس نوع المواسير تركب على خطوط تغذية المياه ذو من طول أو قصير على ان يتم تركيب عدد ٢ لاكور قبل وبعد المحبس كامل بجميع المشتملات والإكسسوارات وعمل كل ما يلزم فهو العمل نهوا كاماً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	محبس قطر ٣٢ مم (١٢)	١	عدد	١,٣٠٠	١,٣٠٠	
عمال واحد	محبس قطر ٣٢ مم (١٢) (بالعذر واحد)	١	عدد	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	
عمال واحد	محبس قطر ٩ مم (٣٢,٥) (بالعذر واحد)	١	عدد	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	
Air Valve	سخان المياه الكهربائي	١	عدد	٧,٨٠٠	٧,٨٠٠	
بالعذر توبرد وتركيب وإختبار وتجربة محبس تفريغ هواء قطر ٢٥ مم مزود بمحبس كروي (BALL VALVE) يركب في الخر عمود التغذية كامل بجميع مشتملاته والسرع يشمل اعمال التثبيت كامل بجميع المشتملات والإكسسوارات وعمل كل ما يلزم فهو العمل نهوا كاماً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	سخان مياه كهربائي سعة ١٠ لتر	١	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	
بالعذر واحد	سخان مياه كهربائي سعة ٥ لتر	١	عدد	١,٥٠٠	١,٥٠٠	
مواسير الصرف ضغط ٦ بار للموقع العام Drainage Pipes	مواسير UPVC ضغط ٦ بار قطر ١٦ ملليمتر	٨٠	متر	٥٠	٤٠,٠٠	
بالعذر الطول توبرد وتركيب وإختبار مواسير من البلاستيك UPVC ضغط جوى ٦ بار لزوم الصرف والسرع يشمل القطع والتثبيت والعزل والردم وبريل نظيفة طبقاً للمواصفات والرسومات على أن تكون المواسير من النوع الذي يركب بطريقة الجوانات وعمل ما يلزم فهو العمل نهوا كاماً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري.	مواسير UPVC ضغط ٦ بار قطر ٢٠ ملليمتر	٨٠	متر	٥٠	٤٠,٠٠	
وتحمل على سرع بند المواسير الركام النظيف طبقاً للمواصفات المرفقة أسلف المواسير وتغليف المواسير بالرخام النظيف والمنقول الطيفي للمواصفات بسمك ٣ سم فوق الرأس المليري والأسفل للumasرة والردم بعد ذلك من الأرجح العفر على طبقات سميكة ٣ سم، وتقديم عينة للإشتراكي للاعتماد قبل التنفيذ وتوبرد و فهو العمل نهوا " كماً " و " كاماً " طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.	مواسير UPVC ضغط ٦ بار قطر ٢٠ ملليمتر	٨٠	متر	٥٠	٤٠,٠٠	
بالعذر الطول توابلون	مواسير UPVC ضغط ٦ بار قطر ٢٠ ملليمتر	٢٦٤	متر	٥٠	٢٢٦,٤٠٠	
بالبوليوبوت الأرضية Floor Drain& Area Drain	توبرد وتركيب وإختبار وتسليم بالبوليوبوت الأرضية ذات جسم مصنوع من ال PVC ومشتملة على عازل مائي لا يتأكل ارتقاها عن ٥ ملليمتر، بالبوليوبوت الأرضية يجب أن تكون مشتملة على غطاء مطلي بالكريوم بأبعاد ١٥ - ١٠ ملليمتر، الخطاء يجب أن يكون مجهز بفتحة دائرة ملحوظة للامالة للوصول ذات خطاء محرك مظلويوظ، جسم بالبوليوبوت الأرضية يجب أن يكون مجهزاً بمسورة ملائمة وبنفس قطر ماسورة ال PVC، قطر المسورة الخارجية من بالبوليوبوت الأرضية يجب أن يكون ٧٥ ملليمتر، البند مشتمل على أعمال المواسير والقطع الخاصة إلى المسورة الرئيسية أو القائم الرئيسي وجمع الإكسسوارات اللازمة حسب الرسومات والمواصفات.	سبلون أرضية قطر المخرج ٧٥ مم (٣٣) (بالعذر واحد)	١	عدد	٣,٥٠	١,٠٠٠
جاري الراب	Page 10 of 46	٢٠				




مقدمة مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (الميناء البحري و ملحقاته)					
الإجمالي	النقطة	الكمية	الوحدة	البيان	
٢,٤٥٠	٧,٩٥٠	١	عدد	<p>بالمدد توريد وتركيب والختبار جالبزاب من البلاستيك كامل بالقطاء والمصفاة وسرير البند بشمل أعمال الحفر والسبائك حروه او معلق على زوايا حديد وكل ما يلزم للتبني وتوصيلات الصرف حتى اقرب غرفة تنفيش وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p>	٤
٦٧,٠٠٠	٨,٩٠٠	٢	عدد	<p>بالمدد توريد وتركيب وإنشاء غرفة تنفيش مبني جوانحها بالطوب الأسمسي المصمت سمك ٢٥ مم والرمل على قاعدة من الخرسانة المساحة بالوصف والأيام المبنية بالكود المصري لتركيب الأعمال الصحية والمواصفات القياسية ويشمل البند توريد وتركيب عظام من النوع الشفلي زهر وزن ١٢٥ كجم بالحلق وسرير البند يشمل الدهان بالبيوكسي من الداخل والبيطومين الماء من الخارج وعمل قنوات بناع الغرفة وبיאض المواء والمقطع من الداخل بالمونة الأسمسي والرمل على مطبقين وخدمة الضهارة الجديدة بالمحاارة واستدار الزوايا من جميع الاتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الخرسانة الأسمسي حول الزهر مع بياضه بالمونة الأسمسي كما يشمل سرير الحفر والردم وأوعية التي لاصلة كاملاً والبند بجمع شتلاته مما جميه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p>	٢١
١٧,٠٠٠				غرف التنشيط Inspection Chamber	١٠٣٠ سم (بالمدد الثاني)
٣٢٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٩	عدد	<p>بالمدد توريد وتركيب وإنشاء مطبق من الخرسانة المساحة بالوصف والأيام المبنية بالكود المصري لشبكات الصرف والمواصفات القياسية ويشمل البند توريد وتركيب عظام من النوع الشفلي زهر وزن ٢٨٥ كجم بالحلق وسلام من الزهر ويشمل السرير الدهان بالبيوكسي من الداخل والخارج وعمل قنوات بناع الغرفة وبיאض المواء والمقطع من الداخل بالمونة الأسمسي والرمل على مطبقين وخدمة الضهارة الجديدة بالمحاارة واستدار الزوايا من جميع الاتجاهات ومن أعلى وعمل حلق من الخرسانة الأسمسي حول الزهر مع بياضه بالمونة الأسمسي ويشمل السرير الحفر والردم وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p>	٤٢
٧٨٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٨	عدد	مطبق بعمق من ١,٢٠ متر حتى ١,٥٠ متر (بالمدد ستة)	١٠٤٢
٧٨٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	٨	عدد	مطبق بعمق من ١,٥٠ متر حتى ٢,٥٠ متر (بالمدد خمسة)	١٠٤٤
١,٤٠	٤٠٠	٢	عدد	برجوري صرف مطر	٢٣
٣٩٣٦٢٣٦				برجوري جارى	١٠٤٣
				<p>بالمدد توريد وتركيب والختبار بلواغات صرف المطر جانبية من البلاستيك للسطح Roof drain تركيب بجوار الحاطط على شكل نصف دائرة تشمل القطاء من البلاستيك على أن تكون من الجود الأعلى المستوردة والبند يضم مشتملاته مما جميه وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقاً للرسومات التفصيلية والمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتنفيذ وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ.</p>	١٠٤٤
				بلاعات صرف مطر قطر ٧٥ مم (٣") (بالمدد ثلاثة)	١٠٤٥
				أهمي الاعمال الصحية	
				أعمال التكسيف والتوكيد	
				اشتراطات خاصة	
				الأسماء تشمل التوريد والتراكيب وإجراء التجارب والاختبارات الازمة للتأكد من كفاءة وصلاحية كافة ما يتم تدبينه من أعمال	
				ويأتي في جميع الأحوال وعلى مسؤولية المقاول ضرورة اعتماد كافة العينات لجميع الاعمال من مهندس الاستشاري قبل التوريد.	
				على المقاول تقديم لوحة تشغيلية توضح كل تفاصيل الشبكات لنظمه التحكم للاعتماد قبل البدء في التنفيذ.	
				على المقاول تقديم لوحة AS-BUILT TOTOPHATE توضح كل تفاصيل الشبكات بعد الانتهاء من الاعمال وقبل تركيب الإسلام الآلياني لجميع الاعمال.	
				جميع البند تخضع للحمم الناتجة بعد الذهاب إلى التكميل وعلى المقاول الالتزام بالكتبات النهائية بدون المطالبة بثروق اسعار مما كانت تكتب	

مقدمة مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (البني الاءاري و ملحقاته)				
الإجمالي	النوع	الكمية	الوحدة	البيان
				يتم الالتزام بقوانين المصممين المسجلين بوزارة الصحة ومن الاشتراطات تم عمل كل ما يلزم لنحو العمل فهو تماماً وأكمل طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية واصول الصناعة و تطبيقات المهندس المشرف.
				وحدة توليد المياه المثلجة :
				توريـد و تركـيب و تشـفـيل و اختـبار وحدة تـولـيد مـياه مـثـلـجـة منـ النوعـ يـورـدـ بالـهـوـاءـ عـنـ درـجـةـ حرـارـةـ خـارـجـيةـ ٤٣ـ مـ بـهـرـونـ مـصـيقـ لـبـيـنـهـ وـ جـوـنـ وـ جـوـنـ التـحـكـمـ control panelـ وـ جـمـعـ ماـ يـلـزـمـ منـ اـكـسـواـبـ طـبـقـاـ لـجـنـاـوـلـ وـ رـسـوـمـاتـ التـصـمـيمـيـةـ مـنـ مـحـابـ نـحـمـ hookـupـ وـ مـحـابـ الـفـاشـةـ وـ حـاسـاتـ وـ اـجـهـزـهـ قـيـاسـ وـ قـطـعـ وـ شـامـلـ مـوـانـ الـاهـتزـازـ vibration isolatorsـ وـ الـبـنـدـ يـتـحـمـلـ جـمـعـ الـمـكـوـنـاتـ وـ الـلـوـازـمـ.
				درجات حرارة دخول وخروج ٧/١٢ نـافـ المـكـفـ copper/aluminumـ. الـبـنـدـ يـشـفـلـ الـقـوـاعـدـ الـحـدـيـدـيةـ. الـوـحدـةـ مـرـوـدـةـ بـ soft starterـ. HIGH Efficiencyـ. FOLLING Factor 0.005ـ.
٧,٥٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠	٢	عدد	سـمـةـ الـوـحدـةـ ١٦٠ـ طـنـ تـيرـيدـ. (بالـعـدـدـ ٢٠٢ـ)
				طـلـبـاتـ الـمـيـاهـ الـمـثـلـجـةـ :
				تـورـيدـ وـ تـركـيبـ وـ تشـفـيلـ وـ اختـبارـ طـلـبـاتـ رـفعـ مـيـاهـ مـثـلـجـةـ split case Ch.water pumpsـ منـ النـوـعـ طـبـقاـ الـجـنـاـوـلـ وـ رـسـوـمـاتـ التـصـمـيمـيـةـ وـ تـشـمـلـ الـمـلـاقـاتـ وـ الصـفـاتـ وـ مـفـاـقـيـنـ وـ مـبـيـنـاتـ الـضـفـطـ وـ الـوـصـلـاتـ وـ الـتـثـبـيـتـ وـ الـحـوـامـلـ وـ الـأـرـطـهـ وـ الـجـوـانـاتـ وـ الـصـامـرـ وـ الـلـكـلـ HOOKUPـ وـ كـلـ الـأـلـاـكـ وـ كـبـلـاتـ الـلـوـيـ وـ عـوـازـ الـاهـتزـازـ وـ فـاتـحـاتـ التـوصـيلـ كـلـاـهـ وـ سـمـاـتـ الـخـارـجـ الـهـوـاءـ وـ دـوـاتـ التـحـكـمـ وـ صـمـاـتـ التـحـكـمـ وـ أـوـعـةـ الـضـفـطـ وـ مـلـحقـاتـهاـ وـ حـاسـاتـ وـ الـقـوـاعـدـ الـمـدـنـيـةـ وـ الـخـرـاسـانـيـةـ.
١,٢٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤	عدد	الـبـنـدـ يـشـفـلـ الـقـوـاعـدـ الـحـدـيـدـيةـ. سـمـةـ ٣٨٥ـ جـالـونـ /ـ دـ h=30Mـ.
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١	عدد	طـنـ الـتـنـدـ :
				تـورـيدـ وـ تـركـيبـ وـ تشـفـيلـ وـ اختـبارـ خـرـانـ تـمـدـدـ منـ النـوـعـ المـفـلـقـ سـمـةـ ٥٠٠ـ لـترـ وـ الـبـنـدـ يـشـفـلـ الـهـوـكـ اـبـ وـ الـقـاعـدةـ الـحـدـيـدـيـةـ وـ جـمـعـ الـمـكـوـنـاتـ وـ الـلـوـازـمـ. (بالـعـدـدـ واحدـ)
٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١	عدد	وحدة قـصـلـ الـهـوـاءـ :
				تـورـيدـ وـ تـركـيبـ وـ تشـفـيلـ وـ اختـبارـ وـحدـةـ قـصـلـ هـوـاءـ ٨ـ شـامـلـ جـمـعـ الـمـكـوـنـاتـ وـ الـلـوـازـمـ. (بالـعـدـدـ واحدـ)
٢٢,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	١	عدد	وحدة معالجة المياه المثلجة :
				تـورـيدـ وـ تـركـيبـ وـ تشـفـيلـ وـ اختـبارـ نظامـ كـمـيـالـ اـوتـومـاتـيـكـ لمـعـالـجـةـ المـيـاهـ الـمـثـلـجـةـ Chemical Dosingـ لـمـنظـومةـ الـتـكـيـيفـ عـلـىـ أـنـ يـشـلـلـ الـمـوـادـ الـكـيـماـيـةـ الـاـرـزـةـ لـلـتـنـظـيفـ وـ اـهـافـةـ الـمـوـادـ الـكـيـماـيـةـ الـاـرـزـةـ لـحـمـاـيـةـ الـمـوـاسـيـرـ ضـدـ التـاـكـلـ وـ موـادـ التـشـفـيلـ الـدـوـرـيـ لـمـدـنـ عـامـ وـ جـمـعـ الـمـكـوـنـاتـ وـ الـلـوـازـمـ تـورـيدـ الـكـيـماـيـاتـ الـاـرـزـةـ لـمـعـالـجـةـ الـدـوـرـيـ تـكـيـيـفـ لـسـنـ الضـصـانـ. (بالـعـدـدـ واحدـ)
٩,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢	عدد	وحدة (الـنـفـفـ - الـمـروـحةـ) JET AHU :
				تـورـيدـ وـ تـركـيبـ وـ تشـفـيلـ وـ اختـبارـ مـيـاهـ مـنـ النـوـعـ AHU JETـ طـبـقاـ لـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـ الـجـنـاـوـلـ وـ رـسـوـمـاتـ التـصـمـيمـيـةـ عـلـىـ أـنـ تـقـعـ جـمـعـ الـمـكـوـنـاتـ مـنـ مـلـفـ تـيرـيدـ وـ مـروـحةـ تـورـيدـ بـهـرـونـ سـخـالـاتـ وـ الـسـاحـاسـ وـ الـمـواسـيـرـ الـلـازـمـهـ لـلـتـوـصـيلـ وـ الـلـوـازـمـ hookupsـ طـبـقـاـ لـنـوـعـ ٣ـWayـ وـ الـوـصـلـاتـ الـمـرـنةـ الـمـيـاهـ وـ الـلـوـازـمـ وـ die electricalـ وـ جـمـعـ الـمـكـوـنـاتـ وـ مـحـبـسـ اـسـارـ جـانـيـ لـلـفـسـلـ الـمـيـالـيـ لـلـسـكـبـةـ وـ الـمـسـرـ شـفـلـ جـمـعـ الـخـاتـاتـ لـرـبطـ الـوـحدـاتـ بـالـشـبـكـهـ الـمـوـجـودـهـ بـالـمـوقـعـ وـ كـلـ مـاـ يـلـزـمـ طـبـقـاـ لـاـصـولـ الصـنـاعـهـ.
				AHU-01 7060 CFM @ Medium Speed (بالـعـدـدـ عـشـرـ)
				وحدة (الـنـفـفـ - الـمـروـحةـ) FCM :



مقاييس مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (العنبي الإداري و ملحقاته)					
الإجمالي	النوع	الكمية	الوحدة	البيان	
				توريد وتركيب وتشغيل وختبار وحدات مياه Fan coil units طبقاً للمواصفات الفنية والجداول والرسومات التفصيلية على أن تشمل جميع المكونات من ملف توريد ومرόحة توريد بدون سخانات ومحابس والمواسير اللازمة للتوصيل والـ hookup والوصلات المرنة للمياه والهواء والـ die electric وجميع المكونات ومحبس امداد جانبي للنفسى العينى للشبكة واسمر يتضمن جميع الخامات لربط الوحدات بالشبكة الموجودة بالموقع وكل ميلزم طبقاً لاصول الصناعة.	
١٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٧	عدد	FCU 02 - 600 CFM @ Medium Sped (بالعدد سبعة)	١.٧
٣٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠	عدد	FCU 03 - 800 CFM @ Medium Sped (بالعدد عشرة)	٢.٧
٤٨,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٣	عدد	FCU 04 - 1000 CFM @ Medium Sped (بالعدد ستة عشر)	٣.٧
٦٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٩	عدد	FCU 05 - 1200 CFM @ Medium Sped (بالعدد خمسة)	٤.٧
٧٤,٠٠٠	٢٢,٠٠٠	١٩	عدد	FCU 06 - 1240 CFM @ Medium Sped (بالعدد تسعة عشر)	٥.٧
٧٨١,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٧	عدد	FCU 07-1400CFM @ Medium Sped (بالعدد سبعة)	٦.٧
				عمال شبكة المواسير للمياه المثلجة : توريد وتركيب وتشغيل وختبار شبكة توزيع المياه المثلجة من الحديد ERW الاسود جدول ٤ ASTM A53 على أن تشمل التحاميم والتماميات ودعامات الثني والتثبيت وملفات التغليف والدهان ، القطع والملحقات (مشتركات - أكواخ...) والبيند يتضمن جميع محابس عزل للأدوار ومحابس الارتفاع والمحابس المفتوحة حسب الرسومات التفصيلية .والتركيب بالفلوجوت لاقطر ٥٠ مم أو أقل وللإقطار ٦٥ مم وأعلى يتم الربط باللحام وجميع المكونات واللوائح وجميع المكونات واللوائح	٧
٣٤٧,٥٠٠	٤,٠٠٠	١٢٣	متر	"١ (بالเมตร الطولي مائة وثلاثة واربعون)	١.٨
٣١١,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٧٦	متر	"٢ (بالเมตร الطولي مائة ستة وسبعون)	٢.٨
٣٧٥,٠٠٠	٢,٠٠٠	٩١٠	متر	"٣ (بالเมตร الطولي مائة وعشرون)	٣.٨
٣٩٦,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٢٢	متر	"٤ (بالเมตร الطولي مائة واثنان وثلاثون)	٤.٨
٤٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٤	متر	"٥ (بالเมตร الطولي لربع مائة واربعون)	٥.٨
١١٥,٠٠٠	١,٠٠٠	١١٠	متر	"٦ (بالเมตร الطولي مائة وعشرون)	٦.٨
٣٥٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٥٢	متر	"٧ (بالเมตร الطولي ثلاثة وثلاثين وخمسون)	٧.٨
١١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١١٠	متر	"٨ (بالเมตร الطولي مائة وعشرون)	٨.٨
٢٣٣,٠٠٠	٧٠٠	٢٣٠	متر	"٩ (بالเมตร الطولي ثلاثة وثلاثين وثلاثون)	٩.٨
٧٩,٢٠٠	٦٠٠	١٢٢	متر	"١٠ (بالเมตร الطولي مائة اثنان وثلاثون)	١٠.٨
٤٩,٠٠٠	٦٠٠	١٢٥	متر	"١١ (بالเมตร الطولي مائة خمسة وستون)	١١.٨
				واسير بولي إيثيلين مبطنة على لزوم شبكة المياه المثلجة المدنية	١٢.٨



بيانات مشروع محطة التوزيع الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبنى الإداري و ملحقاته)				
العنوان	الوحدة	الكمية	الفلدة	الإجمالي
بالنيل الطولي توريد وتتركيب مواسير لشبكة المياه المثلجة - (HDPE) من البول إلبيلين عالي الكثافة ضغط تشغيل 11 بار شاملة العزل وقطع المخصوصة باتواعها من أ��اع وسائلب ومشترفات وخلافة كاملة بجميع مشتملاتها طبقاً للمواصفات المرفقة تتفق تحت الأرض (مدفونة) عمق لا يقل عن 1 متراً زورق الحريق والاسغر ومحمل على سعر بيود: مواسير الحفر والردم بالرمل النظيف طبقاً للمواصفات المرفقة أصل المواسير وتقليل المواسير بالرمل النظيف والمخلوط المطابق للمواصفات سمك . ١٠٣ فوق الراس الملوى والأسفل للمسؤول والردم بعد ذلك من تأثير الحفر على طياتن سمك . ١٠٤ وتقديم عينة للإشرافي للاعتماد قبل التنفيذ والتوزير وهو العمل فهو "ناما" وكملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والتقييد وعمليات المهندس المشرف على التنفيذ.				
٢٩٧,٠٠٠	٤,٧٠٠	١١٠	مٌٮ٧	
				مواسير قطر ٨ بوصة قطر داخل (١٠٧,٥)
				(بالنيل الطولي مائة وعشرين)
				٢٦٠
				توريد وتركيب العزل الحراري للشبكة والمحابس سمك ٢٥ مم من الفير جلاس للمواسير الداخلية كتلة ٧٦ كجم / م٢ وجميع المكونات واللازم حسب الأقطار الداخلية الآتية:
١٩٤,٢٠٠	٦٤٠	١٧٦	مٌٮ٧	
				"١٠٨ (بالنيل الطولي مائة ستة وسبعين)
١٠١,٣٠٠	٥٧٥	١٧٦	مٌٮ٧	
				"١٠٩ (بالنيل الطولي مائة ستة وسبعين)
٦٦,٠٠٠	٤٠٠	١١٠	مٌٮ٧	
				"١٠١٠ (بالنيل الطولي مائة وعشرين)
٤٢,٩٠٠	٣٦٥	١٣٢	مٌٮ٧	
				"١٠١١ (بالنيل الطولي مائة وثلاثين)
١١,٠٠٠	٩٥٠	٢٤	مٌٮ٧	
				"١٠١٢ (بالنيل الطولي اربعية وخمسون)
٢٢,٠٠٠	٤٠٠	١١٠	مٌٮ٧	
				"١٠١٣ (بالنيل الطولي مائة وعشرين)
٥٢,٨٠٠	١٥٠	٢٥٢	مٌٮ٧	
				"١٠١٤ (بالنيل الطولي ثلاثة وثلاثين وخمسون)
١٠,٤٠٠	١٦٠	١١٠	مٌٮ٧	
				"١٠١٥ (بالنيل الطولي مائة وعشرين)
٤٩,٢٠٠	١٢٥	٣٧٠	مٌٮ٧	
				"١٠١٦ (بالنيل الطولي ثلاثة وثلاثين)
١٣,٢٠٠	١٠٠	١٣٢	مٌٮ٧	
				"١٠١٧ (بالنيل الطولي مائة وثلاثين)
				١٠١٨ توريد وتركيب العزل الحراري للشبكة والمحابس سمك ٥٠ مم للمواسير الخارجية وكتلة ٩٦ كجم / م٢ والواح الألومنيوم سمك ٦٠ مم وجميع المكونات واللازم حسب الأقطار الداخلية الآتية:
٧٩٠,٢٠٠	١,٦٥٠	١٧٦	مٌٮ٧	
				"١٠١٩ (بالنيل الطولي مائة ستة وسبعين)
				١١ مجاري الهواء والعزل الحراري :
٧٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٧	مٌٮ٧	
				١٠٢٠ توريد وتركيب أعمال مجاري الهواء طبقاً لـ SAMANCA من الأدوات الصاج المجلفة المعتمدة من ASTM A ٦٥٣M / ١٥٣ كـ volume damper كما بالمواصفات الفنية والحرائق والتعامل والتحاميل ومجاري الهواء المرنة والوصلات CNC كـ دارات وكل الأكسسوارات طبقاً للمواصفات UL 723 ASHRAE & SMACNA و الرسمـات التقنية المعتمدة.
				"١٠٢١ (بالنيل سبعة) توريد وتركيب أعمال العزل الحراري الخارجي لشبكة مجاري الهواء المكيف داخل المبنى من الصوب الزجاجـي المـنـتفـقـةـ بـ موـلـانـيـوـنـوـمـ سمـكـ ١ـ وـ كـتـلـةـ ٢٤ـ كـجـ /ـ مـ٣ـ وـ طـبـقـاـ لـ رـسـوـمـاتـ وـمـواـصـفـاتـ (ـصـفـ قـوـسـتـ)ـ
٧٩٢,٥٠٠	٢٥١	٨٢٥	مٌٮ٧	
				"١٠٢٢ (بالنيل المصطـطـ لـ تـماـنـهـةـ وـ ثـلـاثـونـ)ـ تـورـيدـ وـ تركـيـبـ أـعـالـىـ العـزـلـ الـخـارـجـيـ شـبـكـةـ مـجـارـىـ الـهـوـاءـ المـكـيفـ منـ الـدـرـالـلـكـسـ سمـكـ ٩ـ مـ وـ طـبـقـاـ لـ مـواـصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـجـمـعـ المـكونـاتـ وـالـلـازـمـ .ـ
١٤٧,٨٤٠	٣٦٤	٢٣٠	مٌٮ٧	
				"١٠٢٣ (بالنيل المصـطـطـ لـ تـماـنـهـةـ وـ ثـلـاثـونـ)ـ مـدـارـجـ الـهـوـاءـ :



مقاييس مشروع محطة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ بالطريق الدائري (المبني الإداري و ملحقاته)

الرقم	العنوان	النوع	القيمة	الوحدة	القيمة	النوع	الرقم
١	ذات تصرف ٤٠٠ قدم² وضiste استانكي خارجي ٢٥ بوصة .	عدد	٤٠٠٠	متر	٤٠٠٠	ذات تصرف	٣
٢	ذات تصرف ٤٠٠ قدم² وضiste استانكي خارجي ٢٥ بوصة .	عدد	٩٠٠٠	متر	٩٠٠٠	ذات تصرف	٤
٣	ذات تصرف ١١٠٠ قدم² وضiste استانكي خارجي ٢٥ بوصة .	عدد	١٢٠٠٠	متر	١٢٠٠٠	ذات تصرف	٥
٤	أعمال لوحات الكهرباء DDC و الحكم MCC .						٦
٥	توريدي و تركيب و تشغيل و اختبار لوحات MCC على أن تكون درجة العملية IP65 اللوحات ر كل ملائم من سممات و مكونات التشغيل من يدعي التشغيل و جميع أجهزة الفحص و الجلبة ضد زيادة التيار و التفاصيل و ارتفاع الجهد و خلاصه و عمل ما يلزم من تصميمات التحكم بالوحدات مع تقديم الرسم الهندسي و سيراليون التشغيل اللاعنة من الاستثنائي قبل التنصيب و التوريد و المعم يشمل جميع الكابلات و التوصيلات من مقاييس فصل على العمل في ال MCC و من ال MCC إلى المعدات و كذلك مقاييس الفصل الشخص بالوحدات بدرجة جعلها IP65 و تكون الروابط مجهزة لاستقبال Signal من لوحة إدارة الطريق عن طريق Control Module الوصل العدادات في حالة العزف و البند يشمل كل ملائم لاتصال العمل على وجهاً الأكمل طبقاً لأصول الصناعة و تطبيقات المعدس المشرف (بالمنظور عليه ذلك)						٧
٦	توريدي و تركيب و تشغيل و اختبار نظام الحكم الرقمي المبادر الآوتوماتيكي DDC SYSTEM للتحكم في التشغيل نظام تكيف الهواء من وحدات المناولة و المراوح و التهارات و الطليمات و يشملأجهزة التحكم في السلامة و التشغيل و لمزيد استثمار درجات الحرارة و اجهزة التحكم الآلي و في المصانع و مشكلات الصلبات بكافة أنواعها و كافة المستلزمات و يغير الحكم Motorised Dampers Dampers ... الخ و كلفات أجهزة التحكم للمبرادات و مضخات المياه المبردة و مضخات التهوية و كلفات المعدن داخل الصاج و كبات التحكم و الغراميل ... الخ و كلفة لوازم التركيب و التشغيل طبقاً للممارسات و كل ملائم لاتصال العمل على وجهاً الأكمل طبقاً لبيانات ASHRAE و طبقاً لتطبيقات المعدس المشرف و أصول الصناعة (بالمنظور عليه واحد)						٨
٧	أعمال الاختبارات والتقييمات والاتزان : عمل لاختبارات وتقديرات والاتزان شبكة الميكرو و الهواء وجمع المكونات وقرارزم . يتم عمل كل ما يلزم لدور العمل نهائياً و كاملاً طبقاً للممارسات التقنية و الفوائد التقنية و اصول الصناعة ومن خلال شركة متقدمة وأجهزة معايرة من جهة معتمدة .						٩
٨	أهمية أعمال التكيف والتقوية لجمالي أعمال الالكتروني و يكتوي						١٠
٩	أجمالي المقاييس ثلاثة و سنتة واربعون مليون و سبعمائة واحد وستون ألف و ٣ جنیهات						١١
	ملاحظات :						
١	في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لأشاه وتنمية و إدارة الطريق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة و المرازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :						
٢	أعمال توريد الاترية يتم لمسافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكتب هندسي						
٣	أعمال طبقات الاسفل يتم لمسافة مبلغ ٥ جنيه لكل متر مكتب هندسي						
٤	أعمال طبقات الاسفل يتم لمسافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مسطح هندسي						
٥	سعر النبود المنكورة علية تغيرية لحين مقارضة الشركة عليها						
٦	يحق للشركة صرف قيمة التغيرات الناتجة لكتلة بند الشفاعة التي تدخل في مكوناتها مواد مهجرة بعد مرحلة المنشأة يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بايزادة / التضليل) للبندول المطرد عليها بالتفاهم (الحديد بجميع أنواعه - الإسمنت - البليتومين - الصوار - الكابلات الكهربائية - كثافات الاصناف - لوحات توزيع الكهربائية - المحول الكهربائي) طبقاً لنشر الأرقام الفنية للأسماء الصارمة من الجهاز المركزي للتنمية والاحسنه						

الهيئة العامة لتنمية و إدارة الطرق والجسور



حصر الکمیات



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبوسيات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
32071.88	٢م	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدملك جيدا باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2-2

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الفني



الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co. ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
سامدو الوطنية للإنشاءات - مصر

الهيئة العامة للطرق والجسور

Architects & Urban Planners

الاستشاري الشريك



NAB DESIGNS

Architects & Urban Planners

الهيئة العامة للطرق والجسور

(OS Submit)
طلب اعتراض حضر

عنوان المقالة / العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	إلى الاستشاري :-
مساكن الوطني التشييد		

تفصيل أعمال الباقي الإيجاري وملحقاته لمشروع محطة شحن البوتاسيوم الكهربائية بشرم الشيخ		اسم المشروع						
النوع	الكمية المطلوبة	الترخيص	الإصدار	التصنيف	الموضوع	الموقع	الشريك	نوع العمل
المرافق	٠٠	SHARM-TRANSIT-STR-QS-2.2- EX-01-REV00	غيره دريم رمل نظيفة					
المنطقة	-			المنسق				
آخر				معيار	✓			
				أشخاص				

الوحدة	البيان / الوصف	بندر رقم
الكمية المطلوب اعتمادها	الكمية المطلوب اعتمادها	الكمية المطلوب اعتمادها
١	٣٢٠٧١.٨٨	٢٤

تمهد المطالبة: المستندات المرفقة تم تقديمها وراجعتها من حيث تطابقها مع المذكورة في المطالبات المقدمة في المشروع من قبل المقاول.

مقدمة المطالبة:
التاريخ:
المقاول:	
التوقيع:

بيانات المستشار:
التوقيع:
الإعتماد توسيع:
التوقيع:

الاستشاري المختص:
الإعتماد توسيع:
التوقيع:
الإعتماد توسيع:
التوقيع:
الاستشاري المختص:
الإعتماد توسيع:
التوقيع:
الاستشاري المختص:
الإعتماد توسيع:
التوقيع:



SAMCO National Construction Co.
ساماكو الوطنية للتنمية

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن التبويضات الكهربائية بشرم الشيخ							اسم المشروع Project Name
الوحدة Unit	توضيف البند في المقاييس Description (BOQ)						رقم البند في المقاييس NO. Item (BOQ)
٣م	بالметр المكعب توريد وردم رمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات الازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						2-2
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions		عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length	مسلسل NO. OF ORDERS
	33260.19	0.00	33260.19	33260.190		1	ميزانية شبكة
	-360.56	360.56	0.00	360.560		1	خصم القواعد العادية
	-827.75	827.75	0.00	827.750		1	خصم القواعد المسلحة
	32071.88	Total Quantity					

استشاري المشروع

الاسم :
التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الذي

SAMCO
EGYPT

الاسم

التوقيع

ESE
Economical & Safe Engineering

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
Surface2	1.000	1.000	22278.59sq.m	0.00 Cu. M.	33260.19 Cu. M.	33260.19 Cu. M.<Fill>
Totals			22278.59sq.m	0.00 Cu. M.	33260.19 Cu. M.	33260.19 Cu. M.<Fill>





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية Quantity	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
814.11	٢م	بالمتر المكعب هندسي توريد وفرض طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوسر أنجلوس عن ٤٠% وفردها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام الات التسوية الحديثة (جريدر) على ألا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصوصية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات.	2-3

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع
الاسم
التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب التقني

SAMCO
EGYPT

الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co.
ساماكو الوطنية للبناء
للتنمية

الاستشاري الإنشائي

الهيئة العامة للطرق والنقل البري



Architects & Urban Planners

الاستشاري العام

(QS Submit)

طلب اعتقاد مصر

مساكن الولادة التشديد

الإيصال إلى المستشار :

ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING

الإيصال إلى المستشار :

تفصيل أعمال المبنى الإداري، وتحفظاته لمعابر معدة شحن الأتوبيسات الكبيرة بشرط الشفاعة

العنوان	التصنيف	الإصدار	نوع العمل	الموضوع
ش. القرماني	قرى وقرى طرق اسلام	SHARM-TRANSIT -STR-QS-2.3- EX-01-REV00	التصدير	رمد المطلب
المنطقة	-	مستوى	-	النودج
أخرى	مساحة	متر مربع	مساري	نوع العمل

العنوان	الوحدة	البيان / الوصف	ردم
ش. القرماني	الكمية المطلوب (احتياطها)	بالنظر المدى في التسويق، وفرض طلاقة أسلوب من الأجهزة الصناعية لتجاه تكسير المسارات والمطابقة للمواصفات، ولا تقل نسبة تحمل كثافة زرنا عن ٢٠٪، ولا تزيد اللؤلؤة بمقدار ٣٪ من التلوّس عن ٤٪، وفرضاً وتشغيل على الـ ٦٠٪، لا تزيد نسبة التلوّن عن ٦٪، وتم إدخالها بالمواصفات التالية (جهاز)، على الأرجح، وذلك لتقييمها على الـ ١٠٪، ولذلك، لا تزيد نسبة التلوّن إلى نسبة الرطوبة المطلوبة، والتذبذب الجيد بالمواصفات.	٢-٣

نعم المطلوب: المستندات المرفقة تم تسليمها وموافقها من حيث تطابقها مع المطلوب وتغير مطلوب الاستخدام في المشروع من قبل المطلوب.

معلم المكتب المنسق

المطالع

الاستلام

الاستلام

التاريخ:

التوقيع:



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

nD
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبوسيات الكهربائية بشرم الشيخ							اسم المشروع Project Name
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)						رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
٣٥	بالمتر المكعب هندي توبيد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوسر أنجلوس عن ٤% وفردها وتشغيلها على طبقات والتسوية بإستخدام الات التسوية الحديثة (جريدر) على ألا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات .						2-3
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity	مقاسات Dimensions		عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
	814.11	0.00	814.11	814.110	1	ميزانية شبکية	1
	814.11	Total Quantity					

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

ESE
Economical & Safe Engineering

Cut/Fill Summary

Name	Cut Factor	Fill Factor	2d Area	Cut	Fill	Net
Surface1	1.000	1.000	743.75sq.m	0.00 Cu. M.	125.87 Cu. M.	125.87 Cu. M.<Fill>
Surface3	1.000	1.000	1196.97sq.m	0.00 Cu. M.	688.24 Cu. M.	688.24 Cu. M.<Fill>
Totals			1940.73sq.m	0.00 Cu. M.	814.11 Cu. M.	814.11 Cu. M.<Fill>





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبوسيات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
360.56	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلانى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3-1

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co.
سامبو الوطنية للبناء
الاستشاري الإنشائي

NAB DESIGNS

Architects & Urban Planners

الاستشاري المعماري

الهيئة العامة للطرق والجسور

والماء

(OS Submittal)

طلب اعتماد حصر

سائق المقطورة للشحنة

إلى المستشاري :

ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING

تفيد أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشبه الجزيرة

نوع العمل	العنوان / الوصف	الوحدة	الكمية المطلوبة اعتباراً منها	عدد النسخ	المنطقة	المسؤل	المرفقات	التاريخ	الإصدار	اسم المشروع	رقم الطلب	الموضوع
آخر		متر مربع	٣٦٠.٥٦	١					٠٠	SHARM-TRANSIT-STR-QS-3.1-PC-01-RV00		
سلة		متر مربع										

٣-١	بالنطاق خريطة عليه الامثليات مع استخدام المسند للوقتىى على ومحلىى استفتى لائق عن ٢٠ كجم/م٢ واحده لأقل عن ٠٧ كجم/م٢ والتىى تشتم كل ما يلزم لنفور العمل يكفل طبقاً للمشروط والمواصفات التالية وتطبيقات المهندس المشرف.
مقدمة	بيان

التوقيع	بيان	بيان	بيان
الوقت	الوقت	الوقت	الوقت
بيان	بيان	بيان	بيان

بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان

بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان

بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان

بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان
بيان	بيان	بيان	بيان



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والجسور
وزارة النقل

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ								اسم المشروع Project Name
الوحدة Unit	تصنيف البند في المقايسة Description (BOQ)						رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)	
٢م	بالمتر المكعب خرسانة عادي للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ وجهاز لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والفتنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.						3-1	
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List
	121.03	121.03	0.300	4.100	4.100	24		F1
	52.80	-52.80	0.300	4.000	4.400	10		F2
	69.77	69.77	0.300	3.400	3.800	18		F3
	17.33	17.33	0.300	3.800	3.800	4		F4
	16.22	16.22	0.300	2.600	2.600	8		F5
	11.86	11.86	0.300	3.800	5.200	2		F6
	22.74	22.74	0.300	75.790		1		Raft
	18.90	18.90	6.800	2.780		1		Tank foundation
	29.91	29.91	0.100	299.100		1		P.C OF R.WALL
	360.56	Total Quantity						

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع


مهندس المكتب الفن

الاسم

التوقيع



GENERAL NOTES




DRAWING REFERENCE	DESCRIPTION	REF. DESCRIPTION	
		BLWNS	CHWNS
NO.	REF NAME	BLWNS	CHWNS
REF	DESCRIPTION	BLWNS	CHWNS
REF	DESCRIPTION	BLWNS	CHWNS
REF	DESCRIPTION	BLWNS	CHWNS

RAMONDS ARCHITECTURAL PLANNERS
ELEKTRONIK HANDELS B. SIONETH SUDAN ZAITO.
Hedekstraat 100, 1013 DS Amsterdam, The Netherlands
tel: +31 20 632 2111 fax: +31 20 632 2111
e-mail: ramonds@ramonds.nl web: www.ramonds.nl




PROJECT TITLE
SHARM - TRANSIT AREA

DRAWING NO.	SHARM - TRANSIT - STR-QS - 3.1 - PC - 01 - R00
DESIGNED BY	SPRD. IP
CHECKED BY	SPRD. IP
REVIEWED BY	SPRD. IP
SCALE	1:100
REV.	00
DATE	00
DRAWING NO.	Sharm - Transit - STR-QS - 3.1 - PC - 01 - R00

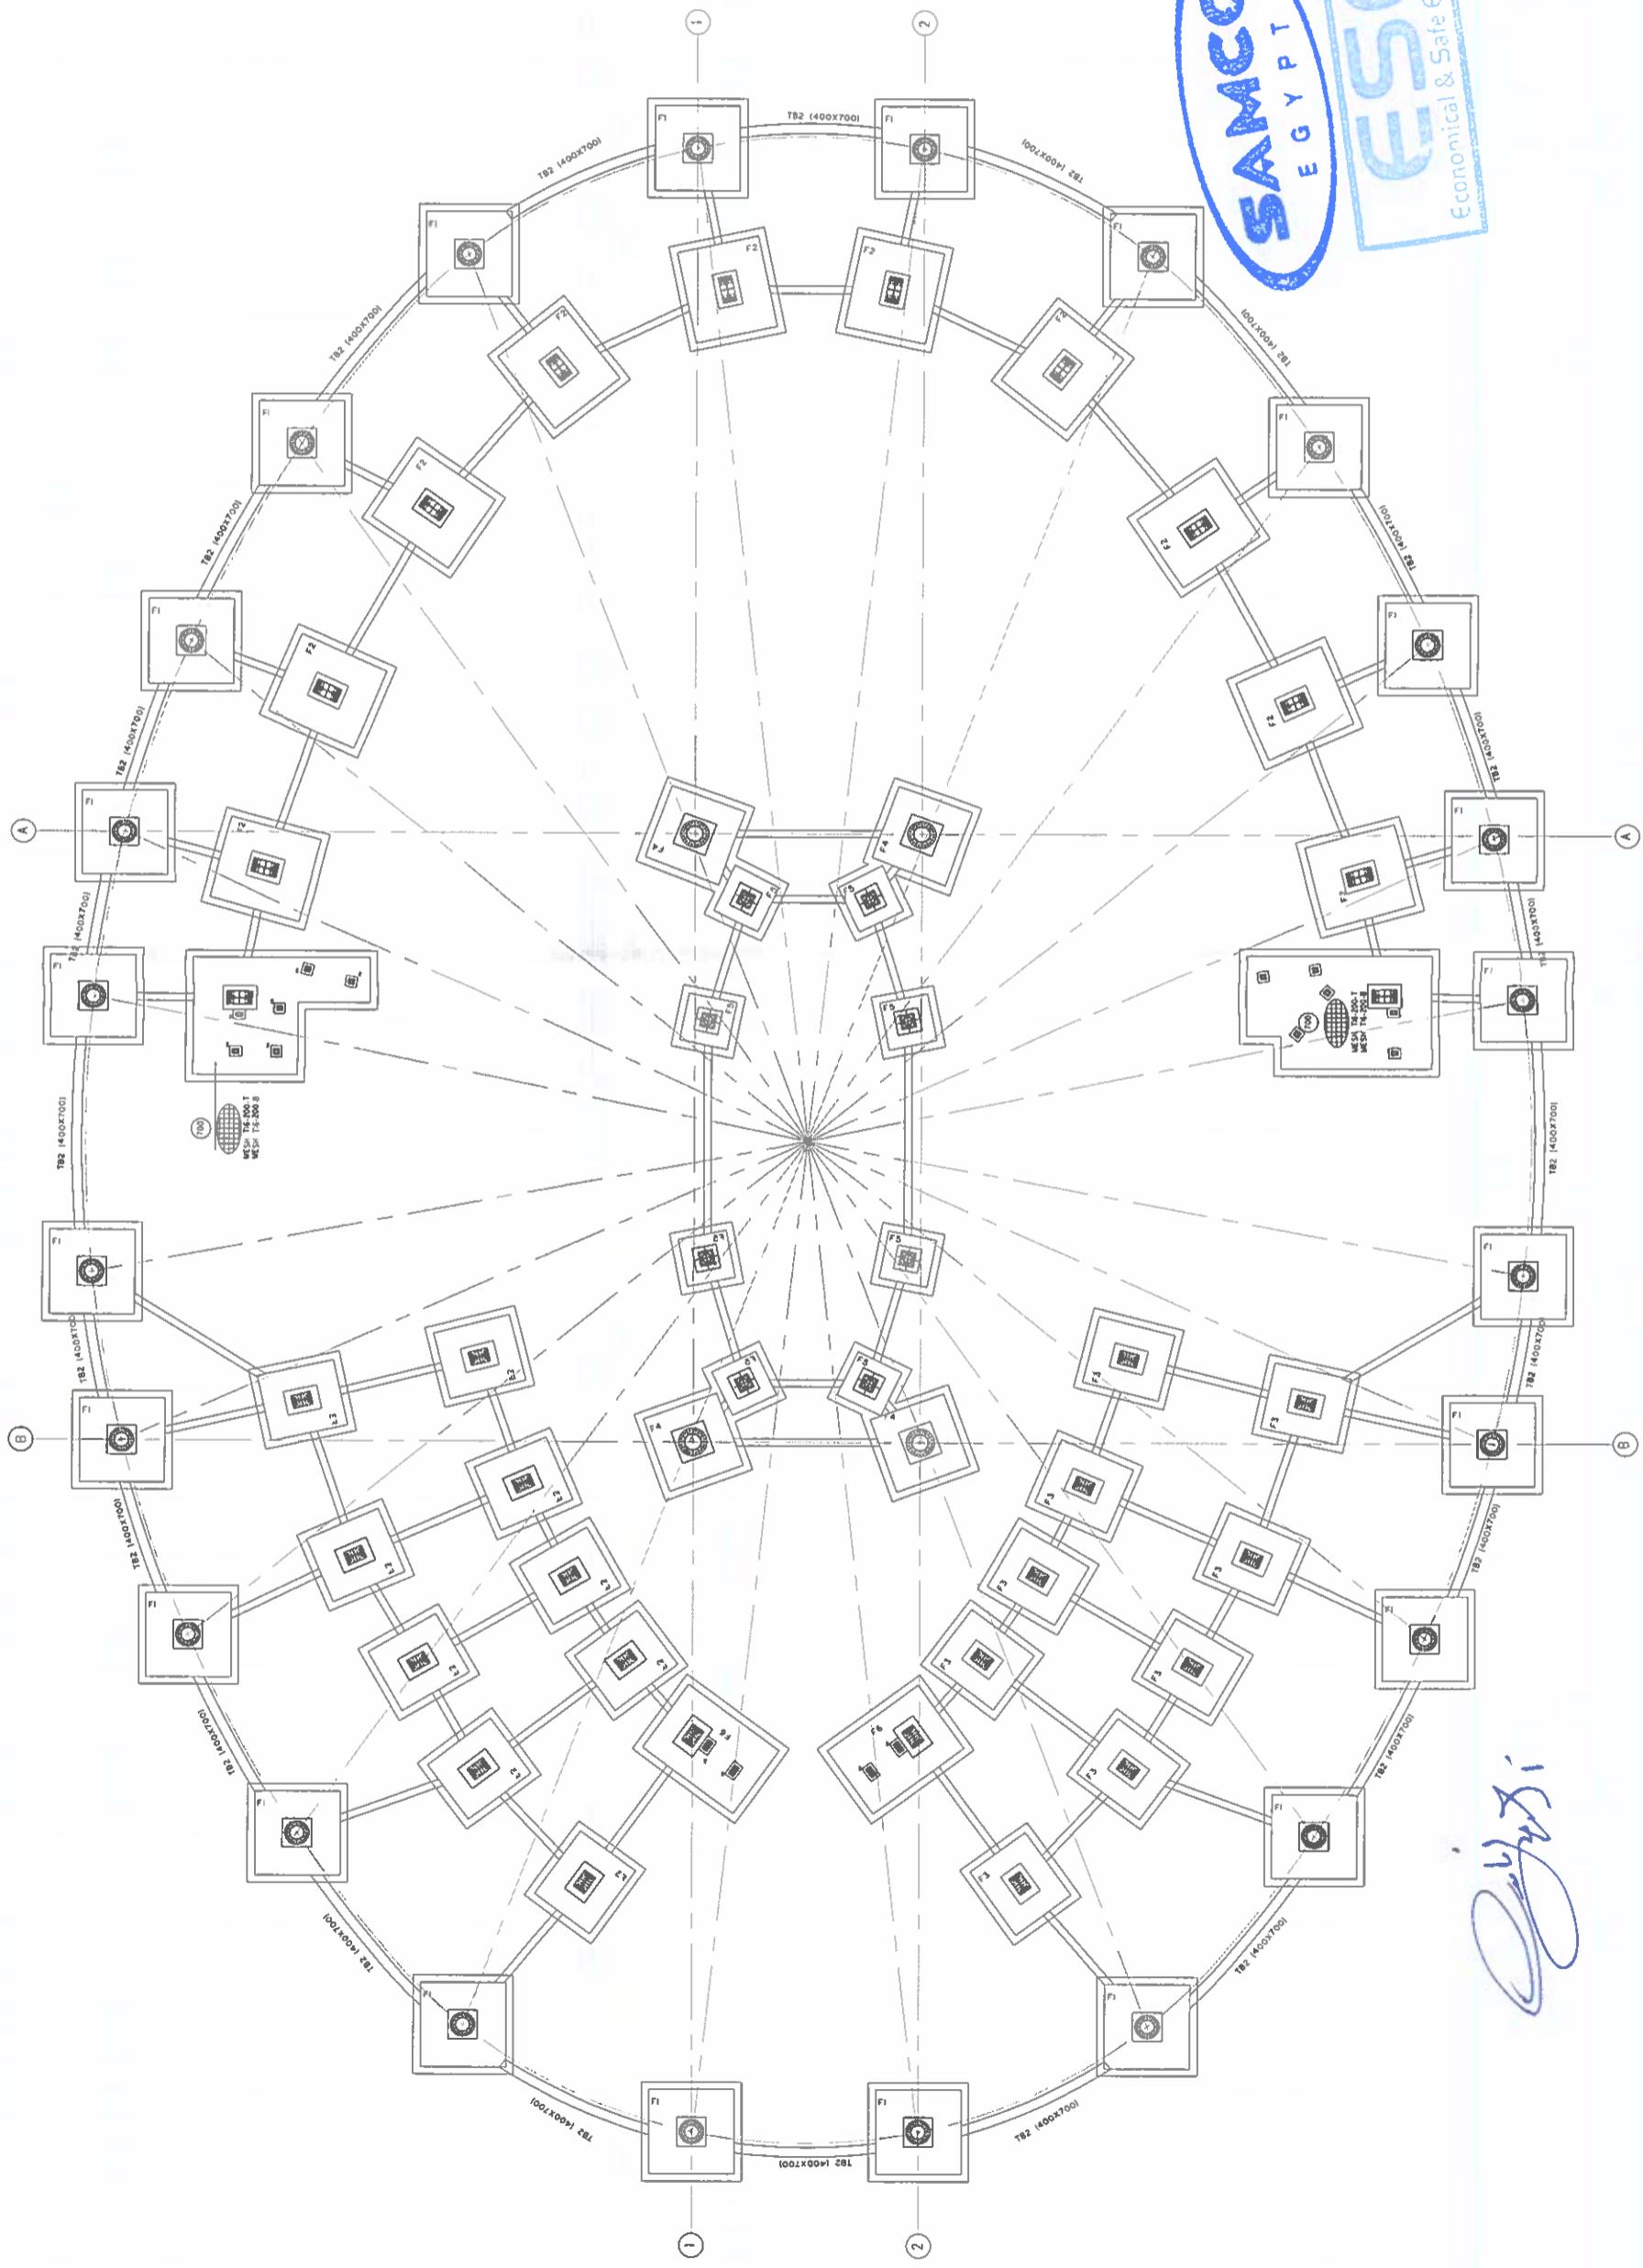

PC Footing


GENERAL NOTES

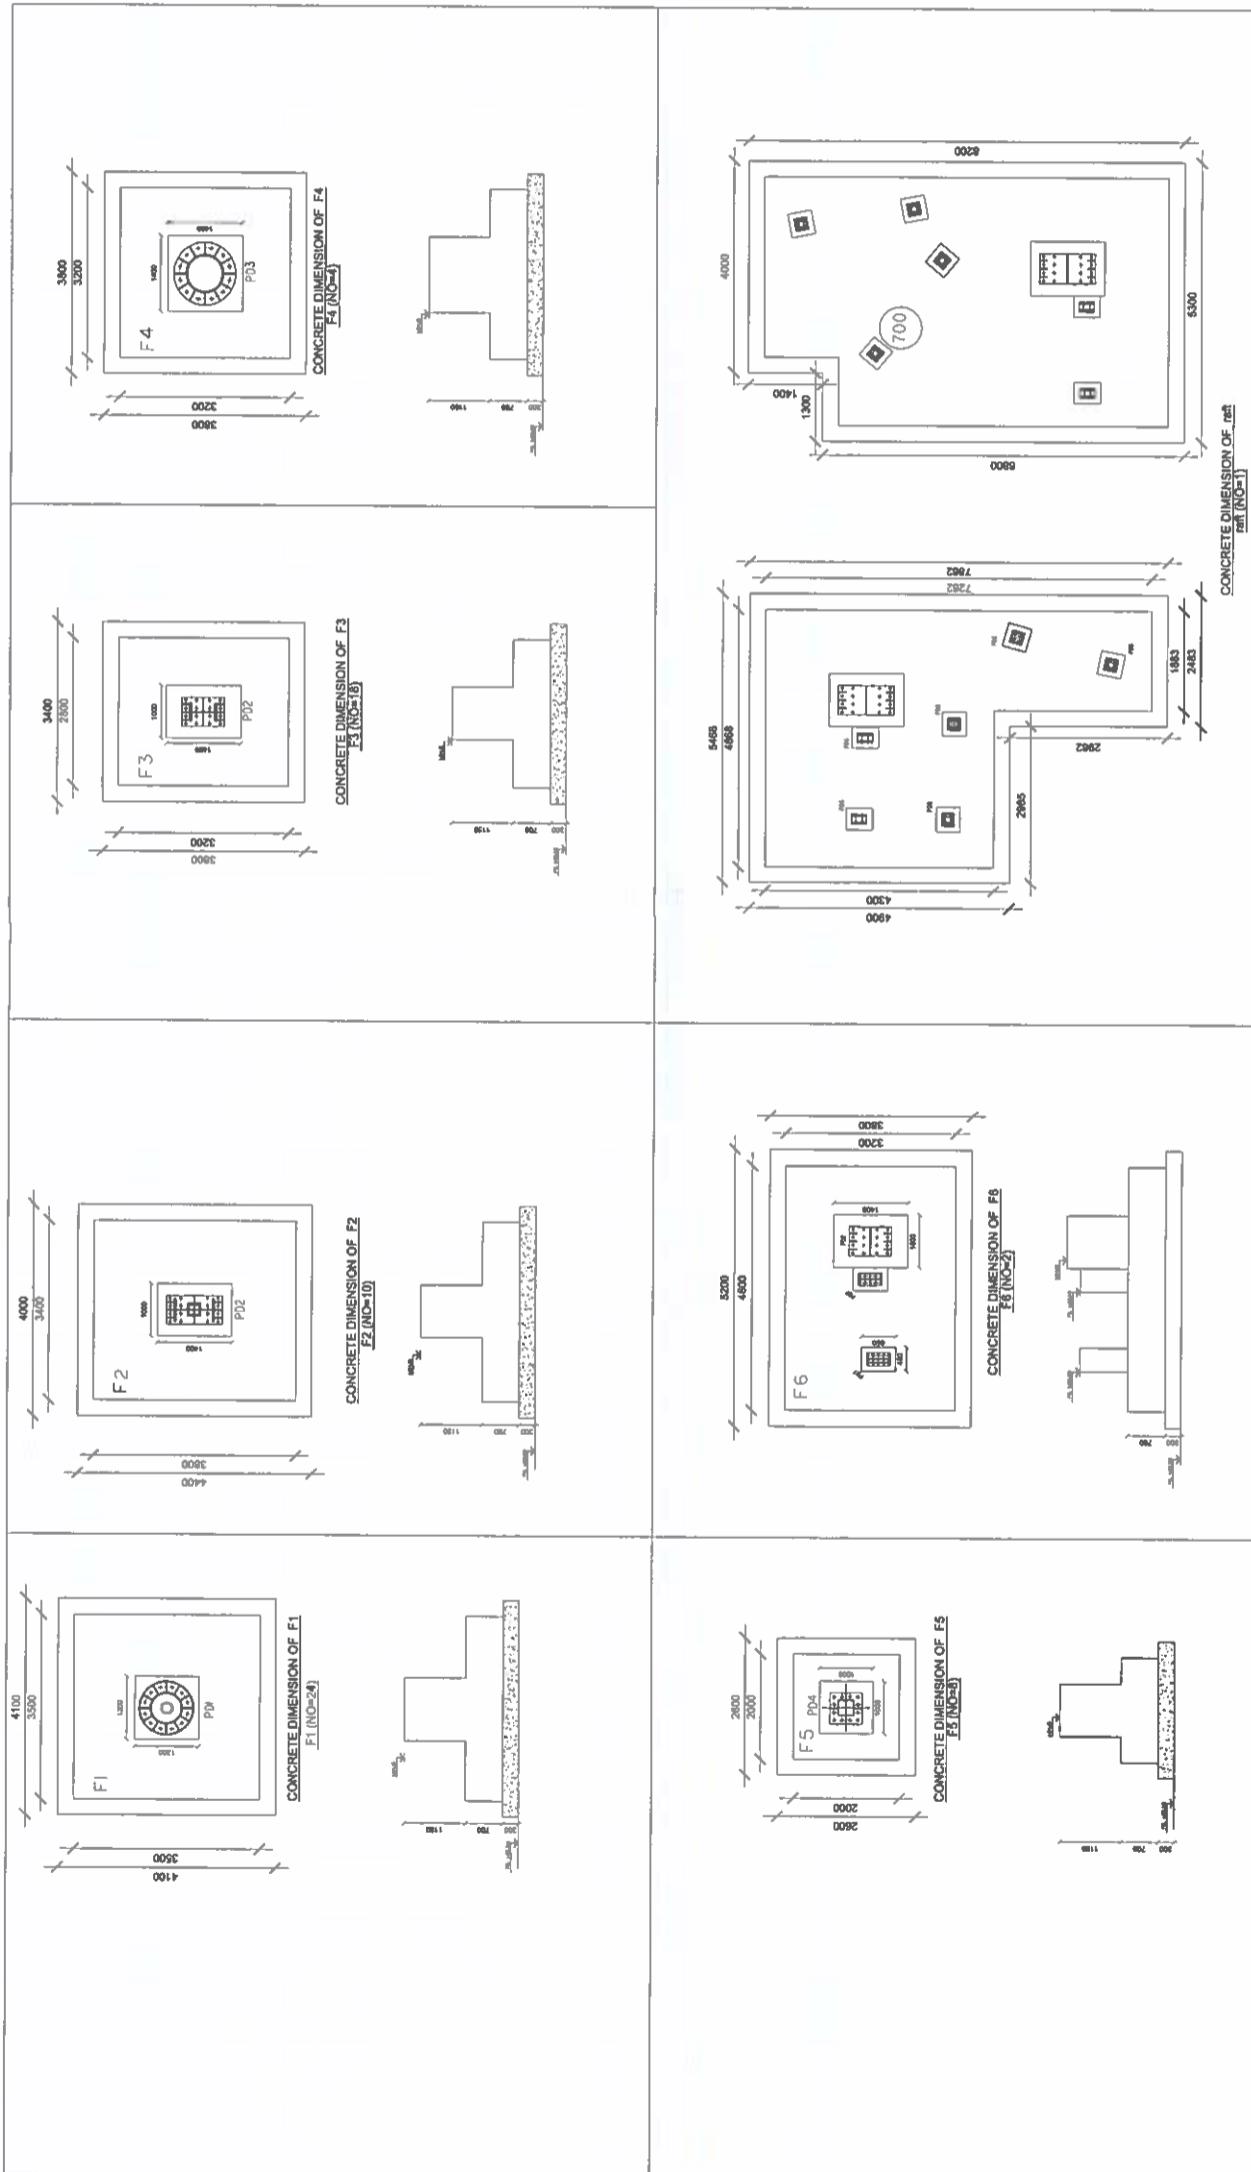

KEY PLAN

DRAWING REFERENCE	DESCRIPTION	REVISION	DATE	DRAWN BY	APPROVED BY

NO.	REF. NAME	REF. DATE	DESIGNER	CHIEF DESIGNER	APPROVING AUTHORITY



PROJECT TITLE	SHARM - TRANSIT AREA
SCALE	1:100
DRAWING NO.	SHARM-TRANSIT-STR-QS-3.1-PC-01-R00
DRAWING TITLE	SHARM-TRANSIT-STR-QS-3.1-PC-01-R00
CHIEF DESIGNER	CHIEF DESIGNER
APPROVING AUTHORITY	APPROVING AUTHORITY
REVISION	00
DATE DRAWN	00/00/00
DATE APPROVED	00/00/00
REMARKS	SHARM-TRANSIT-STR-QS-3.1-PC-01-R00




PC tank foundation = 2.78*6.8-18.84 m³

PC tank foundation

A handwritten signature in blue ink.

GENERAL NOTES



Ergonomics, Space


PROJECT TITLE SHARM - TRANSIT AREA

SHARM-TRANSIT-STR-QS-3.1-PC-01-R00

SEARCHED	INDEXED	FILED
SERIALIZED	STAMPED	APR 15 1968
SEARCHED BY WELCH		SEARCHED BY WELCH
CHECKED BY ELEC		RECEIVED APR 15 1968

PC OF R.WALL

✓ ✓ ✓

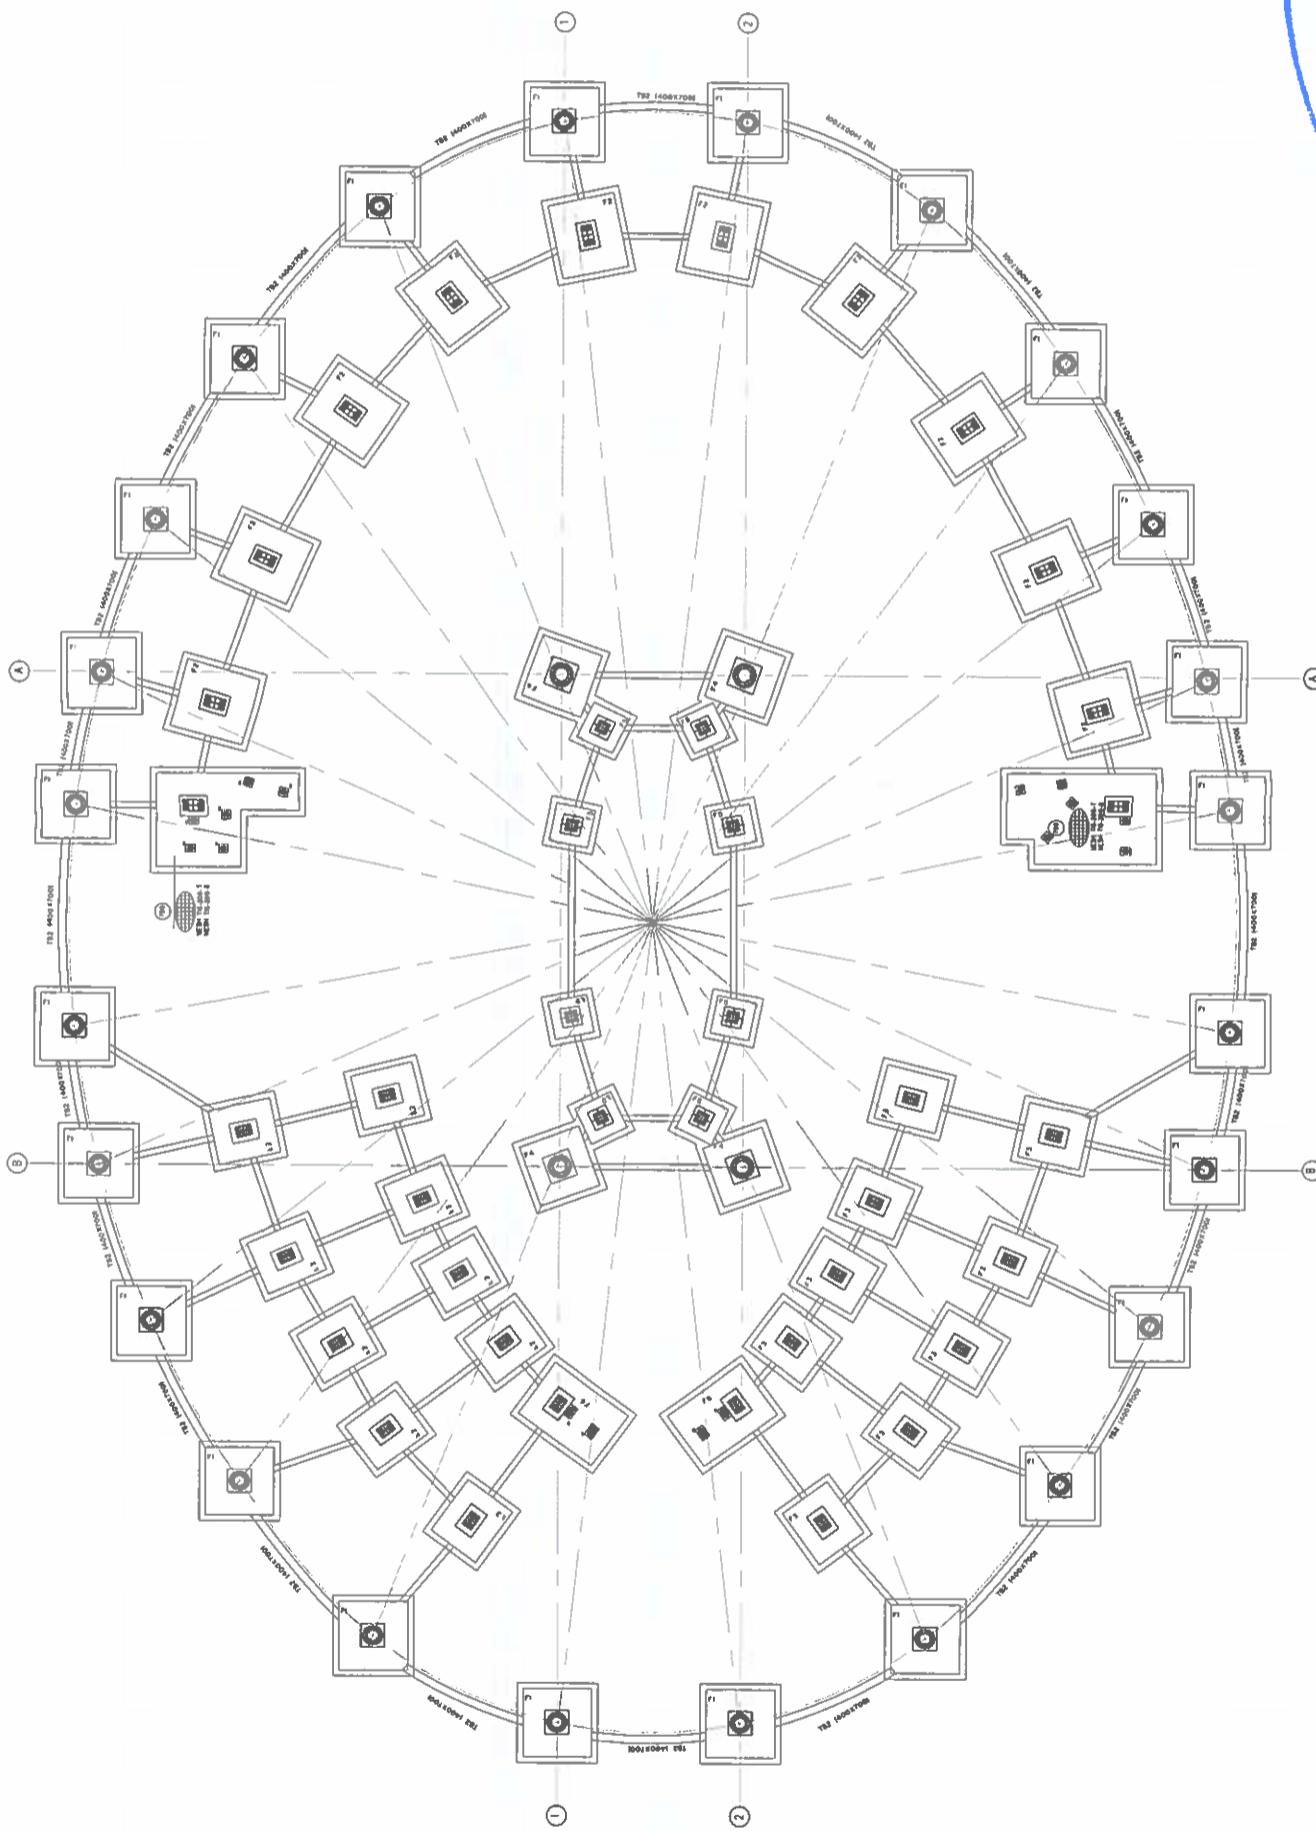



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ				اسم المشروع Project Name
الكمية Quantity	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)	
827.75	م³	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات مع استخدام اسمنت بورتلانى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م³ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم² والسعر لا يشمل حديد التسليح .	3-2	

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للبناء - يد
الاستشاري الإنشائي

NAB DESIGNS

Architects & Urban Planners

الاستشاري المعماري

الهيئة العامة للطرق والجسور



(QS Submit)	
طلب اعتماد حضر	

مسكر الوظيفة بشهر الشيف	من المطلوب العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	إلى المستشاري :-
-------------------------	--------------------	-------------------------------	------------------

تفصيل أعمال المعنى الإداري ومتطلبات مشروع معملة شحن الأتوبيسات الكهربائية بضم الشيف				
	النوع	الإصدار	العنوان	اسم المشروع
المرفقات	00	SHARM TRANSIT -STR-QS-3.2- RC-01-REV00	رقم الطلب	
المنطقة	خريطة معملة للأسمنت	الموضوع	الموضوع	الموضوع
-	أسمنت	-	التوزيع	
آخري	ميكروبلا	محباري	نوع العمل	
مسلسلة	ميكروبلا	أشباحى		

عدد النسخ	الوحدة	القيمة المطلوب اعتمادها	بيان / الوصف	بيان رقم
1	827.75	٣٤	بالنحو المكتوب خريطة معملة للأسمنت من حيث تضمينها في المشروع من قبل المقاول.	٣-٢ استناد إلى على عن ٠٠٠ كجم/م٢ وأوجهه لا يزيد عن ٥٠ كجم/م٢ والمسار الأشمل حديد القطع.

مطر المكتب الفرع	التاريخ:	الوقت:	العنوان:
------------------	----------	--------	----------

بيان رقم	التاريخ:	بيان رقم
----------	----------	----------

بيان رقم	التاريخ:	بيان رقم
----------	----------	----------

الاستاذ المسئول	الإعتماد بواسطة:	التاريخ:	بيان رقم
محمد	١	٢٠٢٣/١٢/٢٧	٢
محمد مع ملاحظات - يمكن للمقاول أن يستقر بناءً على الملاحظات	٢		
الطلب مرفوض	٣		

بيان رقم	بيان رقم
بيان رقم	بيان رقم



SAMCO National Construction Co
سامكو الوطنية للبناء

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



البنية التحتية للطرق والمتاجر


تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأدبيسات الكهربائية بضم الشيف						
الوحدة Unit	بيان المطلوب Project Name					
	رقم البند في المطلب NO. Item (BOQ)					
٢٤	بالنحو المكتسب خرسانة مسلحة للاستعمال مع استخدام اسمنت بوتازين عادي ومحترفي اسمنت اول اقل عن .. كجم/م٢ وجاهد لا يزيد عن .. كجم/سم٢ والسرع					
لإنشاء حديقة النسخ .						
ملاحظات Notes		الكمية Quantity	الارتفاع Height	عرض Width	طول Length	مقدار NO. OF ORDERS
اجمالي الكمية Total Quantities		جزئي Partial	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List			مسلسل NO. OF ORDERS
RC Footings						
كثافة		الارتفاع Height	عرض Width	طول Length	مقدار NO.	مقدار NO.
Notes	Total Quantities	Cuts				
	205.80		205.80	0.70	3.50	3.50
	90.44		90.44	0.70	3.40	3.80
	112.90		112.90	0.70	2.80	3.20
	28.67		28.67	0.70	3.20	3.20
	22.40		22.40	0.70	2.00	2.00
	20.61		20.61	0.70	3.20	4.60
	42.29		42.29	0.70	60.42	1
	109.48		109.48	1.15	35.20	1
	3.23		3.23	0.90	3.59	1
RC Smells						
	88.79		88.79	0.70	126.848	1
RC STRIP FOOTING						
	103.14		103.14	0.40	257.85	1
	827.75					
Total Quantity						

استشاري المشروع
الاسم :
التوقيع

مدير المشروع
الاسم :
التوقيع



GENERAL NOTES




ND NEDERSONS ARQUITECTOS EN BANGLADESH
EL SAGHAFI SPENCH ZATO,


ESE ECONOMIC & SAFE ENGINEERING
INDIA - UK - CHINA

ESE Economical & Safe Engineering

DRAWING TITLE		DRAWN BY		CHECKED BY		SCALE		REV.		DRAWING NO.	
SHARMA - TRANSIT - STR - OS - 3.2 - RC - 01 - R00		DRAFTER BY		CHECKED BY		1:100		to		SHARMA - TRANSIT - STR - OS - 3.2 - RC - 01 - R00	
				MACHINIST BY						00	

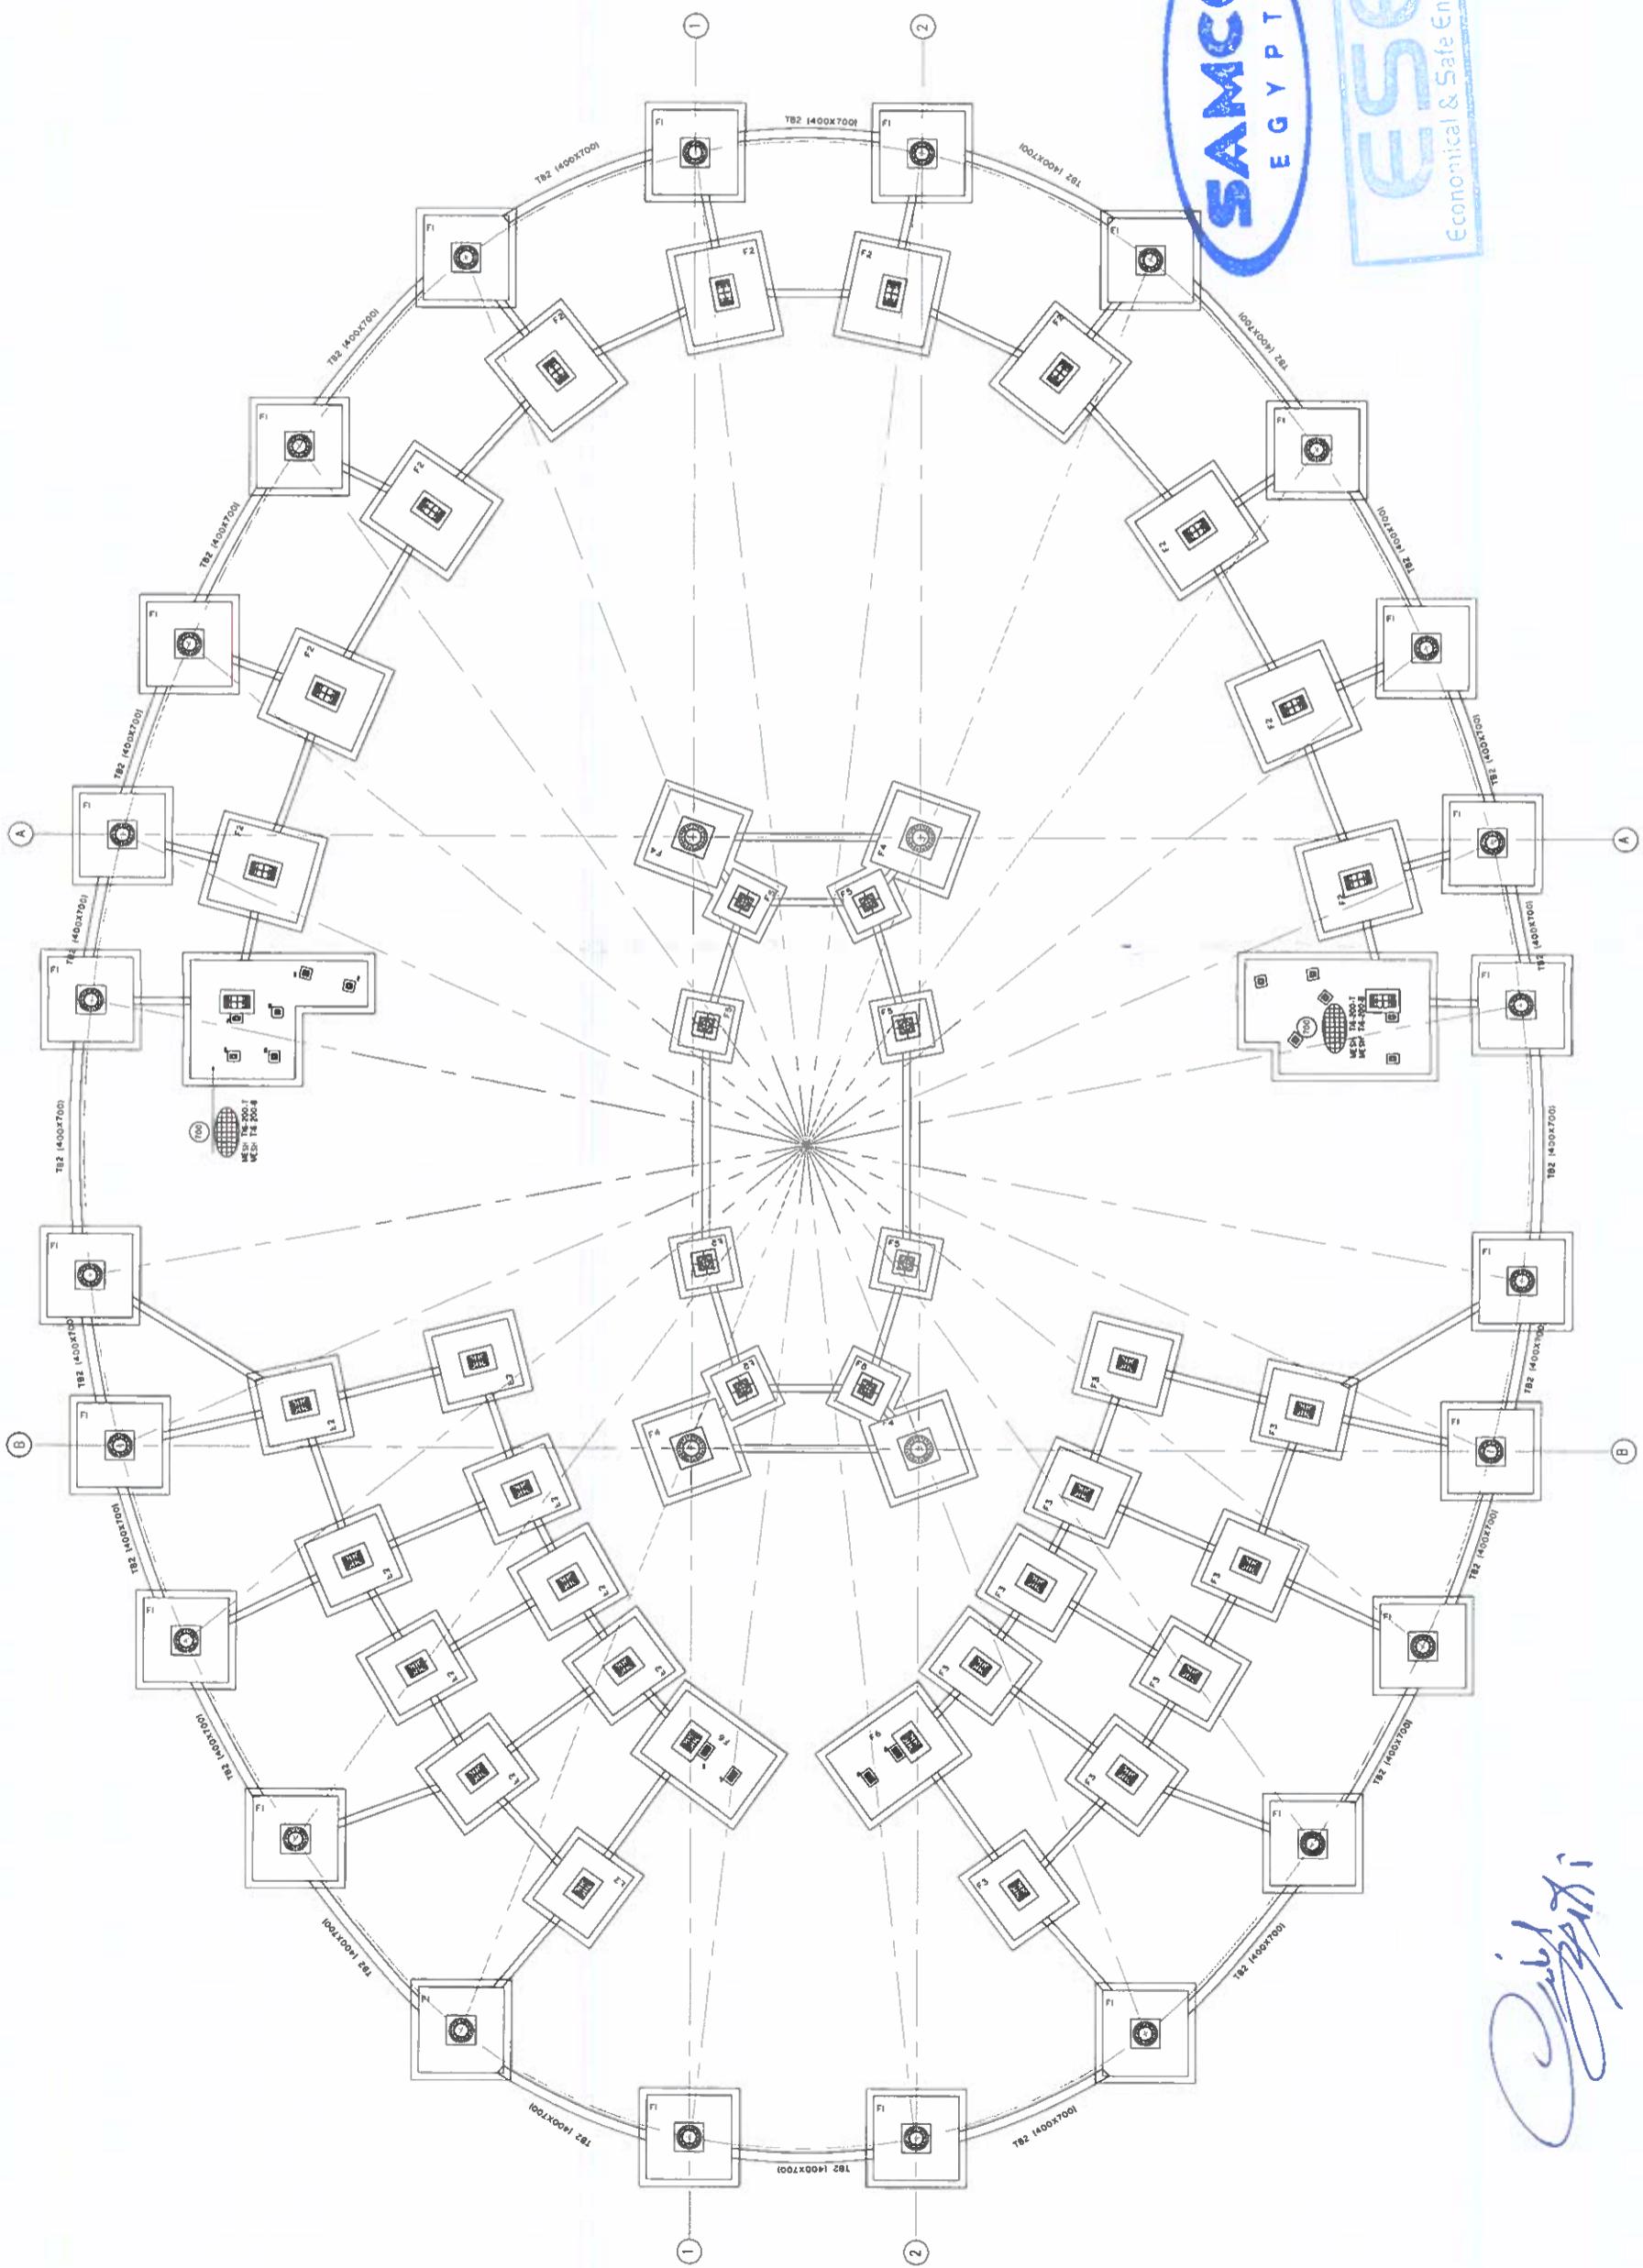

RC Footing

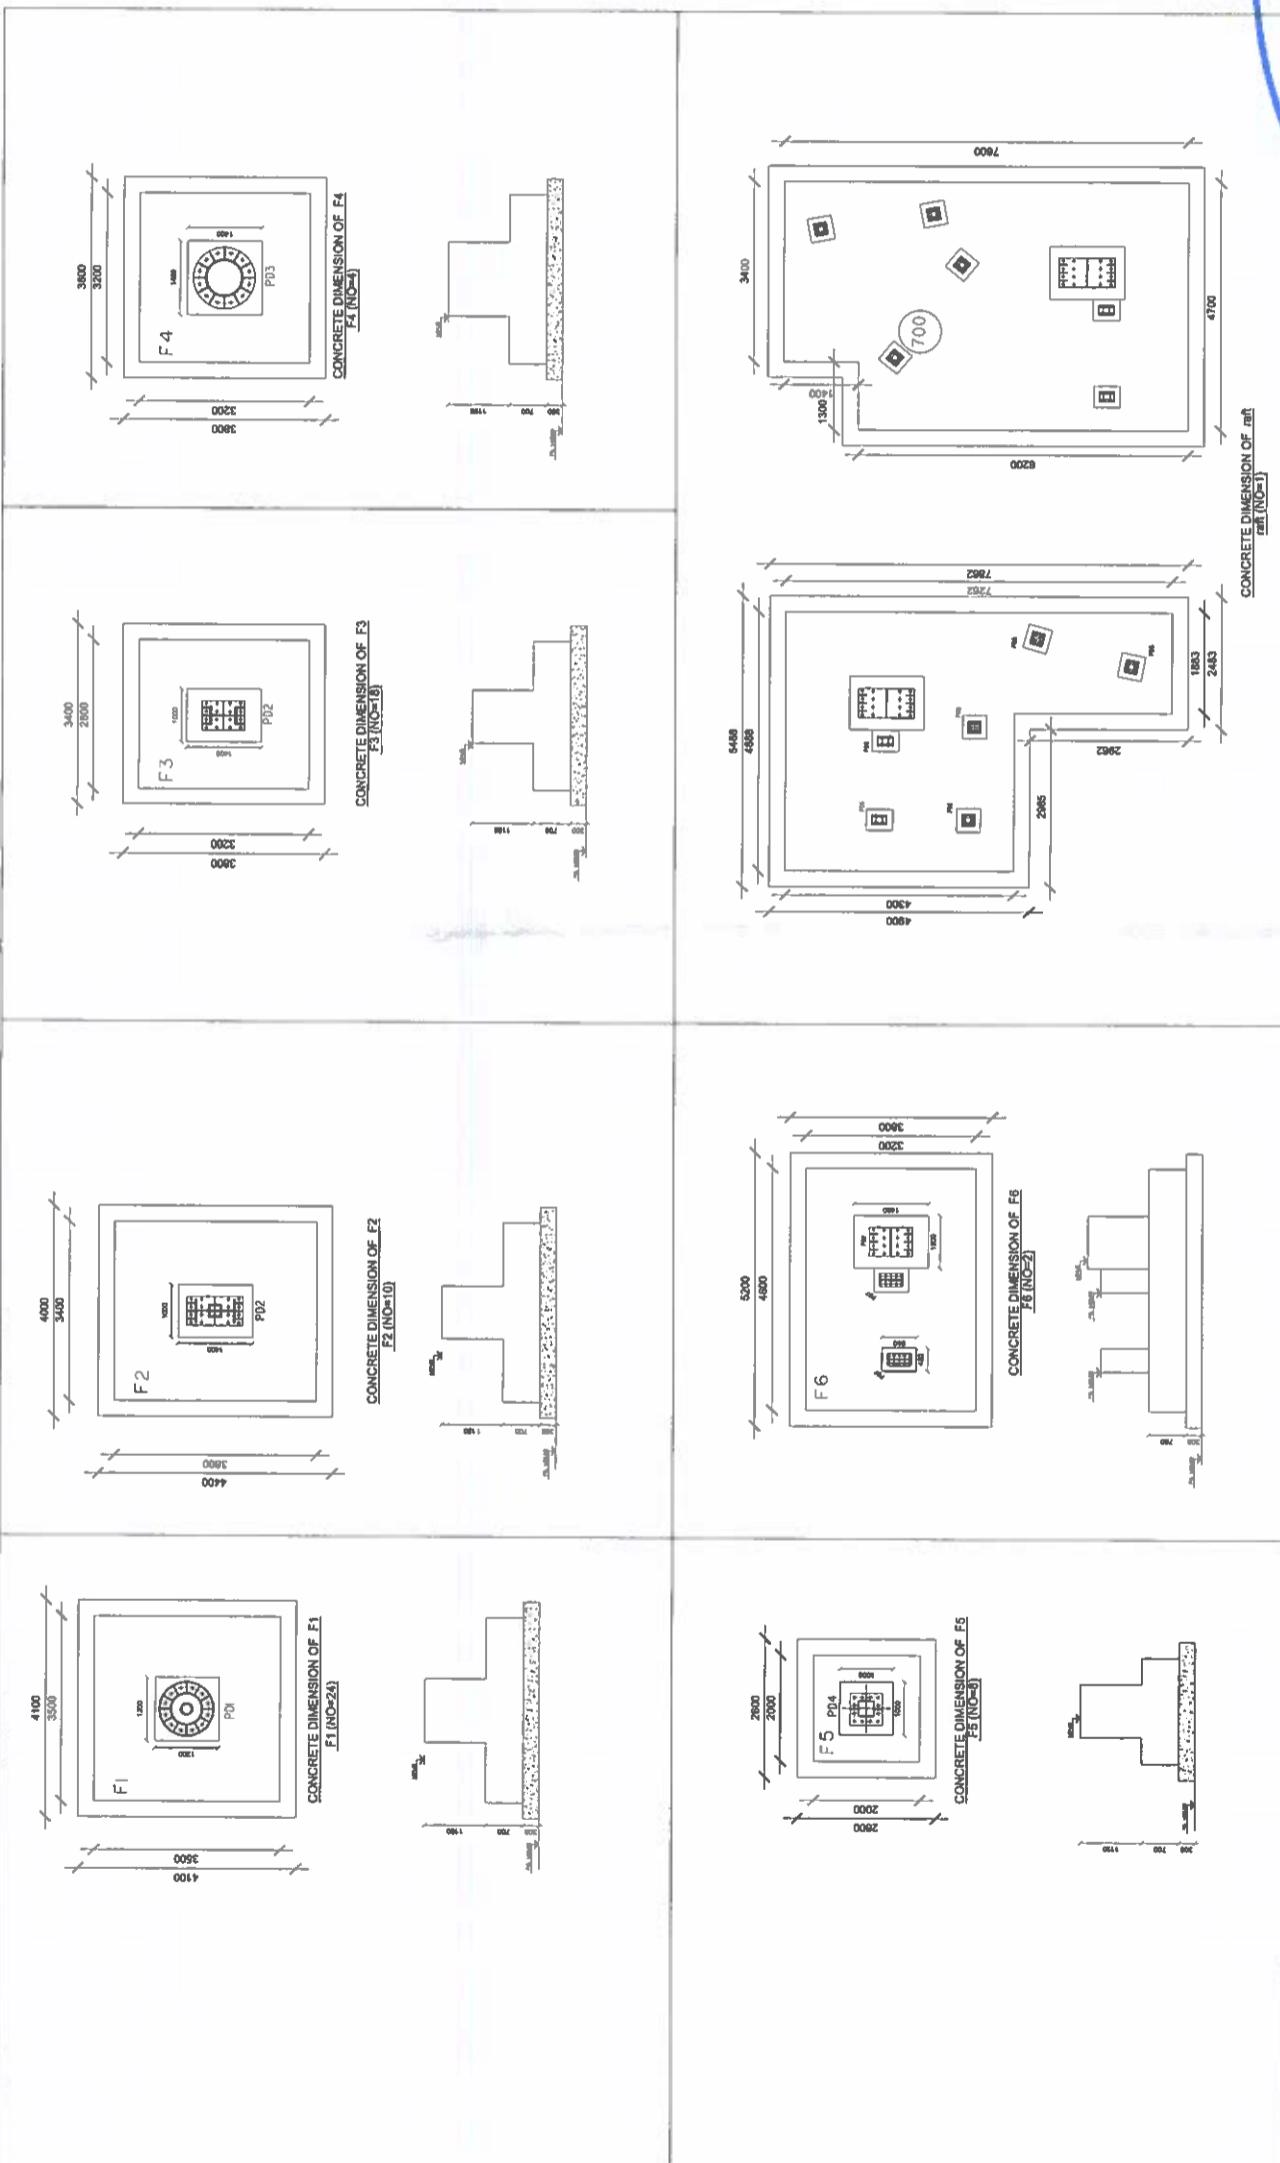

21

NEDERSONS ARCHITECTUREN PLANNERS
68 JULIAANSTRAAT, EL. SAGHIEH, SURABAYA 65111, INDONESIA
CIRCLE FLOOR APP. 2
PHONE: +62 31 544 2773
FAX: +62 31 544 2773
E-MAIL: info@nederons.com

ESE ECONOMIC & SAFETY ENGINEERS LTD.

卷之三


PROJECT TITLE

SHARLI - TRANSIT - STR-05712-RC-01

ଅମ୍ବାର ପତ୍ର


DRAWING NO.
SHEATH - TRANSIT - STR-05-3-2-RG-01
DO

GENERAL NOTES



DRAWING REFERENCE	DESCRIPTION		
	NO.	REF. NAME	SECTION
1	R1	ROCKFISH	R1
2	R2	ROCKFISH	R2
3	R3	ROCKFISH	R3
4	R4	ROCKFISH	R4
5	R5	ROCKFISH	R5
6	R6	ROCKFISH	R6
7	R7	ROCKFISH	R7
8	R8	ROCKFISH	R8
9	R9	ROCKFISH	R9
10	R10	ROCKFISH	R10
11	R11	ROCKFISH	R11
12	R12	ROCKFISH	R12
13	R13	ROCKFISH	R13
14	R14	ROCKFISH	R14
15	R15	ROCKFISH	R15
16	R16	ROCKFISH	R16
17	R17	ROCKFISH	R17
18	R18	ROCKFISH	R18
19	R19	ROCKFISH	R19
20	R20	ROCKFISH	R20
21	R21	ROCKFISH	R21
22	R22	ROCKFISH	R22
23	R23	ROCKFISH	R23
24	R24	ROCKFISH	R24
25	R25	ROCKFISH	R25
26	R26	ROCKFISH	R26
27	R27	ROCKFISH	R27
28	R28	ROCKFISH	R28
29	R29	ROCKFISH	R29
30	R30	ROCKFISH	R30
31	R31	ROCKFISH	R31
32	R32	ROCKFISH	R32
33	R33	ROCKFISH	R33
34	R34	ROCKFISH	R34
35	R35	ROCKFISH	R35
36	R36	ROCKFISH	R36
37	R37	ROCKFISH	R37
38	R38	ROCKFISH	R38
39	R39	ROCKFISH	R39
40	R40	ROCKFISH	R40
41	R41	ROCKFISH	R41
42	R42	ROCKFISH	R42
43	R43	ROCKFISH	R43
44	R44	ROCKFISH	R44
45	R45	ROCKFISH	R45
46	R46	ROCKFISH	R46
47	R47	ROCKFISH	R47
48	R48	ROCKFISH	R48
49	R49	ROCKFISH	R49
50	R50	ROCKFISH	R50
51	R51	ROCKFISH	R51
52	R52	ROCKFISH	R52
53	R53	ROCKFISH	R53
54	R54	ROCKFISH	R54
55	R55	ROCKFISH	R55
56	R56	ROCKFISH	R56
57	R57	ROCKFISH	R57
58	R58	ROCKFISH	R58
59	R59	ROCKFISH	R59
60	R60	ROCKFISH	R60
61	R61	ROCKFISH	R61
62	R62	ROCKFISH	R62
63	R63	ROCKFISH	R63
64	R64	ROCKFISH	R64
65	R65	ROCKFISH	R65
66	R66	ROCKFISH	R66
67	R67	ROCKFISH	R67
68	R68	ROCKFISH	R68
69	R69	ROCKFISH	R69
70	R70	ROCKFISH	R70
71	R71	ROCKFISH	R71
72	R72	ROCKFISH	R72
73	R73	ROCKFISH	R73
74	R74	ROCKFISH	R74
75	R75	ROCKFISH	R75
76	R76	ROCKFISH	R76
77	R77	ROCKFISH	R77
78	R78	ROCKFISH	R78
79	R79	ROCKFISH	R79
80	R80	ROCKFISH	R80
81	R81	ROCKFISH	R81
82	R82	ROCKFISH	R82
83	R83	ROCKFISH	R83
84	R84	ROCKFISH	R84
85	R85	ROCKFISH	R85
86	R86	ROCKFISH	R86
87	R87	ROCKFISH	R87
88	R88	ROCKFISH	R88
89	R89	ROCKFISH	R89
90	R90	ROCKFISH	R90
91	R91	ROCKFISH	R91
92	R92	ROCKFISH	R92
93	R93	ROCKFISH	R93
94	R94	ROCKFISH	R94
95	R95	ROCKFISH	R95
96	R96	ROCKFISH	R96
97	R97	ROCKFISH	R97
98	R98	ROCKFISH	R98
99	R99	ROCKFISH	R99
100	R100	ROCKFISH	R100
101	R101	ROCKFISH	R101
102	R102	ROCKFISH	R102
103	R103	ROCKFISH	R103
104	R104	ROCKFISH	R104
105	R105	ROCKFISH	R105
106	R106	ROCKFISH	R106
107	R107	ROCKFISH	R107
108	R108	ROCKFISH	R108
109	R109	ROCKFISH	R109
110	R110	ROCKFISH	R110
111	R111	ROCKFISH	R111
112	R112	ROCKFISH	R112
113	R113	ROCKFISH	R113
114	R114	ROCKFISH	R114
115	R115	ROCKFISH	R115
116	R116	ROCKFISH	R116
117	R117	ROCKFISH	R117
118	R118	ROCKFISH	R118
119	R119	ROCKFISH	R119
120	R120	ROCKFISH	R120
121	R121	ROCKFISH	R121
122	R122	ROCKFISH	R122
123	R123	ROCKFISH	R123
124	R124	ROCKFISH	R124
125	R125	ROCKFISH	R125
126	R126	ROCKFISH	R126
127	R127	ROCKFISH	R127
128	R128	ROCKFISH	R128
129	R129	ROCKFISH	R129
130	R130	ROCKFISH	R130
131	R131	ROCKFISH	R131
132	R132	ROCKFISH	R132
133	R133	ROCKFISH	R133
134	R134	ROCKFISH	R134
135	R135	ROCKFISH	R135
136	R136	ROCKFISH	R136
137	R137	ROCKFISH	R137
138	R138	ROCKFISH	R138
139	R139	ROCKFISH	R139
140	R140	ROCKFISH	R140
141	R141	ROCKFISH	R141
142	R142	ROCKFISH	R142
143	R143	ROCKFISH	R143
144	R144	ROCKFISH	R144
145	R145	ROCKFISH	R145
146	R146	ROCKFISH	R146
147	R147	ROCKFISH	R147
148	R148	ROCKFISH	R148
149	R149	ROCKFISH	R149
150	R150	ROCKFISH	R150
151	R151	ROCKFISH	R151
152	R152	ROCKFISH	R152
153	R153	ROCKFISH	R153
154	R154	ROCKFISH	R154
155	R155	ROCKFISH	R155
156	R156	ROCKFISH	R156
157	R157	ROCKFISH	R157
158	R158	ROCKFISH	R158
159	R159	ROCKFISH	R159
160	R160	ROCKFISH	R160
161	R161	ROCKFISH	R161
162	R162	ROCKFISH	R162
163	R163	ROCKFISH	R163
164	R164	ROCKFISH	R164
165	R165	ROCKFISH	R165
166	R166	ROCKFISH	R166
167	R167	ROCKFISH	R167
168	R168	ROCKFISH	R168
169	R169	ROCKFISH	R169
170	R170	ROCKFISH	R170
171	R171	ROCKFISH	R171
172	R172	ROCKFISH	R172
173	R173	ROCKFISH	R173
174	R174	ROCKFISH	R174
175	R175	ROCKFISH	R175
176	R176	ROCKFISH	R176
177	R177	ROCKFISH	R177
178	R178	ROCKFISH	R178
179	R179	ROCKFISH	R179
180	R180	ROCKFISH	R180
181	R181	ROCKFISH	R181
182	R182	ROCKFISH	R182
183	R183	ROCKFISH	R183
184	R184	ROCKFISH	R184
185	R185	ROCKFISH	R185
186	R186	ROCKFISH	R186
187	R187	ROCKFISH	R187
188	R188	ROCKFISH	R188
189	R189	ROCKFISH	R189
190	R190	ROCKFISH	R190
191	R191	ROCKFISH	R191
192	R192	ROCKFISH	R192
193	R193	ROCKFISH	R193
194	R194	ROCKFISH	R194
195	R195	ROCKFISH	R195
196	R196	ROCKFISH	R196
197	R197	ROCKFISH	R197
198	R198	ROCKFISH	R198
199	R199	ROCKFISH	R199
200	R200	ROCKFISH	R200
201	R201	ROCKFISH	R201
202	R202	ROCKFISH	R202
203	R203	ROCKFISH	R203
204	R204	ROCKFISH	R204
205	R205	ROCKFISH	R205
206	R206	ROCKFISH	R206
207	R207	ROCKFISH	R207
208	R208	RO	

GENERAL NOTES



DRAWING NUMBER	DESCRIPTION	DATE	REVISION	DESIGN	CHG	APPROVAL
D-111 NAME						

卷之三



The logo consists of the letters "ESE" in a bold, serif font, enclosed within a rectangular border. The border is blue and has a slightly irregular, hand-drawn appearance. To the right of the letters, the words "Economical & Safe Engineering" are written in a smaller, sans-serif font, oriented vertically along the right edge of the box.

RC Smells 70 cm

Total Area = 126.85 m²

Original



SAMCO National Construction Co.
سامكواطنية للتشييد



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

اسم المشروع Project Name	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	الكمية Unit
	3-3	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة اساسات الخزان مع استخدام اسمنت بورتلانى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل مادة مانع صدأ الحديد ومادة مانع النفاذية ولا يشمل حديد التسلیح .	١٠٦.١٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co. ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
سامكو الوطنية للإنشاء - مصر

الهيئة العامة للطرق والكباري

NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners
الاستشاري العام

الهيئة العامة للطرق والكباري

(QS Submittal)
طلب اعتماد حصر

سامكو الوطنية لـ التصميد

ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING

تفصيل أعمال المبنى الإداري ومرافقاته لمشروع محطة شحن الألومنيوم بشرم الشيخ

العنوان	التصنيف	النوع	الجهة المختصة	الجهة المسئولة	الجهة المسئولة	الجهة المسئولة	الجهة المسئولة
ش.الإسكندرية - مصر	المدنية	محلية	الإدارية	الإدارية	الإدارية	الإدارية	الإدارية
ش.الإسكندرية - مصر	المدنية	محلية	الإدارية	الإدارية	الإدارية	الإدارية	الإدارية
ش.الإسكندرية - مصر	المدنية	محلية	الإدارية	الإدارية	الإدارية	الإدارية	الإدارية
ش.الإسكندرية - مصر	المدنية	محلية	الإدارية	الإدارية	الإدارية	الإدارية	الإدارية

عدد النسخ	الوحدة	البيان / الوصف	رقم	بيان رقم
1	106.13	الوحدة المطلوب اعتمادها	٣٢	٣-٣

تم تقديم المطالبات المقترنة بالطلب وتقدير مطلوبه لل استخدام في المشروع من قبل المطلوب.

ممثل المكتب المختص
.....

البيان رقم:	التاريخ:	بيان رقم:
.....

بيان رقم:	العنوان:	العنوان:
.....

بيان رقم:	بيان رقم:	بيان رقم:
.....

بيان رقم:	بيان رقم:	بيان رقم:
.....



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المشروع

الاسناد

التوقيع



مدير المشروع

لاسم

التوقيع




مهندس المكتب الفقى

الاسم

التوقيع

5304 NOTE



NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP	DESCRIPTION		QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
					ITEM	QTY			
JOHN SMITH	1234 BROADWAY	NEW YORK	NY	100-00					
MARY BROWN	4567 PARK AVENUE	DETROIT	MI	48200-00					
CHARLES WILSON	3210 BROADWAY	LOS ANGELES	CA	90000-00					
FRANCIS COOPER	1540 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
ELIZABETH HARRIS	2100 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
RONALD GORDON	1800 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
WILLIAM JONES	1000 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
JAMES KELLY	1400 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
THOMAS LEE	1600 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
ROBERT MCKEE	1200 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
CHARLES NICHOLS	1800 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
JOHN PETERS	1400 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
FRANCIS QUADE	1600 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
CHARLES RICHARDSON	1200 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
JOHN SMITH	1800 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
FRANCIS WILSON	1400 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
CHARLES XAVIER	1600 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					
JOHN YOUNG	1200 BROADWAY	NEW YORK	NY	10000-00					



RC tank foundation

$$Rc \text{ tank foundation} = 16.08 * 6.6 = 106.13 \text{ m}^3$$

卷之三

This architectural plan drawing shows the layout of two rectangular tanks within a larger foundation area. The tanks are positioned side-by-side, separated by a central vertical space. Each tank has a width of 4000 and a height of 600. The foundation area has a total width of 26400 and a total height of 6800. The tanks are represented by white rectangles with black outlines, while the foundation area is shown with a diagonal hatching pattern. Dimension lines indicate the widths of the tanks and the foundation, as well as the height of the tanks. A scale bar at the bottom indicates a distance of 50-200 meters.



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية Quantity	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
123.89	طن	بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٤٠/٦) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات ويشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والجذب المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل هالك حديد لا يتعدى ٦٥% والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	3-8

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع
الاسم
التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الفني



الاسم

التوقيع





١٢٣٤٥٦٧٨٩٠

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

NAB DESIGNS

Architects & Urban Designers

111

(OS submitted)

مطلب اعتماد حصر

مادمكوا الوظيفية للتدريب	سنت المدربون العام :	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING	الى الإنتشارى :-
--------------------------	----------------------	----------------------------------	------------------

اسم المشروع	رقم المطلب	الموضوع	النحوذ	نوع العمل
التاريخ	الإصدار	المسنود	مسند	أشتراك
٢٢/١٤/٢٠٢٣	SHARM-TRANSIT -STR-QS-3-8-RIT-01-REV00	كتابات المعدودة استرشاداً باللوحات التبلديه ولقطها للوراث التصديرية للمشروع حتى تاريخ	-	-
المرفقات	الإصدار	المسنود	مسند	أشتراك
المنشأة	آخر	مختار	مبكرها	غيرها

العنوان: ملحوظات المستشار
العنوان: ملحوظات المستشار
العنوان: ملحوظات المستشار
العنوان: ملحوظات المستشار

الطلاب مرافقون	بعد التدريسمرة أخرى بعد إتمام الملاحمات	١	متعدد مع ملاحمات - يمكن للطالب أن يستثمر بناءً على الملاحمات
التوقيع:	التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٢٤	٢	العنوان: [العمل أو المكان]: المستشاري المختص

 Signature of the shareholder	Date: / /
أحمد المستشاري Ahmed Al-Mustashari	استلام المطلوب Acceptance of the demand



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للبناء

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

ND
NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ							اسم المشروع Project Name	
الوحدة Unit	تصنيف البند في المقايسة Description (BOQ)						رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)	
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions		عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
RC Footings								
	64.31	67.25		67.25		1	قواعد المنفصلة	1
	26.28	26.28		26.28		1	السملات	2
	11.26	11.26		11.26		1	قواعد واشایر الحالط الخرساني	3
	18.99	18.99		18.99		1	قواعد واشایر الخزان	4
	3.04	3.04		3.04		1	قواعد الانارة	5
	123.89	Total Quantity						

استشاري المشروع
الاسم ^
التوقيع

ESE
Economical & Safe Engineering

مدير المشروع
الاسم
التوقيع

مهندس المكتب الفني
الاسم
التوقيع



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية Quantity	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
1039.15	٢م	بالمتر المسطح توريد شيتات من البولي ايثلين سماكة ٤٠ ميكرون (vapour barrier) اسفل الاساسات وأسفل الدكّات من الخرسانة العادية كما يشمل البند كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	4-1

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الفني



الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للبناء
للسنة



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
الاستشاري الإنشائي



Architects & Urban Planners
الاستشاري العام








الجهة العامة للطرق والجاري،
وزير الموارد

[QS Submital] طلب اعتماد حضر

مسند أو طلبية التشديد	من المقاول النام :
	ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING

تفصيل أعمال الباقي الإداري ومحاقاته لمشروع معطاة شحن الأدوبيات الكهربائية بشكل الشيغ			
	التاريخ	الإصدار	اسم المشروع
المرفقات	٠٠	SHARM-TRANSIT-STR-QS-4-1-POLY-01-REV00	رقم الطلب
-	-	-	الموضوع
المقدمة	-	المستوى	النوع
أخرى	مساحة	مقدار	نوع العمل

عدد التسخن	الكمية المطلوب اعتمادها	الوحدة	البيان / الوصف	بند رقم
١	1039.15	٢٣	(vapour barrier) بالمتسطع توريد شبات من البولي إيثيلين سمك .٠٠٥ ممكدة	٤-١
			اسفل الامثلثات وأسفل الدوارات من الرقائمة العالمية كما يشمل البند كل ما يلزم لنحو الأعمال	
			طهياً للواسطات الفنية وأصول الصناعة.	

تمهد المقاول: المستدات المرفقة تم تسييلها وراجعتها من حيث ظاهرها مع العذر وتعذر مقلولة للإستخدام في المشروع من قبل المقاول.	
مدير المقاول بال manuscrip	
 GAMCO المقاول:  التوقيع:  التاريخ: 	
الاستاذ/الاستاذة :  GS التوقيع: 	
الاستاذ/الاستاذة :  GS التوقيع: 	
الاستاذ/الاستاذة :  GS التوقيع: 	
الاستاذ/الاستاذة :  GS التوقيع: 	
الاستاذ/الاستاذة :  GS التوقيع: 	
الإعتماد المختص	الإعتماد بوساطة:
<input type="checkbox"/> ممتد مع ملاحظات - يمكن للمقاول أن يستفسر بناءاً على الملاحظات	
<input checked="" type="checkbox"/> ممتد	
الاستاذ/الاستاذة :  GS التوقيع: 	
الاستاذ/الاستاذة :  GS التوقيع: 	
الاستاذ/الاستاذة :  GS التوقيع:	



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ							اسم المشروع Project Name	
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)						رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)	
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity	مقاسات Dimensions			عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width	طول Length		
	1039.15		1039.15	-	1039.15	1	PC AREA	1
	1039.15	Total Quantity						

استشاري المشروع
الاسم: د. محمد عباس
التوقيع



مدير المشروع
الاسم
التوقيع



مهندس المكتب الفني
الاسم
التوقيع



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبني الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ				اسم المشروع Project Name
الكمية Quantity	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)	
2020.54	٢م	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهين للأساسات وجميع الأجزاء المدفونة والبند يشمل جميع الأدوات والخامات اللازمة لدهان طبقة العزل على أن يتم تقديم المواصفات الفنية للمواد المستخدمة للاعتماد من طاقم الإشراف قبل البدء في التنفيذ ودفع جميع الكارتات المطلوبة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	4-2	

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co
سامدو الوليد للإنشاء - مصر

الهيئة العامة للطرق والجسور

NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners

المشترى العام

المشترى الإنشائى

(QS Submittal)

طلب اعتراض حصر

سلكى المعاذنة للمشروع

ECONOMICAL & SAFE
ENGINEERING

اسم المستشارى : -

من المقاول العاشر :

مقدمة المعاذنة للمشروع	الموعدة	التصديق	الإصدار	التاريخ	الرقم
-	-	-	bit-sharm-STR-QS-4.2-bit-GN-F0-04	00	00
-	المسقى	-	عنوان بحوث ومنشور	المرادفات	-
-	معارف	✓	كتوريا	أساليب	-
-	بيانها	✓	مدونها	أخرى	-

عدد النسخ	النوع	الجهة المطلوب اعتراضها	الوقت	البيان / الوصف	رقم بلدية
1	2020.54	٢٠٢٠	٢٠٢١	بالنور المصطبغ تقلية طلاقة عازلة من البارد بوجه تحضيري وجدهن بالصلب وجموع الأجزاء المفتوحة والبنادق وجموع الأدوات والخامات اللازمة لحمل طبقية الغزل على أن يتم تقديم المواصلات الفنية للمواد المسندنة للاعتراض من طاقم الأشغال قبل بدءه في التنفيذ وتفع جموع القارات المطلوبة وكل ما يتطلبه لعموه العمل ككلها بخلاف الصناعة والشروط والمواصفات ومتطلبات المهندس المشرف.	٤-٢

تعهد المقاول: المستندات المرفقة تم تسليمها وراجحتها من حيث مطابقها مع المذكورة وتغير مبنويا للاستخدام فى المشروع من قبل المقاول.

مقدمة المعاذنة للتصديق

التاريخ: ٧/٦/٢٠٢١

بيان رقم:

التوقيع:

التصديق:

استلام المستشارى

بواسطة: ١

بيان رقم:

التصديق:

استلام المقاول

بيان رقم:

التصديق:

التوقيع:

التصديق:

الاستشارى المتقى

لا يعتمد بواسطه:

بيان رقم:

التصديق:

مقدم

بيان رقم:

التصديق:

بيان رقم:

التصديق:

مقدم مع ملاحظات - يمكن للمقاول أن يشتري بما على

بيان رقم:

التصديق:

بيان رقم:

التصديق:

اعتماد المستشارى

بيان رقم:

التصديق:

بيان رقم:

التصديق:



SAMCO National Construction Co
سامكوا للمقاولات العامة للبناء

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



Architects & Urban Planners

الطبعة الأولى لمشروع المطار والكتابي



بيان المشروع

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الكهربائية بـشرم الشنقيط

تصنيف البند في المقابلة

تصنيف البند في المقابلة

تصنيف البند في المقابلة

٢٤ تفصيل البند في المقابلة
٢٤ تفصيل البند في المقابلة
٢٤ تفصيل البند في المقابلة

٢٤ تفصيل البند في المقابلة
٢٤ تفصيل البند في المقابلة
٢٤ تفصيل البند في المقابلة

الوحدة Unit	المقدمة Description (ROQ)	بيان المشروع						
		أجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity	الارتفاع Height	عرض Width	طول Length	عدد NO.	
ملاحظات Notes	أجمالي الكمية Total Quantities	قطع Cuts	جزئي Partial	Dimensions	بيان الأعمال أو الواردات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS		
RC Footings								
	581.04	34.56	615.60	25.65	24	F1	1	
	252.00	14.00	266.00	26.60	10	F2	2	
	352.08	25.20	377.28	20.95	18	F3	3	
	85.76	7.84	93.60	23.40	4	F4	4	
	92.80	8.00	100.80	12.60	8	F5	5	
	59.16	3.97	63.13	31.57	2	F6	6	
	112.79	5.22	118.01	118.01	1	Raft (70 cm)	7	
	-13.44	13.44		0.70	0.40	-	RC Smell Sections 40 cm	8
	-30.87	30.87		0.70	0.30	-	RC Smell Sections 30 cm	9
SMELL								
	529.21		529.21	0.70	756.020	1	Sides of RC Smells 70 cm	10
							Total Quantity	
								2020.54

استشاري المشروع

الاسم:

مشرف المشروع

الاسم:


التاريخ:

مهندس المكتب المشرف
الاسم:
التاريخ:



Economical & Safe Engineering

SAMCO EGYPT

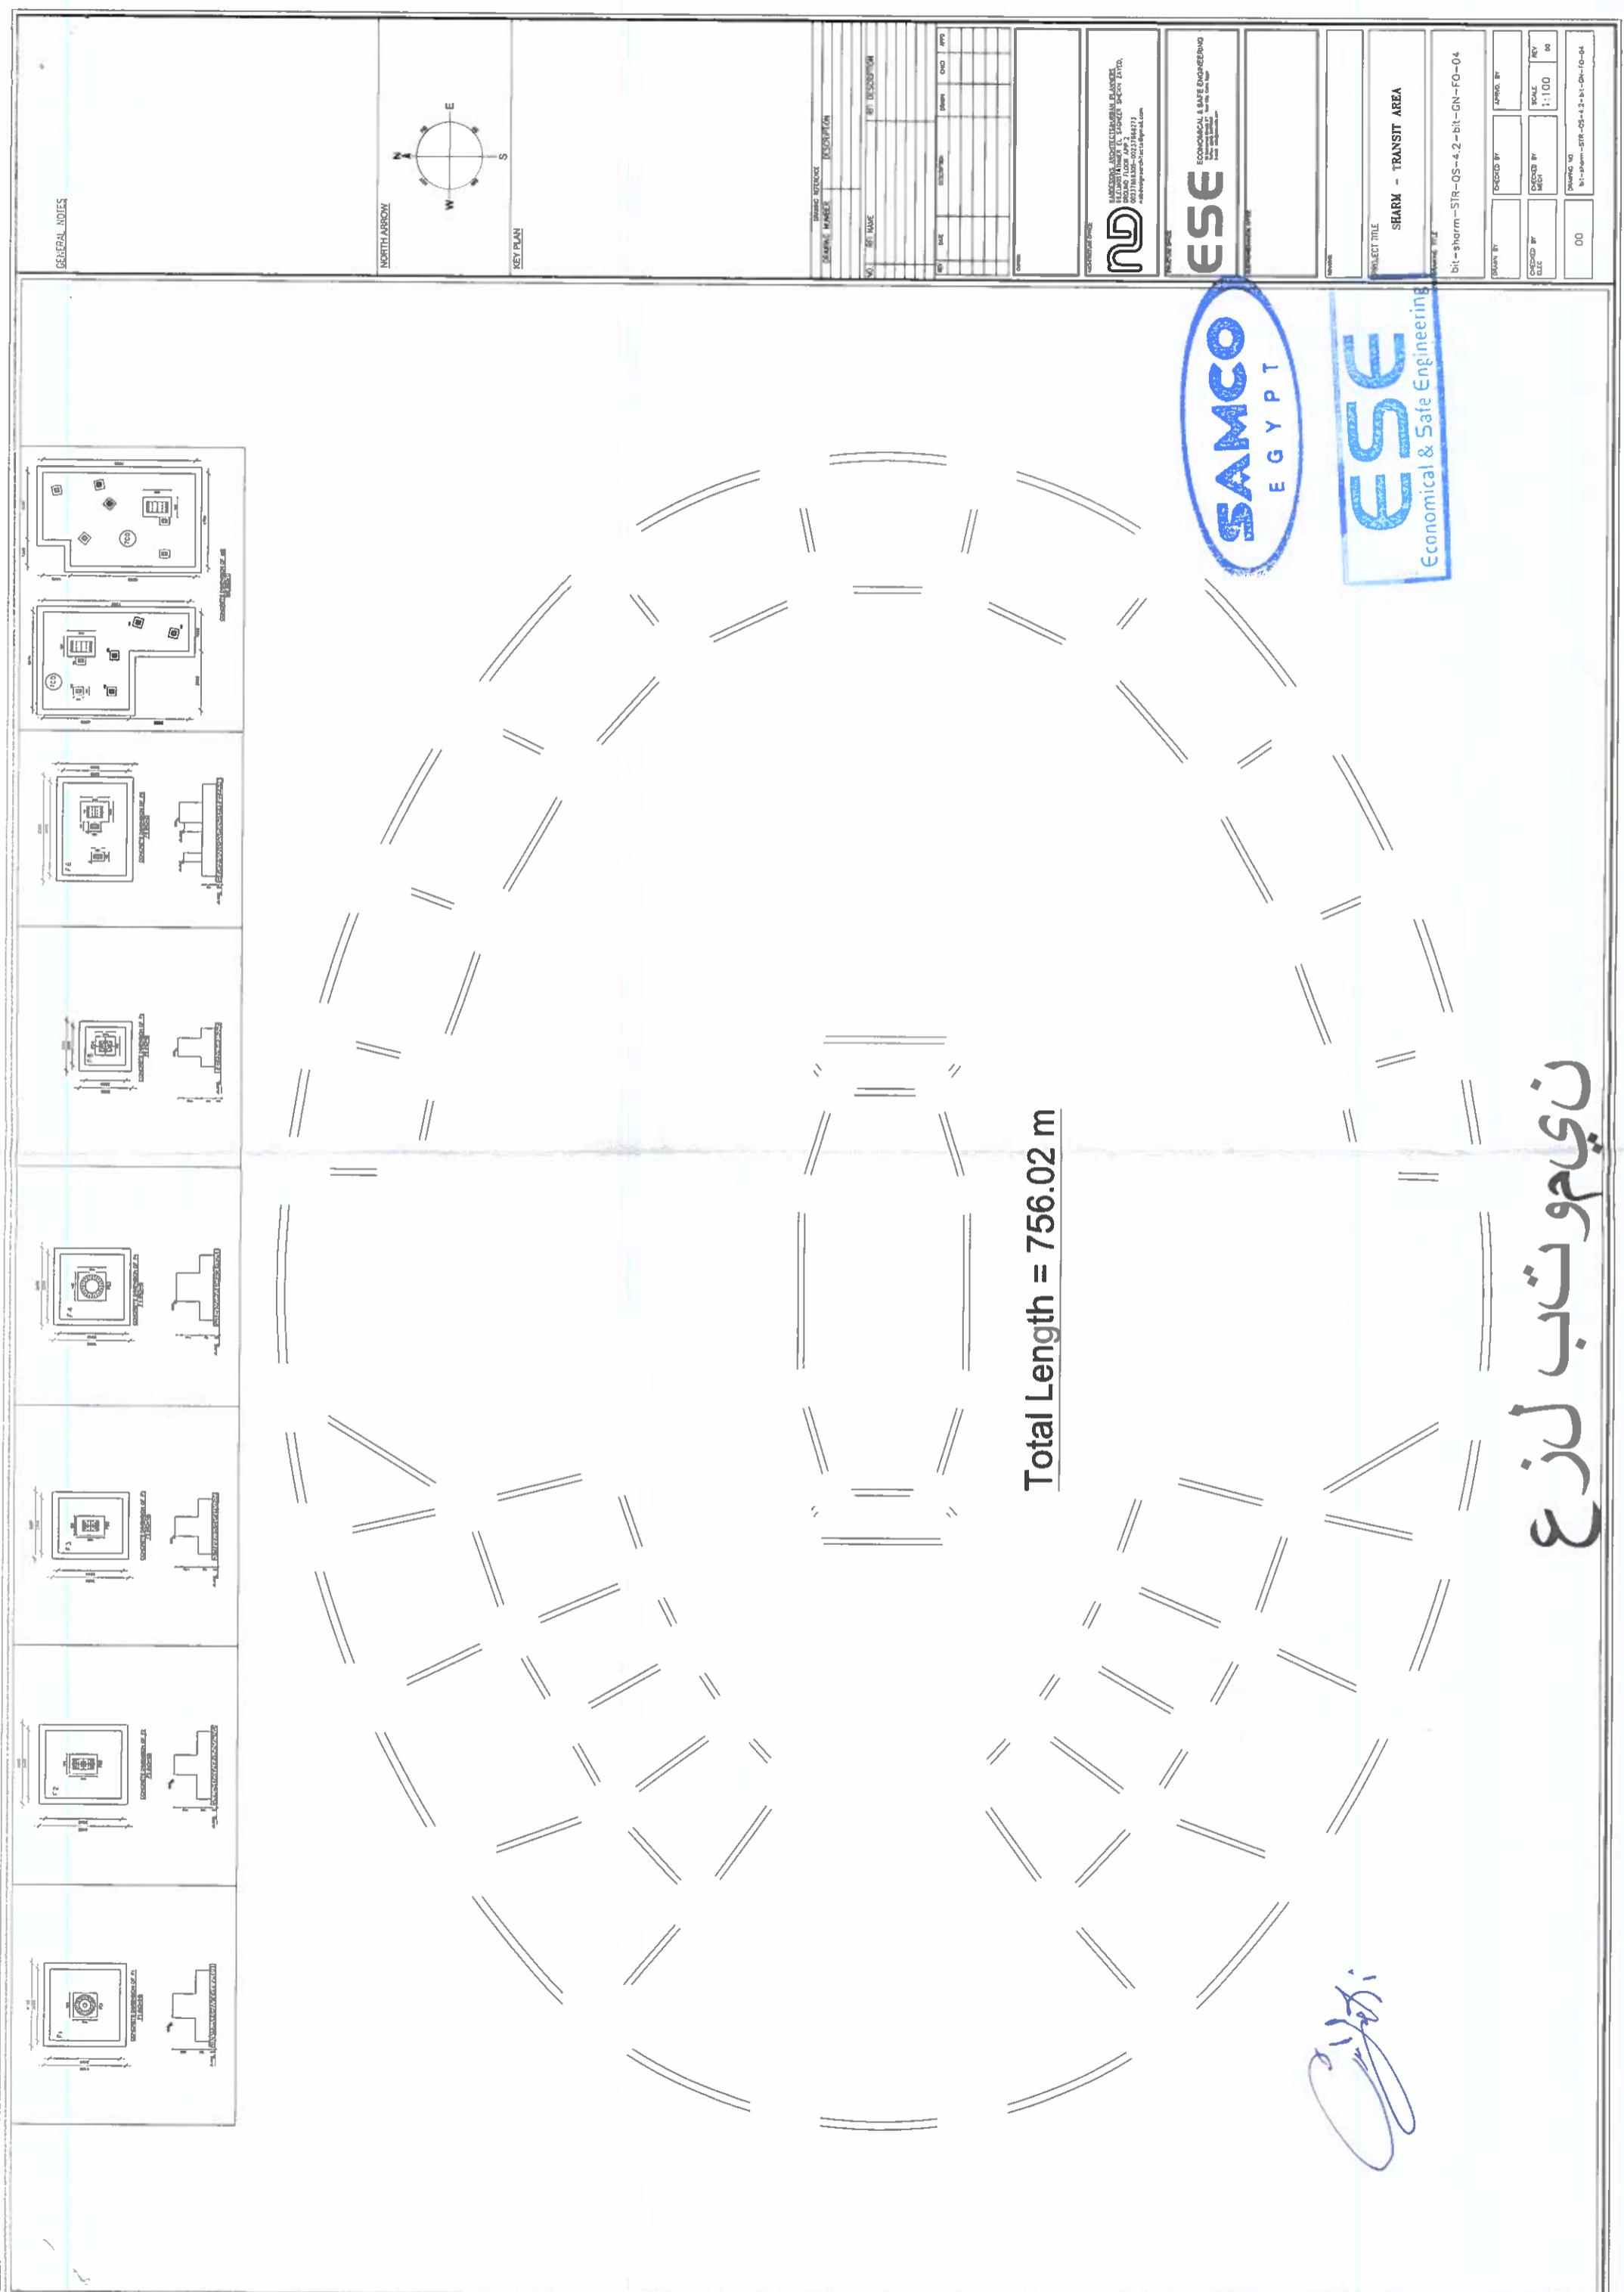



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بـشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية Quantity	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
183.60	٢م	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة ورشح المياه والمادة العازلة لها خاصية حماية الاسطح من الرطوبة وضد رشح المياه وتسريرها للاسطح المطلوب عزلها وذلك بين الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة للأساسات الخزان والطبقة العازلة من لفائف بيتمينية سمك ٤مم من نسيج بيتميني متجلانس وخالي من الشوائب والثقوب ومساحة بالياف البوليستر يتم فردها ولصق كامل مسطحةها باستخدام لهب البلاشبوري بعد دهان الأسطح بالبرايمر الخاص بهذه النوعية من المواد العازلة والبند محمل عليه عمل لياسته أسمنتية بسمك ٢ سم بمحتوى أسمنتي ٢٥٠ كجم/٣م ^٢ رمل أعلى الطبقة العازلة مضاد إليها مواد إيبوكسية لمنع نفاذية المياه مع تسوية سطح اللائحة بالبروة ويشمل البند كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	5-1

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم
التوقيع

مدير المشروع

الاسم
التوقيع



مهندس المكتب التكنولوجي

الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للبناء



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

الوحدة Unit	توضيف البند في المقايسة Description (BOQ)						اسم المشروع Project Name	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions			عدد No.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	
٢٤			بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة ورشح المياه وضد رشح المياه وتسريرها للسطح المطلوب عزليها وذلك بين الخرسانة العادي والخرسانة المسلحة للاسات الخزان والطبقة العازلة من لفائف بيتومينية سمك ٤مم من نسيج بيتوميني متجانس وخالي من الشوائب والثقوب ومسلحة بالياف البوليستر يتم فردها ولصق كامل مسطحها باستخدام لهب الباثبوري بعد دهان الأرضي بالبرaimer الخاص بهذه النوعية من المواد العازلة والبند محمل عليه عمل لياستة أسمنتية بسمك ٢ سم بمحنتي أسمنتي ٢٥٠ كجم/م٣ رمل أعلى الطبقة العازلة مضارف إليها مواد ليوكسية لمنع نفاذية المياه مع تسوية سطح ال liaise بالبروة ويشمل البند كل ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة. ملحوظة :- يراعى استمرار إتصال (دون فصل) المادة العازلة التي بين الخرسانة العادي والخرسانة المسلحة للاسات الخزان الخارجية لخزان المياه.			5-1		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity	المقاسات Dimensions	عدد No.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS		
	183.60	خصم Cuts جزئي Partial	ارتفاع Height عرض Width طول Length	1	طبقة عازلة افقية ضد الرطوبة ورشح المياه	1		
	183.60	Total Quantity						

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم



التوقيع

مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



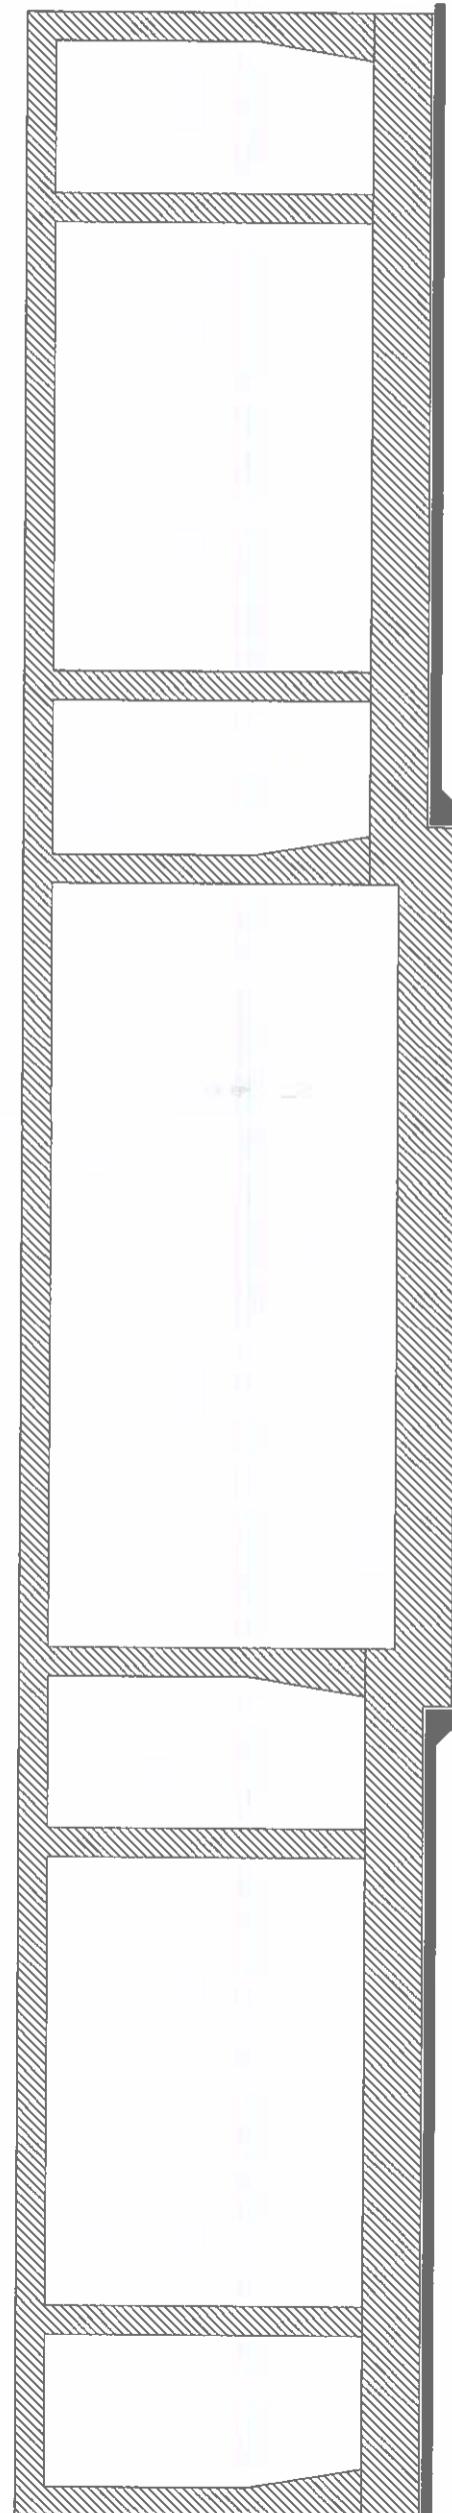

B TANK CONCRETE DIA SECTION
Scales 1:50

DRAWING REFERENCE	DESCRIPTION
DRAWING NUMBER	REF. DESCRIPTION
NO.	REF. NAME
REV.	DATE
	REVISIONS
	NUMBER
	CHIEF DESIGNER
	APPROVED BY
	DESIGNED BY
	CHECKED BY
	APPROVED BY
	SCALE
	KEY
	1:100
	00

bitumen = $27 \times 6.8 = 183.6 \text{ m}^2$

Membrane tank foundation



PROJECT TITLE	SHARM - TRANSIT AREA
DRAWING NO.	SHARM - TRANSIT - STR - QS - 5.1 - H21 - 01 - R00
DESIGNED BY	APPROVED BY
CHECKED BY	DESIGNED BY
APPROVED BY	CHECKED BY
SCALE	KEY
1:100	00
DRAWING NO.	SHARM - TRANSIT - STR - 25 - 5.1 - H21 - 01 - R00
00	



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتشييد



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
77.00	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مائبة مانعة للنفاذية بارتفاع ٢٥ سم ويتم تركيبه في الحواف عند اتصال سطح القاعدة المسلحة بالحائط الساند بين شبكتي تسليح الحائط الساند بكتابات خاصة وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والبند يشمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة.	5-3

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع
الاسم
التوقيع

مدير المشروع

الاسم

التوقيع

مهندس المكتب الذي



الاسم

التوقيع





SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبني الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الاتوبوسيات الكهربائية بشرم الشيخ							اسم المشروع Project Name
الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)						رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتثبيت (water stop) من شرائح مالية مانعة للنفاذية بارتفاع ٢٥ سم ويتم تركيبه في الحوائط عند اتصال سطح القاعدة المسلحه بالحائط الساند بين شبكي تسليح الحائط الساند بكائنات خاصة وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والبند يشمل كل ما يلزم لنها الاعمال طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات الشركة المنتجة.						5-3
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions		عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width		
	51.80		51.80	25.90		2	water stop
	25.20		25.20	6.30		4	water stop
	77.00	Total Quantity					

استشاري المشروع

الاسم :

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع




مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع

GENERAL NOTES



DRAWING NO. & DATE		DESCRIPTION		
NO.	REV.	ITEM	DESCRIPTION	AMOUNT

ND
NEDERLANDS Onderzoeks Instituut voor
Staal en Beton
Postbus 2070
2600 AH Delft
The Netherlands
www.nd.nl

ESE
ECONOMIC & SAFE ENGINEERING
Engineering Services
Project Management
Construction Management
Procurement Services


SHARM - TRANSIT AREA

SHARM - TRANSIT ~STR-OS-5.3-WS-01

DRAWN BY	APPROVED BY
CHECKED BY	
DATE	REV.

1:100
00

DRAWING NO.
Sharm-Transit ~STR-OS-5.3-WS-01

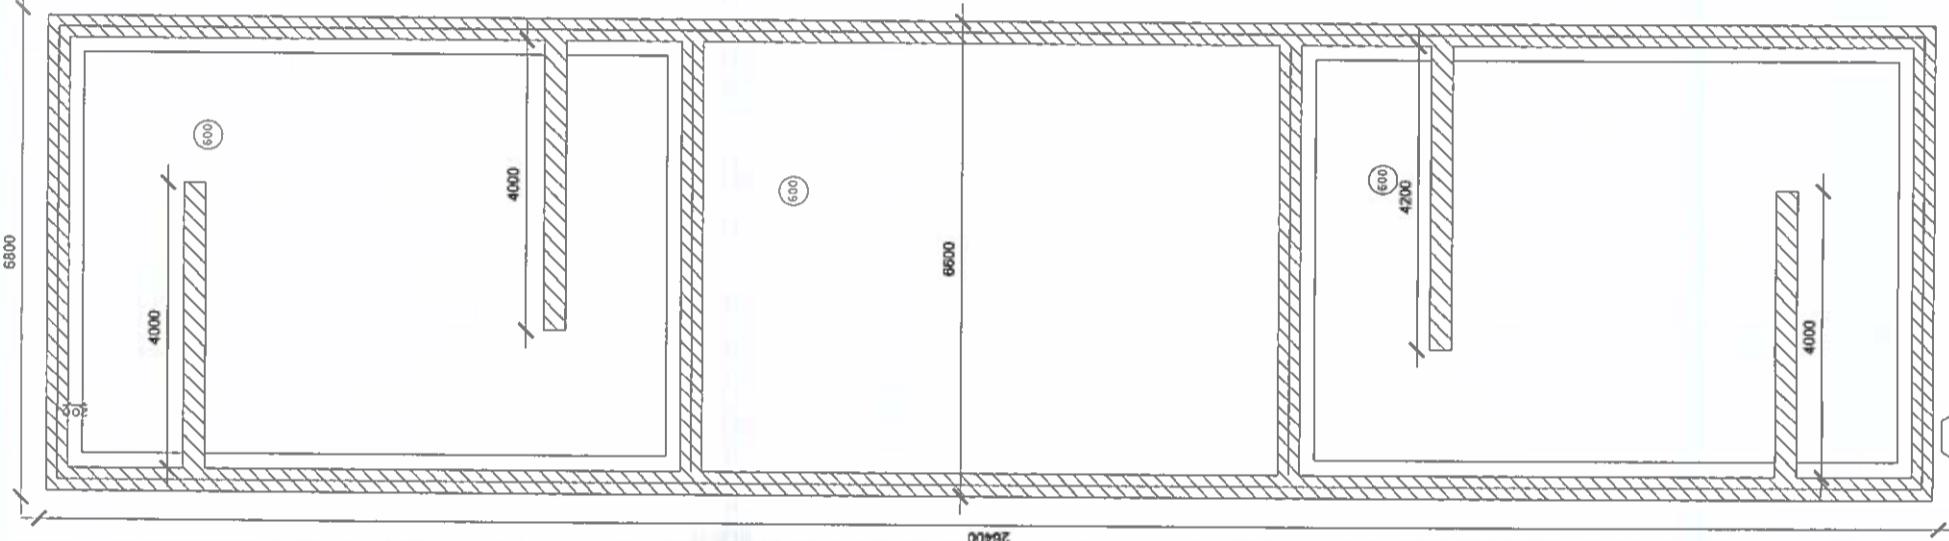

Oil Tank Base Plan
Scale 1:50
S-01-201

Signature



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن التوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ			اسم المشروع Project Name
الكمية	الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)	رقم البند في المقايسة NO. Item (BOQ)
98.10	طن	بالطن توريد وتركيب هيكل معدني من القطاعات الـ ST.37 - ST.52 وقطاعات B.U.S وموادات A500Gr.B و مواسير ST.37 و يتم تشكيل العناصر الإنسانية بواسطة القطع الآلي وتهذيب الأطراف المقطوعة مع استخدام المثقب لعمل التقسيب وعمل الترميل للقطاعات ويشمل ايضا اللحامات مع اختبار جميع اللحامات المستخدمة لتشكيل الإطارات المعدنية بواسطة Magnetic test or Penetration liquid test وتقديم شهادة تفيد بأن جميع اللحامات مطابقة للمواصفات الفنية للحام وكل ما يلزم لثبتت الجوايط باستخدام الكراسي وتقويه الرقاب علي اكمل وجه، وعلى المقاول تقديم الرسومات التنفيذية (الشوب دروينج) للاعتماد قبل البدء في التصنيع وحصر الكميات طبقا لما هو وارد بالرسومات التنفيذية والبند لا يشمل وزن المسامير واللحام حيث يتم احتسابها بجدول الكميات طبقا للنسب المقررة في مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري ويتم استخدام جميع المعدات والأوناش والتجهيزات اللازمة لنقل وتركيب القطاعات المعدنية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشتمل الصاج المعرج .	1

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم

التوقيع

استشاري المشروع

الاسم

التوقيع



مدير المشروع

الاسم

التوقيع



مهندس المكتب الفني

الاسم

التوقيع



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية



ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING



الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ أعمال المبنى الإداري وملحقاته لمشروع محطة شحن الانوبيسات الكهربائية بشرم الشيخ

الوحدة Unit	توصيف البند في المقايسة Description (BOQ)					اسم المشروع Project Name		
ملاحظات Notes	اجمالي الكمية Total Quantities	الكمية Quantity		مقاسات Dimensions		عدد NO.	بيان الأعمال أو التوريدات Works or Supplies List	مسلسل NO. OF ORDERS
		خصم Cuts	جزئي Partial	ارتفاع Height	عرض Width			
RC Footings								
	98.10		98.10	98.10		1	وزن الأعمال المنفذة	1
	98.10	Total Quantity						

استشاري المشروع

الاسم

التواقيع



مدير المشروع

الاسم

التواقيع

مهندس المكتب الفي

الاسم

التواقيع



ASSEMBLY MARK	QTY	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	WEIGHT\UNIT	WEIGHT\Total
SHARM TRANSIT-B1	2	4514	250	866	494.98	989.96
SHARM TRANSIT-B2	4	647	289	866	148.41	593.62
SHARM TRANSIT-B3	1	648	289	866	147.58	147.58
SHARM TRANSIT-B4	2	647	290	866	147.22	294.44
SHARM TRANSIT-B5	1	970	290	866	209.32	209.32
SHARM TRANSIT-B6	2	971	290	866	209.39	418.78
SHARM TRANSIT-B7	1	970	290	866	209.32	209.32
SHARM TRANSIT-B8	2	5699	250	866	603.37	1206.75
SHARM TRANSIT-B9	1	981	289	866	210.43	210.43
SHARM TRANSIT-B10	1	981	270	866	186.21	186.21
SHARM TRANSIT-B11	1	6939	473	866	868.65	868.65
SHARM TRANSIT-B12	1	6939	360	866	841.23	841.23
SHARM TRANSIT-B13	1	1019	289	866	214.19	214.19
SHARM TRANSIT-B14	2	1020	289	866	214.2	428.39
SHARM TRANSIT-B15	1	1019	290	866	214.1	214.1
SHARM TRANSIT-B16	1	1019	289	866	214.14	214.14
SHARM TRANSIT-B17	1	1019	270	866	190.25	190.25
SHARM TRANSIT-B18	1	1021	289	866	214.28	214.28
SHARM TRANSIT-B19	1	1019	270	866	183.99	183.99
SHARM TRANSIT-B20	2	6939	290	866	1055.61	2111.22
SHARM TRANSIT-B21	1	1000	290	866	212.3	212.3
SHARM TRANSIT-B22	1	1195	152	520	71.48	71.48
SHARM TRANSIT-B23	1	6940	472	866	867.75	867.75
SHARM TRANSIT-B24	1	6940	471	866	867.75	867.75
SHARM TRANSIT-B25	1	6940	360	866	840.53	840.53
SHARM TRANSIT-B26	1	1019	290	866	214.08	214.08
SHARM TRANSIT-B27	1	1019	270	866	183.87	183.87
SHARM TRANSIT-B28	2	4532	250	866	496.64	993.28
SHARM TRANSIT-B29	2	5721	250	866	604.47	1208.94
SHARM TRANSIT-B30	1	986	290	866	210.91	210.91
SHARM TRANSIT-B31	1	986	270	866	186.9	186.9
SHARM TRANSIT-B32	1	3179	250	866	372.47	372.47
SHARM TRANSIT-B33	1	4059	250	866	453.01	453.01
SHARM TRANSIT-B34	1	6601	466	866	832	832
SHARM TRANSIT-B35	1	3980	250	866	445.98	445.98
SHARM TRANSIT-B36	1	1322	290	866	245.47	245.47
SHARM TRANSIT-B37	1	1000	289	866	212.15	212.15
SHARM TRANSIT-B38	1	1000	290	866	212.3	212.3
SHARM TRANSIT-B39	1	3111	250	866	366.5	366.5
SHARM TRANSIT-B40	1	3103	250	866	365.73	365.73
SHARM TRANSIT-B41	1	6936	474	866	868.56	868.56
SHARM TRANSIT-B42	1	6937	368	866	842.34	842.34
SHARM TRANSIT-B43	1	997	290	866	211.95	211.95
SHARM TRANSIT-B44	1	5336	250	866	576.88	576.88
SHARM TRANSIT-B45	1	976	290	866	209.87	209.87
SHARM TRANSIT-B46	1	977	289	866	209.96	209.96
SHARM TRANSIT-B47	1	1023	270	866	190.7	190.7
SHARM TRANSIT-B48	1	2168	200	560	125.86	125.86
SHARM TRANSIT-B49	4	1007	270	340	83.93	335.74




SHARM TRANSIT-B50	1	969	289	866	209.2	209.2
SHARM TRANSIT-B51	1	5416	250	866	576.57	576.57
SHARM TRANSIT-B52	1	3884	250	866	436.6	436.6
SHARM TRANSIT-B53	1	6794	467	866	852.36	852.36
SHARM TRANSIT-B54	1	4038	250	866	451.14	451.14
SHARM TRANSIT-B55	1	1130	290	866	225.29	225.29
SHARM TRANSIT-B56	1	3106	250	866	365.16	365.16
SHARM TRANSIT-B57	1	3063	250	866	361.34	361.34
SHARM TRANSIT-B58	2	5539	151	520	239.61	479.21
SHARM TRANSIT-B59	2	5724	151	520	247.49	494.98
SHARM TRANSIT-B60	2	5909	151	520	254.72	509.44
SHARM TRANSIT-B61	2	6094	151	520	262.6	525.2
SHARM TRANSIT-B62	2	6279	151	520	270.48	540.97
SHARM TRANSIT-B63	2	5520	151	520	238.85	477.7
SHARM TRANSIT-B64	2	5704	151	520	246.7	493.4
SHARM TRANSIT-B65	2	5888	151	520	253.9	507.81
SHARM TRANSIT-B66	2	6072	151	520	261.11	522.22
SHARM TRANSIT-B67	1	6257	151	520	269.61	269.61
SHARM TRANSIT-B68	3	4885	150	500	212.85	638.54
SHARM TRANSIT-B69	3	4885	150	500	212.85	638.54
SHARM TRANSIT-B70	1	5772	150	430	237.95	237.95
SHARM TRANSIT-B71	1	5426	150	430	223.79	223.79
SHARM TRANSIT-B72	1	5082	150	430	209.7	209.7
SHARM TRANSIT-B73	1	2163	200	560	125.51	125.51
SHARM TRANSIT-B74	1	4393	150	430	181.46	181.46
SHARM TRANSIT-B75	2	6940	290	866	1055.65	2111.31
SHARM TRANSIT-B76	1	4130	150	430	169.9	169.9
SHARM TRANSIT-B77	1	4257	150	430	175.51	175.51
SHARM TRANSIT-B78	1	4383	150	430	181.08	181.08
SHARM TRANSIT-B79	1	4511	150	430	186.09	186.09
SHARM TRANSIT-B80	1	4646	150	430	191.35	191.35
SHARM TRANSIT-B81	1	4500	150	430	185.66	185.66
SHARM TRANSIT-B82	1	4355	150	430	179.98	179.98
SHARM TRANSIT-B83	1	4210	150	430	173.65	173.65
SHARM TRANSIT-B84	1	4064	150	430	167.33	167.33
SHARM TRANSIT-B85	1	4675	150	430	192.49	192.49
SHARM TRANSIT-B86	1	4537	150	430	187.11	187.11
SHARM TRANSIT-B87	1	4400	150	430	181.74	181.74
SHARM TRANSIT-B88	1	4263	150	430	175.75	175.75
SHARM TRANSIT-B89	1	4127	150	430	169.78	169.78
SHARM TRANSIT-B90	1	1457	390	400	139.54	139.54
SHARM TRANSIT-B91	1	1782	250	866	199.03	199.03
SHARM TRANSIT-B92	2	4643	390	400	408.02	816.05
SHARM TRANSIT-B93	2	4643	390	400	408.02	816.04
SHARM TRANSIT-B94	1	1458	390	400	139.63	139.63
SHARM TRANSIT-B95	1	1459	390	400	139.71	139.71
SHARM TRANSIT-B96	1	1460	390	400	139.78	139.78
SHARM TRANSIT-B97	1	4057	150	430	167.05	167.05
SHARM TRANSIT-B98	1	4192	150	430	172.95	172.95
SHARM TRANSIT-B99	1	4327	150	430	178.87	178.87



Egypt

SHARM TRANSIT-B100	1	4462	150	430	184.17	184.17
SHARM TRANSIT-B101	1	4598	150	430	189.49	189.49
SHARM TRANSIT-B102	1	5682	150	430	234.46	234.46
SHARM TRANSIT-B103	1	5335	150	430	219.61	219.61
SHARM TRANSIT-B104	1	4989	150	430	206.05	206.05
SHARM TRANSIT-B105	1	4642	150	430	191.2	191.2
SHARM TRANSIT-B106	1	3202	250	866	374.51	374.51
SHARM TRANSIT-B107	1	4901	150	430	201.99	201.99
SHARM TRANSIT-B108	1	4901	150	430	201.99	201.99
SHARM TRANSIT-B109	1	4901	150	430	201.99	201.99
SHARM TRANSIT-B110	1	4901	150	430	201.99	201.99
SHARM TRANSIT-B111	2	5115	201	570	304.87	609.74
SHARM TRANSIT-B112	1	1032	220	570	89.01	89.01
SHARM TRANSIT-B113	1	1032	220	570	89.07	89.07
SHARM TRANSIT-B114	1	991	151	520	63.73	63.73
SHARM TRANSIT-B115	4	986	152	520	63.28	253.12
SHARM TRANSIT-B116	2	1196	152	520	71.49	142.98
SHARM TRANSIT-B117	8	1038	189	520	82.44	659.53
SHARM TRANSIT-B118	10	1038	190	520	82.46	824.6
SHARM TRANSIT-B119	1	986	152	520	63.27	63.27
SHARM TRANSIT-B120	1	986	152	520	63.27	63.27
SHARM TRANSIT-B121	2	986	152	520	63.27	126.55
SHARM TRANSIT-B122	2	1039	189	520	82.5	165
SHARM TRANSIT-B123	1	1175	152	520	70.7	70.7
SHARM TRANSIT-B124	2	1175	152	520	70.68	141.37
SHARM TRANSIT-B125	1	1175	152	520	70.7	70.7
SHARM TRANSIT-B126	1	788	151	520	54.43	54.43
SHARM TRANSIT-B127	2	1028	220	570	88.75	177.5
SHARM TRANSIT-B128	2	1028	220	570	88.83	177.67
SHARM TRANSIT-B129	2	6663	201	570	386.97	773.94
SHARM TRANSIT-B130	1	1030	220	570	88.89	88.89
SHARM TRANSIT-B131	1	788	151	520	54.43	54.43
SHARM TRANSIT-B132	2	993	151	520	63.15	126.3
SHARM TRANSIT-B133	1	787	151	520	54.87	54.87
SHARM TRANSIT-B134	1	991	151	520	63.73	63.73
SHARM TRANSIT-B135	2	5143	201	570	306.33	612.65
SHARM TRANSIT-B136	1	3757	201	570	232.52	232.52
SHARM TRANSIT-B137	1	3555	201	570	220.62	220.62
SHARM TRANSIT-B138	1	1030	220	570	88.89	88.89
SHARM TRANSIT-B139	1	3825	201	570	235.92	235.92
SHARM TRANSIT-B140	1	6466	201	570	375.53	375.53
SHARM TRANSIT-B141	1	4903	201	570	293.57	293.57
SHARM TRANSIT-B142	1	4983	201	570	297.59	297.59
SHARM TRANSIT-B143	1	648	289	866	147.58	147.58
SHARM TRANSIT-B144	1	3651	201	570	225.47	225.47
SHARM TRANSIT-B145	1	6548	201	570	379.62	379.62
SHARM TRANSIT-B146	1	4795	201	570	287.31	287.31
SHARM TRANSIT-B147	1	4969	201	570	296.84	296.84
SHARM TRANSIT-B148	1	3737	201	570	231.42	231.42
SHARM TRANSIT-B149	1	3715	201	570	229.6	229.6




Signature

SHARM TRANSIT-B150	1	1420	433	500	91.2	91.2
SHARM TRANSIT-B151	1	1420	433	500	91.32	91.32
SHARM TRANSIT-B152	1	1658	461	500	100.56	100.56
SHARM TRANSIT-B153	1	1658	461	500	100.47	100.47
SHARM TRANSIT-B154	1	1427	434	500	91.55	91.55
SHARM TRANSIT-B155	1	1427	434	500	91.55	91.55
SHARM TRANSIT-B156	1	7399	303	580	572.38	572.38
SHARM TRANSIT-B157	1	7379	303	580	571.06	571.06
SHARM TRANSIT-B158	1	4303	240	580	428.81	428.81
SHARM TRANSIT-B159	1	4319	240	580	429.83	429.83
SHARM TRANSIT-B160	1	6921	368	866	839.83	839.83
SHARM TRANSIT-B161	1	6257	151	520	271.55	271.55
SHARM TRANSIT-B162	1	4737	150	430	194.93	194.93
SHARM TRANSIT-B163	1	4003	150	430	164.94	164.94
SHARM TRANSIT-B164	1	4295	150	430	177.65	177.65
SHARM TRANSIT-B165	1	1776	250	866	198.43	198.43
SHARM TRANSIT-B166	1	1195	152	520	71.48	71.48
SHARM TRANSIT-B167	2	986	152	520	63.27	126.55
SHARM TRANSIT-B168	2	986	152	520	63.28	126.55
SHARM TRANSIT-B169	4	986	152	520	63.28	253.11
SHARM TRANSIT-B170	1	787	151	520	54.87	54.87
SHARM TRANSIT-B171	1	6687	201	570	387.29	387.29
SHARM TRANSIT-B173	1	6687	201	570	387.29	387.29
SHARM TRANSIT-C2	1	4550	736	827	617.86	617.86
SHARM TRANSIT-C3	1	4550	689	734	569.24	569.24
SHARM TRANSIT-C4	1	4550	688	734	569.22	569.22
SHARM TRANSIT-C5	1	4550	687	734	569.13	569.13
SHARM TRANSIT-C6	1	4550	690	734	569.38	569.38
SHARM TRANSIT-C7	1	4550	741	826	618.17	618.17
SHARM TRANSIT-C8	1	4550	736	830	618.17	618.17
SHARM TRANSIT-C9	1	4550	736	830	618.2	618.2
SHARM TRANSIT-C12	1	9175	1079	800	2382.92	2382.92
SHARM TRANSIT-C13	1	9175	1074	800	2382.65	2382.65
SHARM TRANSIT-C14	1	9175	1076	800	2383.06	2383.06
SHARM TRANSIT-C15	1	9175	1077	800	2476.81	2476.81
SHARM TRANSIT-C16	2	9175	1076	800	2476.65	4953.3
SHARM TRANSIT-C17	1	9175	1074	800	2383.11	2383.11
SHARM TRANSIT-C18	1	4575	1072	800	1312.12	1312.12
SHARM TRANSIT-C19	1	4575	1073	800	1312.21	1312.21
SHARM TRANSIT-C20	1	4575	1075	800	1312.09	1312.09
SHARM TRANSIT-C21	1	4575	1074	800	1312.01	1312.01
SHARM TRANSIT-C22	1	4575	1076	800	1311.26	1311.26
SHARM TRANSIT-C23	1	4575	1074	800	1311.48	1311.48
SHARM TRANSIT-C24	1	4575	1074	800	1311.6	1311.6
SHARM TRANSIT-C25	1	4575	819	800	1217.93	1217.93
SHARM TRANSIT-C26	1	4575	819	800	1217.94	1217.94
SHARM TRANSIT-C27	1	4575	1066	800	1312.13	1312.13
SHARM TRANSIT-C28	1	9175	1077	800	2479.72	2479.72
SHARM TRANSIT-C29	1	4575	1079	800	1312.01	1312.01
SHARM TRANSIT-C30	1	4550	1062	800	1307.21	1307.21

SAMCO
EGYPT

ECS
Economical & Safe Engineering

R. El Sayed



98104
103500

Total weight (Kg)
Total weight (Kg) * 1.055



وزارة السياحة
المدينة العالمة للشمس والشواطئ
شرم الشيخ

CLIENT:

PROJECT:
SHARM - TRANSIT AREA

ARCHITECTURE OFFICE:



Structure Designer
ESE
ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING
www.esengineering.com

CONTRACTOR:



KEY PLAN


NOTES:

1. All dimensions are in millimeters. All drawings are to be read from the bottom left corner.
2.1. STRUCTURAL STEEL: PLATE THICKNESS FOR BEAMS IS 16 MM.
2.2. STRUCTURAL STEEL: TUBE DIAMETER AND WALL THICKNESS FOR COLUMNS IS 40 MM.
3.1. ALL COLUMNS ARE TO BE PROVIDED WITH A 100 MM DEEP CONCRETE BASE.
3.2. ALL COLUMNS ARE TO BE PROVIDED WITH A 100 MM DEEP CONCRETE BASE.
3.3. REINFORCING STEEL IS TO BE PROVIDED AS PER DRAWINGS.
3.4. REINFORCING STEEL IS TO BE PROVIDED AS PER DRAWINGS.
3.5. CONCRETE COLUMNS ARE TO BE PROVIDED AS PER DRAWINGS.
4. VIBRATION ISOLATORS: 2 X 100 MM DIAMETER OR 100 MM DIAMETER X 100 MM THICKNESS. 2 X 100 MM DIAMETER X 100 MM THICKNESS. 2 X 100 MM DIAMETER X 100 MM THICKNESS.
5. REINFORCING STEEL: 2 X 100 MM DIAMETER X 100 MM THICKNESS.
6.1. LUBRICANT: THE COLUMN AND BEAM Joints ARE TO BE PROVIDED WITH 100 MM LENGTH OF 100 MM DIAMETER X 100 MM THICKNESS.
6.2. LUBRICANT: THE COLUMN AND BEAM Joints ARE TO BE PROVIDED WITH 100 MM LENGTH OF 100 MM DIAMETER X 100 MM THICKNESS.
6.3. LUBRICANT: THE COLUMN AND BEAM Joints ARE TO BE PROVIDED WITH 100 MM LENGTH OF 100 MM DIAMETER X 100 MM THICKNESS.
6.4. SHOP SITE CONSTRUCTION: 2 X 100 MM DIAMETER X 100 MM THICKNESS.
6.5. ALL STRUCTURAL CONNECTIONS ARE TO BE PROVIDED AS PER DRAWINGS.
6.6. ALL STRUCTURAL CONNECTIONS ARE TO BE PROVIDED AS PER DRAWINGS.
6.7. The above dimensions are to be taken at the mid height of the columns and beams.
6.8. The above dimensions are to be taken at the mid height of the columns and beams.
6.9. The above dimensions are to be taken at the mid height of the columns and beams.
6.10. The above dimensions are to be taken at the mid height of the columns and beams.

Revised for
6 RELEASED FOR CONSTRUCTION
Date: 01/08/2022
DRAWER: M. K.H. CHECKED: DR. M.M. REVISION NO: 01
PROJECT NAME: SHARM - TRANSIT AREA

3D VIEW
SCALE 1:35
DRAWER: AB SHARON/4 DATE: 01/08/2022
CHECKED: DR. M.M. REVISION NO: 01
PROJECT NAME: SHARM - TRANSIT AREA
SHEET TITLE: SHARM - TRANSIT AREA

SCALE: 1:35
DRAWER: AB SHARON/4 DATE: 01/08/2022
CHECKED: DR. M.M. REVISION NO: 01
PROJECT NAME: SHARM - TRANSIT AREA
SHEET TITLE: SHARM - TRANSIT AREA

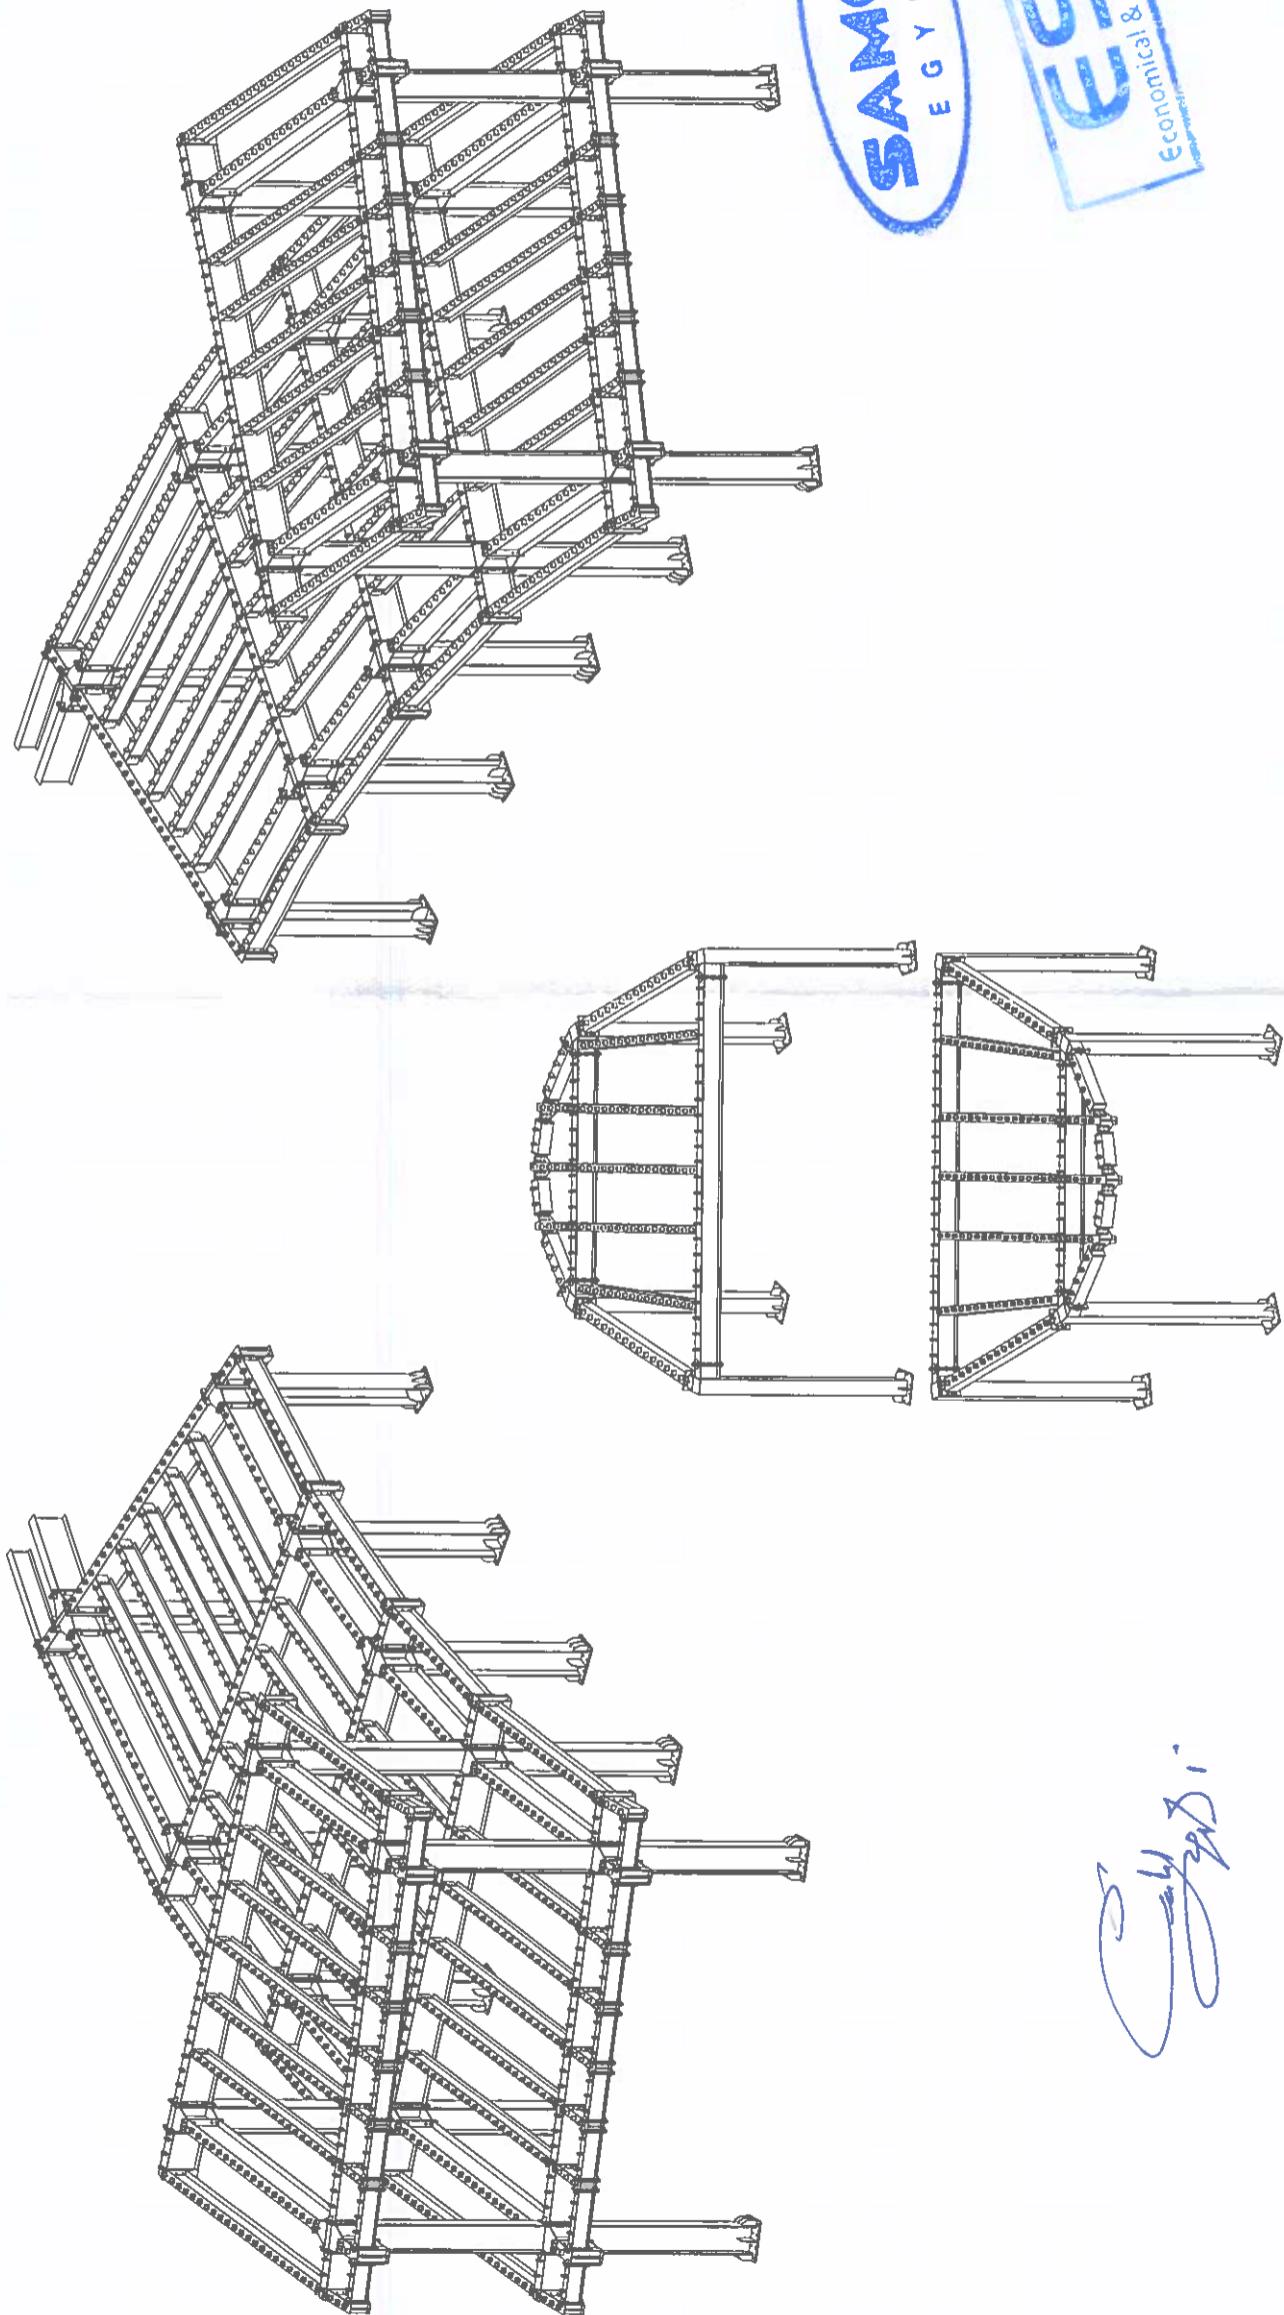

طلبات الاستلام



SAMCO National Construction Co.
سامكو الوطنية للتنمية

ESE

ECONOMICAL & SAFE ENGINEERING


NAB DESIGNS
Architects & Urban Planners



الهيئة العامة للطرق والكباري

**Civil Works
IRs LOG**

X	Request No.	Inspected Item	Location	Request Date	Approval Date	Approval Code	Revesion
1	SAMCO-ESE-SHARM-IR-001	تسليم منصب التسلیم على (١٠٠٠) كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	01/08/2022	08/08/2022	B	00
2	SAMCO-ESE-SHARM-IR-002	نجارة قواعد عادية كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	02/08/2022	08/08/2022	B	00
3	SAMCO-ESE-SHARM-IR-002	تسليم نجارة قواعد عادية	المبنى الإداري	03/08/2022	08/08/2022	B	00
4	SAMCO-ESE-SHARM-IR-006	تسليم نجارة قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	08/08/2022	09/08/2022	B	00
5	SAMCO-ESE-SHARM-IR-003	تسليم حداة قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	09/08/2022	10/08/2022	B	00
6	SAMCO-ESE-SHARM-IR-013	عزل قواعد وشدادات	المبنى الإداري	10/08/2022	10/08/2022	B	00
7	SAMCO-ESE-SHARM-IR-004	تسليم نجارة قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	12/08/2022	13/08/2022	B	00
8	SAMCO-ESE-SHARM-IR-005	تسليم حداة قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	13/08/2022	14/08/2022	B	00
9	SAMCO-ESE-SHARM-IR-004	تسليم حداة قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	20/08/2022	21/08/2022	B	00
10	SAMCO-ESE-SHARM-IR-005	تسليم نجارة قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	20/08/2022	21/08/2022	B	00
11	SAMCO-ESE-SHARM-IR-014	عزل قواعد وشدادات	المبنى الإداري	22/08/2022	23/08/2022	B	00
12	SAMCO-ESE-SHARM-IR-006	تسليم حداة قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق	المبنى الإداري	24/08/2022	25/08/2022	B	00






طلب فحص أعمال

العنوان (الكلدار)		اسم المبنى (Building Name)	Project / المشروع - محطة المترو الخفيف بالعاصمة شرم الشيخ	
Mech.	مساحة	النوع	Civil	Contractor / المقاول (شركة سامكو الوطنية للتشييد)
رقم الطلب / Request No.: SAMCO-ESE-SHARM-IR-001		تاريخ الطلب / Request date: ١٨-٨-٢٠٢٢	بيان الموساد / Material Name	رقم البند / Items No.
		المرفقات / Attachments	وصف المواد / Description Material	
		بيان المعاصفات / Specifications		
التوقيع / Signature:		الإسم / Name: محمد عبد العليم	التوقيع / Signature:	الإسم / Name: محمد عبد العليم
ملاحظات / Remarks	تاريخ الاعتماد / Approval Date: ٨/٨/٢٠٢٢	مهندس الاستشاري / Cons. Eng.	مهندس المقاول / Cont. Eng.	البند / Inspected Item: تسليم منسوب التشمير على (102.0) كما موضح بالمرفق
				Item No: ١
نتيجة الفحص / Inspection Result:				
التوصيات / Recommendation:				
التوقيع / Signature:	الإسم / Name: أيمن محمد	المهندس المقيم للمشروع / Project R.E.	التوقيع / Signature:	الإسم / Name: أيمن محمد
التاريخ / Date: -----	التاريخ / Date: -----		التاريخ / Date: -----	التاريخ / Date: -----

١٠٠م^٢ على الأقل كل Send one - طلبت عينات اختبار

Accepted



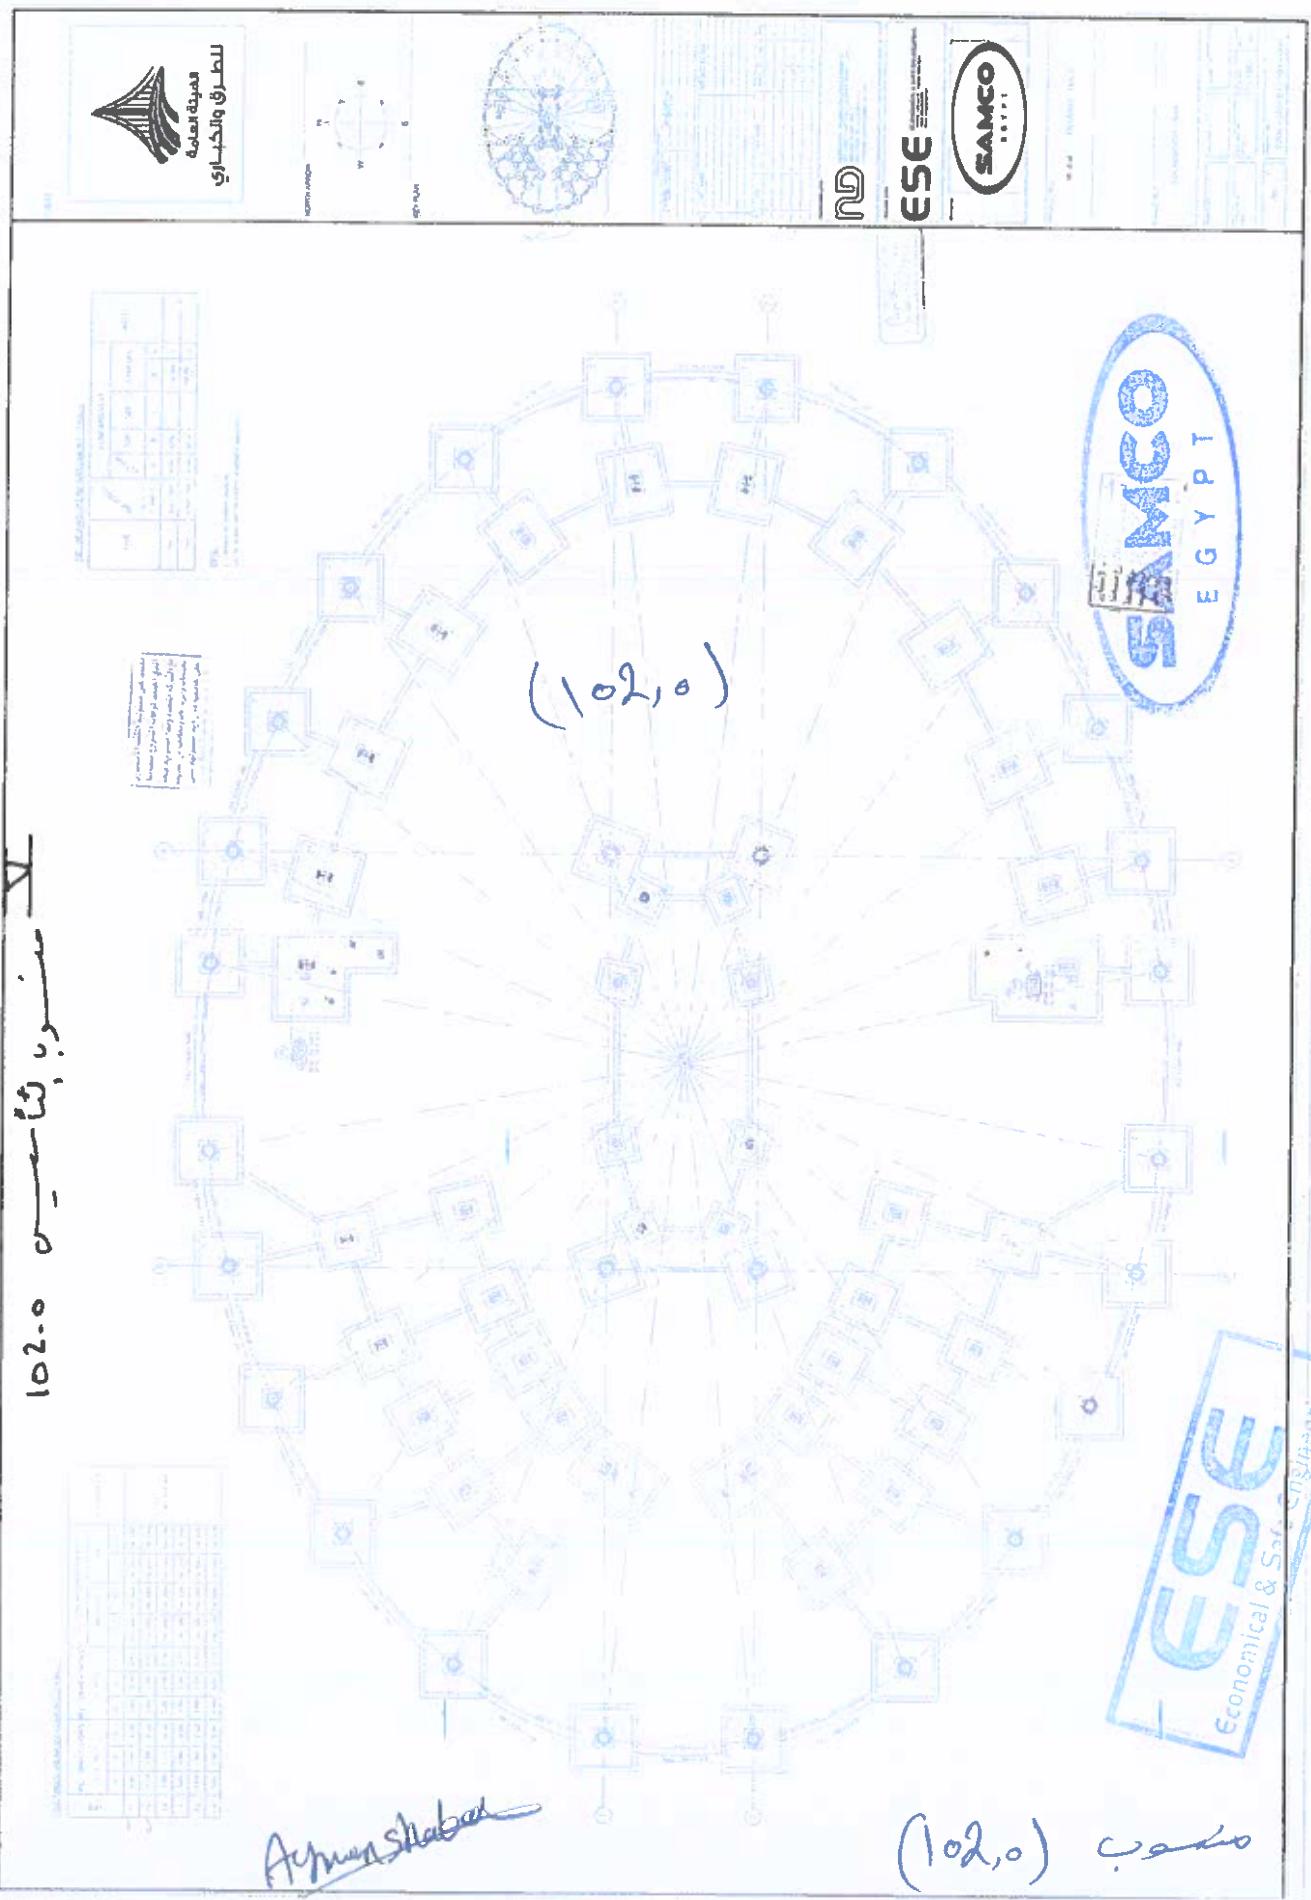



Work Inspection Requests				طلب فحص افضل	
				Project / المشروع	
				مشقة الأتوبيسات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ	
				القطب الدارسي	
Building Name		Name of the building		Contractor / المقاول	
Mech.	مساحة	Finishing	Civil	شركة سامكو الوطنية للتشييد	Contractor
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب		Material Name / بيل المواد	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-002		2-8-2022		Items No / رقم البند	
Attach / المرفقات		Specifications / بند المواصفات		Description Material / وصف المواد	
				Contractor / المقاول	
Name / الاسم		Project Manager		Name / مدير المشروع	
Signature / التوقيع				Signature / التوقيع	
P.O. Manager					
Remarks	Approval Date	Cons. Eng.	Cont. Eng.	Inspected Item	Item No
B	8-8-2022			نتيجة الفحص / Inspection Result	
نجد فواد عابد كما موضح بالمرفق					
القرار والتوصيات / Recommendation					
Name / الاسم	المهندس المقيم للمشروع	Name / الاسم	المهندس الاستشاري		
Signature / التوقيع	Project R.E	Signature / التوقيع	Consultant Eng		
Date / التاريخ		Date / التاريخ			




Ahmed Shabana
8/8/2022



- انتا كبير من اصحاب و ائمداد الاعمال .
- الشفافية مسؤولية المقاول -

٢٠١٩/٩/٣٠
Al-Hamra Shabab

دیکٹیو

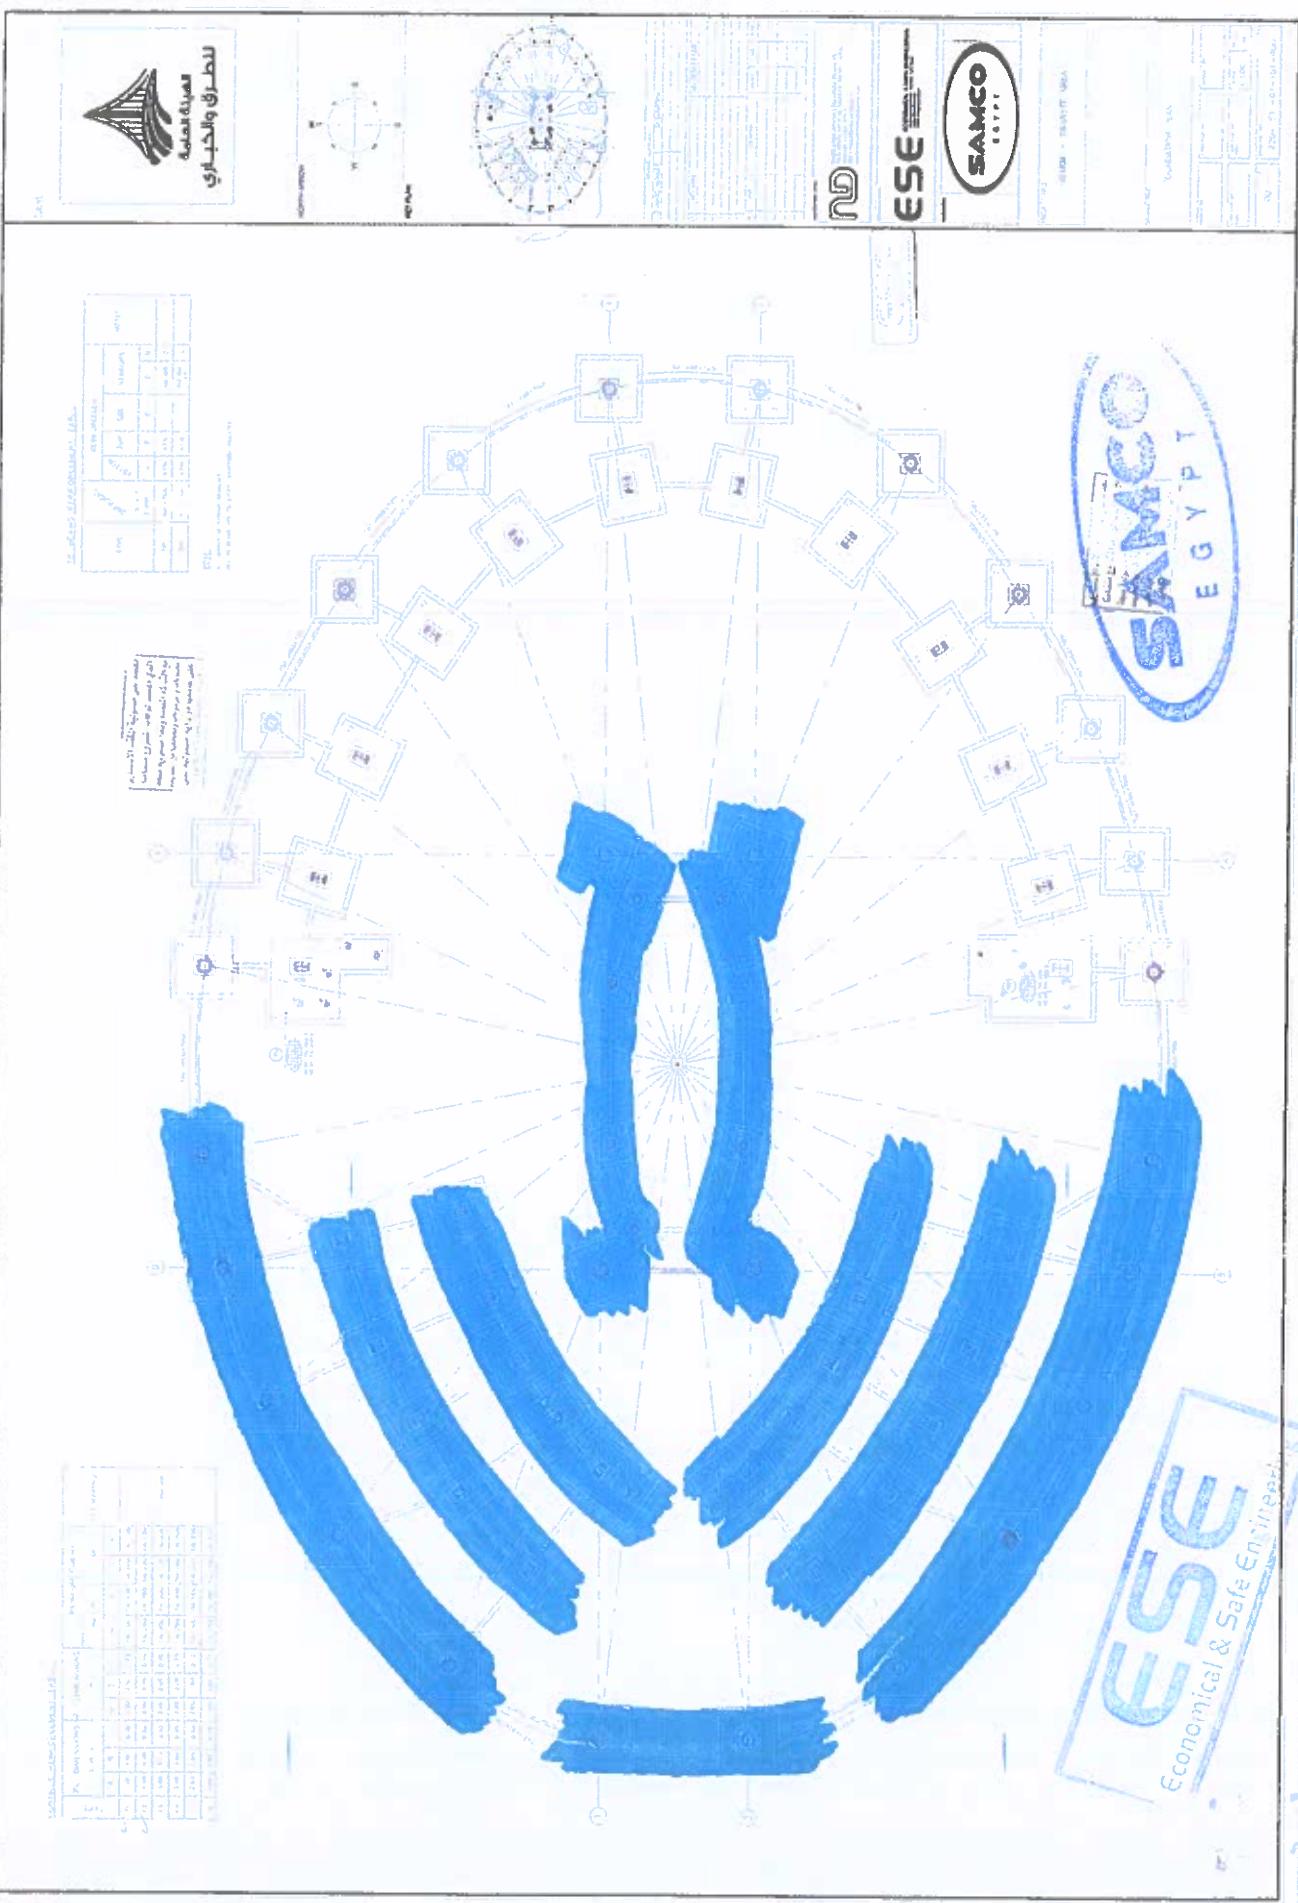




Work Inspection Requests طلب فحص العمل				Project / المشروع - عطاء التوريدات التكميلية بمدينة شرم الشيخ																													
<p style="text-align: center;">الادارى</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Building Name / اسم المبنى</td> <td colspan="2">Contractor / المقاول</td> </tr> <tr> <td>Mech.</td> <td>Finishing</td> <td>شركة سامكرو الوطنية للتسيير</td> <td>Contractor No.</td> </tr> <tr> <td>Request No. / رقم الطلب</td> <td>Request date / تاريخ الطلب</td> <td>Material Name / بيان المواد</td> <td>Item No. / رقم البند</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SAMCO-ESE-SHARM-IR-002</td> <td colspan="2">3-8-2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Attach / المرفقات</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Description Material / وصف المواد</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Specifications / بنود المواصفات</td> </tr> </table>				Building Name / اسم المبنى		Contractor / المقاول		Mech.	Finishing	شركة سامكرو الوطنية للتسيير	Contractor No.	Request No. / رقم الطلب	Request date / تاريخ الطلب	Material Name / بيان المواد	Item No. / رقم البند	SAMCO-ESE-SHARM-IR-002		3-8-2022				Attach / المرفقات				Description Material / وصف المواد				Specifications / بنود المواصفات		Contractor / المقاول	
Building Name / اسم المبنى		Contractor / المقاول																															
Mech.	Finishing	شركة سامكرو الوطنية للتسيير	Contractor No.																														
Request No. / رقم الطلب	Request date / تاريخ الطلب	Material Name / بيان المواد	Item No. / رقم البند																														
SAMCO-ESE-SHARM-IR-002		3-8-2022																															
		Attach / المرفقات																															
		Description Material / وصف المواد																															
		Specifications / بنود المواصفات																															
 Name / الاسم		Project Manager / مدير المشروع		 Name / الاسم																													
Signature / التوقيع		Project Manager		Signature / التوقيع																													
T.O. Manager / مدير المكتب				T.O. Manager / مدير المكتب																													
EGYPT				EGYPT																													
ملحوظات / Remarks	تاريخ الاعتماد / Approval Date	مهندس الاستشاري / Cons. Eng.	مهندس المقاول / Cont. Eng.	المفدوخ / inspected item	رقم البند / Item No.																												
				تسليم بجاية قواعد عادلة	1																												
B	8/8/2022			Inspection Result / نتائج الفحص																													
Recommendation / التوصيات																																	
 Name / الاسم		المهندس المقاول الشهود Project R.E.		 Name / الاسم																													
Ayman Shalaby / التوقيع		Signature / التوقيع		Consultant Eng / المهندس الاستشاري																													
Date / التاريخ				Date / التاريخ																													

Ayman Shalaby
8/8/2022



- التقويم موافق (تماماً) .
 - يعتمد به اذن في انتهاى (بخار لـ تأكيد من تسلیم مصلحة)

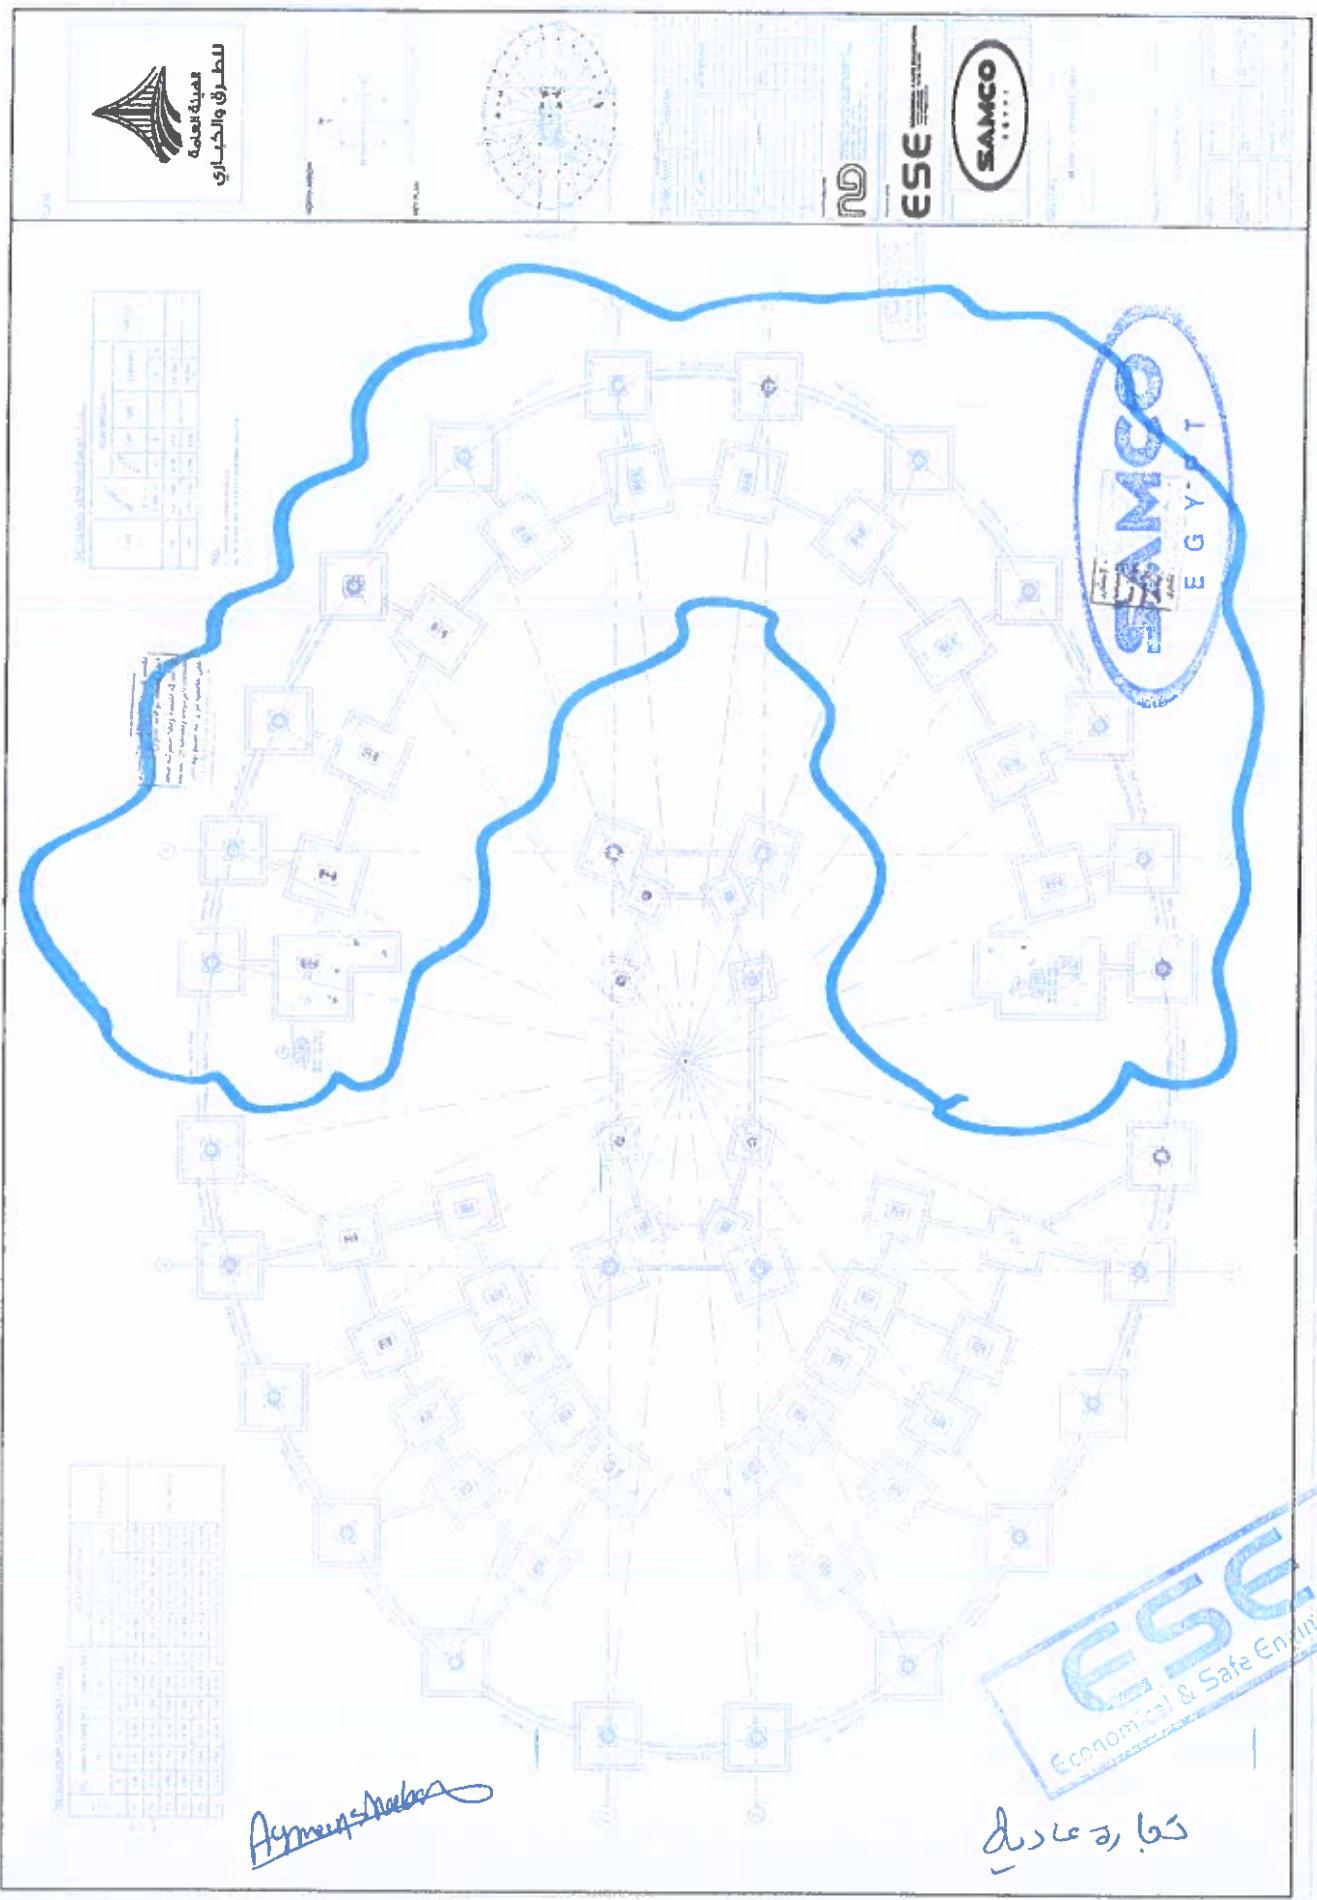




Work Inspection Requests				طلب بفحص أضطراري	
Building Name				Project / المنشئ - محطة التوليد الكهربائية مدينة شرم الشيخ	
				الطريق الدائري	
Type of work / نوع العمل				Contractor / المقاول	
Mech.	مساحة	الاعمار	Finishing	Civil	
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب		Material Name / بيان المواد	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-006		8-8-2022		Items No / رقم البند	
				Description Material / وصف المواد	
Bnd المواقف Specifications					
				Contractor / المقاول	
Name / الاسم Signature / الموقع		مدير المشروع Project Manager		Name / الاسم Signature / الموقع	
B		9/8/2022		T.O. Manager	
Remarks	Approval Date	Cons. Eng.	Cont. Eng.	Inspected Item	Item No
				تسليم نجارة فواد مسلحة كـ هو موضح بالمرفق	
				1	
Inspection Result / نتائج الفحص					
Recommendation / القرارات والتوصيات					
Name / الاسم Signature / الموقع Date / التاريخ		المهندس المقيم Project R.E.		Name / الاسم Signature / الموقع Date / التاريخ	
Ahmed Shaker 9/8/2022		Consultant Eng			

- النقوشه موقعة على المقاول



Ahmed Shaker
9/8/2022

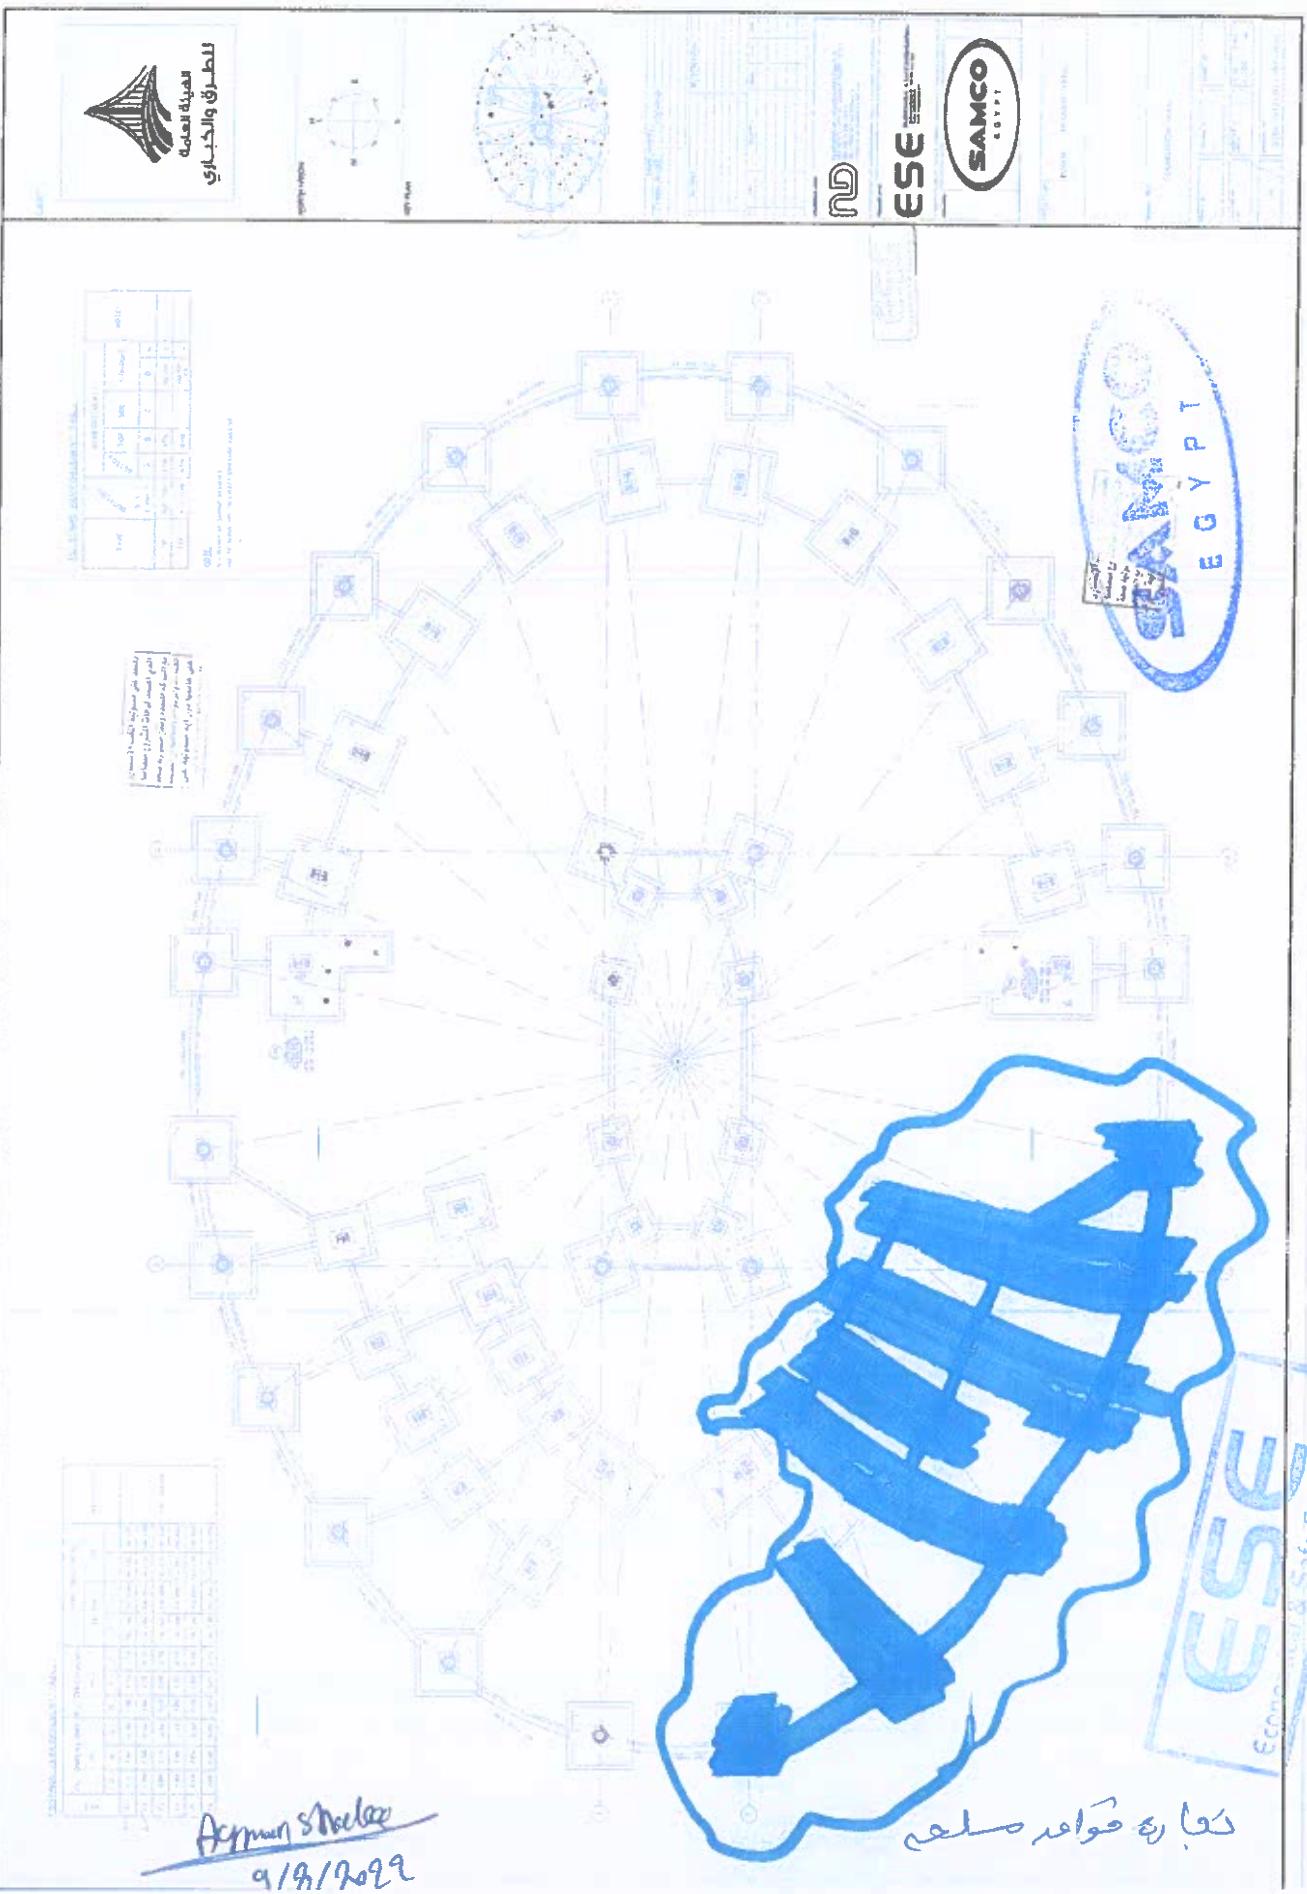

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE (M)	PC. DIMENSIONS		RC. DIMENSIONS		REINFORCEMENT				REMARKS		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	FNL (102.00)
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	

TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS					REINFORCEMENT	NOTES
	BOTTOM		TOP	SIDE	STIRRUPS		
b X t (mm)	A	B	C	D	N		
TB1	300x700	6116	6116	-	T10-150	2	
TB2	400x700	6118	6118	-	T10-150	4	CS

NOTE:
N = NUMBER OF STIRrup BRANCHES
ALL TB BEAMS ARE TB EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Aymen Sharara
9/18/2022

Net weight 0.65




Work Inspection Requests طلب فحص أعمل				Project / المشروع - محطة الموليات الكهربائية بمنطقة شرم الشيخ	
Building Name / اسم المبنى				Contractor / المقاول شركة سامكو الوطنية للتبريد والتكييف	
Mech	مساحة	Finishing	Civil	Items No. / رقم الماد	Contractor / المقاول
Request No. / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب		Description Material / وصف المواد	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-003		٥ - ٤ - ٢٠٢٢		Specifications / بند المواصفات	
Name / الاسم		Project Manager مدير المشروع		Name / الاسم	
Signature / توقيع		Project Manager		Signature / توقيع	
EGYPT ملحوظ		مهندس المقاول		T.O. Manager	
Remarks	Approval Date	Cons. Eng.	Cont. Eng.	Inspected Item	Item No.
				تسليم حاده قرارد مسلحه كما هو موضح بالمرفق	
B	٢٦/٨/٢٠٢٢	Inspection Result نتائج الفحص			
Recommendation / التوصيات					
Name / الاسم		المهندس المقيم للمشروع	Name / الاسم		المهندس الاستشاري
Signature / التوقيع		Project R.E.	Signature / التوقيع		Consultant Eng
Date / التاريخ			Date / التاريخ		

- ضرورة مرئي للمشروع اعمل جميع المطارات واطبع ورفع الصور للبيان على
 - رسم القراءة والفحص قبل العصب مباشرةً (Cover Concrete)

Ayman Shabbeer
10/8/2022



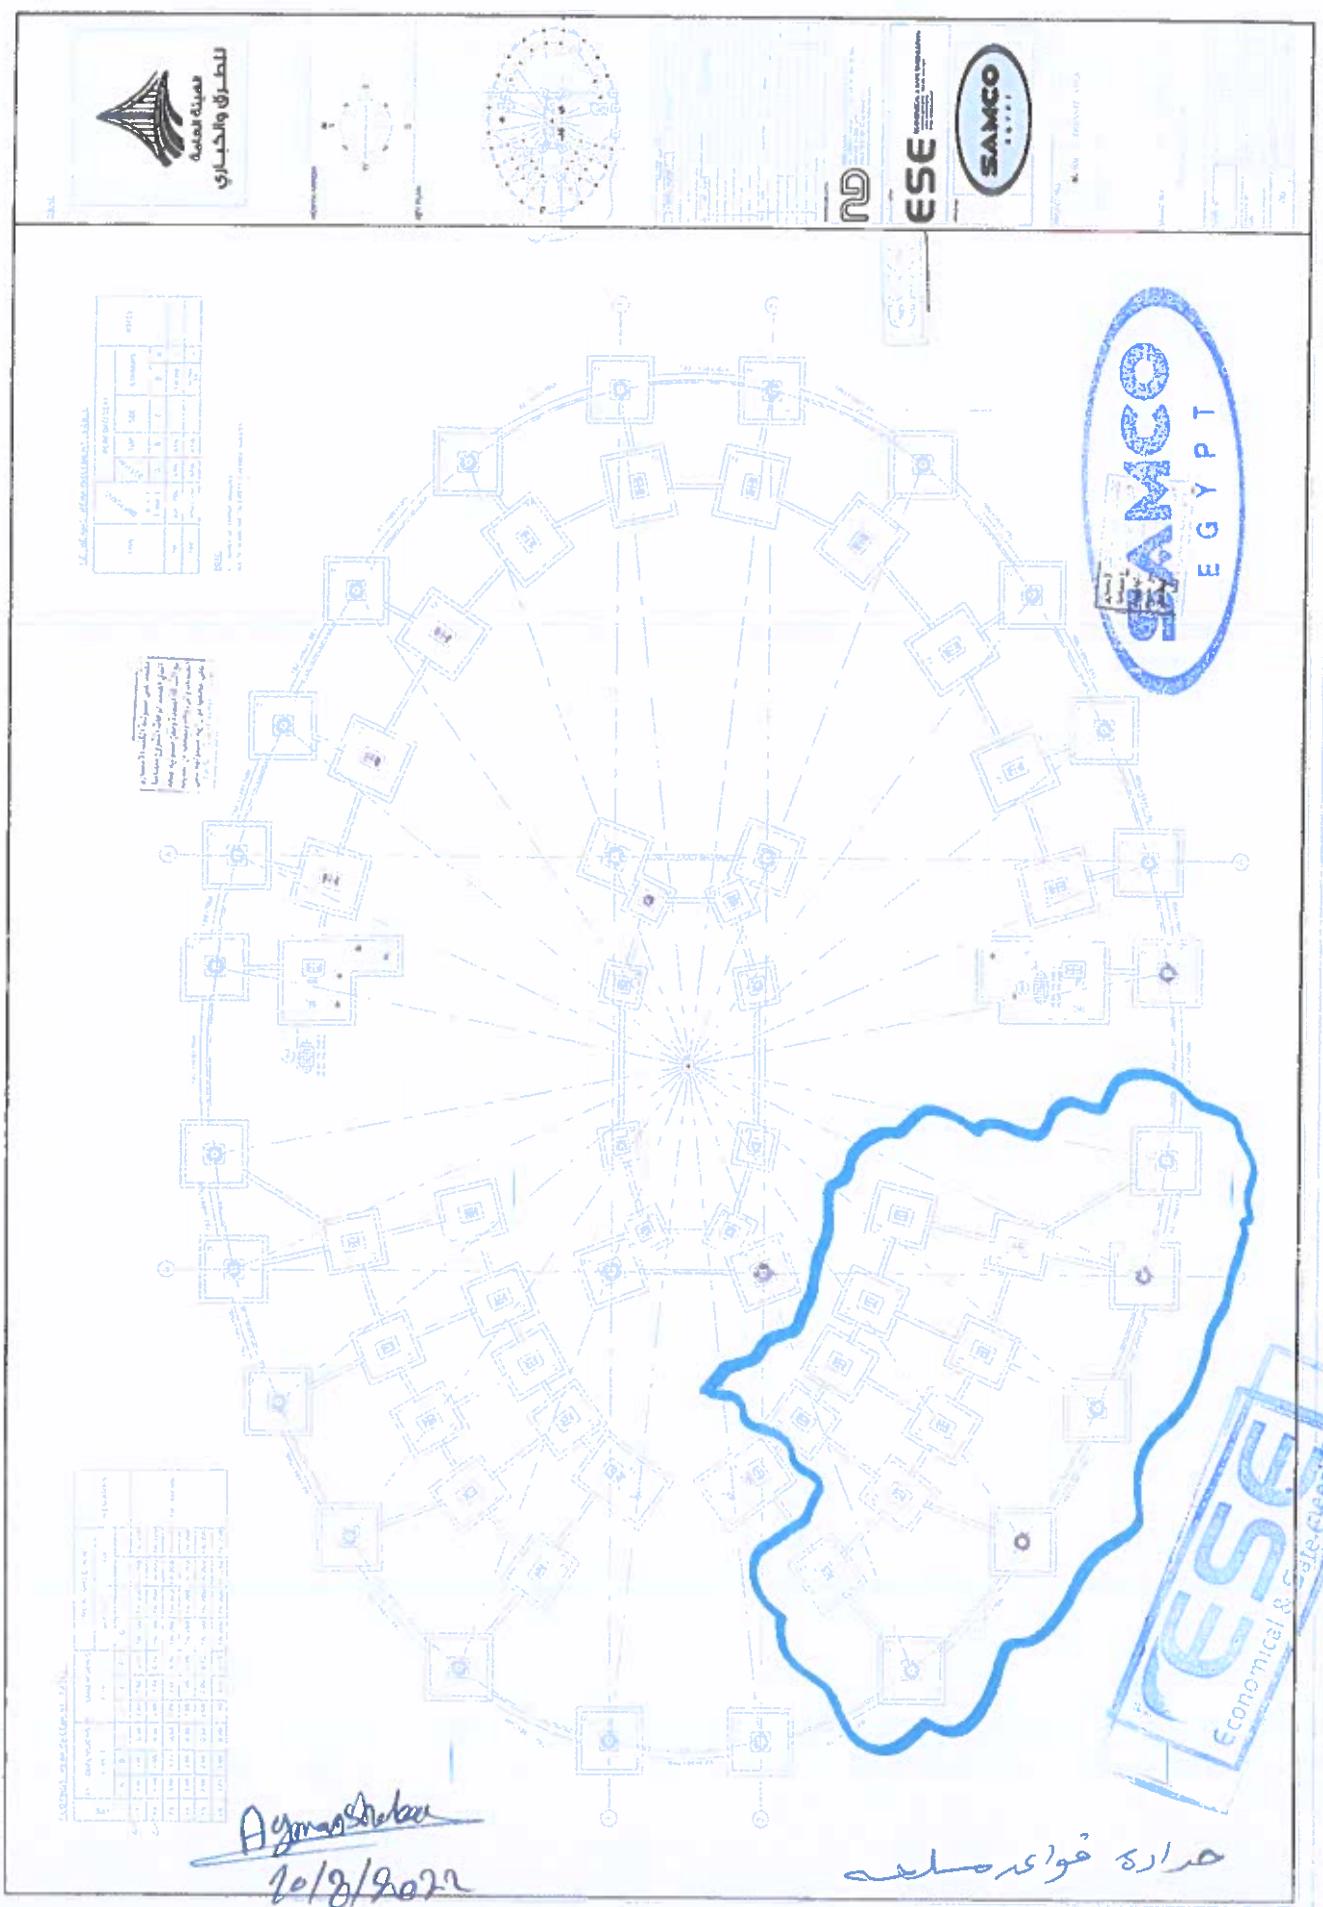

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	PC. DIMENSIONS (M)		RC. DIMENSIONS (M)		REINFORCEMENT					REMARKS	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	

TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS $b \times l$ (mm)	REINFORCEMENT			NOTES
		BOTTOM	TOP	SIDE	
TB1	300x700	6T16	6T16	-	T10-150 2
TB2	400x700	6T18	6T18	-	T10-150 4

NOTE:



N = NUMBER OF STIRRUP BRANCHES

ALL TB BEAMS ARE TB EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Ayman Shalash
10/18/2022




Building Name / اسم المبنى		Project / محله المؤسسات الكبيرة بمدينة شرم الشيخ			
Type of work / نوع العمل		Contractor / المقاول			
Mech	مساحة	كشط	شركة سامكو الوطنية للتشييد		
Request No / رقم الطلب		Finishing	Civil		
SAMCO-ESE-SHARM-IR-013		Request date / تاريخ الطلب			
		Material Name / بديل المواد			
		Items No / رقم البند			
		Description Material / وصف المواد			
		Contractor / المقاول			
 Signature / توقيع		Name / الاسم مدير المشروع Project Manager			
 Signature / توقيع		Name / الاسم مدير المكتب الفرع EGYPT			
Remarks		Approval Date	Cons. Eng.	Inspected Item	Item No
			Cont. Eng.	عزل فواد وشداد	١
B		10/8/2022		Inspection Result / نتائج الفحص	
				Recommendation / التوصيات	
 Signature / توقيع		Name / الاسم المهندس محمد شبانة Project R.E		Name / الاسم المهندس الاستشاري Ayman Shabana Consult. Eng	
Date / التاريخ		Signature / توقيع		Signature / توقيع	
10/8/2022					

- الـ عـارـة عـلـى الـأـمـاـكـيـلـكـسـتـوـهـ وـالـقـفـيفـ.
- عـدـم الـرـوـدـمـ بـلـ جـعـافـ الـبـيـتـوـمـيـنـ عـلـى الـأـنـفـ بـعـدـ مـوـرـ ٢٠١٠ـ.

Ayman Shabani
✓ 20/8/2022



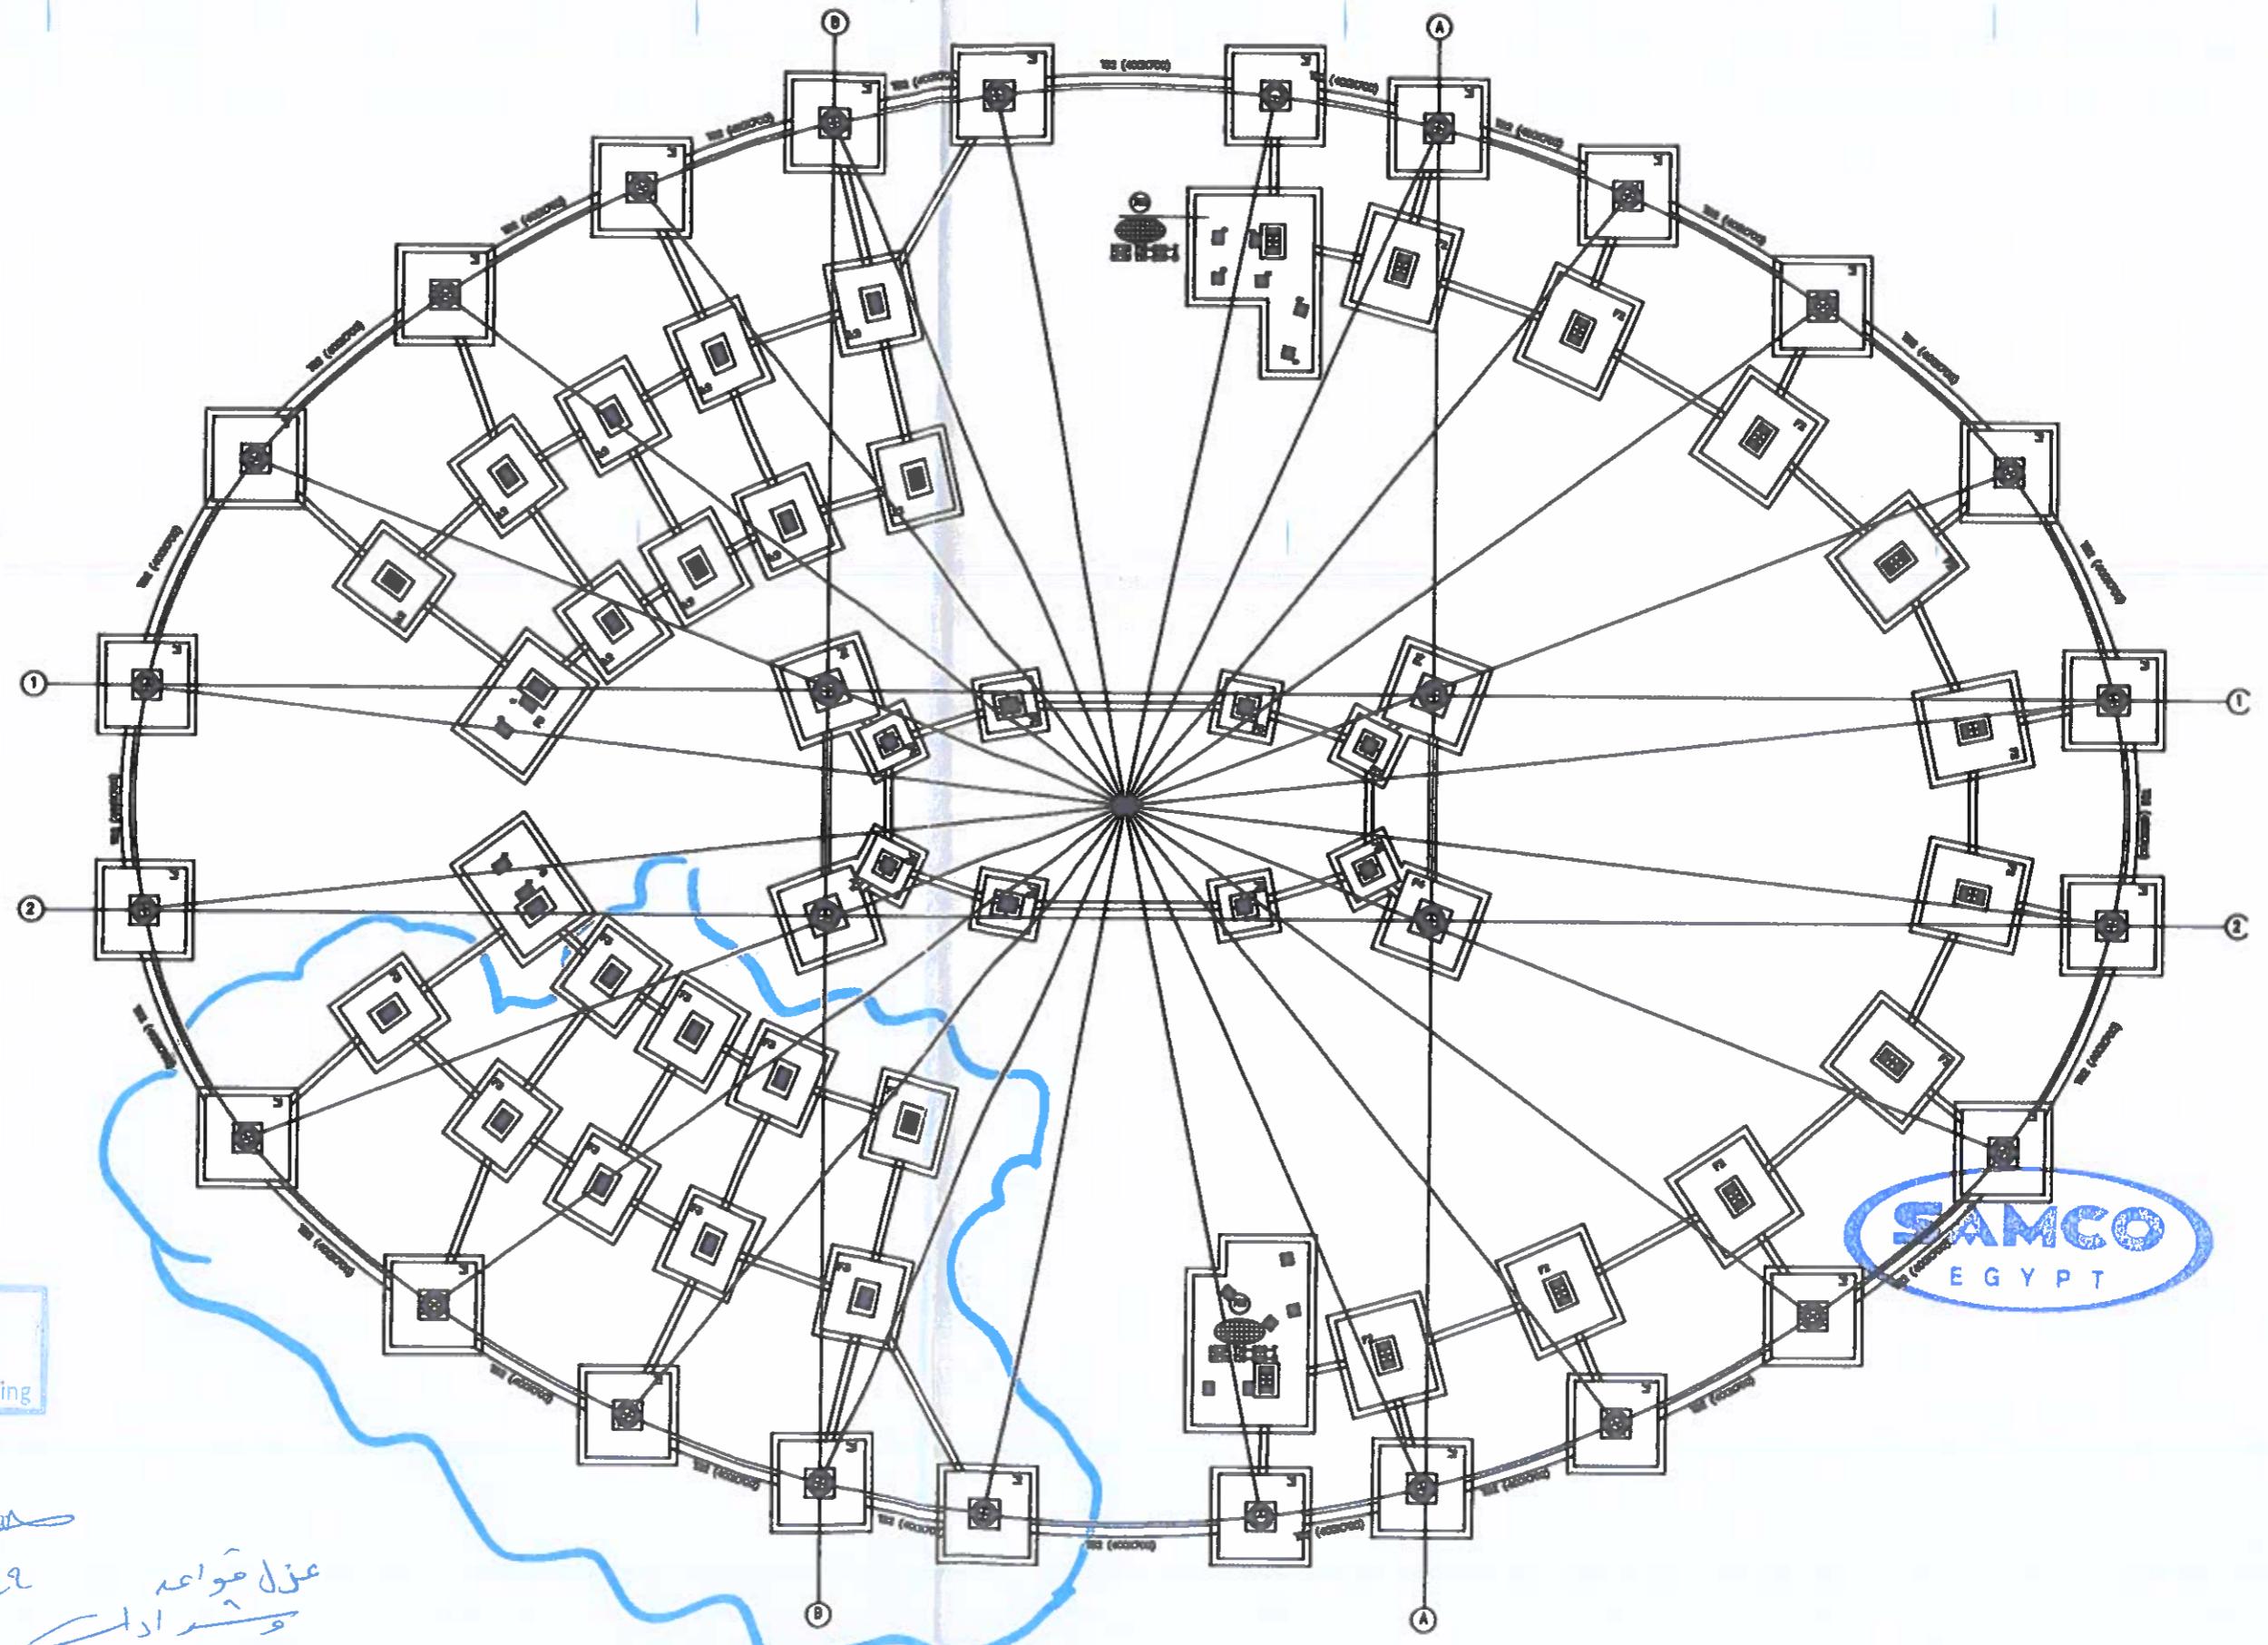




Building Name				Project / المشروع		
Building Name				شركة سامكر الوطنية للتنمية العنوان		
Type of work		Building		Contractor/ المقاول		
Mech.	صلبة	Finishing	Civil	Items No/ رقم المقدمة		
Request No/ رقم الطلب		Request date/ تاريخ الطلب		:Material Name/ بيان الماد		
SAMCO-ESE-SHARM-IR-004		٢٠٢٢-١٢-٣٢		:Description Material/ وصف الماد		
		بند المواصفات Specifications				
AMCO EGYPT		Name/ الاسم	مدير المشروع Project Manager	Contractor/ المقاول		
		Signature/ توقيع		Name/ الاسم		
				Signature/ توقيع		
Remarks		Approval Date	Cons. Eng.	Cont. Eng.	Inspected Item	.item No
					تسليم نجارة قواعد مسلحة كما هو موضع بالمرفق	I
B					نتيجة الفحص	
Inspection Result / نتيجة الفحص						
Recommendation / التقرير والتوصيات						
Name / الاسم		الهندسة المقديمة للمشروع	Name / الاسم		المهندس المستشاري	
Signature / التوقيع		Project R.E	Signature / التوقيع		Consultant Eng	
Date / التاريخ			Date / التاريخ			

- تغيير الألوان الخشبية اماضاته -

Afghan Shulan
13/8/2022



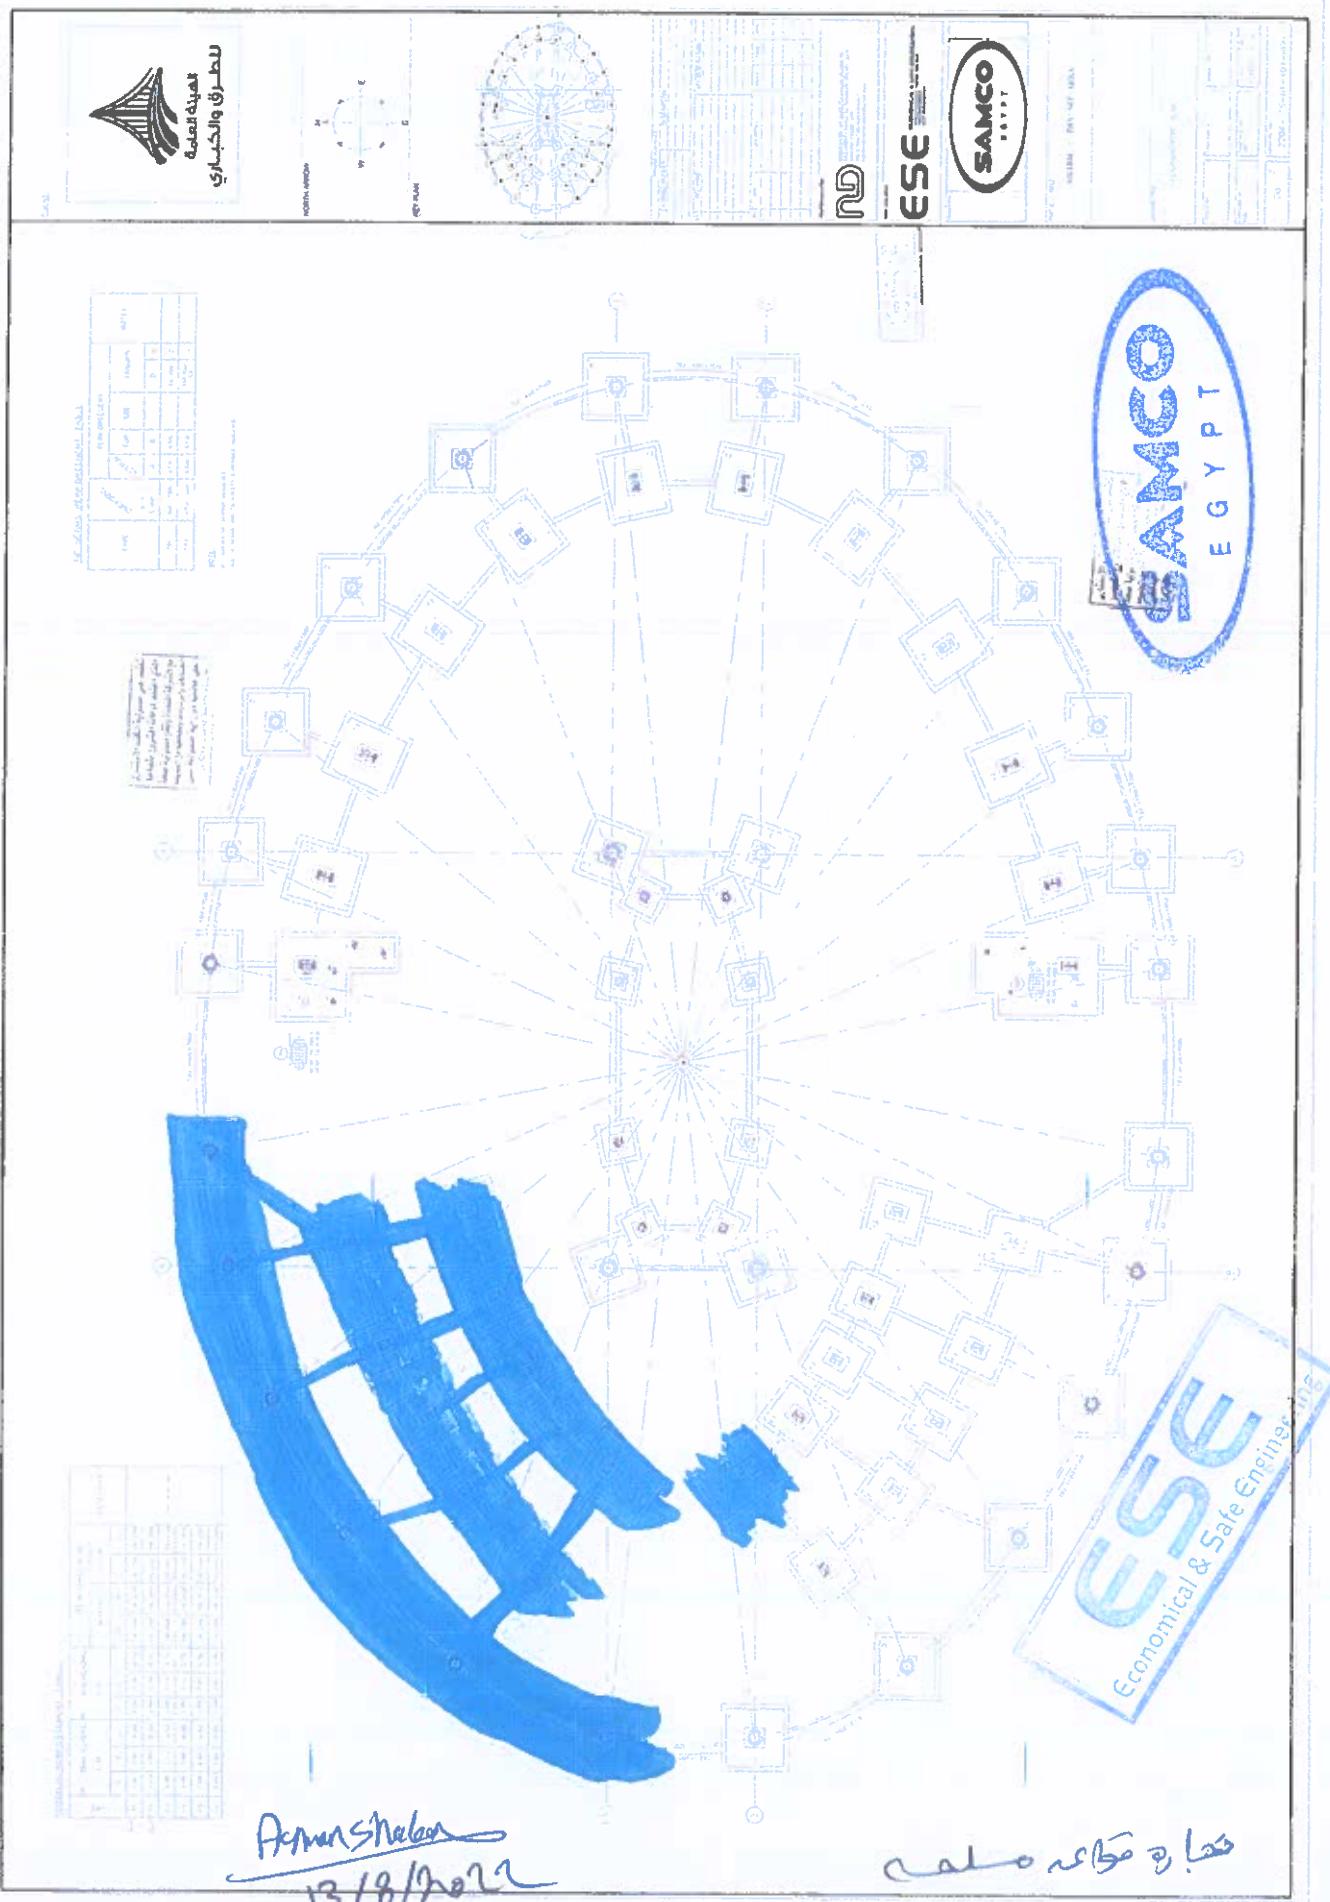

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	PC. DIMENSIONS (M)			RC. DIMENSIONS (M)			REINFORCEMENT				REMARKS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	FNL (102.00)
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	

THE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS			REINFORCEMENT		NOTES
	b X t (mm)	BOTTOM		TOP	SIDE	
		A	B	C	D	N
TB1	300x700	6T16	6T16	-	T10-150	2
TB2	400x700	6T18	6T18	-	T10-150	4

NOTE:
N = NUMBER OF STIRRUP BRANCHES
ALL THE BEAMS ARE TB EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Aswan Shala
13/18/2022



ESE
Economical & Safe Engineering




طلب فحص اضطراري Work Inspection Requests

Project / المشروع		Building Name / اسم المبنى			
مشهورة بالبرية بمدينة شرم الشيخ الطريق الدائري					
Type of work / نوع العمل	Mech. مساحة	Finishing / تطبيق	Civil / انتاج		
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب	13-8-2022		
SAMCO-ESE-SHARM-IR-005		: Material Name / بيان المواد			
		: Description Material / وصف المواد			
Bnd. المعايير Specifications					
Name / الاسم Signature / التوقيع	Manager / مدير المشروع	Name / الاسم Signature / التوقيع	Project Manager / مدير المشروع		
Remarks / ملاحظات	Approval Date / تاريخ الاعتماد	Cons. Eng. / مهندس الاستشاري	Cont. Eng. / مهندس المقاول	Inspected item / المفتش	Item No / سلسلة
				تسليم حداه قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق	1
B					Inspection Result / نتائج المفتش
Recommendation / التقرير والتوصيات					
Name / الاسم Signature / التوقيع Date / التاريخ		Project R.E / المفتش المقيم للمشروع	Name / الاسم Signature / التوقيع Date / التاريخ		Consultant Eng / المهندس الاستشاري
Ammar Shabana 14/8/2022		Project R.E	Ammar Shabana 14/8/2022		Consultant Eng



Ammar Shabana
14/8/2022

- إدارة مدارس ارباح .
- إدارة السكك .
- دوامات حفظ الغرب .

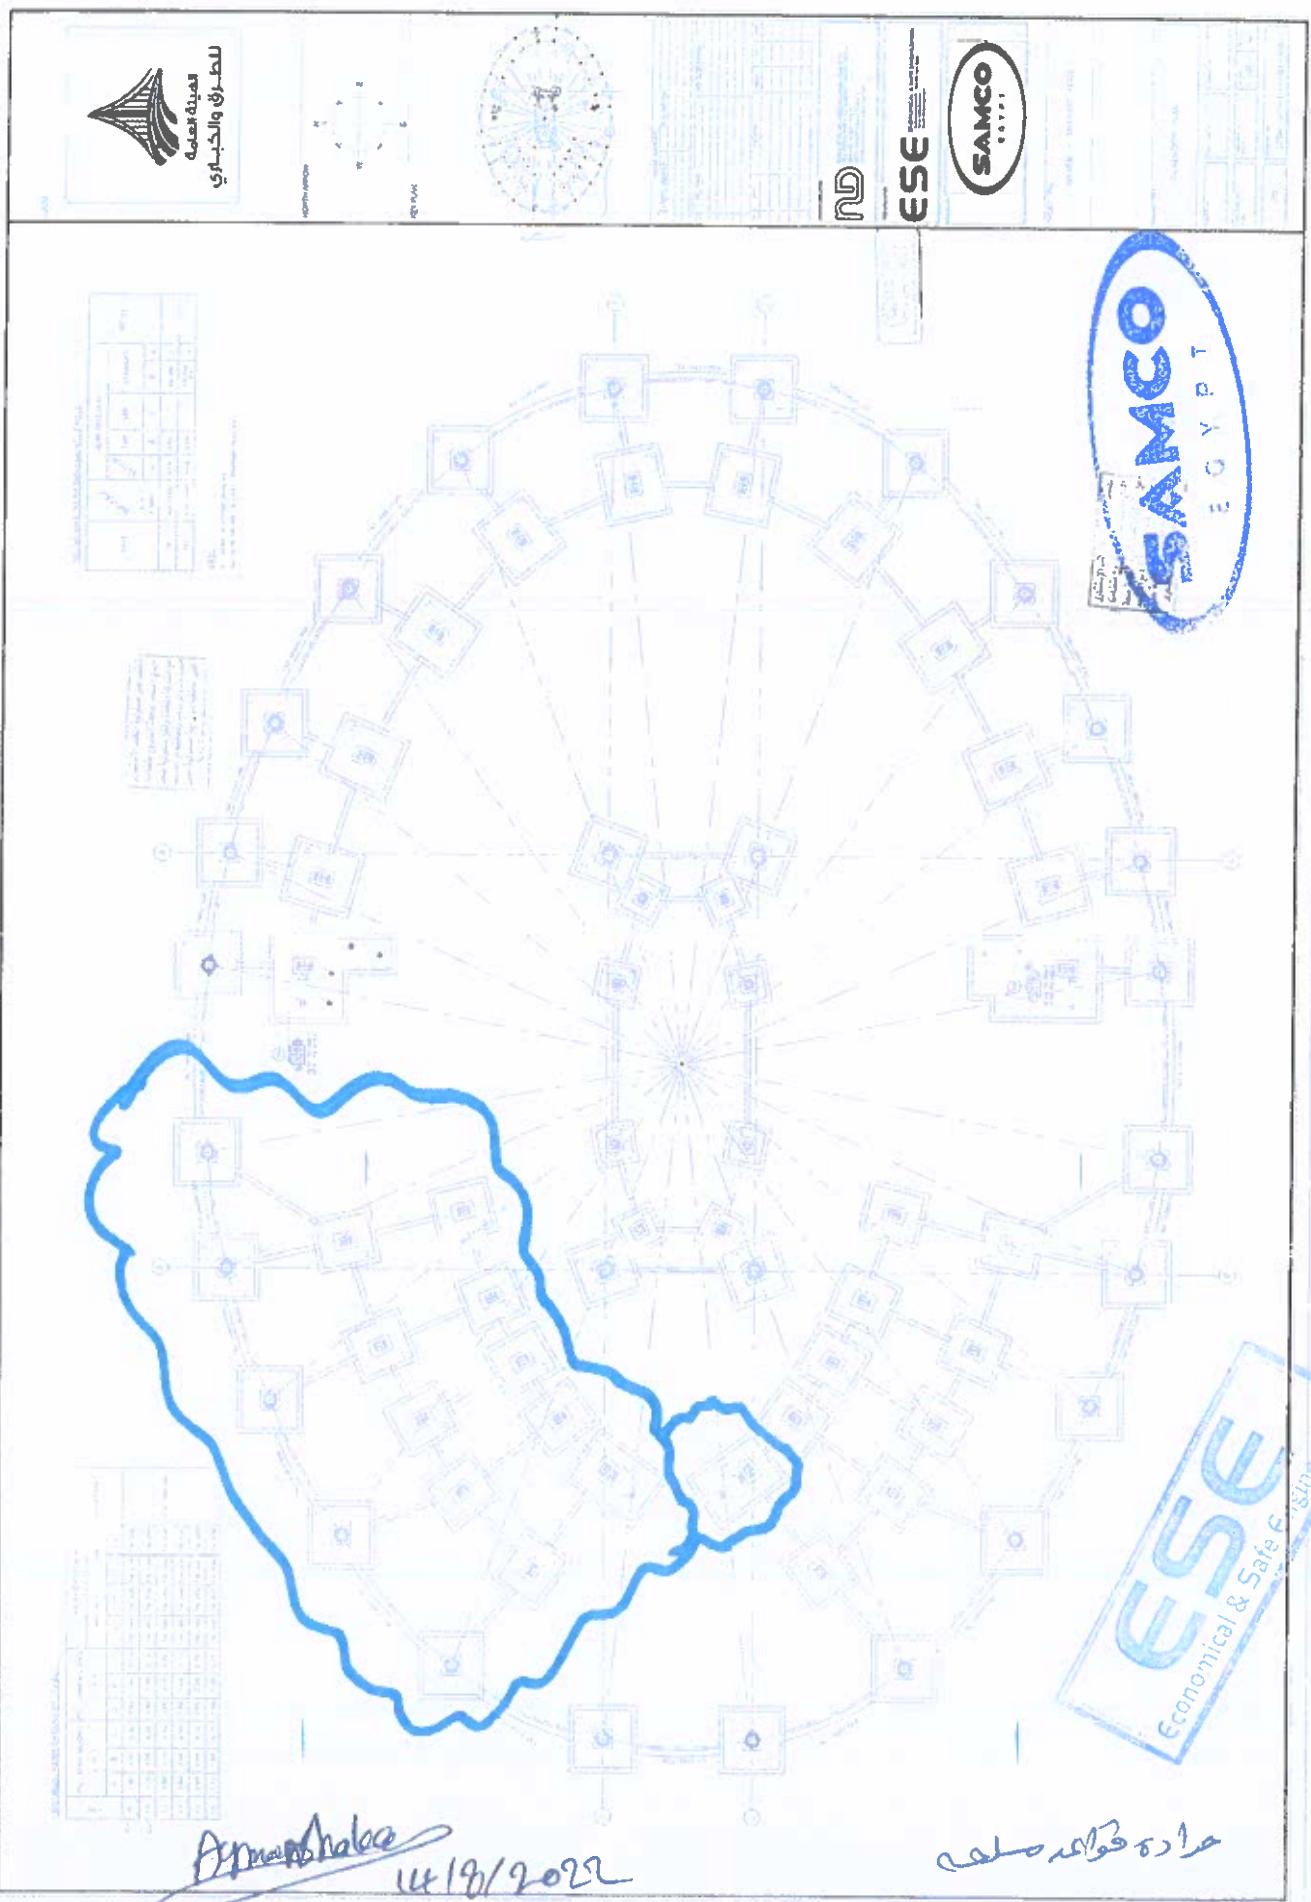

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE #	PC. DIMENSIONS (M)			RC. DIMENSIONS (M)			REINFORCEMENT				REMARKS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	

THE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS			REINFORCEMENT			NOTES
	BOTTOM			TOP	SIDE	SIRRUPS	
	b X t (mm)	A	B	C	D	N	
TB1	300x700	6T16	6T16	-	T10-150	2	
TB2	400x700	6T18	6T18	-	T10-150	4	

NOTE:

N = NUMBER OF SIRRUP BRANCHES.
ALL TIE BEAMS ARE TIR EXCEPT OTHERWISE INDICATED.



Achman Shekar
14/18/2022



طلب لفحص أعمال

Work inspection Requests

Building Name / اسم المبنى		Project / معرفة الأشغال الكهربائية بمدينة شرم الشيخ الطريق الداربي	
Mech.	Surface	Finishing	Civil
Type of work / نوع العمل		Contractor / المقاول	
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب	Material Name / (بيان المواد)
SAMCO-ESE-SHARM-IR-004		20-8-2022	Items No / رقم البند
		Description Material / وصف المواد	
		Name / الاسم Project Manager مدير المشروع	
Signature / توقيع		Signature / توقيع T.O. Manager مدير المكتب	
EGYPT ملحوظات		Remarks	
Approval Date / تاريخ الاعتماد		Cons. Eng. / مهندس الاستشاري	Cont. Eng. / مهندس المقاول
B 21/8/2022			
Inspection Result / نتائج الفحص			
Recommendation / التوصيات			
Name / الاسم Ayman Shabana توقيع / Signature		Consultant / المهندس الاستشاري	
Project R.E / التاريخ		Date / التاريخ	

SAMCO

Name / توقيع

EGYPT / مصر

Signature / توقيع

T.O. Manager / مدير المكتب

- زيارة سلة اريلات .
- زيارة السكرت تحص العددي
- التعميم صولية المقاول .

Ayman Shabana
21/8/2022



FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	PC. DIMENSIONS (M)				RC. DIMENSIONS (M)				REINFORCEMENT				REMARKS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200			
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200			
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200			
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200			
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200			
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200			


TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS				REINFORCEMENT				NOTES
	BOTTOM (mm)		TOP	SIDE	STIRRUPS				
	A	B	C	D	N				
TB1	300x700	6116	6116	-	T10-150	2			
TB2	400x700	6118	6118	-	T10-150	4			

NOTE:
N = NUMBER OF STIRRUP BRANCHES
ALL THE BEAMS ARE TB EXCEPT OTHERWISE INDICATED.

Agmar Nalek
01/3/2022



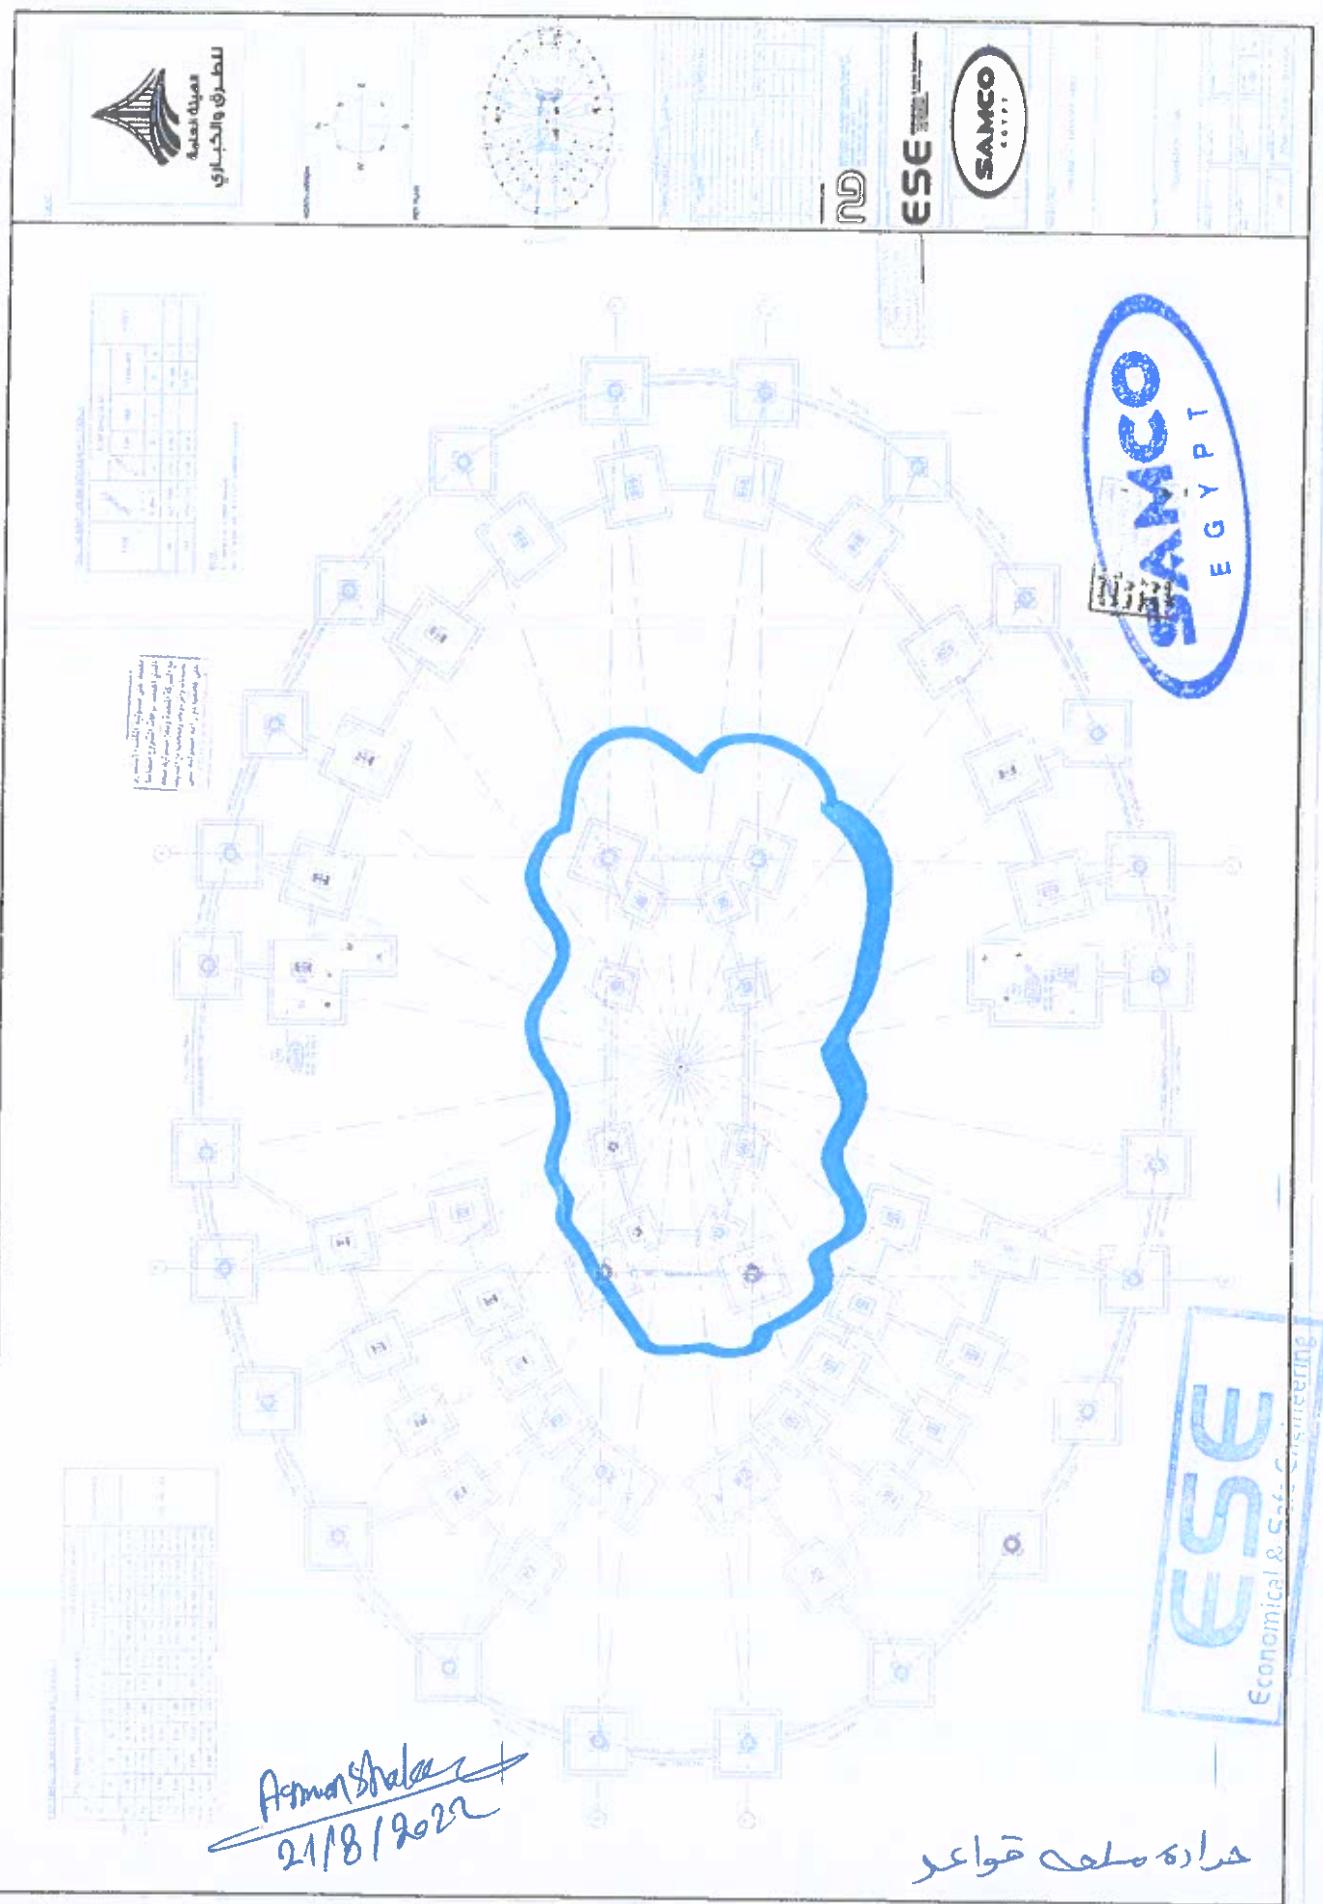



Work Inspection Requests طلب فحص أعمال					
Building Name : Building Name			Project / المترجع - هيئة الأوربيات الكهربائية مدينة شرم الشيخ العنوان/ العنوان		
Mech.	مساحة	النحوت	شركة سامكرو الوطنية للتشييد	Contractor المقاول	
Request No رقم الطلب		Request date تاريخ الطلب	Material Name بيان المواد	Items No رقم البند	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-005			20-8-2022	Description Material وصف المواد	
B شهادة			Project Manager مدير المشروع	Name/ الاسم	Signature التوقيع
Signature التوقيع			Project Manager	Name/ الاسم	Signature التوقيع
Remarks	Approval Date تاريخ الاعتماد	Cons. Eng. مهندس الاستشاري	Cont. Eng. مهندس المقاول	Inspected Item البند	Item No. مصل
				بيان تفاصيل ملحوظة كما هو موضح بالمرفق	
B	21-8-2022	Inspection Result نتائج الفحص			
Recommendation / التقرير والتوصيات					
Name/ الاسم			المهندس المقيم للمشروع	Name/ الاسم	
Signature التوقيع			Project R.E	Signature التوقيع	
Date التاريخ			Date التاريخ		

- التفويض صدوره امتحان
- صدوره الرفع اصحابه



Ayman Shabot
21/8/2022

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	PC. DIMENSIONS (M)			RC. DIMENSIONS (M)			REINFORCEMENT				REMARKS	
	A	B	C	D	E	F	BOTTOM		TOP			
							G	H	I	J		
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200		
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200		
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200		
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200		
F5	2.60	2.60	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200		
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200		

FNL (102.00)



TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS b X t (mm)	REINFORCEMENT					NOTES	
		BOTTOM	TOP	SIDE	STIRRUPS			
					A	B		
TB1	300X700	6T16	6T16	-	T10-150	2		
TB2	400X700	6T18	6T18	-	T10-150 CS	4		

NOTE:


N = NUMBER OF STIRRUP BRANCHES

ALL TIE BEAMS ARE TB1 EXCEPT OTHERWISE INDICATED.

Ammar Ghale
21/10/2022

~~Appendix 1
21/01/2022~~

also by

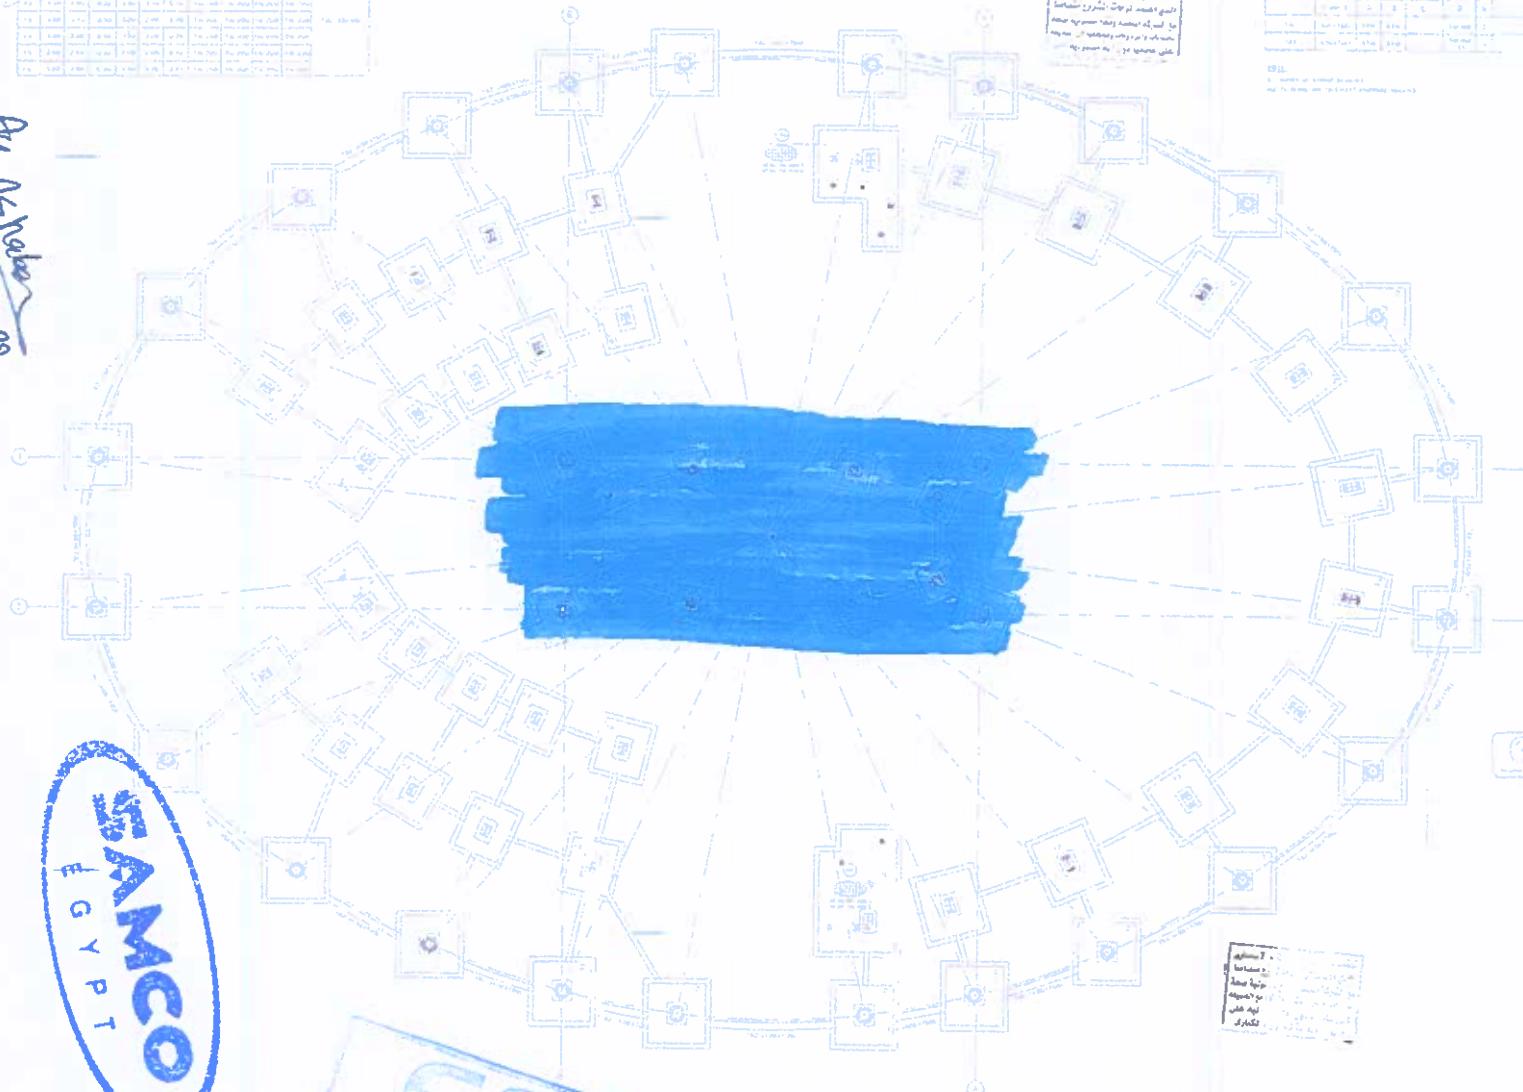




طلب فحص أصل

Work Inspection Requests

Building Name / اسم المبنى		Project / Project Name - محطة الأوزان الكهربائية بمدينة شرم الشيخ	
Type of work / نوع الأعمال		Contractor / المقاول	
Mech	مساحة	اعماري	شركة سامكو الوطنية للتشييد
		Finishing	Civil
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-014		22 - 8 - 2022	
Attach / المرفقات		Material Name / بيان المواد	
		Items No / رقم البند	
		Description Material / وصف المواد	
Name / الاسم		Contractor / المقاول	
Signature / توقيع		Name / الاسم	
Project Manager		P.O. Manager	
Signature / توقيع		Signature / توقيع	
Remarks / ملاحظات		Inspected Item / البند	
Approval Date / تاريخ الاعتماد		Item No / مسلسل	
		Cons. Eng.	Cont. Eng.
		Rejected Items / عزل تواعد وشادات	
B		Inspection Result / نتائج الفحص	
Recommendation / التوصيات			
Name / الاسم		Name / الاسم	
Signature / توقيع		Signature / توقيع	
Date / التاريخ		Date / التاريخ	

- النكارة الجديدة بيد الصواعده قبل الردم

Ayman Shabana
23/8/2022

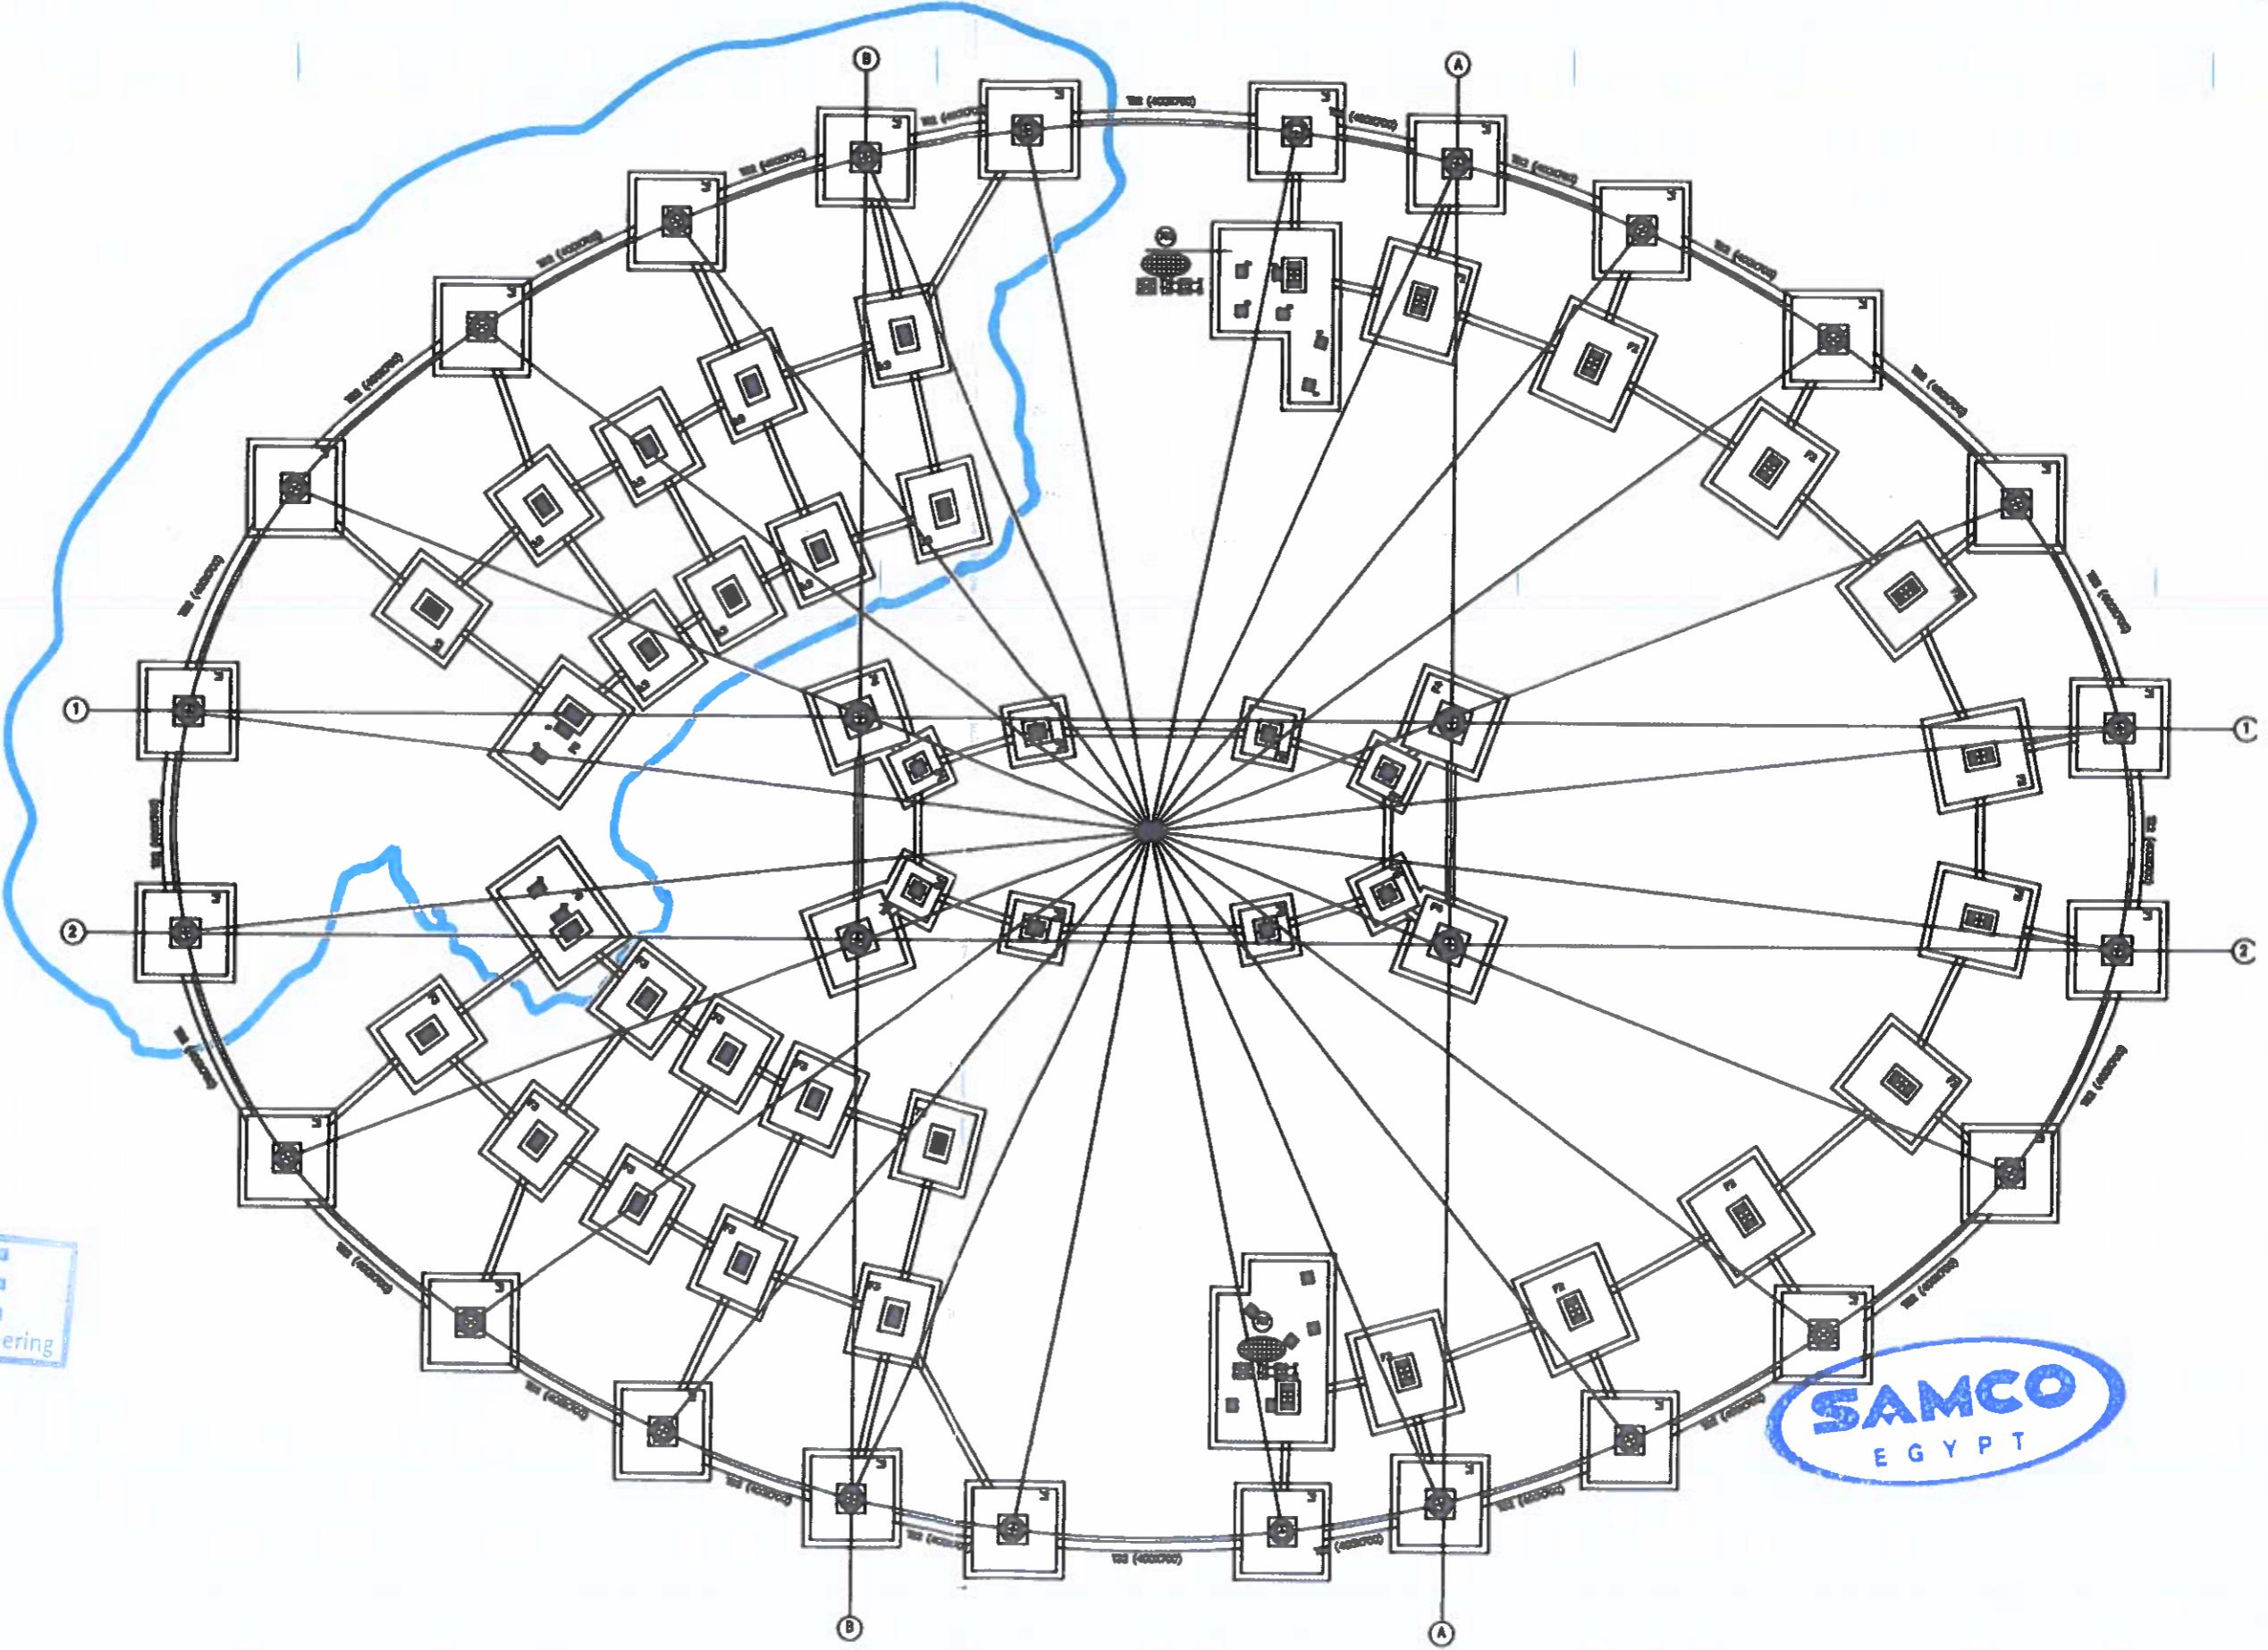


ESE
Economical & Safe Engineering

SAMCO
EGYPT




طلب فحص أعمال

Building Name		Project / المترقب / محطة التوليد الكهربائية بمدينة شرم الشيخ		
Mech.	مساحة	النهايات	شركة سامكو الوطنية للمقاولات	
		Finishing	Contractor / المقاول	
Request No / رقم الطلب		Request date / تاريخ الطلب	Material Name / بولي المودع	
SAMCO-ESE-SHARM-IR-006		24/8/2022	Items No / رقم البند	
		بند المواصفات	Description Material / وصف المواد	
		Specifications	Contractor / المقاول	
 EGYPT SAMCO		Name / الاسم Signature / توقيع	مدير المشروع Project Manager	
Remarks B		Approval Date / تاريخ الاعتماد 28/8/2022	Cons. Eng. / مهندس الاستشاري Cont. Eng. / مهندس المقاول	Inspected Item / المفتش Item No /編號 تسليم حالي قواعد مسلحة كما هو موضح بالمرفق
				Inspection Result / نتائج الفحص
				Recommendation / القرار والوصيات
Ayman Mohamed Sharab Ayman Sharab 25/8/2022		Name / الاسم Signature / توقيع Date / التاريخ	Project R.E / المفتش Signature / توقيع Consultant Eng / المهندس الاستشاري	Date / التاريخ

- زيارة السكرتير نصف القراءة
- زيارة ملء ارتباط



Ayman Sharab
25/8/2022

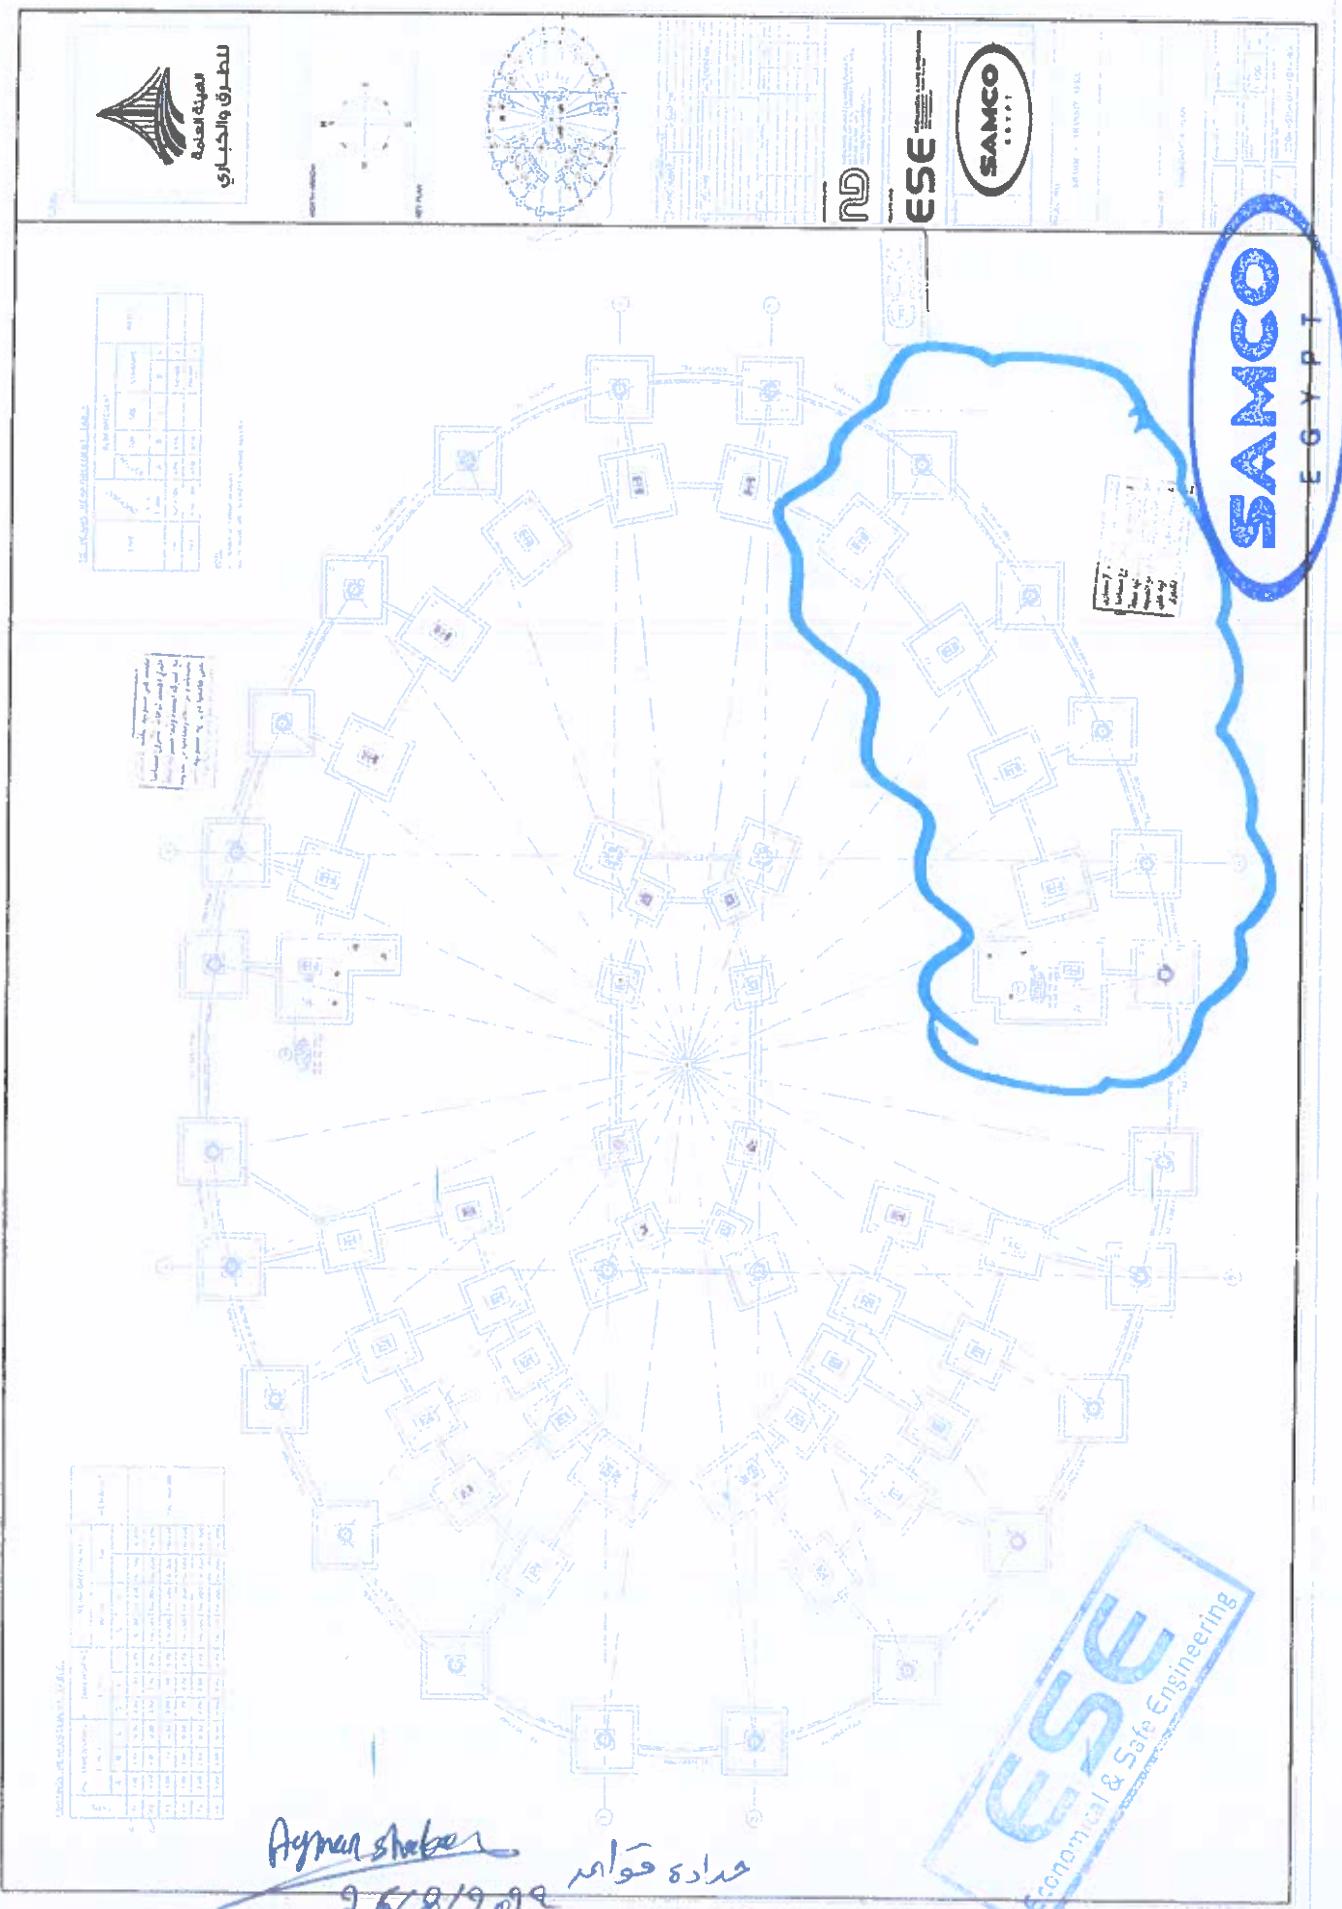

FOOTINGS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	PC. DIMENSIONS (M)			RC. DIMENSIONS (M)			REINFORCEMENT				REMARKS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
F1	4.10	4.10	0.30	3.50	3.50	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F2	4.40	4.00	0.30	3.80	3.40	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F3	3.80	3.40	0.30	3.20	2.80	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F4	3.80	3.80	0.30	3.20	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F5	2.50	2.50	0.30	2.00	2.00	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	
F6	5.20	3.80	0.30	4.60	3.20	0.70	T16-200	T16-200	T16-200	T16-200	

TIE BEAMS REINFORCEMENT TABLE

TYPE	DIMENSIONS				REINFORCEMENT		NOTES
	b X t (mm)		TOP	SIDE	STIRRUPS		
	A	B	C	D	N		
TB1	300x700	6T16	6T16	-	T10-150	2	
TB2	400x700	6T18	6T18	-	T10-150	4	CS

NOTE:

N = NUMBER OF STIRrup BRANCHES
ALL THE BEAMS ARE TIE DUEPT OTHERWISE INDICATED.

AfghanShahab
25/8/2022

