

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاعات
غرب النيل في المسافة من كم 353+680 الى كم 354+000 بطول 320 كم.
تنفيذ: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير
إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/956) بتاريخ 2024/1/8

إنه في يوم الاثنين الموافق 2024/1/15 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس /مارجريت مجدي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس / محمد شعبان مدير مشروع - شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2024/1/15 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- محمد شعبان

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس //

"هاني محمد محمود طه"

Test Report No.:

022-2024

بيانات العميل

المسدة / شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات
المشروع: القطر الكهربى السريع القطاع الخامس (اسكندرية- برج العرب-المنام)
تفسيده: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات
Section = From 353+680 To 354+620
الاستشاري: مكتب د. خالد فنديل (تم سحب العينات المقلدة بمعرفة الاستشاري)

بيانات العينة

تاريخ الاستلام: ٢٠٢٤/٠١/٢٤	الظروف البيئية للاختبار: جو الغرفة
تاريخ الاختبار: ٢٠٢٤/٠١/٢٧	وصف العينة: إجراء بعض الاختبارات المعملية على عينة Geogrid لون اسود

نتيجة الاختبار

Test	Test Method	Result	Unit	Uncertainty		Conformity	
				Result	Unit	✓	✗
1- Wide width tensile strength	MD XMD	40.2 40.8	kN/m				
2- Elongation @ max. load	MD XMD	16.4 14.2	%				

هذه النتيجة تخضع للتحقق من قبل الجهة المختصة وتحتفظ لأي كميات أخرى هي مسؤولة جهة تقديم العينة
لا يجوز استخدام هذا التقرير في الدعاية أو الإعلان عن المنتج إلا بعد الرجوع إلى المركز والاتفاق على ذلك
يتم الاحتفاظ بالعينة بعد اختبارها بالمعامل لمدة الصناديق شهر من تاريخ الاختبار
التقرير صالح لمدة عام من تاريخ الاستلام

بمقتضى

الوظيفة	المشرف على الاختبارات	رئيس القسم	وحدة التحليل والاستشارات
الاسم	أ.د. محمود حمودة الشقيري	أ.د. مروة عاطف علي	رئيس مجال النسيج
التوقيع			أ.د. سمر محمد سامي شرف
التاريخ			

RECEIPT OF NOTIFICATION Minimum Notice Period not less than 24 Hours The Work described below will be complete and ready for inspection as planned time shown									
Contractor Company		Dream way (2) Company		Designer Company		Office		Office	
Issued by Contractor		Name		Date/Serial Number		Time		1:00 PM	
Received by GARB		Eng : Mohamed Shaban		21/11/2023		(S6-A-SR2) TR-CD(01)		1:00 PM	
CONSULTANT		Eng : Saeed Saif		UR		22		11	
STATION REFERENCE		D1 to D3 Depot Reference		Rp XXX Note		For kilo meter point only Start Km to used		00	
EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		Description		Element		Item			
From St. 354+000		To St. 354+120		Geogrid		OVERLAP 30CM AREA= 321.748 M2			
INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time Planned Inspection Date Planned Inspection Time									
COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate Checklist Attached Test Results Attached Calibration Attached Other as indicated MS Reference									
Drawing Reference PLAN AND PROFILE (REV.02-20/11/2023) POINT OF SHEET POINT ON PLAN MASTER SHEET FOR CUT AND FILL APPROVED BY (K.K)CONSULTING									
Comments by: (XYZ) 1-Attached master Sheet approved by J.K. 2-As Built (Geogrid) WITH OVERLAP 30CM AREA=321.748 M2 Comments by: Eng. Saeed Saif (Khaled Kandil)									
Comments by: Eng. Saeed Saif (Khaled Kandil) 1-coordinates & levels and width checked by GARB consultant 2- (REV. 02-20/11/2023 & X-sec./20m) Should approved from SYSTRA. 3-Final approval is subject to above mentioned equipments. Wait for result of QTR of geogrid #									
INSPECTION RESULT Approval Status A-AW-C-R Not Attend Please Tick #									
Organisation		Name		Date		Time		A	
Contractor		Eng. Mohamed Shaban		22/11/2023					
XYZ Survey		Eng.							
QA/QC		Eng. Saeed Saif							
GARB		Eng. Margaret							
Employers Representative		Eng. Alaa Abd-Alattif		22-11-2023				AUC	
Page 1 of 1 File Name : MS-H-1032									

RECEIPT OF NOTIFICATION- Minimum Notice Period not less than 24 Hours The Work described below will be complete and ready for inspection at (approx) time shown									
Contractor Company Dream way (2) Company			Designer Company (KHALED KANDIL) Engineering Consulting Office			Issued by Contractor Name: _____ Date/Serial Number: 16/12/2023 Time: 1:00 PM			
Received by GARB CONSULTANT Eng: Said Safi			Signature: <i>[Signature]</i> Date: 17/12/2023			Time: 12:00 PM Date: 2023 YV: _____ HSE: _____ MM: 00			
STATION REFERENCE DT to D3 Depot Reference			Work Activity Sub Element or Activity			For Kilo meter point only Start Km is used Km XXX Note			
EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED									
Description Element			Item OVERLAP 30CM/AREA= 1287 M2			INSPECTION DETAILS The following will be ready at the time of inspection time Planned Inspection Date: _____ Planned Inspection Time: _____			
COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate									
Checklist Attached Test Results Attached Calibration Attached Other as indicated			Drawing Reference I.T.P. References MS Reference			PLAN AND PROFILE (REV.02) 20/7/2023) POINT OF SHEET POINT ON PLAN MASTER SHEET FOR CUT AND TILL APPROVED BY (K/K) CONSULTING			
Comments by: (K/VZ) 1- Attached master sheet approved by K/L 2- As Built (Geoplot) WITH OVERLAP 30CM/AREA=1287 M2									
Comments by: Eng. Said Safi (Khaled Kandil) 1- Coordinates & levels and width checked by GARB consultant 2- (REV. 02-20/7/2023 & 2-sec 200m) should be approved from SYSTRA. 3- Final approval is subject to above mentioned comments. - Work is completed responsibly until receive result # of RT of 96-# zone 27-1-2023									
INSPECTION RESULT Approval: <i>[Signature]</i> Status: A-AWC-R Time: _____ Date: 17/12/2023 Signature: <i>[Signature]</i> Name: Eng. Mohamed Shaban Eng. Said Safi Eng. Margaret Eng. Alina Abd-Allah Representative: _____ Eng. Name: MS F.002									

354+040

354+060

354+080

354+100


354+120


354+140



Handwritten note: 2.10.18

Contractor Company		Dream way (2) Company		Designer Company	(KHALED KANDIL) Engineering Consulting Office	
Issued by Contractor	Name	Eng : Mohamed Shaban	Sign	Date/Serail Number	20/12/2023 1:00 PM	
Received by GARB CONSULTANT	Eng : Said Saf	UR	Sign	Date/Serail Number	20/12/2023 1:00 PM	
STATION REFERENCE		D1 to D3 Depot Reference		Kp XXX Name For kilo meter point only Start Km is used		
EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED						
Description	Element	Item				
From St. 254+250 To St. 254+340	Geogrid	OVERLAB 30CM AREA= 136SM ²				
INSPECTION DETAILS The following will be completed at the Planned Inspection Time						
Planned Inspection Date		Planned Inspection Time				
COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate						
Checklist Attached	Test Results Attached	Calibration Attached	Other as Indicated			
Drawing Reference	I.T.P. References	NIS Reference				
PLAN AND PROFILE (REV.02-20/7/2023)	Laboratory test result from third party	Specification: EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CS2-A12) VERSION 2 BY CIVICON GROUP				
POINT OF SHEET	(SS - A-DR2) IR-SG(05)	TECHNICAL REPORT (CG1-I-122.1) VERSION 1 BY CIVICON GROUP				
MASTER SHEET FOR CUT AND FILL						
APPROVED BY (K.K.)CONSULTING						
Comments By: (XYZ)						
1-Attached master sheet approved by k.k.						
2-As Built (Completed) WITH OVERLAP 30CM AREA=136SM ²						
Comments by: Eng. Said Safir (khaled kandil)						
1-coordinates & levels and width checked by GARB consultant						
2-(REV.02-20/7/2023 & X-sec./form) Should Approved from SYSTRA						
3-Final approval is subject to above mentioned comments.						
- Work to Contract or responsibility until /						
RECEIVE RESULT OF geogrid at #						
INSPECTION RESULT				# Done 22-1-2024 #		
Approval	Status	Not Attend	Please Tick It			
A-AVC-R	A					
Name	Eng. Mohamed Shaban	Sign	Date	Time		
Contractor	Eng. Mohamed Shaban	Sign	20/12/2023			
XVZ Survey	Eng.					
QA/QC	Eng.Said Saf					
GARB	Eng. Margret					
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Alattif					
File Name :	MSE-L092					

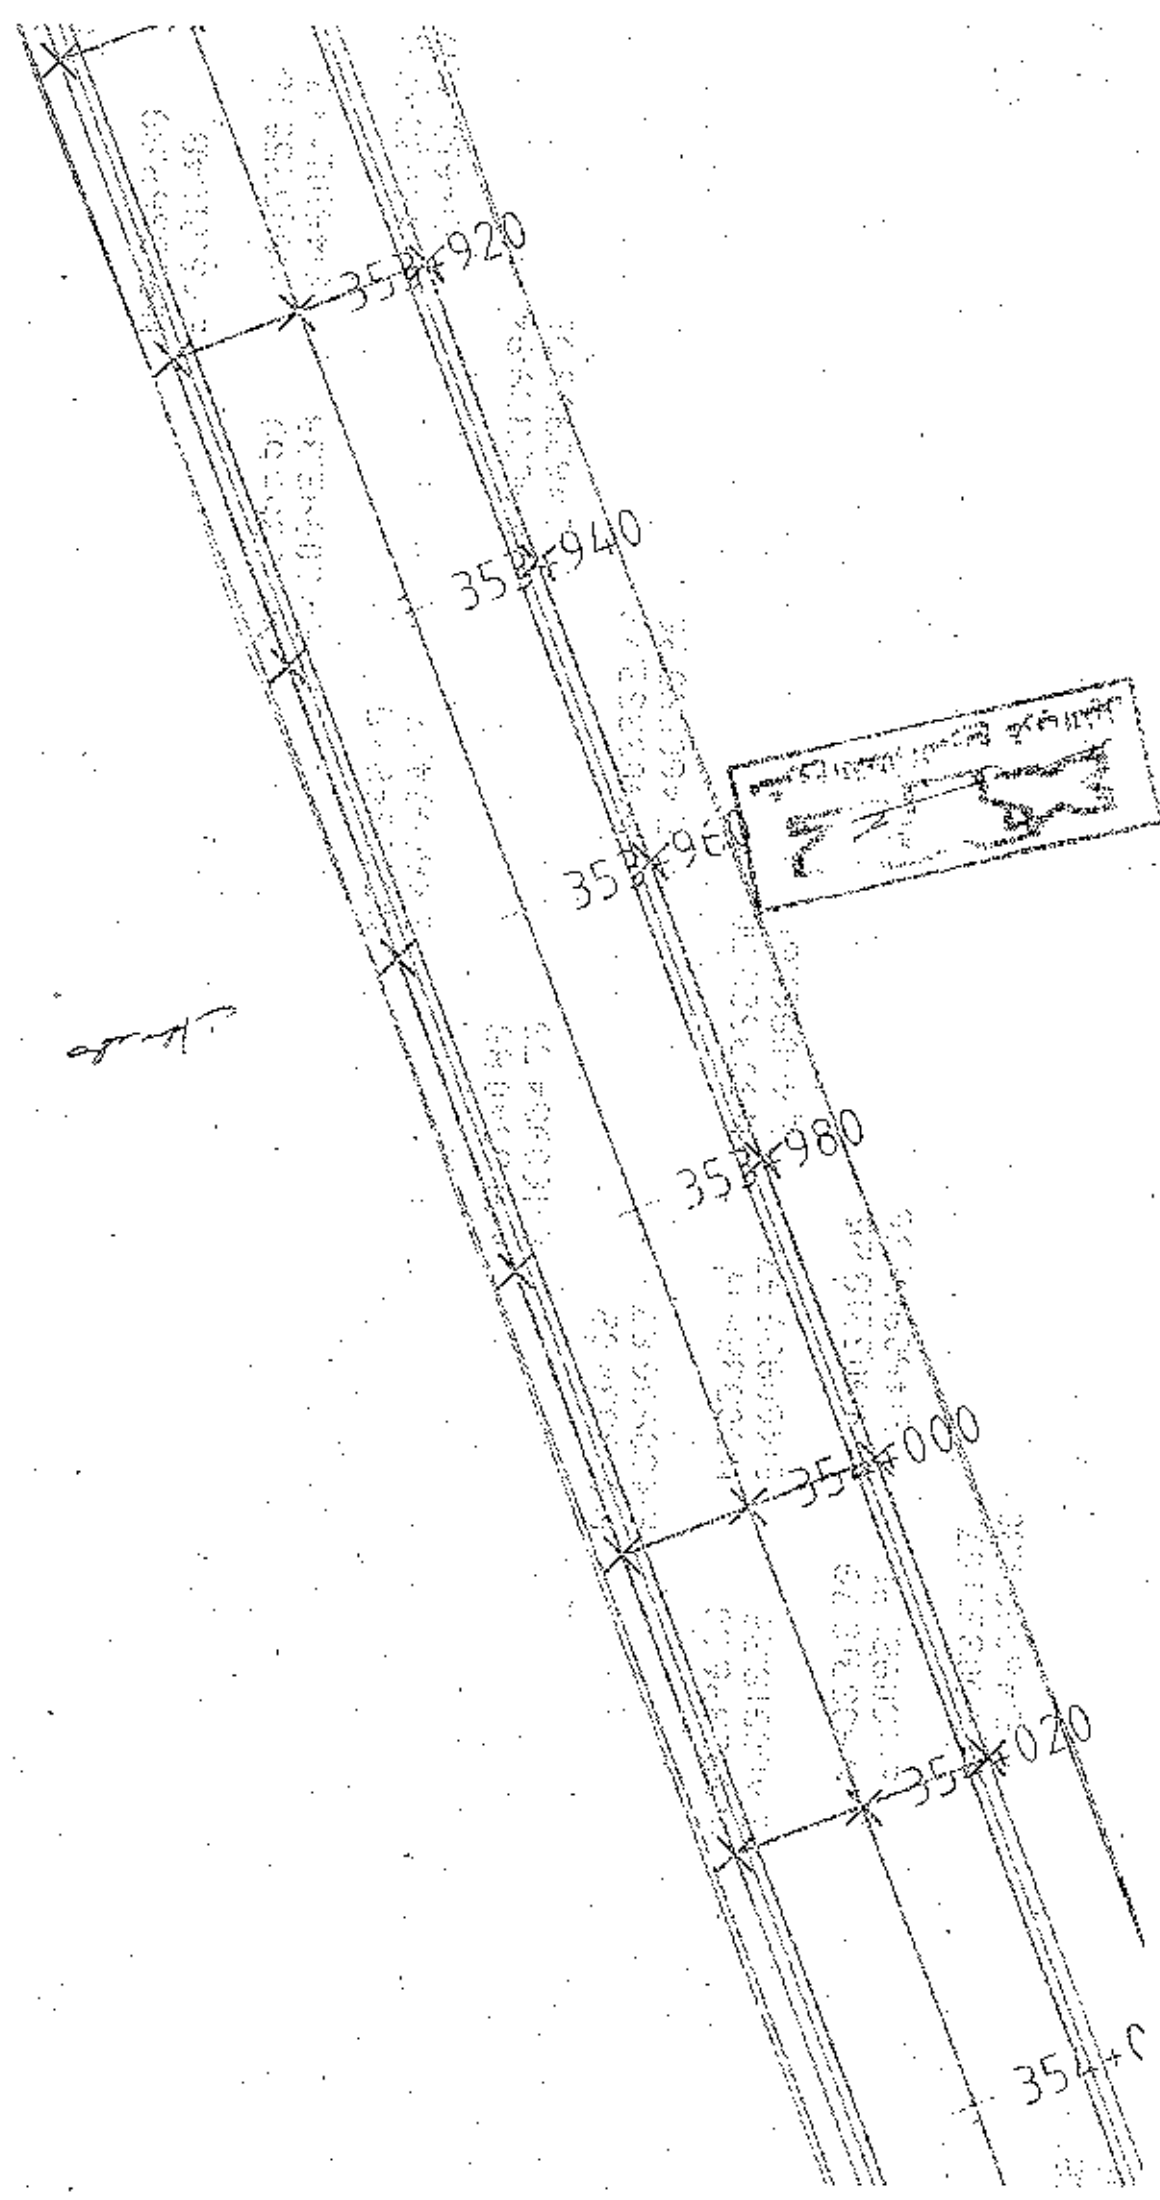

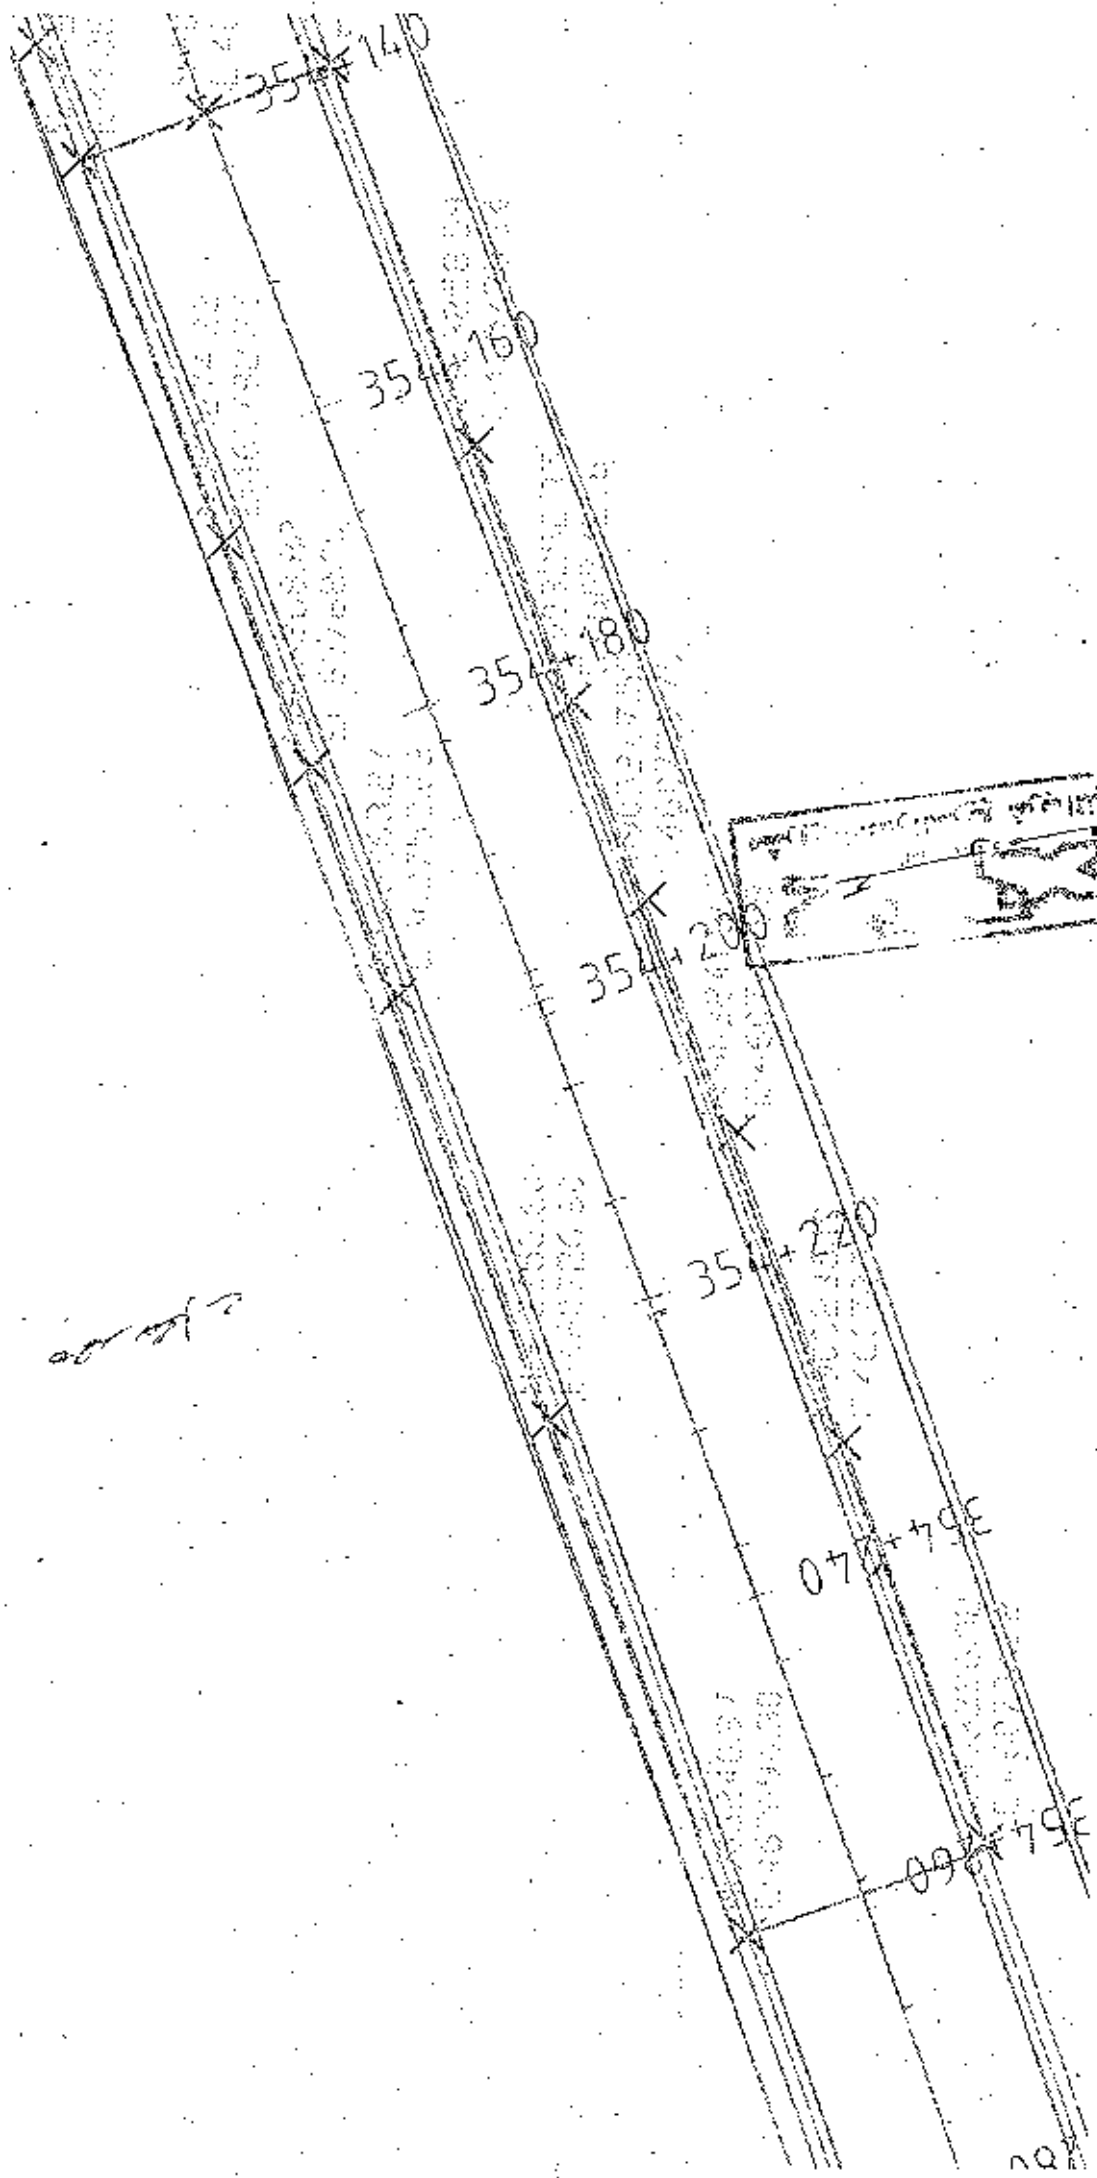

2/10/2000

001

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع : القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين) تنفيذ شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير القطاع من المحطة ٣٥٤+٠٠٠ الي ٣٥٣+٦٨٠

رقم البند و بيانه : (٣-٤) بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من التسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ %

الاعمال ابتداء من ٢٠٢٤/٤/٢٤ طبقاً للمفاوضه

تتضمن : دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٢م الكمية بالمقايسة 6,000.00 م ٢م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		رقم الطلب	تاريخ الطلب	بيان الاعمال بالمقايسة
	العرض	طول	الى	من			
1286.40	16.08	80	354+000	353+920	IR-GD(01)	11/10/2023	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من التسيج الصناعي جيوجريد مستورد التداخل لايقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامه للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ذات قوه شد ٣٠ ك . نيوتون فى الاتجاهين Biaxial
964.80	16.08	60	353+740	353+680	IR-GD(02)	14/11/2023	
2251.20	16.08	140	353+900	353+760	IR-GD(03)	19/12/2023	
4502.40	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م')						
4502.40	الاجمالي الكلى (م')						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي زاهر

مهندس الاستشاري

مكتب م / محمد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة

م / السيد محمد السيد



المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

المسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (برج العرب - العلمين) (القطاع الخامس)

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	رقم العقد	التكلفة
1	شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستيراد والتصدير	353+680	354+000	956	16187600

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة للقطاعات الآتية:

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ..

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس/

"هاني محمد محمود طه"

           				
مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (عين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-عطروح)				
المقاييس المعدلة لبيوتد الاعمال للعقد 2023/2024/956 بعد التفاوض بتاريخ 18/12/2023 للقطاع الخامس تنفيذ شركة دريم واي				
القطاع من المحطة 353+680 إلى المحطة 354+000				
رقم قيد	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة	الكمية
1	أعمال الإزالة والتطهير			الإجمالي
1-1	إزالة المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية والكثيفة والتخلص منها بالمطالب العمومية التي تعزل أعمال الرقع المائي طبقا لشروط ومواصفات تعليمات المهندس المشرف.	م ²	6.00	9,000.0
2	أعمال الحفر			
2-1	إزالة الكهكس أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة العادية أو الأمان ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عند التربة الصخرية وأسوية المسطح لآلات التسوية وأرثي بالماء الاسوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على البنت تحميل وذلك باستخدام الآلات ذات الأوزان 500 متر من محور الطريق والفتحة لتشمل عمل الحفر على مراحل باستخدام الآلات الجوارية لنقل تاج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لطبيعة التربة والمواد المتواجدة في الموقع ويتم التنقيب طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	26.50	14,000.0
2-2	إزالة الكهكس أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتساكنة والاراضي الزراعية أو الأمان ذات منسوب مياه مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عند التربة الصخرية وأسوية المسطح لآلات التسوية وأرثي بالماء الاسوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على البنت تحميل وذلك باستخدام الآلات ذات الأوزان 500 متر من محور الطريق والفتحة لتشمل عمل الحفر على مراحل باستخدام الآلات الجوارية لنقل تاج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لطبيعة التربة والمواد المتواجدة في الموقع ويتم التنقيب طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	43.70	6,000.0
3	أعمال الردم			
3-1	إزالة الكهكس لوردم والتفريغ ويتم احجار بسمكيات تتراوح بين 1 إلى 2 إلى 4 سم أو بين 1 إلى 3 إلى 6 بأسية 1:1:1 بأسية اعراضا لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (أما من مشغل 200) هاتيا أو مواد طافية أو بيت العمل يتم تطهيرها كطريقة تسيب والقطاع اسفل سطح المرآة بعرض 100 سم حتى أعلى منسوب المياه الأرضية بارتفاع 50 سم ويتم العمل الجهد لطيفة هورس لا بعد اعطاء الاحجار واعطاء التجارب العملية والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	347.20	16,500.0
3-2	إزالة الكهكس لوردم والتفريغ ويتم احجار بسمكيات تتراوح بين 1 إلى 2 إلى 4 سم أو بين 1 إلى 3 إلى 6 بأسية 1:1:1 بأسية اعراضا لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (أما من مشغل 200) هاتيا أو مواد طافية أو بيت العمل يتم تطهيرها كطريقة تسيب والقطاع اسفل سطح المرآة بعرض 100 سم حتى أعلى منسوب المياه الأرضية بارتفاع 50 سم ويتم العمل الجهد لطيفة هورس لا بعد اعطاء الاحجار واعطاء التجارب العملية والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	111.80	16,500.0
3-3	إزالة الكهكس لوردم والتفريغ ويتم احجار بسمكيات تتراوح بين 1 إلى 2 إلى 4 سم أو بين 1 إلى 3 إلى 6 بأسية 1:1:1 بأسية اعراضا لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (أما من مشغل 200) هاتيا أو مواد طافية أو بيت العمل يتم تطهيرها كطريقة تسيب والقطاع اسفل سطح المرآة بعرض 100 سم حتى أعلى منسوب المياه الأرضية بارتفاع 50 سم ويتم العمل الجهد لطيفة هورس لا بعد اعطاء الاحجار واعطاء التجارب العملية والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	42.00	6,500.0
3-4	إزالة الكهكس لوردم والتفريغ ويتم احجار بسمكيات تتراوح بين 1 إلى 2 إلى 4 سم أو بين 1 إلى 3 إلى 6 بأسية 1:1:1 بأسية اعراضا لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (أما من مشغل 200) هاتيا أو مواد طافية أو بيت العمل يتم تطهيرها كطريقة تسيب والقطاع اسفل سطح المرآة بعرض 100 سم حتى أعلى منسوب المياه الأرضية بارتفاع 50 سم ويتم العمل الجهد لطيفة هورس لا بعد اعطاء الاحجار واعطاء التجارب العملية والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	101.40	15,000.0
3-5	إزالة الكهكس لوردم والتفريغ ويتم احجار بسمكيات تتراوح بين 1 إلى 2 إلى 4 سم أو بين 1 إلى 3 إلى 6 بأسية 1:1:1 بأسية اعراضا لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (أما من مشغل 200) هاتيا أو مواد طافية أو بيت العمل يتم تطهيرها كطريقة تسيب والقطاع اسفل سطح المرآة بعرض 100 سم حتى أعلى منسوب المياه الأرضية بارتفاع 50 سم ويتم العمل الجهد لطيفة هورس لا بعد اعطاء الاحجار واعطاء التجارب العملية والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	162.00	12,000.0
3-6	إزالة الكهكس لوردم والتفريغ ويتم احجار بسمكيات تتراوح بين 1 إلى 2 إلى 4 سم أو بين 1 إلى 3 إلى 6 بأسية 1:1:1 بأسية اعراضا لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (أما من مشغل 200) هاتيا أو مواد طافية أو بيت العمل يتم تطهيرها كطريقة تسيب والقطاع اسفل سطح المرآة بعرض 100 سم حتى أعلى منسوب المياه الأرضية بارتفاع 50 سم ويتم العمل الجهد لطيفة هورس لا بعد اعطاء الاحجار واعطاء التجارب العملية والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	114.00	3,000.0
3-7	إزالة الكهكس لوردم والتفريغ ويتم احجار بسمكيات تتراوح بين 1 إلى 2 إلى 4 سم أو بين 1 إلى 3 إلى 6 بأسية 1:1:1 بأسية اعراضا لا تزيد عن 3% ولا تحتوي على أي المواد الناعمة أو البودرة (أما من مشغل 200) هاتيا أو مواد طافية أو بيت العمل يتم تطهيرها كطريقة تسيب والقطاع اسفل سطح المرآة بعرض 100 سم حتى أعلى منسوب المياه الأرضية بارتفاع 50 سم ويتم العمل الجهد لطيفة هورس لا بعد اعطاء الاحجار واعطاء التجارب العملية والبيد بجمع مشكلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ³	13.00	15,000.0

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

مدير المشروع المالك
م/م/جريت مجدي زاهر

مدير المشروع المقاول
م/المهندس محمد السعيد

مهندس الاستشاري الهندسي
السيد سيف الدين
م/م/جريت مجدي زاهر

مهندس المشروع المقاول
م/المهندس محمد السعيد

				
مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح)				
المقاييس المعدلة لبيود الأعمال للمقدد 2023/2024/956 بعد التفاوض بتاريخ 18/12/2023 للقطاع الخامس تنفيذ شركة دريم واي				
القطاع من المحطة 353+680 إلى المحطة 354+000				
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الإجمالي
4	أعمال الأساس			
4-1	بأثر المكعب أعمال توريد ورش طبقة أساس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم ولا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 12 % والناتج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليورنيا عن 25 % ولا تزيد نسبة نسبة القالب بجهاز لوجس عن 30 % ولا يزيد الانحصاس عن 15 % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوج التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام اللات الترسية الحديثة على الأرض مسك الطبقة بعد تمام الدك عن 25 سم ورشها بالماء الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعيارية والملاءة لتشمل اجراء التجارب المعيارية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	3م	146.40	3,000.0
	بم اعتبار عتلا 4.4 جنية لكل 1 كم بقرابة 18/12/2023		3,000.00	483,000.00
	قيمة المادة المحجورة طبقا للمواصفة بتاريخ 18/12/2023	3م	3,000.0	335,400.0
	علاوة مسافة النقل 20-106 كم 1.3*80+ جنية 111.8 جنية	3م	3,000.0	75,000.0
	علاوة تحميل الكارنه والموازين طبقا لالتزام الشركة الوطنية	3م	25.00	
4-2	بأثر المكعب أعمال توريد ورش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 60 مم ولا تزيد نسبة العار من متخل 200 عن 5 % والناتج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليورنيا عن 80 % ولا تزيد نسبة نسبة القالب بجهاز لوجس عن 30 % ولا يزيد الانحصاس عن 15 % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوج التحميل عن 120 ميجاسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام اللات الترسية الحديثة على الأرض مسك الطبقة بعد تمام الدك عن 20 سم ورشها بالماء الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعيارية والملاءة لتشمل اجراء التجارب المعيارية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	3م	151.30	2,000
	بم اعتبار عتلا 1.2 جنية لكل 1 كم بقرابة او التفتت		2,000	350,000
	قيمة المادة المحجورة طبقا للمواصفة بتاريخ 18/12/2023	3م	2,000	223,600
	علاوة مسافة النقل 20-106 كم 1.3*80+ جنية 111.8 جنية	3م	2,000	50,000
	علاوة تحميل رسوم الكارنه والموازين طبقا لالتزام الشركة الوطنية	3م	25.00	
4-3	بأثر المسطح توريد وتركيب طبقة من السبج الصلبي جوردو مسانير التعامل لاول من 10 % ويتم تنفيذ طبقة لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2م	105.00	6,000.00
	ذات قوة شد 30 ك . نيوتن في الاجزاء المائلة			630,000.0
5	أعمال الخرسانة			
5-1	بأثر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عتلا مسك 15 سم لعمالة الاكلاف والبول الجوانية تتكون من 0.8 م 3 من دواميت ملدج + 0.4 م 3 رمل حريش و250+ كجم اسمنت بورتلاندي عادي (فهر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والزل خالي من الشوائب والافلاخ والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبيد يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية اسفل الولافة للوصول إلى المعايير التصميمية على ان تحلق الخرسانة (بهد لا يقل عن 250 كجم / سم 3) وكشط السطح وبلد القواصل والبوليون المرمل وتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	2م	457.00	475.5799
	بأثر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عتلا لعمالة الجوانية والبول الجوانية تتكون من 0.8 م 3 من دواميت ملدج + 0.4 م 3 رمل حريش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فهر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والزل خالي من الشوائب والافلاخ والمواد الغريبة مع وضع قووم (بالفاصل) بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبيد يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهوض العمل على ان تحلق الخرسانة (بهد لا يقل عن 250 كجم/سم 3) وبلد القواصل والبوليون المرمل وتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيد بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	3م	2,665.20	50
5-2				133,260.0
				16,187,600.00

مدير عام مشروعات الهيئة

م/محمد حسني قناهن

مدير المشروع المالك

م/ مارجريت مجدي زاهر

مدير المشروع المقاول

م/عبد المجيد الطبعيد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مدير المشروع الاستشاري

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله

م/محمد عبد الله
