



شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

الجدول الزمني - مدة التنفيذ ٦ أشهر


مشروع / أعمال تنفيذ استكمال أعمال رصف شارع احمد عرابي من أم بيومي حتي كوبري ١٥ مايو (بطول ٥٠٠م.ط) (القطاع الثاني)
في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر

بطول ٥٠٠م.ط عقد ٤٧٨

م	الاعمال	المدة الزمنية (اسبوع)	الاتجاه	الشهر الاول				الشهر الثاني				الشهر الثالث				الشهر الرابع				الشهر الخامس				الشهر السادس			
				١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤
١	اعمال الرقع المساحي	١	الايمن																								
٢	اعمال تطهير الموقع	٢	الايمن																								
٣	اعمال التكسير (أسفلت قديم)	٣	الايمن																								
٤	اعمال القطع	٥	الايمن																								
٥	اعمال توريد السن و خلطه بالمياه	٦	الايمن																								
٦	اعمال تشغيل طبقة الاساس	٦	الايمن																								
٧	اعمال البردورات	٥	الايمن																								
٨	اعمال رش طبقة التشريب MCO	٤	الايمن																								
٩	اعمال تنفيذ طبقة الاسفلت الرابطة	٤	الايمن																								
١٠	اعمال الانترلوك	٤	الايمن																								
١١	اعمال رش طبقة التشريب RC	٦	الايمن																								
١٢	اعمال تنفيذ طبقة الاسفلت السطحية	٦	الايمن																								

اعمال الرقع المساحي	
اعمال التكسير (أسفلت قديم)	
اعمال تطهير الموقع	
اعمال القطع	
اعمال توريد السن و خلطه بالمياه	
اعمال تشغيل طبقة الاساس	
اعمال البردورات	
اعمال رش طبقة التشريب MCO	
اعمال تنفيذ طبقة الاسفلت الرابطة	
اعمال الانترلوك	
اعمال رش طبقة التشريب RC	
اعمال تنفيذ طبقة الاسفلت السطحية	

البيانات الاساسية للمشروع	
أمر الاسناد القطاع الثاني	(٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٤٧٨)
تاريخ العقد	٠٤ أكتوبر، ٢٠٢٣
تاريخ النهو المتوقع	٠١ أبريل، ٢٠٢٤



مهندس /
في م.ه.ه.ه.



٥	تلفات	٥٠٠	٥٠٠ ألف
١		٢	٢٠٠ ألف
٢		٢	٢٠٠ ألف
٣		٣	٣٠٠ ألف
٤		٥	٥٠٠ ألف
٥		١٠	١٠٠٠ ألف
٦		٢	٢٠٠ ألف

کشف المہسین
شکر الشکر المواقف بالجدۃ خا
التشیت والیت والیت



مهندس الشكري
4/10

ملاحظات	عدد	المعدة
	١	جريدة
	١	هـ اس
	٢	لورد
	١	تابلو
	٢	مياه
	٢	هـ اس
	١	فنشر
	١	هـ اس
	١٠	قلائد
		نقل


كشف المعدات المتواجدة بالموقع



شركة الخارح للنماء
والتشطيب والبناء



EL-MADANI GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING
Dr. Abrar Sakhan Koth



مجموعة الممار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

مستخلص رقم ١ جاري. عملية استكمال أعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ ميلو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الايمن

بيان كميات أعمال تطهير للموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات مستخلص جاري ١ من بداية المشروع وحتى تاريخ

ملاحظات	الوحدة	الكمية	رقم الطلب	تاريخ الطلب	البند	رقم البند
من المساحة ٨١٠٠٠ كم. في المساحة ١٥٣٦٠ كم	م ^٢	١٤٧٠٠٠٠	١		باعتبر المسطح اصال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق القطاع ذات الطبيعة الزراعية والتخلص منها بالمقالب الصومية تمهيدا لأعمال الرفع المساهي لكامل حدود المشروع طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرف	1
	م ^٢	١٤٧٠٠٠٠			الاجمالي	

الكمية بالمستخلص ١٤٠٠ م^٢

مهندس المشروع (الهيئة)

١٥

مهندس مسئول الاستشاري

١٥



٤٧٨

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن



EL-MADAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Akram Sobhan Kadi



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

حصر أعمال التطهير

الكمية م^٢

العرض

الطول

المحطة

٦٠

٣,٠٠

٢٠

٨٦٠+٠

٥٠

٢,٥٠

٢٠

٨٨٠+٠

٥٠

٢,٥٠

٢٠

٩٠٠+٠

٤٣

٢,١٥

٢٠

٩٢٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

٩٤٠+٠

٦٣

٣,١٥

٢٠

٩٦٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

٩٨٠+٠

٥٠

٢,٥٠

٢٠

١٠٠٠+٠

٥٠

٢,٥٠

٢٠

١٠٢٠+٠

٥٦

٢,٨٠

٢٠

١٠٤٠+٠

٥٧

٢,٨٥

٢٠

١٠٦٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

١٠٨٠+٠

٦٣

٣,١٥

٢٠

١١٠٠+٠

٦٤

٣,٢٠

٢٠

١١٢٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

١١٤٠+٠

٥٦

٢,٨٠

٢٠

١١٦٠+٠

٥٨

٢,٩٠

٢٠

١١٨٠+٠

٥٠

٢,٥٠

٢٠

١٢٠٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

١٢٢٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

١٢٤٠+٠

٥٠

٢,٥٠

٢٠

١٢٦٠+٠

٥٠

٢,٥٠

٢٠

١٢٨٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

١٣٠٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

١٣٢٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

١٣٤٠+٠

٦٠

٣,٠٠

٢٠

١٣٦٠+٠

١٤٧٠

الاجمالي

مهندس الهيئة

مهندسين الاستشاريين

مهندسين الشركة

مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

مستخلص رقم ١ جاري عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيوي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن

بيان كميات أعمال حفر لوجود مرافق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة مستخلص جاري ١ من بداية المشروع وحتى تاريخ

ملاحظات	الوحدة	الكمية	رقم الطلب	تاريخ الطلب	البند	رقم البند
من المحطة ٨٦٠+ كم - الى المحطة ٨٦٠+١ كم	٣م	٧٥٠٠,٠٠	١		بالمتر المكعب أعمال حفر حذر لوجود مرافق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ %) من الكثافة الجافة القصوى ومحمل على البند اعادة استخدام الصالح من ناتج الحفر ونقل الغير صالح الى المقالب العمومية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للمطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	2
	٣م	٧٥٠٠,٠٠				

الإجمالي

الكمية بالمستخلص ٧٥٠٠,٠٠ م

مهندس المشروع (الهيئة)

م /

مهندس مشغل الاستشاري

م /



تجلى استكمال اجمال وصف شارع لحد بحري من ام يومي على كورني ٦٠٠ م بطول ٠٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الايمن



Al-Ham Green for Evolution Construction
Dr. Saad Salem



مجموعة المذكرات الاستشارية الهندسية (إدارة مخطط)

الهيئة العامة للطرق والمواصلات والنقل البحري

حصر أعمال قطع التربة

Cut Volume (Cu.M.)	Cut Area (Sq.M.)	Station
0	15.54	0+800.00
227.65	7.23	0+880.00
237.67	15.54	0+900.00
333.95	16.86	0+920.00
341.85	17.33	0+940.00
381.92	20.86	0+960.00
435.17	22.66	0+980.00
445	22.53	1+000.00
428.22	20.29	1+020.00
416.36	20.72	1+040.00
447.93	23.52	1+060.00
520.16	28.28	1+080.00
558.45	27.56	1+100.00
548.47	27.29	1+120.00
545.19	28.13	1+140.00
534.67	26.42	1+160.00
525.99	26.18	1+180.00
506.23	30.44	1+200.00
589.44	28.4	1+220.00
533.87	24.98	1+240.00
497.76	24.79	1+260.00
405.96	15.8	1+280.00
304.88	14.68	1+300.00
327.31	17.12	1+320.00
292.9	12.17	1+340.00
218.04	9.96	1+360.00
10664.03	اجمالي	

10664.03	قطع الاجمالي
4090	قطع وتكسير اسفلت
6584.03	قطع تراب الطريق

4316.14	قطع الجزيرة
1766.5	تكسير خرسانة
1409.04	تكسير اسفلت
1140.6	قطع تراب الجزيرة

7724.63	اجمالي قطع التراب
---------	-------------------

Volume Summary From 00+340 To 00+804

Fill (Cu.M.)	Cut (Cu.M.)	2d Area (sq.m)	Fill Factor	Cut Factor	Name
0.00	10664.03	13027.67	1.000	1.000	قطع الاجمالي - ١٣٦٠-٨١٠
0.00	4316.14	3434.88	1.000	1.000	قطع الجزيرة - ١٣٦٠-٨١٠
0.00	5489	13722.5	1.000	1.000	تكسير اسفلت - ١٣٦٠-٨١٠
0.00	1766.5	3925.55	1.000	1.000	تكسير الخرسانة - ١٣٦٠-٨١٠
	7724.63				قطع التراب



مهندس الدولة
١٣٦٠-٨١٠



EL-MADINA GHARAF FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Akram Selim Koth



مجموعة الممار للاستشارات الهندسية (إ.أ.ك.م. سلطان)

مستخلص رقم ١ جاري عملية استكمال أعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن

بيان كميات أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بإرصف الحالي مستخلص جاري ١ من بداية المشروع وحتى تاريخ

ملاحظات	الوحدة	الكمية	رقم الطلب	تاريخ الطلب	البند	رقم البند
من المسطحة ٠,٥٨٦٠ كم - اقي المسطحة ١,٥٣٦٠ كم	م ^٢	٥٤٨٩,٠٠٠	١		بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بإرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لتجهيز العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وفي حدة زيادة مسافة نقل ناتج التكشير عن ١٠ كم من محور الطريق يتم احتساب ١ جنيه للكيلومتر الزيادة أو النقص.	4
	م ^٢	٥٤٨٩,٠٠٠			الإجمالي	

الكمية بالمستخلص ٣,٥٦٥ م^٢

مهندس المشروع (الهيئة)

١ م

مهندس مسئول الاستشاري

١ م



عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه اليمين



E-HANA GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

En. Hana Hana Ltd



مجموعة الممار للاستشارات الهندسية (د.إبراهيم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكهرباء والنقل البري

حصر أعمال تكسير الاسفلت

المحطة	الطول	العرض	السمك	الكمية م ^٣
طريق ٨٦٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ٨٨٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ٩٠٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ٩٢٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ٩٤٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ٩٦٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ٩٨٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٠٠٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٠٢٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٠٤٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٠٦٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٠٨٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١١٠٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١١٢٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١١٤٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١١٦٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١١٨٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٢٠٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٢٢٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٢٤٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٢٦٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٢٨٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٣٠٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٣٢٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٣٤٠	٢٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	١٦٠
طريق ١٣٦٠	١٠	٢٠,٠٠	٠,٤٠	٨٠
جزيرة ١٠٢٠	٢٠	٦,٦٠	٠,٤٠	٥٢,٨
جزيرة ١٠٤٠	٢٠	٦,٦٠	٠,٤٠	٥٢,٨
جزيرة ١٠٦٠	٢٠	٨,٦٠	٠,٤٠	٦٨,٨
جزيرة ١٠٨٠	٢٠	٩,٧٥	٠,٤٠	٧٨
جزيرة ١١٠٠	٢٠	٩,٢٥	٠,٤٠	٧٤
جزيرة ١١٢٠	٢٠	١١,٢٣	٠,٤٠	٨٩,٨٤
جزيرة ١١٤٠	٢٠	١٢,١٥	٠,٤٠	٩٧,٢
جزيرة ١١٦٠	٢٠	١٢,٧٠	٠,٤٠	١٠١,٦
جزيرة ١١٨٠	٢٠	١٣,٢٦	٠,٤٠	١٠٦,٠٨
جزيرة ١٢٠٠	٢٠	١٢,٥٢	٠,٤٠	١٠٠,١٦
جزيرة ١٢٢٠	٢٠	١١,٨٦	٠,٤٠	٩٤,٨٨
جزيرة ١٢٤٠	٢٠	١٠,٦٤	٠,٤٠	٨٥,١٢
جزيرة ١٢٦٠	٢٠	١٠,١٨	٠,٤٠	٨١,٤٤
جزيرة ١٢٨٠	٢٠	٩,٧٨	٠,٤٠	٧٨,٢٤
جزيرة ١٣٠٠	٢٠	٨,٨١	٠,٤٠	٧٠,٤٨
جزيرة ١٣٢٠	٢٠	٨,٣١	٠,٤٠	٦٦,٤٨
جزيرة ١٣٤٠	٢٠	٩,٢٠	٠,٤٠	٧٣,٦
جزيرة ١٣٦٠	١٠	٩,٣٨	٠,٤٠	٣٧,٥٢
الاجمالي				5489

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

م. هادي

م. هادي

م. هادي



Dr. Akram Sabhan Kheib

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAARLT)

مجموعة الممار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سبلان)

مستخلص رقم ١ جاري عملية استكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن

بيان كميات أعمال كسور وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو أرضية أو ديش مستخلص جاري ١ من بداية المشروع وحتى تاريخ

ملاحظات	الوحدة	الكمية	رقم الطلب	تاريخ الطلب	البند	رقم البند
من محطة ٠+٤٦٠ كم - إلى المحطة ١+٢٦٠ كم	م ^٣	٢٠٠,٨٠٠	١		بالمتر المكعب أعمال كسور وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مسطحة أو أرضية أو ديش مع نقل الناتج الكسور خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والدفعة شاملة مساحة جميعة بالمتر المكعب	٥
الإجمالي						

الكمية بالمستخلص ٢٠٠,٨٠٠ م^٣

مهندس المشروع (الهيئة)

١ م

مهندس مسئول الاستشاري

١ م





EL-MAGAN GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Alwan Selim Koth



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د. اكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

حصر أعمال تكسير خرسانة ومباني وأرصعة

المحطة	عدد	الطول	العرض	ارتفاع / السمك	الكمية م ^٣
محول كهرباء (ST: 1+200) سقف	١	٤	٤	٠,٢٥	٤,٠
محول كهرباء (ST: 1+200) أرضيه	١	٤	٤	٠,٥٠	٨,٠
محول كهرباء (ST: 1+200) حوائط	٤	٤	٤	٠,٢٥	١٦,٠
محطة صرف (ST: 1+200) سقف	١	٢٢	١٠	٠,٢٥	٥٥,٠
محطة صرف (ST: 1+200) أرضيه	١	٢٢	١٠	٠,٥٠	١١٠,٠
محطة صرف (ST: 1+200) حوائط	٢	٢٢	٣	٠,٢٥	٣٣,٠
محطة صرف (ST: 1+200) حوائط	٢	١٠	٣	٠,٢٥	١٥,٠
رصيف من ٨٦٠ الى ٨٨٠		٢٤,٢٨	٢,٨٥	٠,٤٠	٢٧,٧
رصيف من ٨٨٠ الى ٩٠٠		٢٥,٤٧	٢,٥٠	٠,٤٥	٢٨,٧
رصيف ٩٢٠ الى ٩٤٠		٣٧,١	٢,٥٠	٠,٥٠	٤٦,٤
رصيف من ٩٤٠ الى ٩٦٠		٢١,٥٦	٣,٠٠	٠,٤٠	٢٥,٩
رصيف من ٩٦٠ الى ٩٨٠		٢٥,٧٩	٣,١٠	٠,٥٥	٤٤,٠
رصيف من ١٠٠٠ الى ١٠٢٠		٢٦,٤٣	٢,٩٠	٠,٥٠	٣٨,٣
رصيف ١٠٤٠		٢١,٧٩	٢,٨٥	٠,٤٥	٢٧,٩
رصيف من ١٠٦٠ الى ١٠٨٠		٢١,٩	٢,٨٠	٠,٥٠	٣٠,٧
رصيف ١١٠٠		٢٢,٣١	٢,٩٠	٠,٤٥	٢٩,١
رصيف ١١٢٠		٢١,٤	٣,٠٠	٠,٣٥	٢٢,٥
رصيف من ١١٤٠ الى ١١٦٠		٢١,٥٧	٣,٢٠	٠,٣٠	٢٠,٧
رصيف ١١٨٠		١٩,٦	٢,٥٠	٠,٥٠	٢٤,٥
رصيف ١٢٠٠		٢٠,٠٥	٢,٥٥	٠,٤٥	٢٣,٠
رصيف من ١٢٤٠ الى ١٢٢٠		٨٩	٢,٨٠	٠,٥٠	١٢٤,٦
رصيف ١٢٤٠		١٤	٢,٨٠	٠,٥٥	٢١,٦
خرسانة عادية في الجزيرة		٣٥,٠	١٠,٠٥	٠,٣٥	١٢٣١,١
الاجمالي					٢٠٠٨

مهندس الهيئة
جابر (١) ع ٤٧٨



مجموعة الممار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

مستخلص رقم ١ جاري عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيوي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن

بيان كميات أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مستخلص جاري ١ من بداية المشروع وحتى تاريخ

ملاحظات	الوحدة	الكمية	رقم الطلب	تاريخ الطلب	البند	رقم البند
من المحطة ١٠٣٦٠ كم - الى المحطة ١٠٣٦٠ كم	٣م	١٤٣٠٢,٤٤	١		بالمر المكمب هندسي اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة تشمل اجراء التجارب عن ٩٥% من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠%	6

الإجمالي

١٤٣٠٢,٤٤

الكمية بالاستخلص ١٣٨٤٢م

مهندس المشروع (الهيئة)

١/م

مهندس مشغل الاستشاري

١/م



عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الايمن

	 EL-MAGAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING Dr. Ahmed Soliman Koth	
	مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)	الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
	حصر أعمال توريد وتشغيل طبقة الاساس	

حصر الملبقه الناتجة

الكمية	المسك	العرض	الطول	Station
0.00	0	20.53	20	0+860.00
79.92	0.2	19.98	20	0+880.00
78.60	0.2	19.65	20	0+900.00
78.00	0.2	19.50	20	0+920.00
78.32	0.2	19.58	20	0+940.00
85.43	0.2	21.36	20	0+960.00
93.62	0.2	23.41	20	0+980.00
101.51	0.2	25.38	20	1+000.00
102.80	0.2	25.70	20	1+020.00
103.58	0.2	25.90	20	1+040.00
103.48	0.2	25.87	20	1+060.00
104.18	0.2	26.04	20	1+080.00
104.44	0.2	26.11	20	1+100.00
103.56	0.2	25.89	20	1+120.00
101.99	0.2	25.50	20	1+140.00
102.82	0.2	25.71	20	1+160.00
102.49	0.2	25.62	20	1+180.00
100.32	0.2	25.08	20	1+200.00
97.17	0.2	24.29	20	1+220.00
94.65	0.2	23.66	20	1+240.00
91.82	0.2	22.95	20	1+260.00
89.15	0.2	22.29	20	1+280.00
86.74	0.2	21.69	20	1+300.00
91.54	0.2	22.89	20	1+320.00
96.19	0.2	24.05	20	1+340.00
96.42	0.2	24.11	20	1+360.00
2368.74				الاجمالى (م ³)

مهندس الهيئة

طارى (1) ٢٧/٤

مهندس الاستشاري

طارى (1) ٢٧/٤



عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الايمن



IL-MINDAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Hermann Soltan-Kath



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى

حصر أعمال توريد وتشغيل طبقه
الاساس

حصر الطليقة الثانية

الكمية	السمك	العرض	الطول	Station
0.00	0	20.73	20	0+860.00
80.72	0.2	20.18	20	0+880.00
79.40	0.2	19.85	20	0+900.00
78.80	0.2	19.70	20	0+920.00
79.12	0.2	19.78	20	0+940.00
86.23	0.2	21.56	20	0+960.00
94.42	0.2	23.61	20	0+980.00
102.31	0.2	25.58	20	1+000.00
103.60	0.2	25.90	20	1+020.00
104.38	0.2	26.10	20	1+040.00
104.28	0.2	26.07	20	1+060.00
104.98	0.2	26.24	20	1+080.00
105.24	0.2	26.31	20	1+100.00
104.36	0.2	26.09	20	1+120.00
102.79	0.2	25.70	20	1+140.00
103.62	0.2	25.91	20	1+160.00
103.29	0.2	25.82	20	1+180.00
101.12	0.2	25.28	20	1+200.00
97.97	0.2	24.49	20	1+220.00
95.45	0.2	23.86	20	1+240.00
92.62	0.2	23.15	20	1+260.00
89.95	0.2	22.49	20	1+280.00
87.54	0.2	21.89	20	1+300.00
92.34	0.2	23.09	20	1+320.00
96.99	0.2	24.25	20	1+340.00
97.22	0.2	24.31	20	1+360.00
2388.74				

الإجمالي (م³)

الاجملى (م ۳)

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندسين الشركة

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{1, 4, 12\}$$

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الايمن



AL-MIDAT GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Hossam Soliman Elshor



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

حصر أعمال توريد وتشغيل طبقة الاساس

حصر الطبقة الاولى

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
0+860.00	20	20.93	0	0.00
0+880.00	20	20.38	0.2	81.52
0+900.00	20	20.05	0.2	80.20
0+920.00	20	19.90	0.2	79.60
0+940.00	20	19.98	0.2	79.92
0+960.00	20	21.76	0.2	87.03
0+980.00	20	23.81	0.2	95.22
1+000.00	20	25.78	0.2	103.11
1+020.00	20	26.10	0.2	104.40
1+040.00	20	26.30	0.2	105.18
1+060.00	20	26.27	0.2	105.08
1+080.00	20	26.44	0.2	105.78
1+100.00	20	26.51	0.2	106.04
1+120.00	20	26.29	0.2	105.16
1+140.00	20	25.90	0.2	103.59
1+160.00	20	26.11	0.2	104.42
1+180.00	20	26.02	0.2	104.09
1+200.00	20	25.48	0.2	101.92
1+220.00	20	24.69	0.2	98.77
1+240.00	20	24.06	0.2	96.25
1+260.00	20	23.35	0.2	93.42
1+280.00	20	22.69	0.2	90.75
1+300.00	20	22.09	0.2	88.34
1+320.00	20	23.29	0.2	93.14
1+340.00	20	24.45	0.17	83.12
1+360.00	20	24.51	0.18	88.22
2384.27				

الاجمالي (م³)

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني
في الاتجاه الأيمن



EL-MIDAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Alwan Sultan Zaki



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى

حصر أعمال توريد وتشغيل طبقه
الاساس

حصر الطبقة الثالثه

Station	الطول	العرض	السمك	الكميه
0+360	20	26.03	0	0.00
0+380	20	23.01	0.2	92.04
0+400	20	24.17	0.2	96.66
0+420	20	25.32	0.2	101.29
0+440	20	25.27	0.2	101.09
0+460	20	24.74	0.2	98.96
0+480	20	24.21	0.2	96.83
0+500	20	22.59	0.2	90.37
0+520	20	22.85	0.2	91.40
0+540	20	24.04	0.2	96.14
0+560	20	25.40	0.2	101.61
0+580	20	27.20	0.2	108.79
0+600	20	27.15	0.2	108.61
0+620	20	26.75	0.2	106.99
0+640	20	25.90	0.2	103.61
0+660	20	23.85	0.2	95.39
0+680	20	23.20	0.2	92.78
0+700	20	22.50	0.2	89.99
0+720	20	21.89	0.2	87.58
0+740	20	21.68	0.2	86.71
0+760	20	22.11	0.2	88.43
0+780	20	22.63	0.2	90.50
0+800	20	22.48	0.2	89.91
0+820	20	21.37	0.2	85.48
0+840	20	20.90	0.2	83.60
0+860	20	20.53	0.2	82.13
				2366.90

الاجمالى (م٣)

مهندس الاستشاري



مهندس الهيئ
جاري (١٩٧٨)

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عراي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني
في الاتجاه الأيمن



AL-MAGAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Alwan Sultan Farah



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د. أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى

حصر أعمال توريد وتشغيل طبقة
الاساس

حصر الطبقة الثانية

Station	الطول	العرض	السماك	الكمية
0+360	20	26.23	0	0.00
0+380	20	23.21	0.2	92.84
0+400	20	24.37	0.2	97.46
0+420	20	25.52	0.2	102.09
0+440	20	25.47	0.2	101.89
0+460	20	24.94	0.2	99.76
0+480	20	24.41	0.2	97.63
0+500	20	22.79	0.2	91.17
0+520	20	23.05	0.2	92.20
0+540	20	24.24	0.2	96.94
0+560	20	25.60	0.2	102.41
0+580	20	27.40	0.2	109.59
0+600	20	27.35	0.2	109.41
0+620	20	26.95	0.2	107.79
0+640	20	26.10	0.2	104.41
0+660	20	24.05	0.2	96.19
0+680	20	23.40	0.2	93.58
0+700	20	22.70	0.2	90.79
0+720	20	22.09	0.2	88.38
0+740	20	21.88	0.2	87.51
0+760	20	22.31	0.2	89.23
0+780	20	22.83	0.2	91.30
0+800	20	22.68	0.2	90.71
0+820	20	21.57	0.2	86.28
0+840	20	21.10	0.2	84.40
0+860	20	20.73	0.2	82.93
الاجمالي (م ^٣)				2386.90

مهندس الاستشاري

جاري ١٨٠٢٥٠٧٨



عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عراي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني
في الاتجاه الأيمن



EL-MIDAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Ahmad Sultan Farid



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق
والكبارى والنقل البرى

حصر أعمال توريد وتشغيل طبقه
الاساس

حصر الطبقة الاولى

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
0+360	20	26.43	0	0.00
0+380	20	23.41	0.2	93.64
0+400	20	24.57	0.2	98.26
0+420	20	25.72	0.2	102.89
0+440	20	25.67	0.2	102.69
0+460	20	25.14	0.2	100.56
0+480	20	24.61	0.2	98.43
0+500	20	22.99	0.2	91.97
0+520	20	23.25	0.2	93.00
0+540	20	24.44	0.2	97.74
0+560	20	25.80	0.2	103.21
0+580	20	27.60	0.2	110.39
0+600	20	27.55	0.2	110.21
0+620	20	27.15	0.2	108.59
0+640	20	26.30	0.2	105.21
0+660	20	24.25	0.2	96.99
0+680	20	23.60	0.2	94.38
0+700	20	22.90	0.2	91.59
0+720	20	22.29	0.2	89.18
0+740	20	22.08	0.2	88.31
0+760	20	22.51	0.2	90.03
0+780	20	23.03	0.2	92.10
0+800	20	22.88	0.2	91.51
0+820	20	21.77	0.2	87.08
0+840	20	21.30	0.2	85.20
0+860	20	20.93	0.2	83.73
				2406.90

الاجمالي (م ٢)

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

جاءر محمد

مجموعة المصارف للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

مستخلص رقم ١ جاري عملية استكمال أعمال رصف شارع احمد عربي من ام بيوي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن

بيان كميات أعمال توريد وتركيب برودره أسمنتية (عجالي مستخلص جاري ١ من بداية المشروع وحتى تاريخ

ملاحظات	الوحدة	الكمية	رقم الطلب	تاريخ الطلب	البند	رقم البند
من المحطة ٠+٨٦٠ كم. إلى المحطة ١+٣٦٠ كم	م.ط	١٧٠٠٠,٠٠			بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برودره أسمنتية (عجالي) بأبعاد ٣٠ × ٢٥ سم مصنوعة تتكون من ٠,٨ م ٢م سن دولوميت لايزيد أكبر بعد للحبيبات ٣٠ × ٥٠ سم ١,٥ سم ٠,٤ م ٣ م ٠,٤ م ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البرودره على فريشه من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبجهد لا يزيد الحامات ١:٢ عن ٢ سم والتي تملأ بمونة من الاسمنت بوالرمل بنسبه ١:٢ البرودره والسعر يشمل التسوية أسفل البرودره ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعات والرسومات ومواصفات هيئة الطرق والكباري والمهندسين المشرف	9
تم حساب كميته في مستخلص جاري ٢ عقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٥٦	م.ط	٨٧٥,٠٠				
تم حساب كميته في مستخلص جاري ٤ عقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٩٠	م.ط	٤٥٠,٠٠				
متبقي	م.ط	٣٧٥,٠٠				
	م.ط	١٧٠٠٠,٠٠				
الإجمالي						

الكمية بالمستخلص ٣٧٥ م.ط

مهندس المشروع (الهيئة)

١ م

مهندس مشغل الاستشاري

١ م



عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن



EL-MADAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING
Dr. Alwan Sobhan Khalil



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

حصر أعمال صب البردوره العجالي

طول البردوره	الى المحطه	من المحطه
٢٠,٦	جنب البيوت 0+380	0+360
٢٠,٦	جنب البيوت 0+400	0+380
٢٠,٦	جنب البيوت 0+420	0+400
٢٠,٦	جنب البيوت 0+440	0+420
٢٠,٦	جنب البيوت 0+460	0+440
٢٠,٦	جنب البيوت 0+480	0+460
٢٠,٦	جنب البيوت 0+500	0+480
٢٠,٦	جنب البيوت 0+520	0+500
٢٠,٦	جنب البيوت 0+540	0+520
٢٠,٦	جنب البيوت 0+560	0+540
٢٠,٦	جنب البيوت 0+580	0+560
٢٠,٦	جنب البيوت 0+600	0+580
٢٠,٦	جنب البيوت 0+620	0+600
٢٠,٦	جنب البيوت 0+640	0+620
٢٠,٦	جنب البيوت 0+660	0+640
٢٠,٦	جنب البيوت 0+680	0+660
٢٠,٦	جنب البيوت 0+700	0+680
٢٠,٦	جنب البيوت 0+720	0+700
٢٠,٦	جنب البيوت 0+740	0+720
٢٠,٦	جنب البيوت 0+760	0+740
٢٠,٦	جنب البيوت 0+780	0+760
٢٠,٦	جنب البيوت 0+800	0+780
٢٠,٦	جنب البيوت 0+820	0+800
٢٠,٦	جنب البيوت 0+840	0+820
٢٠,٦	جنب البيوت 0+860	0+840
٢٠,٦	جنب البيوت 0+880	0+860
٢٠,٦	جنب البيوت 0+900	0+880
٢٠,٦	جنب البيوت 0+920	0+900
٢٠,٦	جنب البيوت 0+940	0+920
٢٠,٦	جنب البيوت 0+960	0+940

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

٤٧٨٢٥١١٢٥١٢٥

٢٠٢٠



عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن



EL-MAGAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Akram Salem Kadi



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

حصر أعمال صب البردوره العجالي

طول البردوره	الى المحطه	من المحطه
٢٠,٦	جنب البيوت 0+980	0+960
٢٠,٦	جنب البيوت 01+000	0+980
٢٠,٦	جنب البيوت 01+020	01+000
٢٠,٦	جنب البيوت 01+040	01+020
٢٠,٦	جنب البيوت 01+060	01+040
٢٠,٦	جنب البيوت 01+080	01+060
٢٠,٦	جنب البيوت 01+100	01+080
٢٠,٦	جنب البيوت 01+120	01+100
٢٠,٦	جنب البيوت 01+140	01+120
٢٠,٦	جنب البيوت 01+160	01+140
٢٠,٦	جنب البيوت 01+180	01+160
٢٠,٦	جنب البيوت 01+200	01+180
٢٠,٦	جنب البيوت 01+220	01+200
٢٠,٦	جنب البيوت 01+240	01+220
٢٠,٦	جنب البيوت 01+260	01+240
٢٠,٦	جنب البيوت 01+280	01+260
٢٠,٦	جنب البيوت 01+300	01+280
٢٠,٦	جنب البيوت 01+320	01+300
٢٠,٦	جنب البيوت 01+340	01+320
٢٠,٦	جنب البيوت 01+360	01+340
٢٠,٦	جنب البيوت 01+360	01+360
١٠	جزيره 0+710	0+700
٢٠	جزيره 0+740	0+720
٢٠	جزيره 0+760	0+740
٢٠	جزيره 0+780	0+760
٢٠	جزيره 0+800	0+780
٢٠	جزيره 0+820	0+800
٢٠	جزيره 0+840	0+820
٢٠	جزيره 0+860	0+840
٢٠	جزيره 0+880	0+860

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري



حارس القاعة

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن



AL-MADINA GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Akram Sultan Farid



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

حصر أعمال صب البردوره العجالي

من المحطه	الى المحطه	طول البردوره
0+880	0+900	٢٠
0+900	0+920	٢٠
0+920	0+940	٢٠
0+940	0+960	٢٠
0+960	0+980	٢٠
0+980	01+000	٢٠
01+000	01+020	٢٠
01+020	01+040	٢٠
01+040	01+060	٢٠
01+060	01+080	٢٠
01+080	01+100	٢٠
01+100	01+120	٢٠
01+120	01+140	٢٠
01+140	01+160	٢٠
01+160	01+180	٢٠
01+180	01+200	٢٠
01+200	01+220	٢٠
01+220	01+240	٢٠
01+240	01+260	٢٠
01+260	01+280	٢٠
01+280	01+300	٢٠
01+300	01+320	٢٠
01+320	01+340	٢٠
01+340	01+360	٢٠
الاجمالي بالمتر الطولي		١٧٠١




مهندس الهيئة

حارة ١٨



EL-PHARAS GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Ahmed Salem Kheir



مجموعة العمار للاستشارات الهندسية (إبراهيم سلطان)

مستخلص رقم ١ جاري عملية استكمال أعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ ميل بطول ٥٠٠ متر القطاع (الثاني في الاتجاه الأيمن)

بيان كميات أعمال توريد و صب برودره من الخرسانة العادية مستخلص جاري ١ من بداية المشروع وحتى تاريخ

ملاحظات	الوحدة	الكمية	رقم الطلب	تاريخ الطلب	البند	رقم البند
من المحطة ١٠+٨٦٠ كم - إلى المحطة ١٠+٩٦٠ كم	م.مط	٥٢٦,٠٠٠	١		بأحضر الطولي أعمال توريد و صب برودره من الخرسانة العادية (بأبعاد ٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت ٢٢٠ لايزيد أكبر بعد للحيات عن ١,٥ سم ٢٠,٤ مل ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البرودره على فرشته من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٢٠ سم طبقا للمخطوط والمسابك التصديرية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١م والتي تملئ بالكمز المضغوط سمك ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البرودره ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات ومواصفات هيئة الطرق والكبارى والمهندسين المشرف	٩٠
	م.مط	٥٢٦,٠٠٠			الإجمالي	

الكمية بالمستخلص ٥٠٠ م.مط

مهندس المشروع (الهيئة)

م



عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن

	 EL-MADAR GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING Dr. Akram Sultan Kadi		
	مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	
	حصر أعمال صب البردوره		
طول البردوره		الى المحطه	من المحطه
٢٩,٨٦	جنب البيوت	0+880	0+860
٣١,٠٩	جنب البيوت	0+900	0+880
٣١,٩١	جنب البيوت	0+920	0+900
٢٧,٩٧	جنب البيوت	0+960	0+940
٣١,١٤	جنب البيوت	0+980	0+960
٣١,٨٢	جنب البيوت	01+020	01+000
١٦,٦٢	جنب البيوت	01+050	01+040
١٥,٢٨	جنب البيوت	01+060	01+050
٢٥,٥١	جنب البيوت	01+080	01+060
٢٤,٦١	جنب البيوت	01+100	01+080
٢٧,٦٥	جنب البيوت	01+120	01+100
٢٧,٩٣	جنب البيوت	01+160	01+140
٢٢,٧٣	جنب البيوت	01+180	01+160
٢٩,٢٤	جنب البيوت	01+220	01+180
٢٨,٩	جنب البيوت	01+240	01+220
٧١,٩	جنب البيوت	01+300	01+240
٢٧,٦٣	جنب البيوت	01+340	01+320
٢٣,٧٨	جنب البيوت	01+360	01+340
٥٢٦	الاجمالي بالمتر الطولي		

مهندس الهيئة


١٤/٣





Dr. Mohamed Elmaghrabi

Dr. Mohamed Elmaghrabi



مجموعة المذكر الاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

مستخلص رقم ١ جاري عملية استكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الزمن

بيان كميات أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسنك ٦ سم مستخلص جاري ١ من بداية المشروع وحتى تاريخ

رقم البند	البند	تاريخ الطلب	رقم الطلب	الكمية	الوحدة	ملاحظات
١	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسنك ٦ سم بعد الامتثال باستخدام احجار صلبة لاجل تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة الدمير بالسويس أو ما يعادلها والقلعة تشمل اجراء التجارب المعملية والتحقيقية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للاختصاصات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف هذا مع احتساب ان مسافة نقل المواد (السن) متوسط ١٢٠ كم و مسافة النقل الداخلي للخلطة ٤٠ كم (علاوة ٠,٦ جنيه لكل ١٠ كم زيادة في مسافة النقل الداخلي للخلطة الاسفلتية و علاوة ٠,٦ جنيه لكل ٣٠ كجم زيادة نقل المواد السن			٢١٩٥٥,٢٤	٢م	من المنطقة ٠٠٣٦٠ - كم - الى المنطقة ١٤٣٦٠ كم
				٦٠٠٠,٠٠٠		تم حساب كمية في مستخلص جاري ٢ عقد ٢٠٢٢/٢٠٢٣
				١١٩٦٤,٢٠		تم حساب كمية في مستخلص جاري ٤ عقد ٢٠٢٢/٢٠٢٣
				٣٩٩١,٠٠٤		مستخلص
				٢١٩٥٥,٢٤	٢م	

الكمية بالمستخلص ٢١٩٩١

مهندس المشروع (الهيئة)

١/٢

٤٧٨٠٠٠٠٠٠٠

مهندس مسئول الاستشاري

مهندس القيمة

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن



EL-MIDAN GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Alwan Ibrahim Erab



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

حصر أعمال طبقه الرابطه

كمية المسطح	عرض	طول	الى المحطة	من المحطة
٠	١٨,٢٢	٢٠,٠٠	0+380	0+360
٤١٢,٥٢	٢٠,٦٣	٢٠,٠٠	0+400	0+380
٣٦٩,٧٦	١٨,٤٩	٢٠,٠٠	0+420	0+400
٣٥٥,٢٦	١٧,٧٦	٢٠,٠٠	0+440	0+420
٣٦٠,٨	١٨,٠٤	٢٠,٠٠	0+460	0+440
٤٠٠,١٤	٢٠,٠١	٢٠,٠٠	0+480	0+460
٤١٣,٧٨	٢٠,٦٩	٢٠,٠٠	0+500	0+480
٣٧٢,٨٢	١٨,٦٤	٢٠,٠٠	0+520	0+500
٣٦٢,١٤	١٨,١١	٢٠,٠٠	0+540	0+520
٣٦٩,٦٦	١٨,٤٨	٢٠,٠٠	0+560	0+540
٣٦٩,٧٨	١٨,٤٩	٢٠,٠٠	0+580	0+560
٣٨٨,٣٢	١٩,٤٢	٢٠,٠٠	0+600	0+580
٣٩٨,٣٨	١٩,٩٢	٢٠,٠٠	0+620	0+600
٣٧٨,٢٢	١٨,٩١	٢٠,٠٠	0+640	0+620
٣٩١,٤	١٩,٥٧	٢٠,٠٠	0+660	0+640
٤٤٠,٤٦	٢٢,٠٢	٢٠,٠٠	0+680	0+660
٤٣٢,٣	٢١,٦٢	٢٠,٠٠	0+700	0+680
٤٢٤,٧	٢١,٢٤	٢٠,٠٠	0+720	0+700
٤٣٨,٥٨	٢١,٩٣	٢٠,٠٠	0+740	0+720
٤٩٤,٠٤	٢٤,٧٠	٢٠,٠٠	0+760	0+740
٤٢٥,٠٦	٢١,٢٥	٢٠,٠٠	0+780	0+760
٤٣٦,١٦	٢١,٨١	٢٠,٠٠	0+800	0+780
٤٦٢,٩٢	٢٣,١٥	٢٠,٠٠	0+820	0+800
٤٨٢,٠٦	٢٤,١٠	٢٠,٠٠	0+840	0+820
٥٣٣,٨٤	٢٦,٦٩	٢٠,٠٠	0+860	0+840
٤٩٥,٦٢	٢٤,٧٨	٢٠,٠٠	0+880	0+860
٤٨٩,٣٤	٢٤,٤٧	٢٠,٠٠	0+900	0+880
٤٨٦,٤٢	٢٤,٣٢	٢٠,٠٠	0+920	0+900
٥٣١,٤	٢٦,٥٧	٢٠,٠٠	0+940	0+920
٤٩١,٦٨	٢٤,٥٨	٢٠,٠٠	0+960	0+940
٤٧٣,٦٨	٢٣,٦٨	٢٠,٠٠	0+980	0+960
٤٨٨,٢٢	٢٤,٤١	٢٠,٠٠	01+000	0+980
٤٦٦,١٢	٢٣,٣١	٢٠,٠٠	01+020	01+000
٤١٦,٢٢	٢٠,٨١	٢٠,٠٠	01+040	01+020
٤٠٠,٠٤	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	01+060	01+040
٣٨٤,٢	١٩,٢١	٢٠,٠٠	01+080	01+060
٤٢٢,٧٢	٢١,١٤	٢٠,٠٠	01+100	01+080



مهندس الهيئة
طارق (أ) عبد
٤٧٨

مهندس الشركة
عرو علاته

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيوي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن



AL-MENA GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Hossam Saba Taha



مجموعة المنار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

حصر أعمال طبقه الرابطه

كمية المسطح	عرض	طول	الى المحطة	من المحطة
٣٩١,٤٤	١٩,٥٧	٢٠,٠٠	01+120	01+100
٤٤٢,٨٦	٢٢,١٤	٢٠,٠٠	01+140	01+120
٤٧٤,٠٨	٢٣,٧٠	٢٠,٠٠	01+160	01+140
٣٣١,٣	١٦,٥٧	٢٠,٠٠	01+180	01+160
٣٢٨,٤٦	١٦,٤٢	٢٠,٠٠	01+200	01+180
٣٦٤	١٨,٢٠	٢٠,٠٠	01+220	01+200
٣٧٢,٨	١٨,٦٤	٢٠,٠٠	01+240	01+220
٣٢٦,١٦	١٦,٣١	٢٠,٠٠	01+260	01+240
٣٢٣,٥٦	١٦,١٨	٢٠,٠٠	01+280	01+260
٣٢٩,٣	١٦,٤٧	٢٠,٠٠	01+300	01+280
٣٧٩,٣٢	١٨,٩٧	٢٠,٠٠	01+320	01+300
٣٣٤,٣٢	١٦,٧٢	٢٠,٠٠	01+340	01+320
٣٣٥,٦٨	١٦,٧٨	٢٠,٠٠	01+360	01+340
٣٣٥	١٦,٧٥	٢٠,٠٠		01+360
١٤٢٨,٢	كمية بنها الرياح			
٢١٩٥٥,٢٤	الاجمالى بالمتر المسطح			



مهندس الهيئة
جاري عقد العمل



مستخلص رقم ١ جازي عملية استكمال اعمال وصف شارع احمد عازي من ام بنومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الايمن

بہان کمیات اعمال توریڈ ورش طیقۃ نشرب من البیوتومین السائل متوسط الطایر مستخلص جاری ۱ من بدایۃ المشروع وحتى تاریخ

رقم البند	البند	تاريخ الطلب	رقم الطلب	الكمية	الوحدة	ملاحظات
27	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين فوق المسائل متوسط التناير ٣٠ M/C بعدد ١,٢ كجم / ٢م/ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دسكها وتطبيقها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات المرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبيند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .			٢١٩٥٥,٢٤	٢م	من المنطقة ٢١٠- كم - الى المنطقة ١٠٣٦٠ كم
				٦٠٠٠,٠٠		تم حساب كفيه في مستخلص جاري ٢ عقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٥٦
				١١٩٦٤,٢٠		تم حساب كفيه في مستخلص جاري ١ عقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٢٩
				٢٩٩١,٠٤		متبقى
				٢١٩٥٥,٢٤	٢م	

تاریخ ۱۳۹۹

($\bar{a}_{100}^{(1)}$) $\times$ $\bar{E}_{\text{normal}}$ $\times$ $\bar{a}_{100}^{(1)}$

11/5/16

12

ΣΝΠ-2023

الاستاذ المساعد

الإجمالي

27

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عرابي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن



MGECE GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING

Dr. Ahmad Fahmy Fahmy



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

حصر أعمال طبقه التشريب

كمية المسطح	عرض	طول	الى المحطة	من المحطة
٠	١٨,٢٢	٢٠,٠٠	0+380	0+360
٤١٢,٥٢	٢٠,٦٣	٢٠,٠٠	0+400	0+380
٣٦٩,٧٦	١٨,٤٩	٢٠,٠٠	0+420	0+400
٣٥٥,٢٦	١٧,٧٦	٢٠,٠٠	0+440	0+420
٣٦٠,٨	١٨,٠٤	٢٠,٠٠	0+460	0+440
٤٠٠,١٤	٢٠,٠١	٢٠,٠٠	0+480	0+460
٤١٣,٧٨	٢٠,٦٩	٢٠,٠٠	0+500	0+480
٣٧٢,٨٢	١٨,٦٤	٢٠,٠٠	0+520	0+500
٣٦٢,١٤	١٨,١١	٢٠,٠٠	0+540	0+520
٣٦٩,٦٦	١٨,٤٨	٢٠,٠٠	0+560	0+540
٣٦٩,٧٨	١٨,٤٩	٢٠,٠٠	0+580	0+560
٣٨٨,٣٢	١٩,٤٢	٢٠,٠٠	0+600	0+580
٣٩٨,٣٨	١٩,٩٢	٢٠,٠٠	0+620	0+600
٣٧٨,٢٢	١٨,٩١	٢٠,٠٠	0+640	0+620
٣٩١,٤	١٩,٥٧	٢٠,٠٠	0+660	0+640
٤٤٠,٤٦	٢٢,٠٢	٢٠,٠٠	0+680	0+660
٤٣٢,٣	٢١,٦٢	٢٠,٠٠	0+700	0+680
٤٢٤,٧	٢١,٢٤	٢٠,٠٠	0+720	0+700
٤٣٨,٥٨	٢١,٩٣	٢٠,٠٠	0+740	0+720
٤٩٤,٠٤	٢٤,٧٠	٢٠,٠٠	0+760	0+740
٤٢٥,٠٦	٢١,٢٥	٢٠,٠٠	0+780	0+760
٤٣٦,١٦	٢١,٨١	٢٠,٠٠	0+800	0+780
٤٦٢,٩٢	٢٣,١٥	٢٠,٠٠	0+820	0+800
٤٨٢,٠٦	٢٤,١٠	٢٠,٠٠	0+840	0+820
٥٣٣,٨٤	٢٦,٦٩	٢٠,٠٠	0+860	0+840
٤٩٥,٦٢	٢٤,٧٨	٢٠,٠٠	0+880	0+860
٤٨٩,٣٤	٢٤,٤٧	٢٠,٠٠	0+900	0+880
٤٨٦,٤٢	٢٤,٣٢	٢٠,٠٠	0+920	0+900
٥٣١,٤	٢٦,٥٧	٢٠,٠٠	0+940	0+920
٤٩١,٦٨	٢٤,٥٨	٢٠,٠٠	0+960	0+940
٤٧٣,٦٨	٢٣,٦٨	٢٠,٠٠	0+980	0+960
٤٨٨,٢٢	٢٤,٤١	٢٠,٠٠	01+000	0+980
٤٦٦,١٢	٢٣,٣١	٢٠,٠٠	01+020	01+000
٤١٦,٢٢	٢٠,٨١	٢٠,٠٠	01+040	01+020
٤٠٠,٠٤	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	01+060	01+040
٣٨٤,٢	١٩,٢١	٢٠,٠٠	01+080	01+060
٤٢٢,٧٢	٢١,١٤	٢٠,٠٠	01+100	01+080



مهندس الهيثم
جاري (١٩٢٨٤٧)

مهندس الشركة
عروسة

عملية استكمال اعمال رصف شارع احمد عراي من ام بيومي حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر القطاع الثاني في الاتجاه الأيمن



El-Masr Group Engineering Consulting

Dr. Alwan Salim Eidi



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

حصر أعمال طبقه التشريب

كمية المسطح	عرض	طول	الى المحطة	من المحطة
٣٩١,٤٤	١٩,٥٧	٢٠,٠٠	01+120	01+100
٤٤٢,٨٦	٢٢,١٤	٢٠,٠٠	01+140	01+120
٤٧٤,٠٨	٢٣,٧٠	٢٠,٠٠	01+160	01+140
٣٣١,٣	١٦,٥٧	٢٠,٠٠	01+180	01+160
٣٢٨,٤٦	١٦,٤٢	٢٠,٠٠	01+200	01+180
٣٦٤	١٨,٢٠	٢٠,٠٠	01+220	01+200
٣٧٢,٨	١٨,٦٤	٢٠,٠٠	01+240	01+220
٣٢٦,١٦	١٦,٣١	٢٠,٠٠	01+260	01+240
٣٢٣,٥٦	١٦,١٨	٢٠,٠٠	01+280	01+260
٣٢٩,٣	١٦,٤٧	٢٠,٠٠	01+300	01+280
٣٧٩,٣٢	١٨,٩٧	٢٠,٠٠	01+320	01+300
٣٣٤,٣٢	١٦,٧٢	٢٠,٠٠	01+340	01+320
٣٣٥,٦٨	١٦,٧٨	٢٠,٠٠	01+360	01+340
٣٣٥	١٦,٧٥	٢٠,٠٠		01+360

١٤٢٨,٢

كمية بنها الرياح

٢١٩٥٥,٢٤

الاجمالي بالمتر المسطح



مهندس الهيئة
صالح
جار الله
٧٨



جامعة بنها
كلية الهندسة ببنها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



تقرير فني عن

اختبارات جودة الدمك

رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الاستشاري: مكتب المدار للاستشارات الهندسية
شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق


معد التقرير والمشرف علي الاختبارات
ا.م.د/ محمد سمير عيسى

د. احمد سرور

يعتمد
عميد الكلية

١٢

ا.د / السيد علي فؤاد





جامعة بنها
كلية الهندسة ببها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



نتائج اختبار جودة الدمك

العميل :	شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق - الهيئة العامة للطرق والكباري
المهروع :	رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني)
الامتحاري:	مكتب المدار للاستشارات الهندسية

مقدمة :

تم عمل اختبار جودة الدمك لعدد 3 نقاط من الطبقة الاولى من اعمال اساس من رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني) وكانت النتائج كما في الجدول التالي :

رقم النقطة	المحطة	كثافة جافة جم /سم ³	جودة الدمك %
1	1+300	2.151	98.67
2	1+060	2.145	98.39
3	0+880	2.156	98.90

• الكثافة الجافة = الكثافة الكلية / (1 + المحتوي المائي)

ملاحظات:

اقصى كثافة جافة من تجربة بروكتر = 2.180 جم /سم³

الخلاصة:

النتائج مقبولة فنياً وصالحة طبقاً للمواصفات العامة للطرق والكباري وذلك لعدد 3 نقاط من الطبقة الاولى من اعمال اساس من رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني).



معد التقرير والمشرط على الاختبارات
أ.م.د/ محمد سمير عيسى

د/ احمد سرور



جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



نتائج اختبار جودة الدمك

العميل :	شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق - الهيئة العامة للطرق والكباري
المشروع :	رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني)
الامتياز :	مكتب المدار للاستشارات الهندسية

مقدمه :

تم عمل اختبار جودة الدمك لعدد 3 نقاط من الطبقة الثانية من اعمال اساس من رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني) وكانت النتائج كما في الجدول التالي :

رقم النقطة	المحطة	كثافة جافة جم /سم ³	جودة الدمك %
1	1+340	2.139	98.12
2	1+100	2.143	98.30
3	0+900	2.150	98.62

• الكثافة الجافة = الكثافة الكليه / (1 + المحتوي المائي)

ملاحظات:

اقصى كثافة جافة من تجربة بروكتر = 2.180 جم /سم³

الخلاصة:

النتائج مقبولة فنياً وصالحة طبقاً للمواصفات العامة للطرق والكباري وذلك لعدد 3 نقاط من الطبقة الثانية من اعمال اساس من رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني).



معد التقرير والمشرط على الاختبارات
ا.م. د/ محمد سمير عيسى

د/ محمد سمير



جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



نتائج اختبار جودة الدمك

العمل :	شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق - الهيئة العامة للطرق والكباري
المخبر :	رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني)
الامتياز :	مكتب المدار للاستشارات الهندسية

مقدمه :

تم عمل اختبار جودة الدمك لعدد 3 نقاط من الطبقة الثالثة من اعمال اساس من رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني) وكانت النتائج كما في الجدول التالي :

رقم النقطة	المحطة	كثافة جافة جم /سم ³	جودة الدمك %
1	1+350	2.148	98.53
2	1+120	2.147	98.49
3	0+870	2.153	98.76

• الكثافة الجافة = الكثافة الكلية / (1 + المحتوي المائي)

ملاحظات:

أقصى كثافة جافة من تجربة بروكتر = 2.180 جم /سم³

الخلاصة:

النتائج مقبولة فنياً وصالحة طبقاً للمواصفات العامة للطرق والكباري وذلك لعدد 3 نقاط من الطبقة الثالثة من اعمال اساس من رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني).



معد التقرير والمشراف علي الاختبارات
أ.م.د/ محمد سمير عيسى

د. احمد عيسى



جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



اختبارات عينات مواد (سن 6 – ركام كبير بولدر)

رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الاستشاري: مكتب المدار للاستشارات الهندسية
شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق

معد التقرير والمشرّف علي الاختبارات

ا.م.د/ محمد سمير عيسى

د.م.ع.س

يعتمد

عميد الكلية

٢٠٢٧

ا.د/ السيد علي فؤاد





جامعة بنها
كلية الهندسة ببها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



نتائج اختبارات عينة سن اساس

العمول	شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق - الهيئة العامة للطرق والكباري
المحروغ	رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني)
الاصحاري:	مكتب المدار للاستشارات الهندسية

المقدمة:

تم توريد عينات من سن (6) ناتج تكسير كسارات بمعرفة شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق والتوريدات وذلك من رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني).

الاختبارات :

1- اختبار التدرج الحبيبي

رقم المهزة	نسب المار %	المواصفات %
"2	100	100
"1.5	97	100-70
"1	63	85-55
"4/3	55	80-50
"8/3	46	70-40
رقم 4	27	60-30
رقم 10	23	50-20
رقم 40	16	30-10
رقم 200	9	15-5



معد التقرير والمشرّف علي الاختبارات

ا.م.د/ محمد سمير عيسى

د. محمد عيسى



جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



2- باقي الاختبارات

المواصفات	العينة	الاختبار
لا يزيد عن 50 %	30	التآكل %
لا يزيد عن 10 %	2.20	الإمتصاص %
لا يزيد عن 5 %	0,50	التفتت %
	2,213	وزن نوعي كلي
---	2,332	وزن نوعي مشبع الداخل جاف السطح
	2,517	وزن نوعي ظاهري
لا يزيد عن 25	-	حد السيولة
لا يزيد عن 6	عديمة	مجال التدونة
---	2,180	أقصى كثافة جافة طن / م ³
---	6,50	نسبة الرطوبة الأصوية %
لا تقل عن 80	82	نسبة تحمل كاليفورنيا

الخلاصة:

- 1- تم توريد العينة بمعرفة شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق والتوريدات وذلك من رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني).
- 2- عينات السن التي تم اختبارها جيدة ومطابقة لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والمعمل غير مسؤول عن التشوينات بالموقع .

معد التقرير والمشرّف علي الاختبارات

ا.م.د/ محمد سمير عيسى

د. هيرش





جامعة بنها
كلية الهندسة بنها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



تقرير فني

عن

نتائج اختبار عينات تربه مورده من مشروع
رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الاستشاري: مكتب المدار للاستشارات الهندسية
شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق

معد التقرير والمشراف علي الاختبارات

ا.م.د/ محمد سمير عيسى

استشاري الهندسة الجيوتقنية

رقم استشاري 01/7167

د/ محمد سرخس



يعتمد

عمد الكلية

ا.د / السيد علي فؤاد





جامعة بنها
كلية الهندسة ببها
وحدة الورش والمعامل والاستشارات الهندسية



نتائج اختبار عينات تربه

العميل :	شركة الجارحي للبناء والتشييد واتشاء الطرق - الهيئة العامة للطرق والكباري
المشروع :	رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني)
الامتحاري:	مكتب المدار للاستشارات الهندسية

المقدمة:

تم توريد عينات تربه بمعرفة شركة الجارحي للبناء والتشييد واتشاء الطرق - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري وتحت مسؤوليتها وذلك من مشروع رصف شارع احمد عرابي بمحافظة القليوبية (القطاع الثاني) وتم عمل الاختبارات التالية عليها:
الاختبارات :

الاختبار	العينة عمق 1.40 متر
حد السيولة L.L	30
مجال اللدونة P.I	9
التصنيف طبقا ل AASHTO	A4
نسبة تحمل كاليفورنيا	7
الانتفاش %	0.5

ملاحظات :

التربة مخلفات حتى عمق 1.30 متر تقريبا.

التوصيات :

- 1- يتم عمل قطع في التربه الحالية بسمك لا يقل عن 140 سم من منسوب الارض الطبيعية مع الحفاظ علي الكابلات والمرافق ودمك قاع الحفر جيدا مع عمل اختبارات التأكد من جودة الدمك .
- 2- يتم وضع ركام كبير بولدر بسمك 80 سم.
- 3- نقتراح استخدام طبقة اساس بسمك لا يقل عن 60 سم يتم وضعها علي ثلاثة طبقات او طبقا للتصميم الإنشائي للطريق مع الدمك الجيد بحيث لا تقل نسبة الدمك عن 98% من اقصى كثافته جافة في المعمل باستخدام جهاز بروكتور المعدل.



معد التقرير والمشراف علي الاختبارات

د/ محمد سمير عيسى

استشاري الهندسة الجيوتقنية

رقم استشاري 01/7167

د. احمد سرور

شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

منهجية تنفيذ المشروع

مشروع: تنفيذ استكمال أعمال رصف شارع احمد عرابي من أم بيومي حتى كوبري ١٥ مايو (بطول ٥٠٠ م.ط)

(القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر

بمحافظة القليوبية



● منهجية تنفيذ المشروع

- ١- مرحلة التصميم
- ٢- مرحلة التنفيذ
- ٣- مرحلة المراقبة و التحكم
- ٤- انتهاء المشروع



• مرحلة التصميم :

بعد اسناد المشروع / تنفيذ اعمال تنفيذ استكمال القطاع الثاني من شارع احمد عرابي من أم بيومي حتي كوبري ١٥ مايو (بطول ٥٠٠ م.ط) الي شركة الجارحي للبناء والتشييد وانشاء الطرق تقوم الشركة بالتعاون مع استشاري المشروع بعمل تقرير صلاحيات للطريق القائم لتحديد التصميم الانشائي للطريق بعد اخذ عينات من الاسفلت القائم و طبقة الاساس القائمة و معرفة نوع التربة و التأكد من عدم وجود اي مياه جوفية او مواد عضوية .

يتم عمل رفع مساحي كامل (ASBUILT) للطريق مع ابراز كافة التفاصيل من طرق فرعية و اعمدة انارة و تعديات و خطوط المرافق و غرف المرافق

يتم الدمج بين نتيجة صلاحية الطريق القائم و الرفع المساحي لتصميم الطريق باعلي جودة و اقل تكلفة

يتم اعتماد التصميم من قبل المالك و الاستشاري و من بعده تتم عملية التنفيذ



• مرحلة التنفيذ

١- نقل الموقع

تقوم الشركة بنقل المعدات و الكرفانات الخاصة بالشركة مع تحديد مكان عمل مشون لطبقة الاساس

٢- لوحات SHOPDRAWING

يقوم مهندس مكتب فني الشركة باعداد لوحات التشغيل الي الاطقم المساحية و ذلك لبدء اعمال التوقيع و التشغيل و عمل لوحة LAYOUT للمشروع

٣- تنفيذ بنود الاعمال



• تكسير الاسفلت القائم

تقوم الشركة بازالة الاسفلت القائم بواسطة المعدات الحديثة و بمنتهي الدقة للحفاظ علي خطوط المرافق مع نقل ناتج التكسير أول ب أول الي المقلب العمومي

• مراحل ازالة الاسفلت القائم

م	المحطة		الطول (م.ط)	متوسط العرض (م.ط)
	من	الي		
١	٨٦٠ + ٠	٩٦٠ + ٠	١٠٠	٢٠ م
٢	٩٦٠ + ٠	٠١ + ٠٦٠	١٠٠	٢٧ م
٣	٠١ + ٠٦٠	٠١ + ١٦٠	١٠٠	٣٠ م
٤	٠١ + ١٦٠	٠١ + ٢٦٠	١٠٠	٣١,٥ م
٥	٠١ + ٢٦٠	٠١ + ٣٦٠	١٠٠	٢٩,٥ م



• أعمال قطع التربة

تقوم الشركة بقطع التربة بواسطة المعدات الحديثة و بمنتهي الدقة للحفاظ علي خطوط المرافق مع نقل ناتج التكسير أول ب أول الي المقلب العمومي وذلك لوصول لقاع الحفر

• مراحل قطع التربة

م	المحطة		الطول (م.ط)	متوسط العرض (م.ط)
	من	الي		
١	٨٦٠ + ٠	٩٦٠ + ٠	١٠٠	٢٠ م
٢	٩٦٠ + ٠	٠١ + ٠٦٠	١٠٠	٢٧ م
٣	٠١ + ٠٦٠	٠١ + ١٦٠	١٠٠	٣٠ م
٤	٠١ + ١٦٠	٠١ + ٢٦٠	١٠٠	٣١,٥ م
٥	٠١ + ٢٦٠	٠١ + ٣٦٠	١٠٠	٢٩,٥ م



• توريد طبقة الاساس

يتم اعتماد محجر الاساس من قبل معامل الهيئة ثم البدء بتوريد الكمية مع خلطها بالمياه الاصلوية لتوريدها مبلة علي الطريق

• تشغيل طبقة الاساس

تتم عملية التشغيل بمعدات حديثة و اجهزة مساحية تتم معايرتها باستمرار

• مراحل تشغيل طبقة الاساس

م	المحطة		الطول (م.ط)	متوسط العرض (م.ط)
	من	الي		
١	٨٦٠ + ٠	٩٦٠ + ٠	١٠٠	٢١,٥ م
٢	٩٦٠ + ٠	٠١ + ٠٦٠	١٠٠	٢٥,٥ م
٣	٠١ + ٠٦٠	٠١ + ١٦٠	١٠٠	٢٦,٥ م
٤	٠١ + ١٦٠	٠١ + ٢٦٠	١٠٠	٢٥,٥ م
٥	٠١ + ٢٦٠	٠١ + ٣٦٠	١٠٠	٢٣,٥ م



• أعمال الترميم

يتم العمل علي ترميم القطاع في حالة الانتهاء من أعمال طبقة الأساس وقبل بدء التنفيذ في أعمال الرصف .

• بدء اعمال الرصف

• اعتماد الخلطة

يتم ارسال عينة و تصميم الخلطة و ذلك لاعتمادها

• رش MC

بعد الانتهاء من اعمال طبقة الاساس يتم رش الطريق MC تمهيدا لاعمال الرصف و يكون معدل الرش ٢,١ كجم/ م^٢

• مراحل رش MC

م	المحطة		الطول (م.ط)	متوسط العرض (م.ط)
	من	الي		
١	٨٦٠+٠	٠١+٠٦٠	٢٠٠ م	١٧,٥ م
٢	٠١+٠٦٠	٠١+٢٦٠	٢٠٠ م	٢١,٥ م
	٠١+٢٦٠	٠١+٣٦٠	١٠٠ م	٢١ م



• الطبقة الرابطة

يتم البدء بفرد الطبقة الرابطة بعد رش ال MC بيومين بالمعدات الحديثة

• مراحل تشغيل الطبقة الرابطة

م	المحطة		الطول (م.ط)	متوسط العرض (م.ط)
	من	الي		
١	٨٦٠+٠	٠١+٠٦٠	٢٠٠ م	١٧,٥ م
٢	٠١+٠٦٠	٠١+٢٦٠	٢٠٠ م	٢١,٥ م
٣	٠١+٢٦٠	٠١+٣٦٠	١٠٠ م	٢١ م



• رش ال RC

يتم رش مادة سريعة التطاير قبل البدء باعمال الطبقة السطحية فوراً

• مراحل رش RC

م	المحطة		الطول (م.ط)	متوسط العرض (م.ط)
	من	الي		
١	٨٦٠+٠	٠١+٠٦٠	٢٠٠ م	١٧,٥ م
٢	٠١+٠٦٠	٠١+٢٦٠	٢٠٠ م	٢١,٥ م
٣	٠١+٢٦٠	٠١+٣٦٠	١٠٠ م	٢١ م



• الطبقة السطحية

يتم البدء بفرد الطبقة السطحية بعد رش ال RC بالمعدات الحديثة

• مراحل تشغيل الطبقة السطحية

م	المحطة		الطول (م.ط)	متوسط العرض (م.ط)
	من	الي		
١	٨٦.٠٠	٠.١ + ٠.٦٠	٢٠٠ م	١٧,٥ م
٢	٠.١ + ٠.٦٠	٠.١ + ٢٦.٠	٢٠٠ م	٢١,٥ م
٣	٠.١ + ٢٦.٠	٠.١ + ٣٦.٠	١٠٠ م	٢١ م



• مرحلة المراقبة و التحكم

تتم مراقبة و التحكم في المشروع لضمان تحركه كما هو مخطط له عن طريق تسليم بنود الاعمال أول ب أول و عمل اختبارات للمواد باستمرار و متابعة سير الكميات المنفذة في الموقع و ذلك بالتعاون مع مهندس الهيئة و المهندس الاستشاري .

• التقارير الاسبوعية و الشهرية

• الاجتماعات

• رصد التكاليف الفعلية مقابل التكاليف المخطط لها

• تحديد الفرص لتحسين اداء الجدول الزمني

• مرحلة انتهاء المشروع

يتم توثيق المشروع بالكامل

يتم تسليم المشروع بعد الانتهاء من كافة البنود و عمل لجنة الاستلام الابتدائي



شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

مشروع: تنفيذ استكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من ام بيومي

حتى كوبري 15 مايو بطول 500 متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن

بالأمر المباشر.

التقرير الأسبوعي لفترة

من 17/10/2023 الى 25/10/2023



التقرير الأسبوع 17 / 2023/10 الي 2023/10/25

1- القيام بالرفع المساحي للطريق بأكمله واستخدام الميزان وال total station و ال GPS في رفع عروض الطريق واطواله ومناسيبه.

2- أعمال التكسير الأسفلت والخرسانة و إزالة المخلفات.

3- تسليم أرض طبيعية / وتوريد طبقة أساس اولي وتشغيلها.


4- تسليم أولي أساس / وتوريد طبقة ثانية أساس وتشغيلها.


5- تسليم نهائي طبقة ثانية أساس. / وتوريد طبقة أساس ثالثة .

6- تسليم طبقة أساس ثالثة وعمل البردورة الخرسانة .






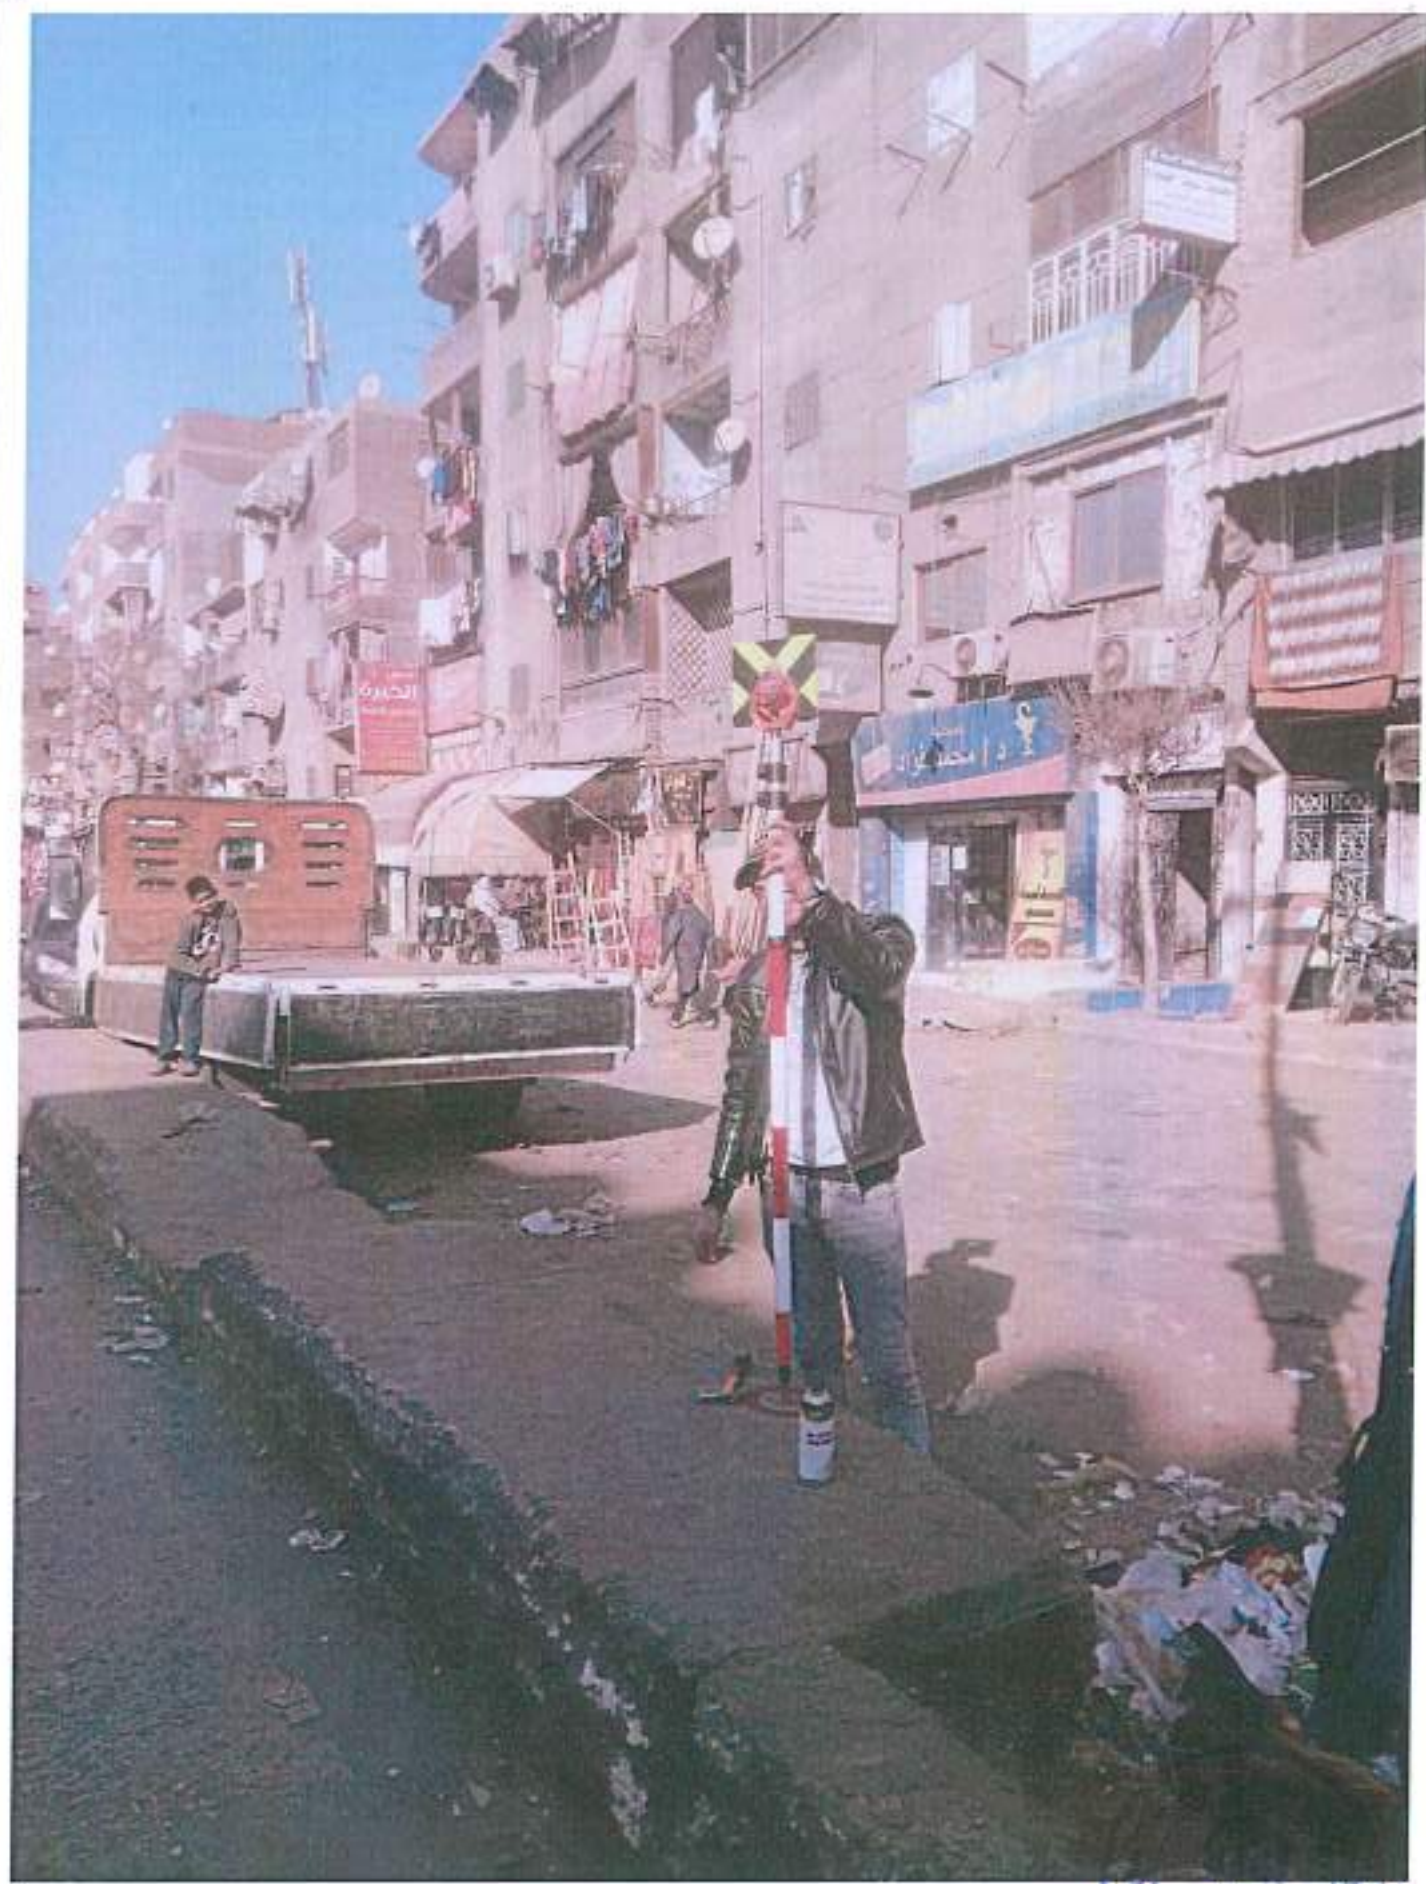


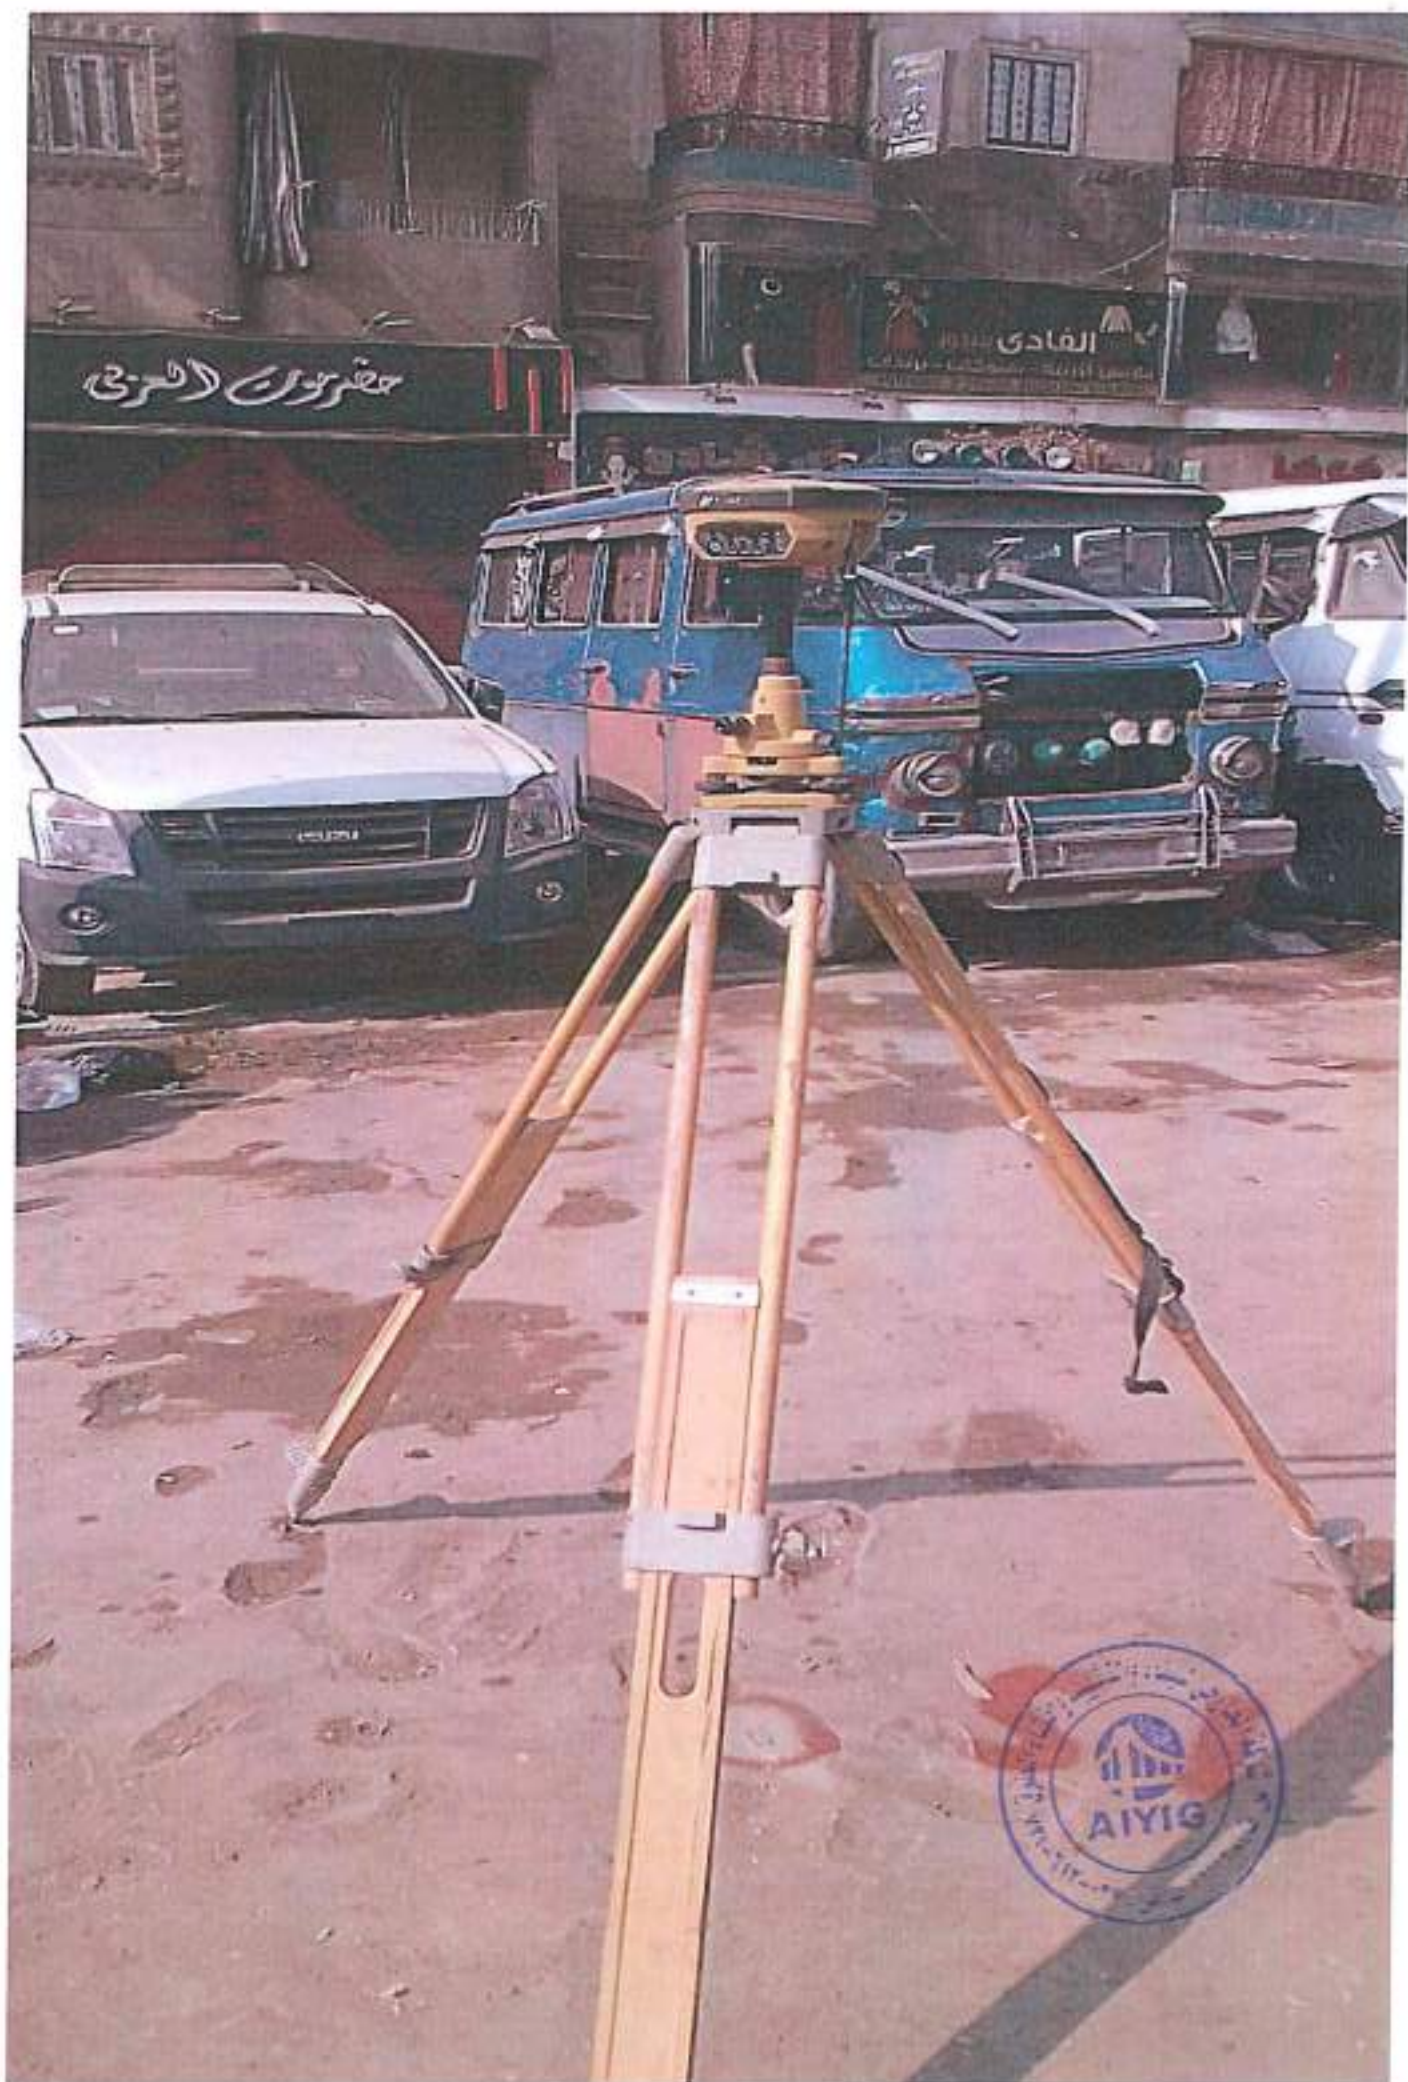





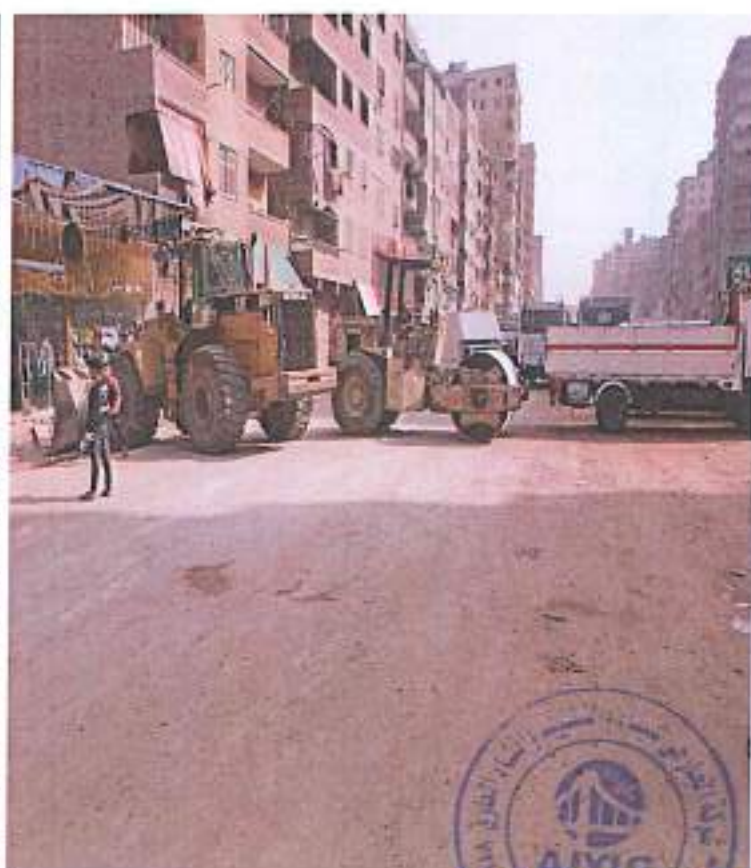

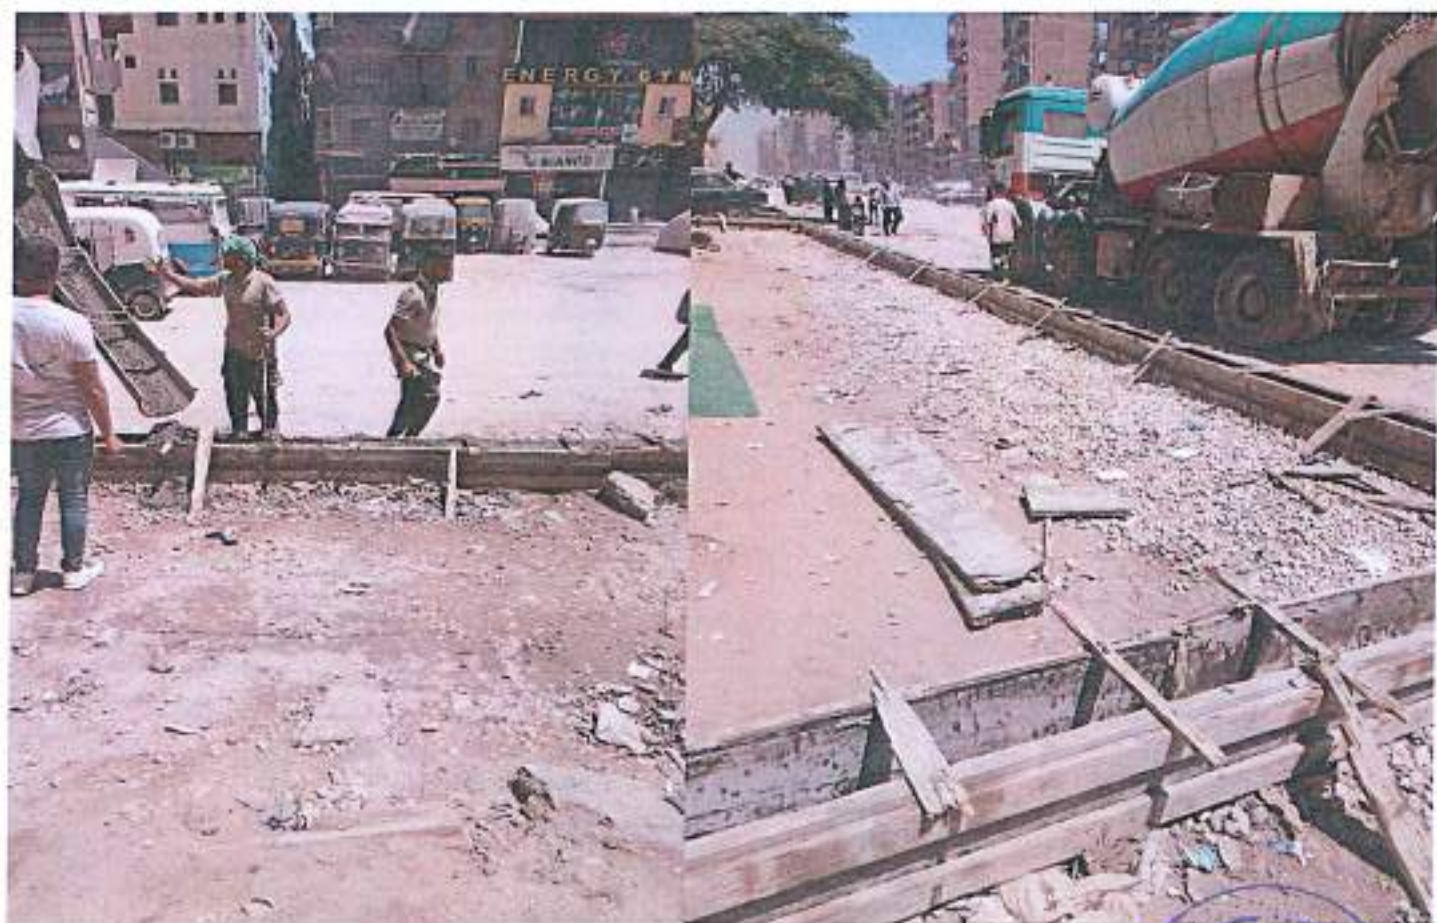



Dr. Hossam Elwan Elwan
Dr. Hossam Elwan Elwan

مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)



الهيئة العامة للطرق والكهارة والنقل البري



شركة الجارحي للبناء والتشييد والشاء الطرق

جديد / إضافة

T1A

نوع

طلب تسليم أعمال رفع مساحي

أعمال رفع كفاءة طريق شارع أحمد عرابي بطول ٥٠٠ متر بمحافظة القليوبية

تاريخ تقديم الطلب ٢٠٢١/١٠/٢٠ التوقيت

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة وبعد

٢ - طبقة ردم

١ - رفع الأرض الطبيعية

يرجى التكرم بالتحقق اللازم نحو إستلام

شك الطبقة /

رقم الطبقة ()

في المسافة من ٨٦٠ + إلى ٣٨٥١ + ٠١

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختباره

التاريخ المطلوب للفحص : / / التوقيت

١. أعمال الفحص البصري

بتاريخ : / /

مطابق

غير مطابق

٢. الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض		نوع الاختبار
	مقبول	مرفوض	
مرافق الرفع المساحي بتاريخ : / /			المستوي
			المساحي
			المساح

ملاحظات:

٣. الأعمال المعملية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع في : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول و الرفض		٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العلية
	جهة الدراسات الفنية برافعة									
										المحطة
										الاختبار
										النتيجة

الملاحظات

المهندس الاستشاري

☐

مرفوض D

☐

يعاد تقديمه طبقاً للملاحظات C

☐

تعتمد مع الملاحظات B

☒

تعتمد A

مهندس الهيئة

مهندس استشاري الهيئة

مهندس شركة

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

ثوابت المشروع (احمد عرابي)			
No	N	E	Z
1			26.447
2			26.211
3			26.36
4			26.382
5			25.93
6			25.57
Z10	825647.344	638977.418	28.08
Z11	825600.387	638976.323	28.418
Z12	825594.389	638977.27	29.081
Z13	825552.974	638973.394	28.442
Z14	825541.292	638973.712	28.124
Z15	825499.523	638972.246	28.537
Z16	825462.382	638969.61	28.949
Z17	825400.689	638968.225	27.704
Z18	825387.998	638967.726	27.436

مهندس الهيئة



مهندس الاستشاري



مهندس الشركة





Ministry of General Economic Cooperation
Dr. Mostafa El-Sayid



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

جديد / إعادة

TIA

كرد

طلب تسليم أعمال رفع مساحي

أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عربى بطول ٥٠٠ متر بمحافظة اقليبية

تاريخ تقديم الملف ٢٠٢٤/١٠/١٧ التوقيت

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة و بعد

يرجى التكرم باتخاذ اللازم لنحو إستلام طبقة ما قبل التكسير

سك الطبقة /

فى المسألة من ٨.٦٠ + ٠٠٠ إلى ١٠.٣٠ + ٠٠٠

أو الرسم المرفق لتسليح المراد إختياره

التاريخ المطلوب للمخصص : / / التوقيت

٢- طبقة ردم

١- رفع الأرض الطبيعية

رقم الطبقة (١)

١- أعمال الفحص البصري

بتاريخ : / /

غير مطابق ☐

مطابق ☒

٢- الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض		نوع الاختبار
	مرفوض	مقبول	
مرفق لرفع المساحي بتاريخ : / /		☒	المتسبب
		☒	العرض
		☒	المسك

ملاحظات:

٣- الأعمال المعجلة

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع فى : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض		٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العينة
	طبقا لمواصفات القياسية و الخاصة									
										المعجلة
										الاختبار
										النتيجة

الملاحظات

المهندس الاستشاري

☐

D مرفوض

☐

بعد تقديمه طبقا للملاحظات C

☐

تعتمد مع الملاحظات B

☒

A تعتمد

مهندس الهيئة

مهندس استشاري الهيئة

مهندس الشركة

الاسم : محمد صفوت

الاسم : إسلام ربيع

الاسم : محمد عشري

التاريخ :

التاريخ :

التاريخ :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

تسليم رفع أرض طبيعیه قبل التکسیر

PT	N	E	Z	D
359	825176.728	638981.369	26.112	Z
360	825176.845	638983.634	26.057	Z
361	825180.868	638980.973	26.116	Z
362	825181.052	638983.229	26.307	Z
363	825182.122	638982.405	26.161	Z
364	825187.227	638982.288	26.145	Z
367	825181.954	638987.571	26.02	Z
368	825180.12	638979.614	25.888	G
369	825180.083	638976.358	25.672	G
370	825179.688	638972.139	25.695	G
371	825179.654	638967.555	25.87	G
372	825178.004	638971.413	25.709	MH
373	825171.976	638967.581	25.799	G
374	825171.66	638970.144	25.761	G
375	825171.544	638975.009	25.648	G
376	825171.099	638979.819	25.879	G
377	825166.339	638979.916	25.784	G
378	825166.063	638976.987	25.633	G
379	825166.395	638974.226	25.593	G
380	825164.766	638973.732	25.607	MH
381	825164.642	638971.121	25.702	G
382	825165.012	638968.802	25.829	G
383	825159.109	638968.819	25.82	G
384	825159.109	638972.098	25.623	G
385	825158.878	638975.779	25.666	G
386	825158.74	638980.183	25.699	G
387	825153.657	638980.599	25.749	G
388	825153.467	638978.137	25.594	G
389	825154.015	638974.378	25.546	G
390	825153.926	638970.948	25.597	G
391	825154.343	638968.862	25.813	G

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

باري (1) ٢٨/٤

تسليم رفع أرض طبيعيه قبل التكسير

PT	N	E	Z	D
422	825108.786	638984.156	25.486	G
423	825108.671	638980.317	25.503	G
424	825109.674	638975.56	25.489	G
425	825109.419	638970.383	25.551	G
426	825102.738	638970.782	25.511	G
427	825105.04	638970.413	25.596	MH
428	825102.361	638972.427	25.253	MH
429	825102.311	638975.51	25.329	G
430	825102.173	638980.11	25.455	G
431	825101.903	638984.773	25.416	G
432	825093.105	638985.092	25.427	G
433	825092.398	638980.601	25.428	G
434	825092.463	638975.899	25.282	G
435	825092.418	638971.416	25.393	G
436	825084.561	638971.413	25.372	G
437	825084.818	638974.546	25.229	G
438	825085.565	638980.471	25.319	G
439	825085.839	638984.956	25.437	G
440	825077.573	638985.068	25.452	G
441	825077.498	638980.248	25.258	G
442	825077.204	638975.572	25.196	G
443	825076.748	638971.469	25.276	G
444	825081.219	638979.923	25.27	MH
445	825072.087	638984.894	25.407	G
446	825072.061	638981.224	25.276	G
447	825072.621	638977.436	25.186	G
448	825072.801	638974.046	25.227	G
449	825072.418	638971.767	25.346	G
450	825066.444	638971.982	25.383	G
451	825066.62	638974.186	25.272	G

مهندس الاستشاري




مهندس الشركة



تسليم رفع أرض طبيعيه قبل التكسير

PT	N	E	Z	D
485	825077.469	638968.348	25.473	GN
486	825077.566	638970.075	25.387	GN
487	825077.281	638971.421	25.307	GN
488	825079.92	638971.455	25.207	GN
489	825080.443	638968.709	25.287	GN
490	825082.398	638967.835	25.422	GN
491	825082.534	638969.67	25.323	GN
492	825083.111	638971.346	25.279	GN
493	825083.254	638971.256	25.552	M
494	825083.237	638969.793	25.757	M
495	825083.556	638967.914	25.799	M
496	825087.671	638967.624	25.734	M
497	825087.517	638970.021	25.728	M
498	825087.353	638970.773	25.727	M
499	825087.329	638970.798	25.595	M
500	825087.324	638971.281	25.579✓	M
501	825094.2	638971.085	25.585	M
502	825094.283	638970.752	25.613	M
503	825094.25	638970.722	25.798	M
504	825094.536	638967.242	25.8	M
505	825100.62	638967.465	25.846	M
506	825100.604	638970.698	25.84	M
507	825100.67	638970.684	25.584	M
508	825100.64	638971.134	25.583	M
509	825103.921	638970.727	25.542	M
510	825103.915	638970.688	25.815	M
511	825103.781	638967.522	25.863	M
512	825104.007	638971.614	25.366	GN
513	825104.175	638970.39	25.592	GN
514	825104.161	638967.115	25.622	GN

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

20/1/13

تسليم رفع أرض طبيعيه قبل التكسير

PT	N	E	Z	D
545	825145.328	638964.203	26.525	M
546	825145.745	638966.469	26.122	M
547	825145.688	638966.521	25.863	M
548	825145.693	638964.304	26.14	M
549	825145.703	638968.84	25.766	M
550	825152.249	638968.437	25.73	M
551	825152.277	638966.284	25.917	M
552	825152.229	638964.465	26.137	M
553	825152.765	638964.563	26.032	M
554	825160.909	638968.704	25.848	M
555	825160.713	638965.604	26.018	M
556	825160.393	638964.186	26.014	M
557	825166.445	638964.018	26.082	M
558	825166.754	638967.768	26.053	M
559	825172.053	638967.336	25.967	M
560	825171.843	638963.727	26.048	M
561	825172.107	638963.572	25.764	GN
562	825172.238	638967.363	25.747	GN
563	825175.045	638964.182	25.709	GN
564	825176.692	638963.822	25.786	GN
565	825177.121	638967.556	25.776	GN
566	825177.487	638967.343	26.093	M
567	825176.96	638964.515	26.205	M
568	825184.424	638967.187	26.12	M
569	825184.459	638964.405	26.162	M
570	825191.099	638963.869	26.168	M
571	825191.214	638966.701	26.157	M
572	825191.464	638966.774	26.026	M
573	825191.367	638963.897	26.199	M
574	825196.838	638963.711	25.968	M

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

تسليم رفع أرض طبيعيه قبل التكمير

PT	N	E	Z	D
605	825186.729	638974.803	25.699	G
606	825186.031	638979.102	25.886	G
608	825186.498	638982.263	26.17	M
609	825197.358	638982.079	26.038	M
612	825209.238	638981.838	26.126	M
613	825212.204	638982.201	26.004	M
661	825363.024	638987.014	25.519	G
662	825363.453	638981.214	25.404	G
663	825363.57	638975.669	25.356	G
664	825364.131	638971.871	25.386	G
665	825358.244	638971.729	25.455	G
666	825357.964	638974.688	25.389	G
667	825357.724	638979.258	25.442	G
668	825357.133	638983.465	25.567	MH
669	825356.577	638986.438	25.735	G
670	825345.201	638985.957	25.798	G
671	825345.009	638982.088	25.644	G
672	825345.142	638979.331	25.491	G
673	825345.72	638974.077	25.469	G
674	825345.995	638970.115	25.481	G
675	825338.085	638970.853	25.54	G
676	825337.91	638973.814	25.491	G
677	825337.431	638976.895	25.524	G
678	825336.465	638982.176	25.724	G
679	825336.596	638985.417	25.858	G
680	825328.622	638984.769	25.989	G
681	825328.783	638981.911	25.833	G
682	825328.788	638977.623	25.627	G
683	825329.227	638972.476	25.561	G
684	825328.867	638968.562	25.729	G

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

تسليم رفع أرض طبيعيه قبل التكسير

PT	N	E	Z	D
715	825261.559	638969.674	25.829	G
716	825261.869	638974.731	25.812	G
717	825261.363	638977.935	26.035	G
718	825260.201	638980.558	26.073	G
719	825253.085	638980.5	26.161	G
720	825252.817	638976.799	25.968	G
721	825252.252	638973.143	25.833	G
722	825251.847	638969.354	25.849	G
723	825251.498	638966.872	25.869	G
724	825242.466	638966.461	25.956	G
725	825243.113	638968.218	25.923	G
726	825243.055	638971.182	25.863	G
727	825243.012	638975.507	25.944	G
728	825244.341	638980.115	26.117	G
729	825235.913	638979.906	26.099	G
730	825234.882	638976.498	25.945	G
731	825234.762	638972.934	25.768	G
732	825235.695	638968.57	25.882	G
733	825235.42	638966.311	25.964	G
734	825226.475	638966.063	25.919	G
735	825226.192	638966.171	25.932	MH
736	825226.041	638974.919	25.876	G
737	825225.53	638979.499	26.003	G
738	825222.18	638979.327	25.926	G
739	825222.212	638976.643	25.893	G
740	825222.245	638972.896	25.716	G
741	825221.946	638968.93	25.843	G
742	825220.579	638965.477	25.878	G
743	825223.107	638965.503	26.378	M
744	825223.336	638961.924	26.392	M

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة







تسليم رفع أرض طبيعيه قبل التكسير

PT	N	E	Z	D
775	825103.987	638992.235	25.589	GZ
776	825103.649	638988.48	25.65	GZ
777	825104.097	638984.636	25.63	GZ
778	825113.117	638984.009	25.702	GZ
779	825113.187	638987.514	25.708	GZ
780	825114.426	638991.854	25.673	GZ
781	825122.122	638991.85	25.804	GZ
782	825122.6	638988.023	25.776	GZ
783	825122.918	638983.058	25.78	GZ
784	825132.452	638986.957	25.844	GZ
785	825141.775	638981.615	25.858	GZ
786	825142.13	638985.722	25.903	GZ
787	825142.615	638990.924	25.816	GZ
788	825156.365	638986.19	25.895	GZ
789	825156.063	638980.811	25.921	GZ
790	825162.066	638980.383	25.96	GZ
791	825164.068	638984.121	25.911	GZ
792	825164.455	638989.548	26.558	GZ
793	825176.593	638979.924	26.27	GZ
794	825333.653	638970.422	25.834	GN
795	825334.216	638970.395	26.039	GN
796	825334.316	638966.462	26.619	M
797	825340.914	638970.8	25.953	M
798	825341.136	638966.995	26.246	M
799	825343.801	638970.934	25.686	M
800	825187.236	638979.445	26.113	GZ
801	825181.978	638979.746	26.135	GZ
802	825354.465	638970.247	25.459	M
803	825355.016	638968.357	26.03	M
804	825356.635	638971.209	25.389	GN

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة


تمليم رفع أرض طبيعیه قبل التكمير

PT	N	E	Z	D
835	825387.703	638978.999	25.281	G
836	825387.708	638975.418	25.257	G
837	825388.195	638972.015	25.308	G
838	825397.22	638972.268	25.318	G
839	825396.993	638975.962	25.24	G
840	825396.993	638979.904	25.315	G
850	825424.412	638996.354	25.911	M
851	825426.336	638993.44	25.74	M
852	825427.218	638990.145	25.829	M
853	825435.475	638990.362	25.889	M
854	825436.846	638992.888	25.688	M
855	825436.713	638994.768	25.819	M
856	825446.535	638990.676	25.918	M
857	825446.728	638993.144	25.758	M
858	825446.593	638994.369	25.853	M
859	825455.023	638994.151	25.846	M
860	825455.234	638992.792	25.823	M
861	825455.792	638990.937	25.942	M
862	825463.451	638991.12	25.941	M
863	825463.393	638992.363	25.813	M
864	825463.146	638993.862	25.901	M
865	825470.126	638994.121	26.011	M
866	825470.266	638992.943	25.761	M
867	825470.219	638991.3	25.916	M
868	825479.546	638991.411	25.898	M
927	825556.125	638977.724	25.605	G
928	825555.951	638980.878	25.527	G
929	825555.411	638984.763	25.408	G
930	825556.013	638988.94	25.473	G
931	825555.764	638994.139	25.582	G

مهندس الاستشاري




مهندس الشركة



تسليم رفع أرض طبيعیه قبل التفسير

PT	N	E	Z	D
963	825498.067	638992.155	25.817	G
964	825498.388	638987.244	25.791	G
965	825498.7	638983.91	25.545	G
966	825499.007	638979.301	25.606	G
967	825499.556	638976.166	25.689	G
968	825489.427	638975.849	25.772	G
969	825489.039	638979.717	25.592	G
970	825488.281	638984.287	25.615	G
971	825487.815	638991.977	25.816	G
972	825478.887	638991.435	25.703	G
973	825478.942	638988.077	25.595	G
974	825478.631	638983.937	25.602	G
975	825478.832	638978.786	25.575	G
976	825479.021	638974.878	25.612	G
977	825475.305	638974.264	25.751	MH
978	825468.622	638974.458	25.847	G
979	825468.462	638977.375	25.675	G
980	825468.233	638982.217	25.53	G
981	825467.764	638987.487	25.757	G
982	825467.338	638991.14	25.843	G
983	825459.377	638990.922	25.857	G
984	825459.534	638986.475	25.793	G
985	825459.35	638981.75	25.531	G
986	825459.188	638974.672	25.704	G
987	825450.411	638973.783	25.744	G
988	825448.965	638977.141	25.537	G
989	825448.822	638981.538	25.534	G
990	825448.795	638986.195	25.839	G
991	825449.201	638990.686	25.894	G
992	825437.537	638990.281	25.777	G

مهندس الاستشاري




مهندس الشركة



تمليم رفع أرض طبيعیه قبل التکسیر

PT	N	E	Z	D
1023	825445.706	638970.509	25.73	M
1024	825448.272	638973.473	25.775	GN
1025	825448.076	638968.845	25.876	GN
1026	825450.969	638969.238	26.052	GN
1027	825450.494	638973.631	26.039	M
1028	825455.898	638974.104	25.821	M
1029	825457.578	638969.597	26.903	M
1030	825458.882	638969.598	26.407	M
1031	825462.085	638969.662	26.45	M
1032	825461.991	638974.299	25.845	M
1033	825458.623	638974.262	25.842	M
1034	825469.188	638974.058	25.844	M
1035	825472.041	638974.767	25.714	M
1036	825474.33	638973.398	25.742	GN
1037	825473.144	638970.099	25.761	GN
1038	825476.961	638969.767	25.672	GN
1039	825477.47	638974.399	25.891	M
1040	825478.818	638970.576	25.856	M
1041	825485.501	638971.028	25.86	M
1042	825186.219	638979.595	26.154	GZ
1043	825485.779	638970.882	26.849	M
1044	825492.397	638971.792	26.471	M
1045	825197.689	638979.182	26.039	GZ
1046	825208.669	638978.927	25.986	GZ
1047	825503.603	638972.07	25.914	GN
1048	825504.981	638972.103	25.828	GN
1049	825223.488	638979.49	26.019	GZ
1050	825223.041	638985.283	26.063	GZ
1051	825223.242	638990.967	26.061	GZ
1052	825235.085	638992.317	26.112	GZ

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

13/1/2018

تسليم رقع أرض طبيعيه قبل التكسير				
PT	N	E	Z	D
1083	825327.298	638993.586	26.124	GZ
1084	825335.539	638985.37	25.935	GZ
1085	825335.283	638989.01	26.023	GZ
1086	825335.4	638994.18	26.15	GZ
1087	825342.864	638993.991	26.01	GZ
1088	825342.535	638990.347	25.999	GZ
1089	825343.515	638985.933	25.844	GZ
1090	825349.993	638986.368	25.79	GZ
1091	825349.144	638989.955	25.918	GZ
1092	825349.45	638994.032	25.985	GZ
1093	825361.506	638994.926	25.922	GZ
1094	825363.869	638990.787	25.833	GZ
1095	825362.481	638987.691	25.664	GZ

طابعه (١) سنة ١٤٧٨

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



EL-HADAD GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING
Dr. Alwan Ibrahim Kad



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د. أنور سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد والشاء الطرق

مكتب / Office

TIA

كود

طلب تسليم أصل رفع مساحي

أصل رفع كفاءة طريق شارع احمد عرابى بطول ٥٠٠ متر بمحافظة القليوبية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠٢٢/١٠/١٧ التوقيت

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة و بعد

٢ - طبقة ردم

١ - رفع الأرض الطبيعية

رفع مساحي قبل القطع

يرجى التكرم بالتحقق اللازم نحو إستلام

سك الطبقة /

رقم الشقة ()

فى المسافة من ٥ + 86٥ إلى ٥ + 36٥

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختباره

التاريخ المطلوب للفحص : / / التوقيت

١. أعمال الفحص البصري

بتاريخ : / /

غير مطابق ☐

مطابق ☒

٢. الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض		نوع الاختبار
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحي بتاريخ : / /		☒	المنسوب
		☒	العرض
			المسك

ملاحظات:

٣. الأعمال المعملية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع في : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العيبة
	طية لموصلات القياسية أو الخاصة								المحطة
									الاختبار
									النتيجة

الملاحظات

المهندس الاستشاري

تعتمد A

تعتمد مع الملاحظات B

بعد تقديمه طبقا للملاحظات C

مرفوض D

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

Station	شيت مساحه تسليم قبل القطع						
	EDGE	0	5	10	15	20	EDGE
0+860	25.7352	25.6852	25.5852	25.4839	25.492	25.592	25.692
0+880	25.8635	25.8135	25.7135	25.5547	25.5349	25.6349	25.7349
0+900	25.8534	25.8034	25.7034	25.5203	25.5411	25.6743	25.7743
0+920	25.9399	25.8899	25.7899	25.5798	25.6198	26.0691	26.1691
0+940	25.9067	25.8567	25.6891	25.5662	25.6185	25.7431	25.8431
0+960	25.9039	25.8539	25.8383	25.5538	25.644	25.97	26.07
0+980	25.9067	25.8567	25.6184	25.4317	25.4527	25.6291	25.7291
01+000	25.76	25.6792	25.4342	25.3949	25.3557	25.6157	25.7157
01+020	25.61	25.3655	25.304	25.2632	25.3097	25.4097	25.5097
01+040	25.52	25.2303	25.3471	25.3244	25.3266	25.4266	25.5266
01+060	25.88	25.7429	25.5396	25.4408	25.4612	25.5612	25.6612
01+080	26.10	26.0041	25.7946	25.5854	25.6587	26.2173	26.3173
01+100	26.2876	26.2376	26.1379	25.8456	25.6288	25.722	25.822
01+120	26.2951	26.2451	26.1992	26.0493	25.8042	25.7537	26.1723
01+140	26.181	26.131	26.1926	26.0994	25.8742	25.8205	25.8866
01+160	26.2217	26.1717	26.1708	26.1471	25.9554	25.8366	25.878
01+180	26.1577	26.1077	26.1271	26.0901	25.9397	25.7965	25.9387
01+200	26.2272	26.1772	26.0772	25.9575	25.7133	25.7215	26.0081
01+220	26.1824	26.1324	26.0324	25.9936	25.8086	25.7069	25.9011
01+240	26.3704	26.3204	26.2204	25.9539	25.7897	25.7299	25.7338
01+260	26.007	25.957	25.857	25.7575	25.5746	25.6145	25.9386
01+280	25.9783	25.9283	25.8283	25.6192	25.5611	25.6226	26.0278
01+300	25.7184	25.6684	25.7014	25.5715	25.4534	25.6524	25.768
01+320	25.7179	25.6679	25.5679	25.4326	25.343	25.3704	25.7249
01+340	25.7788	25.7288	25.6288	25.4091	25.2313	25.2257	25.6202
01+360	25.6189	25.5689	25.4689	25.3044	25.2735	25.2787	25.4712

مهندس الهينة
EVA

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



AL-FHAY GROUP FOR ENGINEERING CONSULTING
Dr. Ahmad M. Al-Fay



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د. أحمد سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

جديد / عة

TJA

كود

طلب تسليم أعمال رفع مساحي

أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عرابى بطول ٥٠٠ متر بمحافظه القليوبية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠١٩ / ١٠ / ٢٠

المسيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة و بعد

٢- طبقة ردم

١- رفع الأرض الطبيعية

رفع مساحي بعد تكسير الاسفلت

يرجى التكرم باتخاذ اللازم نحو إستلام

رقم الطبقة ()

سمك الطبقة /

فى المسافة من ٥ + 860 إلى ٥١ + 36٥

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختباره

التاريخ المطلوب للفحص : / / التوقيت

١. أعمال الفحص البصري

بتاريخ : / /

غير مطابق ☐

مطابق ☒

٢. الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

القرار	حدود القبول والرفض		نوع الاختبار
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحي بتاريخ : / /		☒	المستوي
		☒	العرض
			المسك

ملاحظات:

٣. الأعمال المعملية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع في : / /

القرار	حدود القبول والرفض		٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العينة
	طبقا للمواصفات القياسية او الخاصة									
										المحطة
										الاختبار
										النتيجة

الملاحظات

تعتمد A

تعتمد مع الملاحظات B ☒

بعد تقديمه طبقا للملاحظات C ☐

مرفوض D ☐

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

Station	شيت مساحة تسليم بعد تكسير الاسفلت				
	0	5	10	15	20
0+860	25.2852	25.1852	25.0839	25.092	25.192
0+880	25.4135	25.3135	25.1547	25.1349	25.2349
0+900	25.4034	25.3034	25.1203	25.1411	25.2743
0+920	25.4899	25.3899	25.1798	25.2198	25.6691
0+940	25.4567	25.2891	25.1662	25.2185	25.3431
0+960	25.4539	25.4383	25.1538	25.244	25.57
0+980	25.4567	25.2184	25.0317	25.0527	25.2291
01+000	25.2792	25.0342	24.9949	24.9557	25.2157
01+020	24.9655	24.904	24.8632	24.9097	25.0097
01+040	24.8303	24.9471	24.9244	24.9266	25.0266
01+060	25.3429	25.1396	25.0408	25.0612	25.1612
01+080	25.6041	25.3946	25.1854	25.2587	25.8173
01+100	25.8376	25.7379	25.4456	25.2288	25.322
01+120	25.8451	25.7992	25.6493	25.4042	25.3537
01+140	25.731	25.7926	25.6994	25.4742	25.4205
01+160	25.7717	25.7709	25.7471	25.5554	25.4366
01+180	25.7077	25.7271	25.6901	25.5397	25.3965
01+200	25.7772	25.6772	25.5575	25.3133	25.3215
01+220	25.7324	25.6324	25.5936	25.4086	25.3069
01+240	25.9204	25.8204	25.5539	25.3897	25.3299
01+260	25.557	25.457	25.3575	25.1746	25.2145
01+280	25.5283	25.4283	25.2192	25.1611	25.2226
01+300	25.2684	25.3014	25.1715	25.0534	25.2524
01+320	25.2679	25.1679	25.0326	24.943	24.9704
01+340	25.3288	25.2288	25.0091	24.8313	24.8257
01+360	25.1689	25.0689	24.9044	24.8735	24.8787

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

جاري (1) عقد 1/18

مهندس الاسفلت



Ministry of General Engineering & Construction
M. General Engineering & Construction



مجموعة المنار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد وانشاء الطرق

جديد / إعادة

نوع

طلب تسليم أعمال رفع مساحى للأرض الطبيعية
أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عرابى بطول ٢٠٠ متر بحافظة قنطريية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠٢١/١٠/١٨ التوقيت

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة و بعد

٢- طبقة ردم

١- رفع الأرض الطبيعية

رقم الطبقة (٢)

يرجى التكرم باتخاذ اللازم نحو إستلام رفع مساحى مابد التكمير
سمك الطبقة /

فى المسافة من / ١٦٦٠ + إلى / ٢٦٠ +
أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختباره

التاريخ المطلوب للتخص : / / التوقيت

١. أعمال الفحص البصرى

بتاريخ : / /

☐ غير مطابق

☒ مطابق

٢. الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

القرار	حدود القبول و الرفض		نوع الاختبار
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحى بتاريخ : / /			المستوي
			العرض
			السمك

ملاحظات:

تم تسليم كامل المرفق في الحظيرة الجارية
تم نقل نتائج التكمير خارج الموقع

٣. الأعمال المعملية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطع فى : / /

القرار	حدود القبول و الرفض		العينة
	طبا للمواصفات القياسية او الخاصة	طبا للمواصفات القياسية او الخاصة	
	٧	٦	٥

الملاحظات

المهندس الاستشارى

☐ D مرفوض

☐ C بعد تقديمه طبقا للملاحظات

☒ B تعتمد مع الملاحظات

☐ A تعتمد

مهندس الهيئة

الاسم : محمد صقر

التاريخ : / /

التوقيع : / /

مهندس استشارى الهيئة

الاسم : اسلام ربيع

التاريخ : / /

التوقيع : / /

مهندس الشركة

الاسم : محمد عشري

التاريخ : / /

التوقيع : / /

PT	E	N	Z	D
1667	825237	638981.707	24.832	G
1668	825237.277	638976.229	24.895	G
1669	825237.162	638971.16	25.079	G
1670	825237.439	638966.777	25.129	G
1671	825223.25	638966.296	25.088	G
1672	825222.616	638970.319	24.963	G
1673	825222.571	638973.941	24.842	G
1674	825221.974	638977.72	24.664	G
1675	825220.634	638980.981	24.503	G
1676	825221.986	638986.034	24.552	G
1677	825221.342	638991.302	24.742	G
1678	825223.594	638992.929	24.965	G
1679	825208.792	638993.073	25.068	G
1680	825208.248	638991.441	24.794	G
1681	825207.65	638986.78	24.385	G
1682	825207.546	638981.209	24.614	G
1683	825207.546	638976.929	24.723	G
1684	825207.551	638972.44	24.863	G
1685	825207.085	638969.011	24.732	G
1686	825206.202	638965.342	25.005	G
1687	825190.649	638965.216	25.142	G
1688	825190.733	638968.554	24.973	G
1689	825191.302	638972.332	24.893	G
1690	825191.706	638976.536	24.723	G
1691	825191.878	638982.004	24.722	G
1692	825192.492	638987.549	24.679	G
1693	825192.508	638990.91	24.532	G
1694	825192.169	638992.895	24.948	G
1695	825327.113	638972.855	24.716	G
1696	825326.557	638986.989	24.766	G
1697	825326.144	638993.04	24.924	G
1698	825325.539	638994.888	25.018	G
1699	825336.641	638993.487	24.741	G
1700	825337.456	638987.727	24.599	G
1701	825338.036	638982.959	24.625	G
1702	825339.62	638973.445	24.588	G
1703	825339.848	638969.509	24.788	G
1704	825355.319	638969.145	24.566	G
1705	825355.397	638973.108	24.521	G
1706	825355.149	638979.072	24.527	G
1707	825354.833	638983.541	24.684	G
1708	825355.259	638988.389	24.628	G
1709	825355.723	638993.315	24.807	G

مهندس الاستشاري

جاري (١) سنة ٢٠١٨

مهندس الشركة

PT	E	N	Z	D
1710	825366.251	638996.559	25.059	G
1711	825366.363	638994.467	24.823	G
1712	825367.032	638992.001	24.539	G
1713	825367.2	638986.765	24.362	G
1714	825367.191	638980.121	24.431	G
1715	825367.008	638975.799	24.519	G
1716	825367.177	638971.267	24.577	G
1717	825367.335	638968.604	24.753	G
1718	825381.472	638969.512	24.692	G
1719	825381.391	638973.703	24.435	G
1720	825381.777	638979.492	24.373	G
1721	825391.975	638980.237	24.384	G
1722	825391.849	638975.997	24.502	G
1723	825391.851	638973.329	24.509	G
1724	825391.923	638970.349	24.647	G
1725	825406.11	638970.413	24.63	G
1726	825406.123	638971.5	24.455	G
1727	825406.597	638975.256	24.459	G
1728	825406.567	638979.179	24.415	G
1729	825406.082	638983.211	24.351	G
1730	825407.262	638986.342	24.5	G
1731	825417.053	638989.567	24.688	G
1732	825417.217	638986.97	24.353	G
1733	825417.851	638982.516	24.271	G
1734	825418.627	638977.578	24.297	G
1735	825418.371	638972.185	24.586	G
1736	825435.672	638974.352	24.509	G
1737	825435.691	638978.968	24.465	G
1738	825435.279	638983.852	24.44	G
1739	825435.291	638989.76	24.512	G
1740	825432.519	638996.237	25.333	G
1741	825432.783	638995.049	25.018	G
1742	825445.545	638995.705	25.438	G
1743	825446.063	638994.298	25.08	G
1744	825446.128	638992.449	24.779	G
1745	825446.985	638988.184	24.487	G
1746	825447.189	638983.326	24.597	G
1747	825446.774	638978.258	24.614	G
1748	825450.173	638973.584	24.72	G
1749	825461.624	638974.955	24.954	G
1750	825461.727	638978.499	24.668	G
1751	825461.727	638983.633	24.565	G
1754	825461.465	638989.303	24.558	G

مهندس الاستشاري

١٣/٤/٢٠١٤
عبدالله بن محمد

مهندس الشركة

PT	E	N	Z	D
1865	825134.465	638986.275	24.799	G
1866	825134.519	638989.398	24.746	G
1867	825134.871	638992.892	24.897	G
1868	825145.214	638992.808	25.026	G
1869	825145.276	638991.326	24.846	G
1870	825144.764	638985.581	24.727	G
1871	825144.574	638983.194	24.823	G
1872	825144.445	638978.781	25.004	G
1873	825144.583	638974.625	25.112	G
1874	825145.259	638970.677	25.207	G
1875	825145.79	638966.737	25.531	G
1876	825155.623	638966.15	25.077	G
1877	825155.912	638967.982	24.755	G
1878	825156.312	638971.547	24.654	G
1879	825156.775	638975.821	24.603	G
1880	825157.812	638982.29	24.32	G
1881	825158.418	638987.28	24.278	G
1882	825158.459	638991.778	24.508	G
1883	825169.735	638992.335	24.756	G
1884	825169.851	638990.644	24.574	G
1885	825169.704	638984.407	24.662	G
1886	825169.313	638979.466	24.706	G
1887	825169.046	638972.189	24.802	G
1888	825168.559	638965.984	24.988	G
1889	825179.694	638965.746	25.142	G
1890	825180.12	638969.478	24.959	G
1891	825180.308	638975.407	24.762	G
1892	825181.13	638978.474	24.794	G
1893	825180.9619	638991.1962	24.85	G
1894	825181.356	638964.518	25.705	M
1895	825170.202	638963.77	25.856	M
1896	825170.574	638964.92	25.759	M
1897	825155.054	638964.352	25.569	M
1898	825154.969	638965.93	25.562	M
1899	825142.722	638964.201	26.541	M
1900	825142.967	638966.701	26.536	M
1901	825128.752	638965.223	25.993	M
1902	825128.97	638968.314	25.947	M
1903	825103.724	638967.407	25.854	M
1904	825103.379	638968.271	25.857	M
1905	825083.53	638967.798	25.916	M
1906	825083.474	638968.325	25.765	M
1907	825171.272	638964.754	25.75	M

مهندس الاستشاري

ص.ب. ٤٨٨
جاري (١) سنة ١٤٢٨ هـ

مهندس الشركة

PT	E	N	Z	D
1908	825171.242	638963.851	25.756	M
1909	825166.587	638965.87	25.574	M
1914	825146.5	638968.525	25.882	M
1915	825145.791	638966.421	26.14	M
1916	825145.639	638966.469	26.541	M
1917	825145.273	638964.585	26.543	M
1918	825141.812	638964.961	26.525	M
1919	825141.888	638966.743	26.532	M
1920	825141.715	638966.699	26.173	M
1921	825141.576	638964.924	26.182	M
1922	825121.809	638968.277	25.811	M
1923	825121.938	638966.087	25.837	M
1924	825117.701	638967.212	25.774	M
1925	825108.012	638967.525	25.786	M
1926	825103.963	638967.382	25.848	M
1927	825083.212	638968.118	25.782	M
1928	825076.226	638969.673	25.589	M
1929	825076.391	638968.256	25.679	M
1930	825066.09	638968.814	25.736	M
1931	825066.141	638970.374	25.801	M
1932	825065.65	638968.697	25.53	M
1933	825065.773	638970.32	25.556	M
1934	825055.323	638968.811	25.621	M
1935	825055.289	638970.716	25.646	M
1936	825039.056	638970.301	25.615	M
1937	825039.076	638971.34	25.615	M
1938	825026.357	638971.582	25.705	M
1939	825026.49	638972.475	25.706	M
1940	825343.643	638969.492	25.77	M
1941	825341.395	638969.64	25.762	M
1942	825340.605	638968.751	25.449	M
1943	825334.591	638968.251	25.455	M
1944	825302.167	638965.841	25.481	M
1945	825302.125	638964.97	25.483	M
1946	825291.618	638965.854	25.533	M
1947	825291.556	638965.012	25.603	M
1948	825290.747	638964.474	26.342	M
1949	825290.501	638965.659	26.275	M
1950	825286.405	638965.367	26.358	M
1951	825281.907	638965.707	26.459	M
1952	825276.001	638965.466	25.677	M
1953	825264.708	638965.668	25.813	M
1954	825264.762	638964.225	25.762	M

مهندس الاستشاري

صالح
جاري (١) عقد ١٧

مهندس الشركة

PT	E	N	Z	D
1955	825264.602	638964.01	26.273	M
1956	825264.546	638965.792	26.303	M
1957	825254.78	638964.984	26.156	M
1958	825254.717	638963.7	26.283	M
1959	825247.64	638966.466	25.637	M
1960	825239.183	638963.082	25.866	M
1961	825239.141	638965.803	25.85	M
1962	825228.913	638962.751	25.907	M
1963	825228.863	638965.591	25.873	M
1964	825222.917	638963.839	25.762	M
1965	825221.811	638962.238	25.904	M
1966	825205.155	638963.174	25.616	M
1967	825205.389	638964.179	25.529	M
1968	825360.798	638966.32	25.118	M
1969	825381.529	638966.785	24.892	M
1970	825388.536	638969.695	25.041	M
1971	825391.176	638968.065	25.085	M
1972	825413.608	638970.532	25.136	M
1973	825413.494	638968.376	25.147	M
1974	825419.8	638972.022	25.163	M
1975	825432.333	638973.012	25.209	M
1976	825434.055	638972.839	25.164	M
1977	825434.494	638969.42	24.988	M
1978	825450.483	638973.452	25.559	M
1979	825450.724	638969.198	25.565	M
1980	825477.351	638973.905	25.229	M
1981	825478.726	638970.489	25.395	M
1982	825487.965	638975.112	25.761	M
1983	825488.336	638972.324	25.757	M
1984	825491.798	638974.814	25.75	M
1985	825492.455	638971.762	25.9	M
1986	825503.406	638974.859	25.854	M
1987	825503.305	638972.618	25.879	M
1988	825507.04	638976.196	25.952	M
1989	825508.383	638972.421	25.971	M
1990	825531.764	638976.915	25.813	M
1991	825532.355	638973.898	25.825	M
1992	825536.048	638976.665	25.804	M
1993	825536.516	638974.127	25.82	M
2059	825534.746	638986.66	25.098	MH
2172	825055.651	638979.179	25.028	SEN
47963	825555.043	638977.353	24.648	G
47964	825555.179	638980.684	24.585	G

مهندس الاستشاري

جاري (ال) ٤٧٨

مهندس الشركة

PT	E	N	Z	D
47965	825555.927	638985.779	24.524	G
47966	825554.64	638992.668	24.424	G
47967	825554.344	638995.789	24.571	G
47968	825554.423	638998.231	24.975	G
47969	825553.108	638973.422	25.889	M
47970	825553.139	638975.717	25.831	M
47971	825555.043	638977.353	24.648	G
47972	825555.179	638980.684	24.585	G
47973	825555.927	638985.779	24.524	G
47974	825554.64	638992.668	24.424	G
47975	825554.344	638995.789	24.571	G
47976	825554.423	638998.231	24.975	G
47977	825553.108	638973.422	25.889	M
47978	825553.139	638975.717	25.831	M
47979	825540.631	638977.877	24.748	G
47980	825540.91	638981.374	24.589	G
47981	825540.661	638985.311	24.519	G
47982	825540.474	638988.795	24.447	G
47983	825540.632	638993.018	24.278	G
47984	825540.128	638994.124	24.38	G
47985	825540.344	638995.637	24.531	G
47986	825555.168	638997.698	24.829	G
47987	825555.209	638996.632	24.549	G
47988	825555.548	638992.631	24.296	G
47989	825555.788	638988.819	24.39	G
47990	825556.164	638984.754	24.462	G
47991	825556.481	638981.186	24.475	G
47992	825557.061	638977.893	24.724	G
47993	825555.043	638977.353	24.648	G
47994	825555.179	638980.684	24.585	G
47995	825555.927	638985.779	24.524	G
47996	825554.64	638992.668	24.424	G
47997	825554.344	638995.789	24.571	G
47998	825554.423	638998.231	24.975	G
47999	825553.108	638973.422	25.889	M
48000	825553.139	638975.717	25.831	M

مهندس الاستشاري

صافي
جاري

مهندس الشركة



Dr. Hisham Elwan Elwan
Dr. Hisham Elwan Elwan

مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)



الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري



شركة الجارحي للبناء والتشييد واتشاء الطرق

كود TIA ١٤٣٥ / ١٤٣٦

طلب تسليم أعمال رفع مساحي
أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عرابي بطول ٥٠٠ متر بمحافظة القنوبية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٨

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ
تحية طيبة وبعد

يرجى التكرم بالتدخل اللازم نحو (سلام
سمك الطبقة /
في المسافة من /
أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختباره
التاريخ المطلوب للفحص : / /
توقيت

٢- طبقة ردم

١- رفع الأرض الطبيعية

رقم الطبقة ()

١٣٦٥

٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١٣٦٥

١. أعمال الفحص البصري

تاريخ : / /

مطابق

غير مطابق

٢. الأعمال المساحية

تاريخ : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض		نوع الاختبار
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحي بتاريخ : / /		✓	المتسوب
		✓	العروض
			الاسمك

ملاحظات:

٣. الأعمال المعمية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع في : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العينة
	طبقا للمواصفات القياسية أو الخاصة								المحطة
									الإختيار
									النتيجة

الملاحظات

المهندس الاستشاري

تعتمد A

تعتمد مع الملاحظات B

يعاد تقديمه طبقا للملاحظات C

مرفوض D

مهندس الهيئة

مهندس استشاري الهيئة

مهندس الشركة

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

المحطة	الطول	العرض	الكمية م ^٢
٨٦.٠+٠	٢.٠	٣.٠٠	٦.٠
٨٨.٠+٠	٢.٠	٢.٥٠	٥.٠
٩٠.٠+٠	٢.٠	٢.٥٠	٥.٠
٩٢.٠+٠	٢.٠	٢.١٥ ✓	٤٣
٩٤.٠+٠	٢.٠	٣.٠٠	٦.٠
٩٦.٠+٠	٢.٠	٣.١٥	٦٣
٩٨.٠+٠	٢.٠	٣.٠٠ ✓	٦.٠
١٠٠.٠+٠.١	٢.٠	٢.٥٠	٥.٠
١٠٢.٠+٠.١	٢.٠	٢.٥٠	٥.٠
١٠٤.٠+٠.١	٢.٠	٢.٨٠	٥٦
١٠٦.٠+٠.١	٢.٠	٢.٨٥ ✓	٥٧
١٠٨.٠+٠.١	٢.٠	٣.٠٠	٦.٠
١١٠.٠+٠.١	٢.٠	٣.١٥ ✓	٦٣
١١٢.٠+٠.١	٢.٠	٣.٢٠	٦٤
١١٤.٠+٠.١	٢.٠	٣.٠٠	٦.٠
١١٦.٠+٠.١	٢.٠	٢.٨٠ ✓	٥٦
١١٨.٠+٠.١	٢.٠	٢.٩٠	٥٨
١٢٠.٠+٠.١	٢.٠	٢.٥٠	٥.٠
١٢٢.٠+٠.١	٢.٠	٣.٠٠ ✓	٦.٠
١٢٤.٠+٠.١	٢.٠	٣.٠٠	٦.٠
١٢٦.٠+٠.١	٢.٠	٢.٥٠	٥.٠
١٢٨.٠+٠.١	٢.٠	٢.٥٠	٥.٠
١٣٠.٠+٠.١	٢.٠	٣.٠٠	٦.٠
١٣٢.٠+٠.١	٢.٠	٣.٠٠	٦.٠
١٣٤.٠+٠.١	٢.٠	٣.٠٠ ✓	٦.٠
١٣٦.٠+٠.١	٢.٠	٣.٠٠ ✓	٦.٠
الاجمالي			١٤٧.٠

١٥/١٠/٢٠١٧
جاسر (لا) ٤٧٨

~~١٥/١٠/٢٠١٧~~

~~١٥/١٠/٢٠١٧~~



Dr. Hossam Elmaghrabi
Dr. Hossam Elmaghrabi

مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

نوع / إعداد

TIA

نوع

طلب تسليم أعمال رفع مساحي

أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عربى بطول ٥٠٠ متر بمحافظه القليوبية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠٢٢/١٠/١٨

المسئول / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة وبعد

٢- طريقة ردم

١- رفع الأرض الطبيعية

تفسير أرفصه

يرجى التكرم باتخاذ اللازم نحو إستلام

سمك الطبقة /

رقم الطبقة ()

فى المسافة من ٥ + 860 إلى ١ + 360

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختباره

التاريخ المطلوب للمحضر : / / التوقيت

١- أعمال الفحص البصري

بتاريخ : / /

غير مطابق ☐

مطابق ☒

٢- الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض		نوع الاختبار
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحي بتاريخ : / /			المستوي
			المعرض
			المسك

ملاحظات:

٣- الأعمال المعملية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع في : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العينة
	طبقا للمواصفات القومية أو الخاصة								المحطة
									الاختبار
									النتيجة

الملاحظات

المهندس الاستشاري

تعتمد A ☐ تعتمد مع الملاحظات B ☒ يعاد تقديمه طبقا للملاحظات C ☐ مرفوض D ☐

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

المحطة	عدد	الطول	العرض	ارتفاع / السمك	الكمية م ^٣
محول كهرباء (ST: 1+200) سقف	١	٤	٤	٠,٢٥	٤,٠
محول كهرباء (ST: 1+200) أرضيه	١	٤	٤	٠,٥٠	٨,٠
محول كهرباء (ST: 1+200) حوائط	٤	٤	٤	٠,٢٥	١٦,٠
محطة صرف (ST: 1+200) سقف	١	٢٢	١٠	٠,٢٥	٥٥,٠
محطة صرف (ST: 1+200) أرضيه	١	٢٢	١٠	٠,٥٠	١١٠,٠
محطة صرف (ST: 1+200) حوائط	٢	٢٢	٣	٠,٢٥	٣٣,٠
محطة صرف (ST: 1+200) حوائط	٢	١٠	٣	٠,٢٥	١٥,٠
رصيف من ٨٦٠ الى ٨٨٠		٢٤,٢٨	٢,٨٥	٠,٤٠	٢٧,٧
رصيف من ٨٨٠ الى ٩٠٠		٢٥,٤٧	٢,٥٠	٠,٤٥	٢٨,٧
رصيف ٩٢٠ الى ٩٤٠		٣٧,١	٢,٥٠	٠,٥٠	٤٦,٤
رصيف من ٩٤٠ الى ٩٦٠		٢١,٥٦	٣,٠٠	٠,٤٠	٢٥,٩
رصيف من ٩٦٠ الى ٩٨٠		٢٥,٧٩	٣,١٠	٠,٥٥	٤٤,٠
رصيف من ١٠٠٠ الى ١٠٢٠		٢٦,٤٣	٢,٩٠	٠,٥٠	٣٨,٣
رصيف ١٠٤٠		٢١,٧٩	٢,٨٥	٠,٤٥	٢٧,٩
رصيف من ١٠٦٠ الى ١٠٨٠		٢١,٩	٢,٨٠	٠,٥٠	٣٠,٧
رصيف ١١٠٠		٢٢,٣١	٢,٩٠	٠,٤٥	٢٩,١
رصيف ١١٢٠		٢١,٤	٣,٠٠	٠,٣٥	٢٢,٥
رصيف من ١١٤٠ الى ١١٦٠		٢١,٥٧	٣,٢٠	٠,٣٠	٢٠,٧
رصيف ١١٨٠		١٩,٦	٢,٥٠	٠,٥٠	٢٤,٥
رصيف ١٢٠٠		٢٠,٠٥	٢,٥٥	٠,٤٥	٢٣,٠
رصيف من ١٢٤٠ الى ١٣٢٠		٨٩	٢,٨٠	٠,٥٠	١٢٤,٦
١٣٤٠ رصيف		١٤	٢,٨٠	٠,٥٥	٢١,٦
خرسانه عاديه في الجزيرة		٣٥٠	١٠,٠٥	٠,٣٥	١٢٣١,١
الاجمالي					٢٠٠٨



Ministry of General Engineering and Construction
Dr. Alwan Fahim Kadi

مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.الكرم سلطان)



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

جدد / إضافة

TIA

كود

طلب تسليم أعمال رفع مساحي

أعمال رفع كفاءة طريق شارع لحد عرابى بطول ٥٠٠ متر بحافظة القنوبية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠٢٢/١٠/١٩

التوقيت

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة وبعد

٢. طبقة ردم

١. رفع الأرض الطبيعية

طبقة استبدال

يرجى التكرم بإحضار اللازم نحو إستلام

سمك الطبقة /

رقم الطبقة ()

فى المسافة من ٥١ + 36٥ إلى ٥١ + 36٥

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختباره

التاريخ المطلوب للفحص : / / التوقيت

١. أعمال الفحص البصري

تاريخ : / /

مطابق

غير مطابق

٢. الأعمال المساحية

تاريخ : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض		نوع الاختبار
	مرفوض	مقبول	
مرفق رفع المساحي بتاريخ : / /			المنسوب
			العرض
			المسك

ملاحظات:

٣. الأعمال المعملية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع فى : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول والرفض		٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العينة
	طبقا لمتطلبات القياسية أو الخاصة									
										المحطة
										الاختبار
										النتيجة

الملاحظات

المهندس الاستشاري

تعتمد A

تعتمد مع الملاحظات B

بعد تقديمه طبقا للملاحظات C

مرفوض D

مهندس الشركة

مهندس استشاري الهيئة

مهندس الهيئة

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

Station	LAYER WIDTH LEFT	طبقة استبدال										LAYER WIDTH RIGHT	D.I.L	LANE SLOPE	
		EDGE	0	5	10	15	20	EDGE	Left	Right					
0+860	0.25	25.652	25.648	25.573	25.498	25.423	25.348	25.35	19.84	26.358	-1.5%	-1.5%			
0+880	0.25	25.68	25.676	25.601	25.526	25.451	25.376	25.386	19.304	26.386	-1.5%	-1.5%			
0+900	0.25	25.712	25.708	25.633	25.558	25.483	25.408	25.423	18.991	26.418	-1.5%	-1.5%			
0+920	0.25	25.744	25.74	25.665	25.59	25.515	25.44	25.457	18.86	26.45	-1.5%	-1.5%			
0+940	0.25	25.748	25.744	25.669	25.594	25.519	25.444	25.462	18.796	26.454	-1.5%	-1.5%			
0+960	0.25	25.696	25.692	25.617	25.542	25.467	25.392	25.408	18.939	26.402	-1.5%	-1.5%			
0+980	0.25	25.604	25.6	25.525	25.45	25.375	25.3	25.315	18.976	26.31	-1.5%	-1.5%			
01+000	0.25	25.515	25.511	25.436	25.361	25.286	25.211	25.23	18.714	26.221	-1.5%	-1.5%			
01+020	0.25	25.429	25.425	25.35	25.275	25.2	25.125	25.164	17.42	26.135	-1.5%	-1.5%			
01+040	0.25	25.383	25.379	25.304	25.229	25.154	25.079	25.128	16.71	26.089	-1.5%	-1.5%			
01+060	0.25	25.385	25.381	25.306	25.231	25.156	25.081	25.121	17.318	26.091	-1.5%	-1.5%			
01+080	0.25	25.424	25.42	25.345	25.27	25.195	25.12	25.13	19.352	26.13	-1.5%	-1.5%			
01+100	0.25	25.464	25.46	25.385	25.31	25.235	25.16	25.139	21.374	26.17	-1.5%	-1.5%			
01+120	0.25	25.505	25.501	25.426	25.351	25.276	25.201	25.154	23.109	26.211	-1.5%	-1.5%			
01+140	0.25	25.546	25.542	25.467	25.392	25.317	25.242	25.179	24.238	26.252	-1.5%	-1.5%			
01+160	0.25	25.576	25.572	25.497	25.422	25.347	25.272	25.198	24.948	26.282	-1.5%	-1.5%			
01+180	0.25	25.576	25.572	25.497	25.422	25.347	25.272	25.199	24.872	26.282	-1.5%	-1.5%			
01+200	0.25	25.547	25.543	25.468	25.393	25.318	25.243	25.178	24.334	26.253	-1.5%	-1.5%			
01+220	0.25	25.488	25.484	25.409	25.334	25.259	25.184	25.13	23.593	26.194	-1.5%	-1.5%			
01+240	0.25	25.399	25.395	25.32	25.245	25.17	25.095	25.051	22.913	26.105	-1.5%	-1.5%			
01+260	0.25	25.29	25.286	25.211	25.136	25.061	24.986	24.953	22.204	25.996	-1.5%	-1.5%			
01+280	0.25	25.181	25.177	25.102	25.027	24.952	24.877	24.854	21.538	25.887	-1.5%	-1.5%			
01+300	0.25	25.072	25.068	24.993	24.918	24.843	24.768	24.754	20.935	25.778	-1.5%	-1.5%			
01+320	0.25	24.965	24.961	24.886	24.811	24.736	24.661	24.629	22.135	25.671	-1.5%	-1.5%			
01+340	0.25	24.885	24.881	24.806	24.731	24.656	24.581	24.532	23.297	25.591	-1.5%	-1.5%			
01+360	0.25	24.837	24.833	24.758	24.683	24.608	24.533	24.483	23.356	25.543	-1.5%	-1.5%			

مهندس الهيئة
17/11/2017

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



Ministry of General Economic Cooperation
Dr. Ahmed Elmaghrabi



مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد واتشاء الطرق

جديد / إعادة

TIA

نوع

طلب تسليم أعمال رفع مساحي

أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عرابى بطول ٥٠٠ متر بمحافظة القليوبية

التوقيت

١٩٩٠ / ١٠ / ٢٠٢٠

تاريخ تقديم الطلب :

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة و بعد

٢- طبقة ردم

١- رفع الأرض الطبيعية

طبقة أساس أولي

يرجى التكرم بالتأكد اللازم نحو إسئلام

سمك الطبقة /

رقم الطبقة ()

فى المسافة من ٨٦٥ + ٥ إلى ٣٦٥ + ٥

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختياره

التوقيت

/

/

/

/

/

/

/

/

/

١. أعمال الفحص البصري

تاريخ : / /

مطابق

غير مطابق

٢. الأعمال المساحية

تاريخ : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول و الرفض		نوع الاختيار
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحي بتاريخ : / /			المسحوب
			المعرض
			التمسك

ملاحظات:

يتم رفع المساحة و حراس ح كابت لا يتم د حشونه

٣. الأعمال المعملية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع فى : / /

المهندس الاستشاري

القرار	حدود القبول و الرفض	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العينة
	طبقا للمواصفات القياسية لرقم القياسية								
done✓			Φ+880	14060				1+300	المحطة
				Sand	Core				الإختبار
			98.90	98.39				98.67	النتيجة

الملاحظات

لا حشونا مرفق مرفق مرفق

مرفوض D

مرفوض C

بعد تقديمه طبقا للملاحظات

تعدد مع الملاحظات B

تعدد A

تعدد

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

Station	LAYER WIDTH LEFT	LAYER (-0.4)								LAYER WIDTH RIGHT	D.I.	LANE SLOPE	
		EDGE	0	5	10	15	20	EDGE	Left			Right	
0+860	0.25	25.852	25.848	25.773	25.698	25.623	25.548	25.559	19.24	26.358	-1.5%	-1.5%	
0+880	0.25	25.88	25.876	25.801	25.726	25.651	25.576	25.595	18.704	26.386	-1.5%	-1.5%	
0+900	0.25	25.912	25.908	25.833	25.758	25.683	25.608	25.632	18.391	26.418	-1.5%	-1.5%	
0+920	0.25	25.944	25.94	25.865	25.79	25.715	25.64	25.666	18.26	26.45	-1.5%	-1.5%	
0+940	0.25	25.948	25.944	25.869	25.794	25.719	25.644	25.671	18.196	26.454	-1.5%	-1.5%	
0+960	0.25	25.896	25.892	25.817	25.742	25.667	25.592	25.617	18.339	26.402	-1.5%	-1.5%	
0+980	0.25	25.804	25.8	25.725	25.65	25.575	25.5	25.524	18.376	26.31	-1.5%	-1.5%	
01+000	0.25	25.715	25.711	25.636	25.561	25.486	25.411	25.439	18.114	26.221	-1.5%	-1.5%	
01+020	0.25	25.629	25.625	25.55	25.475	25.4	25.325	25.373	16.82	26.135	-1.5%	-1.5%	
01+040	0.25	25.583	25.579	25.504	25.429	25.354	25.279	25.337	16.11	26.089	-1.5%	-1.5%	
01+060	0.25	25.585	25.581	25.506	25.431	25.356	25.281	25.33	16.718	26.091	-1.5%	-1.5%	
01+080	0.25	25.624	25.62	25.545	25.47	25.395	25.32	25.339	18.752	26.13	-1.5%	-1.5%	
01+100	0.25	25.664	25.66	25.585	25.51	25.435	25.36	25.348	20.774	26.17	-1.5%	-1.5%	
01+120	0.25	25.705	25.701	25.626	25.551	25.476	25.401	25.363	22.509	26.211	-1.5%	-1.5%	
01+140	0.25	25.746	25.742	25.667	25.592	25.517	25.442	25.388	23.633	26.252	-1.5%	-1.5%	
01+160	0.25	25.776	25.772	25.697	25.622	25.547	25.472	25.407	24.348	26.282	-1.5%	-1.5%	
01+180	0.25	25.776	25.772	25.697	25.622	25.547	25.472	25.408	24.272	26.282	-1.5%	-1.5%	
01+200	0.25	25.747	25.743	25.668	25.593	25.518	25.443	25.387	23.734	26.253	-1.5%	-1.5%	
01+220	0.25	25.688	25.684	25.609	25.534	25.459	25.384	25.339	22.993	26.194	-1.5%	-1.5%	
01+240	0.25	25.599	25.595	25.52	25.445	25.37	25.295	25.26	22.313	26.105	-1.5%	-1.5%	
01+260	0.25	25.49	25.486	25.411	25.336	25.261	25.186	25.162	21.604	25.996	-1.5%	-1.5%	
01+280	0.25	25.381	25.377	25.302	25.227	25.152	25.077	25.063	20.938	25.887	-1.5%	-1.5%	
01+300	0.25	25.272	25.268	25.193	25.118	25.043	24.968	24.963	20.335	25.778	-1.5%	-1.5%	
01+320	0.25	25.165	25.161	25.086	25.011	24.936	24.861	24.838	21.535	25.671	-1.5%	-1.5%	
01+340	0.25	25.085	25.081	25.006	24.931	24.856	24.781	24.741	22.697	25.591	-1.5%	-1.5%	
01+360	0.25	25.037	25.033	24.958	24.883	24.808	24.733	24.692	22.756	25.543	-1.5%	-1.5%	

مهندس الشركة
مهندس الشركة
مهندس الشركة

مهندس الشركة
مهندس الشركة
مهندس الشركة

مهندس الشركة
مهندس الشركة
مهندس الشركة



Ministry of Planning and Economic Development
Dr. Hossam El-Sayed

مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)



الهيئة العامة للطرق والجوارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

جديد / إضافة

TIA

نوع

طلب تسليم أعمال رفع مساحى
أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عرابى بطول ٥٠٠ متر بمحافظه القليوبية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠ التوقيت

المسئول / مهندس الإشراف على التنفيذ
تحية طيبة و بعد

٢- طبقة ردم

١- رفع الارض الطبيعية

طبقة أساس ثابته

يرجى التكرم باتخاذ اللازم نحو إستلام

رقم الطبقة ()

سمك الطبقة /

فى المسافة من ٨٦٥ + ٥ إلى ٣٦٥ + ٥

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختياره

التاريخ المطلوب للفحص : / / التوقيت

١. أعمال الفحص البصرى

بتاريخ : / / مطابق ☒ غير مطابق ☐

٢. الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

القرار	حدود القبول و الرفض		حدود القبول و الرفض
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحى بتاريخ : / /			نوع الاختيار
			العلامة
			العرض
			السمك

ملاحظات:

٣. الأعمال المصلىة

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع فى : / /

القرار	حدود القبول و الرفض		٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العينة
	طبقا للتوصيات الفنية او الخاصة									
done										المحطة
										الاختبار
										النتيجة

٩٨.٦٢ ٩٨.٣٥ ٩٨.١٢
الكثافة، مرفق بالرسومات

الملاحظات

تعتمد A ☐ تعتمد مع الملاحظات B ☒ يعاد تقديمه طبقا للملاحظات C ☐ مرفوض D ☐

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

Station	LAYER WIDTH LEFT	LAYER (-0.2)										LAYER WIDTH RIGHT	B.L	LANE SLOPE	
		EDGE	0	5	10	15	20	EDGE	Left	Right					
0+860	0.25	26.052	26.048	25.973	25.898	25.823	25.748	25.762	19.04	26.358	-1.5%	-1.5%			
0+880	0.25	26.082	26.076	26.001	25.926	25.851	25.776	25.798	18.504	26.386	-1.5%	-1.5%			
0+900	0.25	26.142	26.108	26.033	25.958	25.883	25.808	25.835	18.191	26.418	-1.5%	-1.5%			
0+920	0.25	26.144	26.14	26.065	25.99	25.915	25.84	25.869	18.06	26.45	-1.5%	-1.5%			
0+940	0.25	26.148	26.144	26.069	25.994	25.919	25.844	25.874	17.996	26.454	-1.5%	-1.5%			
0+960	0.25	26.096	26.092	26.017	25.942	25.867	25.792	25.82	18.139	26.402	-1.5%	-1.5%			
0+980	0.25	26.004	26	25.925	25.85	25.775	25.7	25.727	18.176	26.31	-1.5%	-1.5%			
01+000	0.25	25.915	25.911	25.836	25.761	25.686	25.611	25.642	17.914	26.221	-1.5%	-1.5%			
01+020	0.25	25.829	25.825	25.75	25.675	25.6	25.525	25.576	16.62	26.135	-1.5%	-1.5%			
01+040	0.25	25.783	25.779	25.704	25.629	25.554	25.479	25.54	15.91	26.089	-1.5%	-1.5%			
01+060	0.25	25.785	25.781	25.706	25.631	25.556	25.481	25.533	16.518	26.091	-1.5%	-1.5%			
01+080	0.25	25.824	25.82	25.745	25.67	25.595	25.52	25.542	18.552	26.13	-1.5%	-1.5%			
01+100	0.25	25.864	25.86	25.785	25.71	25.635	25.56	25.551	20.574	26.17	-1.5%	-1.5%			
01+120	0.25	25.905	25.901	25.826	25.751	25.676	25.601	25.566	22.309	26.211	-1.5%	-1.5%			
01+140	0.25	25.946	25.942	25.867	25.792	25.717	25.642	25.591	23.433	26.252	-1.5%	-1.5%			
01+160	0.25	25.976	25.972	25.897	25.822	25.747	25.672	25.61	24.148	26.282	-1.5%	-1.5%			
01+180	0.25	25.976	25.972	25.897	25.822	25.747	25.672	25.611	24.072	26.282	-1.5%	-1.5%			
01+200	0.25	25.947	25.943	25.868	25.793	25.718	25.643	25.59	23.534	26.253	-1.5%	-1.5%			
01+220	0.25	25.888	25.884	25.809	25.734	25.659	25.584	25.542	22.793	26.194	-1.5%	-1.5%			
01+240	0.25	25.799	25.795	25.72	25.645	25.57	25.495	25.463	22.113	26.105	-1.5%	-1.5%			
01+260	0.25	25.69	25.686	25.611	25.536	25.461	25.386	25.365	21.404	25.996	-1.5%	-1.5%			
01+280	0.25	25.581	25.577	25.502	25.427	25.352	25.277	25.266	20.738	25.887	-1.5%	-1.5%			
01+300	0.25	25.472	25.468	25.393	25.318	25.243	25.168	25.166	20.135	25.778	-1.5%	-1.5%			
01+320	0.25	25.365	25.361	25.286	25.211	25.136	25.061	25.041	21.335	25.671	-1.5%	-1.5%			
01+340	0.25	25.285	25.281	25.206	25.131	25.056	24.981	24.944	22.497	25.591	-1.5%	-1.5%			
01+360	0.25	25.237	25.233	25.158	25.083	25.008	24.933	24.895	22.556	25.543	-1.5%	-1.5%			

مهندس الشركة

مهندس الاستشاري

عبد الرحمن

مهندس الهيئة



شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

نوع / تاريخ

TIA

نوع

طلب تسليم أعمال رفع مساحي

أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عرابى بطول ٥٠٠ متر بمحافظه القليوبية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠٢١ / ١٠ / ٢٤ التوقيت

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة و بعد

٢- طبقة ردم

١- رفع الأرض الطبيعية

طبقة أساس ثالثه

يرجى التكرم باتخاذ اللازم نحو إستلام

سكك الطبقة /

رقم الطبقة ()

فى المسافة من ٨٦٠ + ٥ إلى ٨٦٠ + ٥١

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختباره

التاريخ المطلوب للتحقق : / / التوقيت

١. أعمال الفحص البصرى

بتاريخ : / / مطابق ☒ غير مطابق ☐

٢. الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

القرار	حدود القبول و الرفض		نوع الاختيار
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحي بتاريخ : / /			المستوي
			المعرض
			السكك

ملاحظات:

٣. الأعمال المعمارية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع فى : / /

القرار	حدود القبول و الرفض		العينة
	خطا لمواصفات القياسية أو الخاصة	خطا لمواصفات القياسية أو الخاصة	
done	٥٨٨٧٥	١٨١٢٥	H350
		98.76	98.49
			98.93

الملاحظات

لا حياء مرفق: لربح

تعتمد A ☐ تعتمد مع الملاحظات B ☒ يعاد تقديمه طبقا للملاحظات C ☐ مرفوض D ☐

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

الاسم :
التاريخ :
التوقيع :

Station	LAYER WIDTH LEFT	LAYER (0)										LAYER WIDTH RIGHT	Base 3	D.I.L	LANE SLOPE	
		EDGE	0	5	10	15	20	EDGE	Left	Right						
0+860	0.25	26.252	26.248	26.173	26.098	26.023	25.948	25.965	18.84	26.248	26.358	-1.5%	-1.5%			
0+880	0.25	26.28	26.276	26.201	26.126	26.051	25.976	26.001	18.304	26.276	26.386	-1.5%	-1.5%			
0+900	0.25	26.312	26.308	26.233	26.158	26.083	26.008	26.038	17.991	26.308	26.418	-1.5%	-1.5%			
0+920	0.25	26.344	26.34	26.265	26.19	26.115	26.04	26.072	17.86	26.34	26.45	-1.5%	-1.5%			
0+940	0.25	26.348	26.344	26.269	26.194	26.119	26.044	26.077	17.796	26.344	26.454	-1.5%	-1.5%			
0+960	0.25	26.296	26.292	26.217	26.142	26.067	25.992	26.023	17.939	26.292	26.402	-1.5%	-1.5%			
0+980	0.25	26.204	26.2	26.125	26.05	25.975	25.9	25.93	17.976	26.2	26.31	-1.5%	-1.5%			
01+000	0.25	26.115	26.111	26.036	25.961	25.886	25.811	25.845	17.714	26.111	26.221	-1.5%	-1.5%			
01+020	0.25	26.029	26.025	25.95	25.875	25.8	25.725	25.779	16.42	26.025	26.135	-1.5%	-1.5%			
01+040	0.25	25.983	25.979	25.904	25.829	25.754	25.679	25.743	15.71	25.979	26.089	-1.5%	-1.5%			
01+060	0.25	25.985	25.981	25.906	25.831	25.756	25.681	25.736	16.318	25.981	26.091	-1.5%	-1.5%			
01+080	0.25	26.024	26.02	25.945	25.87	25.795	25.72	25.745	18.352	26.02	26.13	-1.5%	-1.5%			
01+100	0.25	26.064	26.06	25.985	25.91	25.835	25.76	25.754	20.374	26.06	26.17	-1.5%	-1.5%			
01+120	0.25	26.105	26.101	26.026	25.951	25.876	25.801	25.769	22.109	26.101	26.211	-1.5%	-1.5%			
01+140	0.25	26.146	26.142	26.067	25.992	25.917	25.842	25.794	23.233	26.142	26.252	-1.5%	-1.5%			
01+160	0.25	26.176	26.172	26.097	26.022	25.947	25.872	25.813	23.948	26.172	26.282	-1.5%	-1.5%			
01+180	0.25	26.176	26.172	26.097	26.022	25.947	25.872	25.814	23.872	26.172	26.282	-1.5%	-1.5%			
01+200	0.25	26.147	26.143	26.068	25.993	25.918	25.843	25.793	23.334	26.143	26.253	-1.5%	-1.5%			
01+220	0.25	26.088	26.084	26.009	25.934	25.859	25.784	25.745	22.593	26.084	26.194	-1.5%	-1.5%			
01+240	0.25	25.999	25.995	25.92	25.845	25.77	25.695	25.666	21.913	25.995	26.105	-1.5%	-1.5%			
01+260	0.25	25.89	25.886	25.811	25.736	25.661	25.586	25.568	21.204	25.886	25.996	-1.5%	-1.5%			
01+280	0.25	25.781	25.777	25.702	25.627	25.552	25.477	25.469	20.538	25.777	25.887	-1.5%	-1.5%			
01+300	0.25	25.672	25.668	25.593	25.518	25.443	25.368	25.369	19.935	25.668	25.778	-1.5%	-1.5%			
01+320	0.25	25.565	25.561	25.486	25.411	25.336	25.261	25.244	21.135	25.561	25.671	-1.5%	-1.5%			
01+340	0.25	25.485	25.481	25.406	25.331	25.256	25.181	25.147	22.297	25.481	25.591	-1.5%	-1.5%			
01+360	0.25	25.437	25.433	25.358	25.283	25.208	25.133	25.098	22.356	25.433	25.543	-1.5%	-1.5%			

جاء في
مهندس الجبل
10/11/14

مهندس
24/09/14

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



Ministry of Economic Planning
Dr. Ahmed El-Sayed

مجموعة المدار للاستشارات الهندسية (د.أكرم سلطان)



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى



شركة الجارحى للبناء والتشييد وإنشاء الطرق

جديد / Update

T1A

كود

طلب تسليم أعمال رفع مساحى

أعمال رفع كفاءة طريق شارع احمد عرابى بطول ٥٠٠ متر بمحافظه القليوبية

تاريخ تقديم الطلب : ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٢
التوقيت

السيد / مهندس الإشراف على التنفيذ

تحية طيبة و بعد

٢- طبقة ردم

١- رفع الأرض الطبيعية

يرجى التكرم باتخاذ اللازم نحو استلام

سحب الطبقة /

فى المسافة من ٠ + 860 إلى ١ + 360

أو الرسم المرفق للمسطح المراد إختياره

التاريخ المطلوب للفحص : / / التوقيت

١. أعمال الفحص البصرى

بتاريخ : / /

مطابق ☐

غير مطابق ☐

٢. الأعمال المساحية

بتاريخ : / /

المهندس الاستشارى

القرار	حدود القبول والرفض		نوع الاختبار
	مرفوض	مقبول	
مرفق الرفع المساحى بتاريخ : / /			المستوي
			المعرض
			السحب
			المساحة

ملاحظات:

٣. الأعمال المعملية

تم إجراء تجارب الصلابة لهذا القطاع فى : / /

المهندس الاستشارى

القرار	حدود القبول والرفض		٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	العينة
	طبقا للمواصفات القياسية رقم ١٠٠٠									
										المحطة
										الاختبار
										النتيجة

الملاحظات

تعتمد A

تعتمد مع الملاحظات B

بعد تقديمه طبقا للملاحظات C

مرفوض D

مهندس الهيئة

مهندس استشارى الهيئة

مهندس الشركة

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

الاسم :

التاريخ :

التوقيع :

من المحطة	الى المحطة	جانب البيوت	طول البردوره
٨٦.٠+٠	٨٨.٠+٠	جانب البيوت	٢٩,٨٦
٨٨.٠+٠	٩٠.٠+٠	جانب البيوت	٣١,٠٩
٩٠.٠+٠	٩٢.٠+٠	جانب البيوت	٣١,٩١
٩٤.٠+٠	٩٦.٠+٠	جانب البيوت	٢٧,٩٧
٩٦.٠+٠	٩٨.٠+٠	جانب البيوت	٣١,١٤
٠.٠+٠.١	٠.٢+٠.١	جانب البيوت	٣١,٨٢
٠.٤+٠.١		جانب البيوت	١٦,٦٢
٠.٥+٠.١		جانب البيوت	١٥,٢٨
٠.٦+٠.١	٠.٨+٠.١	جانب البيوت	٢٥,٥١
٠.٨+٠.١	١.٠+٠.١	جانب البيوت	٢٤,٦١
١.٠+٠.١	١.٢+٠.١	جانب البيوت	٢٧,٦٥
١.٤+٠.١	١.٦+٠.١	جانب البيوت	٢٧,٩٣
١.٦+٠.١	١.٨+٠.١	جانب البيوت	٢٢,٧٣
١.٨+٠.١	٢.٢+٠.١	جانب البيوت	٢٩,٢٤
٢.٢+٠.١	٢.٤+٠.١	جانب البيوت	٢٨,٩
٢.٤+٠.١	٣.٠+٠.١	جانب البيوت	٧١,٩
٣.٢+٠.١	٣.٤+٠.١	جانب البيوت	٢٧,٦٣
٣.٤+٠.١	٣.٦+٠.١	جانب البيوت	٢٣,٧٨
الاجمالي بالمتر الطولي			٥٢٦

الحمد لله

جاري (١) كسب ٤٧٨



تاریخ ۱۳۸۵

رقم الاصل / 1154

٢٠٣٨٠٠١٢٩ / تصوير الفنى

مطالبة سعد

المجلس

جوابت بسطیہ / نسیم الحامی

الحاصل
الطعام

مطلوب من شركة الجواهر للنساء والشباب والطفولة

المعلمة: / رقم: شارع عبد الجواد قورطام - حي النخاعة - بنينا - الكويتية

US\$ 1000000

المصلاحيّة

بیان حساب الکریم

[illegible]

الموتة الأصلية قبل الاستحداثات

مجلس محضر في القاهر



המחלקה לבריאות הציבור

1Y/19Y 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037

17

$$\frac{230 \text{ cm}^3}{1000} = 0.23 \text{ L}$$

(Signature)

Cellular and Molecular Immunology

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر: جنتية مصرية
رقم الوثيقة: ١٩٠٤
تاريخ طلب التأمين: ٢٠٢٢/١٠/٢٥
العملة: جنيه مصري
مدة التأمين: ٢٠٢٢/١٠/٢٥ - ٢٠٢٣/١٠/٢٥
الغرض: ظهور

اسم المتعاقد: شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق
اسم المؤمن عليه: للشخص الواحد في الحادث
المشؤون: رقم ٤ شارع عبد الجواد قرطام - حي الجامعة - بنها - انكبوبية
لصالح: الهيئة العامة للطرق والكباري
اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر علي عدد (١) مهندس وبدون ذكر أسم ويسبب العمل فقط وداخل موقع عمل المؤمن له عملية تنفيذ إستكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من ثم بيومي حتي توبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر وكذا أثناء انشاء الضباب والعودة لموقع العمل بشرط سلوكة الطريق المعتاد دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموقع العمل وألا سقط حقه في التعويض بموجب العقد رقم ٢٠٢٢/١٧٨/٢٠٢٤ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٤
لا يجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري (المستفيدة)

إضافات

عدم ذكر اسم ٢٥ % ٦١,٢٥

القسط الصافي	نصف التغطية	نصف التغطية	مصاريف الامتياز	مصاريف الانشغال	مقابل خدمات مراجعة	صندوق حملة وثائق	القسط الاجمالي
٣٠٦,٢٥	٣,١٠	٤,٠٠	٥٣,٦٥	٢,٠٠	٣٣	٦٧	٣٧٠,٠٠

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

اولا ، اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / اولاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة
ثانيا ، اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
ثالثا ، اذا اصيب المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة
رابعا ، اذا اصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدى له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمسة في الف) من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم الوارد بالبنود ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد اقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة
خامسا، تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

سادسا ، تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ)

شركة المهندسين للتأمين
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث والتأمين

سابعاً ، تغطية مصاريف الجراحة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين

مرفق طيه الشروط العامة للوثيقة عدد (١) صفحة

للحصول والإطلاع على دليل حياة المتأمينين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head Office: 3 El Mohandehi St. Giza

KHOB EL OMAN - EGYPT

Phone: 1111111111

Fax: 1111111111

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي: ٣ شارع المهندسين - الجيزة

الهاتف: ١١١١١١١١١١

الفاكس: ١١١١١١١١١١

www.mohins.com

٢٠٢٣/١٠/٠١

شركة المهندسين للتأمين
هذه الوثيقة مملوكة ومحمية

تقوم الشركة بحماية مصلحة المتأمينين الصالحين على ضرورة الحماية الشخصية والمالية

صفحة ١ من ٢



وثيقة تأمين حوادث شخصية

القرع المصدر	رقم الوثيقة	تاريخ طلب التأمين	العمل
غمد	١٩٠٤ ١٣/٥	٢٠٢٣/١٠/٢٥	ظهور
حثة منه ١٤	مدة التأمين من	ظهور الى	
	٢٠٢٣/١٠/٢٥	٢٠٢٤/١٠/٢٥	

٢٠٧٦٨

مائل محمود عبد القادر

من المعلوم والمتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (4) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها (١).

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة

محمود عبد الحفيظ عبد السميع
١٣/١٩٢
التوقيع

أحمد مكي

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head Office : El-Mohandaa Sq. Dokki - Giza

PO BOX : 420840 - EGYPT

Tel : 15882000

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣ ميدان المهندسين - الدقي - الجيزة

تلفون : ١٥٨٨٢٠٠٠ - ١٥٨٨٢٠٠٠

ص.ب. ٤٢٠٨٤٠ - القاهرة - مصر

موقع : ١٥٨٨٢٠٠٠ - الدقي - الجيزة

تقوم الشركة بإصدار وثيقة التأمين الخاصة بالحوادث الشخصية والتأمين

صفحة

من

٢

هذه الوثيقة مؤمنة وشركة المهندسين للتأمين

٢٠٢٣/١٠/٢٦



كشف بأسماء السادة المؤمن عليهم

كشف متمم للوثيقة ١٣ / ١٩٠٤

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
للشخص الواحد فى الحادث (١) عدد مهنتس	الوفاة	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٤٥٠٠٠
حالة المجرى الكلى او الجزئى المستقيم	العجز الكلى المؤقت	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
العلاج	اسعف	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠
جثة					
اجمالى مبلغ التأمين		١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٤٥٠٠٠
			جثية مصرى		

خصومات و اضافات

عدم ذكر اسم ٢٥٠,٠٠٠ ٢١,٢٥

اسماء المستفيدين فى حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
ان التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد (١) مهنتس ويذون ذكر اسم ويسبب العمل فقط وداخل موقع عمل المؤمن له عملية تنفيذ إستكمال أصل رصف شارع أحمد مرابي من ام بيومى حتى كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر وكذا أثناء الذهاب والعودة لموقع العمل بشرط سلوكة الطريق المعتاد دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموقع العمل والا سقط حقه في التعويض بموجب العقد رقم بتاريخ ٤٧٨/٢٠٢٣/٢٤٠٤/١٠/٢٠٢٣
لا يجوز اجراء ايه تعديلات فى بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري (المستفيدة)

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الجواث المتنوعة

عمره ١٣/١٩٢
محمود عبد الحفيظ عبد السميع
التوقيع

صافى القسط ٣٠٦,٢٥

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head office: 111 Maadia, Giza, Egypt

PO BOX 43 06060 - 11190

Tel: 33388181 - 7

Fax: 33328857 - 3338185

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

البريد الإلكتروني: info@mohins.com

الهاتف: ٣٣٣٨٨١٨١ - ٧

فاكس: ٣٣٣٢٨٨٥٧ - ٣٣٣٨١٨٥

ص.ب. ٤٣ ٠٦٠٦٠ - ١١١٩٠

هذه الوثيقة مؤمنة ومشفرة

تقوم الشركة بمحاكمة مصلحة الضرائب على ضرورة الحفظ التسوية والتدوير

رقم الوثيقة / ٩٠٤٠

رقم الايجال / ١١٢٧

تاريخ اصدار / ٢٠٢٢/١٠/٢٩

مطالبة سداد

جامعة لادبيج - فلسطين رقم الوثيقة ١٢١١
صندوق البريد الخاصة لادبيج - لادبيج
رسم و مبلغ حصة التأمين ١٢٠٢٤ - ١٢٠٢٥

الكنج

نوع التأمين / حوادث شخصية

القطاع / خاص

مطلوب من / شركة الجارحي للبناء والتشييد والانشاء للطرق - لادبيج

الغرض من / رقم ٤ شارع عبد الجواد فرطم - حي الجامعة - بيتا - لادبيج

مبلغ التأمين / ١٠٠٠٠٠

المصلحة / الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان حساب الرسوم

القسمة الصافي	المدة من	الى	القسمة الاجمالي
٣٠١,٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٢٠٢٢/١٠/٢٥	٣٠١,٢٥
٣,١٠			
٥٢,١٥			
٢,٠٠			
١,٠٠			
٠,٢٢٣			
٠,٦٦٧			
حصة مصري			٣٠١,٢٥

المعولة الاصلية قبل الاستقطاعات ١٠٠,٠٠٠

مبلغ محدد عند التقدير ٢٠٣٧٨

شركة التأمين للتأمين

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الرقم المصدر	عمره	رقم الوثيقة	١٩٠٤	١٣/٥	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٢/١٠/٢٥	الفرع المصدر	٢٠٢٢/١٠/٢٥	ظهري
العملة	جنية مصري	مدة التأمين	٢٠٢٢/١٠/٢٥	ظهري	٢٠٢٢/١٠/٢٥	ظهري	العملة	جنية مصري	٢٠٢٢/١٠/٢٥

اسم المتعاقد	شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق -	اسم المؤمن عليه	للشخص الواحد في الحادث	تاريخ الميلاد	أكبر من ١٦ سنة ، وأقل من ٦٥ سنة	الوظيفة	عدد (١) مهندس	العنوان	رقم ١ شارع عيد الجواد قرطام - حي الجامعة - بنها - القليوبية	لصالح	الهيئة العامة للطرق والكباري	اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به	الورثة الشرعيون
--------------	---	-----------------	------------------------	---------------	---------------------------------	---------	---------------	---------	---	-------	------------------------------	--	-----------------

أن التغطية التأمينية المنوطة بموجب هذه الوثيقة تقتصر علي عدد (١) مهندس ويدون ذكر أسم ويسبب العمل فقط وداخل موقع عمل المؤمن له عملية تنفيذ إستكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتي كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر وكذا أثناء الذهاب والعودة لموقع العمل بشرط سلوكه الطريق المعتاد دون أي تحلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموقع العمل وألا سقط حقه في التعويض بموجب العقد رقم ٢٠٢٢/١٠/٢٥ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥

لا يجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري (المستفيدة)

إضافات	عدم ذكر اسم ٢٥ % ٦١,٢٥
--------	------------------------

القسط الصافي	نصف الدفعة النسبية	نصف الدفعة الاتساع	مصاريف الإصدار	مصاريف الإشراف	مقابل خدمات مراجعة	صندوق حيلة وثائق	القسط الاجمالي
٣٠٦,٢٥	٣,١٠	٤,٠٠	٥٣,٦٥	٢,٠٠	٣٣	٦٧	٣٧٠,٠٠

الحالات المغطاة	مبلغ التأمين
أولاً : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول / أولاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثانياً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول / ثانياً من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثالثاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغاً يحدد وفقاً لما جاء بالبند الأول / ثالثاً من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شيء)
رابعاً : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغاً وقدره أسبوعياً بواقع (خمسة في الألف) من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم الوارد بالبند ثانياً من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ أسبوعاً من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شيء)
خامساً : تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سادساً : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ)	(لا شيء)
سابعاً : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)

مرفق فيه الشروط العامة للوثيقة عدد () صفحة

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	رقم الوثيقة	تاريخ طلب التأمين	الفرع المستفيد
حديقة مصر	١٩٠٤ / ١٣	٢٠٢٣/١٠/٢٥	ظهورا
العملة	مدة التأمين من	ظهورا الى	ظهورا
جنية مصر	٢٠٢٣/١٠/٢٥	٢٠٢٤/٠٤/٢٥	ظهورا

٢٠٢٤

مائل محمود عبد القادر

من المعلوم و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (4) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها (١).

مائل محمود عبد القادر

أمان بلا حدود



كشَفَ بِاسْمَاءِ السَّادَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِمُ

12 13 14.5

كشف متمم للوثيقة

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط
للشخص الواحد في الحادث (١) عدد مهندس	حقة العجز التكملي او الجزئي المستقيم	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠	٢٤٥,٠٠
	حقة العجز الكلى المؤقت	٠	٠	٠	٠
	الملاج	٠	٠	٠	٠
	اسعار	٠	٠	٠	٠
	جشرة	٠	٠	٠	٠
اجمالى مبلغ التأمين		١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠	٠
			جشنة مصرى		

خصومات و اضافات

71,20

ΥΟ,...

علم ذکر اسم

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون
أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على عدد (١) مهلهن وبذون ذكر أسم ويسبب العمل فقط وبداخل موقع عمل المؤمن له عملية تنفيذ إستكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتي كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر وكذا أثناء الذهاب والعودة لموقع العمل بشرط سلوكه الطريق المعتاد دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد العدد وقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه بموقع العمل وألا يسقط حقه في التعويض بموجب العقد رقم بتاريخ ٤٧٨/٢٠٢٣/٢٠٢٤ ٠٤/١٠/٢٠٢٣
لا يجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري (المستفيدة)

7-3, 70

صافي القسط



مطالبة تسداد

طابعت في القاهرة بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢١
معددة بالعملة الوطنية المصرية
رقم سجل التأمين ٤٤٢٤٣ - المبرك

رقم الوثيقة / ٩٠٥

رقم الإجمالي / ١١٢٨

تاريخ في / ٢٠٢٣/٠٢/٠١

نوع التأمين / حوادث شخصية

القطاع / خاص

مطلوب من / شركة الجارحي للبناء والتشييد والانشاء للطرق
العمارة رقم ٤ شارع عبد الجواد قريظم - حي الجامعة - بنها - القليوبية

مبلغ التأمين / ٢٠٥٠٠٠

الهيئة العامة للطرق والبحري

بيان حساب الرسوم

القسمة الصافي	القسمة الاجمالي
١٢٧,٨٩	١٢٧,٨٩
٧,٠٠	٧,٠٠
٥٥,١٩	٥٥,١٩
٤,٠٠	٤,٠٠
١,٠٠	١,٠٠
٠,٦٧	٠,٦٧
١,٢٣	١,٢٣
جدة مصرى	جدة مصرى

المسدة من / ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

التأمين بموجب هذه الوثيقة لا يغطي حوادث الناتجة عن خطر الزلازل والتفجيرات والتفجيرات

الاستمراريات الاخرى

نقطة سداد جنية مصرى لا غير

مطل محضرة عند التاجر

العمولة الاصلية قبل الاستقطاعات

شركة المحند للتأمين
MOHANDDES INSURANCE CO.
شركة التأمين العامة
إدارة القاهرة
١٢/٩٢

٢٠٧٨

وثيقة تأمين حوادث شخصية

الرقم المصدر	غمد	رقم الوثيقة	١٩٠٥ / و	١٣	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/١٠/٢٥
العملة	جنية مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٣/١٠/٢٥		ظهرا الى	٢٠٢٣/١٠/٢٥ ظهرا
اسم المتعاقد	شركة الجارحى للبناء والتشييد ولشاه الطرق					
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق					
العنوان	رقم ٤ شارع عبد الجواد لوطام - حي الجامعة - بنها - القليوبية					
	اكبر من ١٦ سنة و اقل من ٦٥ سنة					
	وظيفة					
	كما بالكشف المرفق					

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون للمؤمن عليه
أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على السادة المؤمن عليهم الغير مذكور اسمائهم بسبب الحوادث التي تقع لهم أثناء وبسبب العمل فقط ودخل موقع العمل بموجب العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٧٨ بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٣
عملية تنفيذ إستكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتي كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر وكذا أثناء الذهاب والعودة لموقع العمل بشرط سلوك الطريق المعتاد دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد العدد ووقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه (فريق كل وظيفه) بموجب هذه الوثيقة وإلا سقط حقه في الأنتفاع بمزايا التأمين
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت
لا يجوز إجراء إبه تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري (المستفيدة)

القسط الصافي	نصف الدفعة التأسيسية	نصف الدفعة الاتساع	مصاريف الاصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و الوثائق	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالي
٦٧,٨١	٧,٠٠	٤,٠٠	٥٥,١٩	٤,٠٠	٠,٦٦٧	١,٣٣٣	٧٠٠,٠٠

فقط سیمانه حلیه مصری لا غیر

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

اولا : إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنند الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثانيا : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنند الاول /ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
ثالثا : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبنند الاول /ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظر الكشف المرفق
رابعا : إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمس في الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم الوارد بالبنند ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبنند الاول /رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شيء)
خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابات للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سابعا : تغطية مصاريف الجثّة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)

٢٠٧٦٨ محمود عبد القادر

إدارة الخدمات العامة
١٣/١٩٢ فرع غمسة
محمود عبد الحفيظ عبد السميع
للتوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصغار من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

وثيقة تأمين حوادث شخصية



الفرع المصدر	غمره	رقم الوثيقة	١٩٠٥ و ١٣	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/١٠/٢٥
العملة	جنية مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٣/١٠/٢٥	ظهر الى	٢٠٢٣/١٠/٢٥
				ظهر الى	٢٠٢٣/١٠/٢٥

من المضمون و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها (١) .

٢٠٢٣/١٠/٢٦

تحريرا في

MIC
MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين

إدارة الحوادث المتنوعة

غمره ١٣/١٩٢

محمود عبد الحفيظ عبد السمیع

التوقيع

نزهة هادي



كشف متم للوثيقة ١٩٠٥ / ١٣

خصوصیات و اضافات

عند ذكر اسم

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون للمؤمن عليه

أن التغطية التأمينية المطلوبة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على السادة المؤمن عليهم الغير منكور أسماؤهم بسبب الحوادث التي تقع لهم أثناء وبسبب العمل فقط وبداخل موقع العمل بموجب العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٧٨ بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٤.

عملية تنفيذ إكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من لم بيومي حتي كوبري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر وكذا إنشاء الذهب والعودة لموقع العمل بشرط سلوك الطريق المعتاد دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد الحد ووقت وقوع الحادث عن العدد المؤمن عليه (قرين كل وظيفة) بموجب هذه الوثيقة وإلا سقط حقه في الأنتفاع بمزايا التأمين السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت

لا يجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من اللجنة العامة للطرق والكبارى (المستفيدة)

صافي القسط

14V.A1

MOHANDS INSURANCE CO.
شركة المهندسين للتأمين
إدارة الحوادث المتنوعة
خمسرة ١٣/١٩٢
بسمو السيد المحظوظ عبد السميع
التوقيع

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head Office: 111 Marsha Sq, #0401 - Gey
PO BOX 621000 - 111111
Tel: 2100101 - 2
Fax: 2101000 - 24 01000

19318

تتميز هذه الخدمة بـ:

- سرعة الاستجابة
- إمكانية التواصل مع فريق الدعم الفني عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني
- إمكانية التواصل مع فريق الدعم الفني عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني

للتواصل مع فريق الدعم الفني، يرجى الاتصال على الرقم التالي:

0800 123 456

أو عبر البريد الإلكتروني: info@mobiles.com

உதாரணமாக: கிடைக்கும் கிடைப்புகள்:

تتبع الشركة سياسة صارمة في مراقبة الجودة، حيث يتم فحص كل منتج قبل شحنه، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والرضا.



IT-105

وَقُلِّمَ الْوُحْيَاقَةَ ١٩٠٠/

رقم الاصل ١١٤٨ /

محرر: ا. م. م.

المجلة ١٩٨١ / رقم ١ / شارع عبد الجواد قورطام - حي الجامعة - بنها - القاهرة

٢٠٥٠٠ / مبلغ التكاليف

خطة أخرى

الهيئة العامة للغذاء والدواء
/ **الاملاحية**

1474

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

100	100
-----	-----

وہملاً علیہ السلام

1111	مدرسة محمد بن عبد الله
------	------------------------

تاریخ و جغرافیہ

100

شركة المهندسين للتأمين

1

by

Abstracts of the 1997 Annual Meeting of the American Society of Human Genetics

מפלגת העבודה

نوع التأمين / حوالث التأمينية

الطبعة الأولى

مطلوب من NY: شركة الجاز هي

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

المجلة العامة للطب
المجلة

100

11/10/99 11:00 AM

تدريجياً يتوجب عليه التوقف عن بعض الممارسات التي

مكتبة جامعة القاهرة

பாடகர்: கருணாநிதி

will be 2 more, this

com

with the following description: "A person who is not a member of the club."

Figure 1. Schematic diagram of the experimental design.



وثيقة تأمين حوادث شخصية

الفرع المصدر	شماره	رقم الوثيقة	١٩٠٥ / ١٣	تاريخ طلب التأمين	٢٠٢٣/١٠/٢٥
العملة	جنية مصري	مدة التأمين من	٢٠٢٣/١٠/٢٥	ظهرا الى	ظهرا
اسم المتعاقد	شركة الجارحي للبناء والتشييد وإنشاء الطرق				
اسم المؤمن عليه	كما بالكشف المرفق				
العنوان	رقم ٤ شارع عبد الجواد قرطام - حي الجامعة - بنها - القليوبية				
تاريخ الميلاد	أكبر من ١٦ سنة و أقل من ٦٥ سنة				
وظيفة	كما بالكشف المرفق				

اسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون للمؤمن عليه
أن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على السادة المؤمن عليهم الغير المذكور أسماؤهم بسبب الحوادث التي تقع لهم أثناء وبسبب العمل فقط وداخل موقع العمل بموجب العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٧٨ بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٥
عملية تنفيذ إستكمال أعمال رصف شارع أحمد عرابي من أم بيومي حتي كويري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر وكذا أثناء الذهاب والعودة لموقع العمل بشرط سلوكه الطريق المختار دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن الحد المؤمن عليه (قرين كل وظيفة) بموجب هذه الوثيقة وإلا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين
السادة المؤمن عليهم يستخدمون كهرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فولت
لا يجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري (المستبعدة)

القسط الصافي	نصف النسيئة	نصف دفعة الانتعاش	مصاريف الإصدار	مصاريف الاشراف	رسوم مقابل خدمات مراجعة و	صندوق حملة الوثائق	القسط الاجمالي
٦٢٧,٨١	٧,٠٠	٤,٠٠	٥٥,١٩	٤,٠٠	٠,٦٦٧	١,٣٣٣	٧٠٠,٠٠

قسط سيعانة جنية مصري لا غير

مبلغ التأمين

الحالات المغطاة

اولا : اذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / اولا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظرالكشف المرفق
ثانيا : اذا اصاب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي مبلغا و قدره وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثانيا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظرالكشف المرفق
ثالثا : اذا اصاب المؤمن عليه بعجز جزلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا يحدد وفقا لما جاء بالبنود الاول / ثالثا من الشروط العامة لهذه الوثيقة	انظرالكشف المرفق
رابعا : اذا اصاب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا و قدره اسبوعيا بواقع (خمس في الالف) من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم الوارد بالبنود ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز بحد أقصى ٥٢ اسبوعا من يوم بدء العلاج الطبي وذلك وفقا لما جاء بالبنود الاول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	(لا شيء)
خامسا: تغطية مصاريف العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سادسا : تغطية مصاريف النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى اقرب مستشفى بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)
سابعا : تغطية مصاريف الجنازة بواقع (نسبة و مبلغ) من مبلغ التأمين	(لا شيء)

٢٠٢٨

منال محمود عبد القادر

وثيقة تأمين حوادث شخصية



٢٠٢٣/١٠/٢٦	تاريخ طلب التأمين	١٢ / ١٩٠٥	رقم الوثيقة	الفرع المصدر
٢٠٢٣/١٠/٢٦	ظهور الى	٢٠٢٣/١٠/٢٦	مدة التأمين من	العملة
ظهور				جنية مصرى

من المطلوب و المتفق عليه صراحة ان المؤمن عليه تسلم الشروط العامة للوثيقة و عددها (٤) والكشوف المرفقة للوثيقة و عددها (١) .

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٠/٢٦

أمان بلا حدود



بِأَسْمَاءِ السَّادَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِمُ

13 13 14.0

كشفت متمم الوثيقة

الاسم	الوظيفة	العدد	مبلغ التأمين	السعر	القسط				
	الوقت	حالة العجز الكلى أو الجزئى المسكبه	العجز الكلى المؤقت	العلاج	استعفاء	جنازة			
(٣) تأميناً على عدد مهندس بمبلغ تأمين الشخص الواحد ٧٥٠٠٠,٠٠ جم وبدون ذكر أسماء	مهندس	٢	٧٥٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٥٠	٢,٥٠	٠,٠٠
المبلغ الموضحة نقل الشخص									
(١) تأميناً على عدد مساعد مهندس أو ملاحظ فني بدون ذكر أسم	مساعد مهندس أو ملاحظ فني	١	٢٠٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٥٠	٢,٥٠	٠,٠٠
تأميناً على عدد سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم بدون ذكر أسم	سائق معدة أو سيارة ومن في حكمهم	١	١٥٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٧٥	٢,٥٠	٠,٠٠
تأميناً على عدد عامل عادي بدون ذكر أسم	عامل	١	١٠٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٥٠	٢,٥٠	٠,٠٠
اجمالى مبلغ التأمين									
٢٠٥٠٠٠ جنية مصرى									

خصومات و اضافات

120.07

Yo...

عدم ذکر اسم

اسماء العتقـيدين في حالة وفاة المزمـن عليه و صلة كل منهم به

الورثة الشرعيون للمؤمن عليه
إن التغطية التأمينية الممنوحة بموجب هذه الوثيقة تقتصر على السادة المؤمن عليهم الغير منكور أسماؤهم بسبب الحوادث التي تقع لهم أثناء وسبب العمل فقط وداخل موقع العمل بموجب العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٢/٤٧٨ بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٢ م.
صلية تنفيذ إستكمال أعمال رصف شارع احمد عرابي من أم بيومي حتي كويري ١٥ مايو بطول ٥٠٠ متر (القطاع الثاني) في الاتجاه الأيمن بالأمر المباشر وكذا أثناء الذهاب والعودة لموقع العمل بشرط سلوكه الطريق المعتاد دون أي تخلف أو توقف أو انحراف وبشرط ألا يزيد الحد وقت وقوع الحادث عن الحد المؤمن عليه (قرين كل وظيفة) بموجب هذه الوثيقة وإلا سقط حقه في الانتفاع بمزايا التأمين السادة المؤمن عليهم يستخدمون كعرباء لا تزيد عن ٢٢٠ فوات
لا يجوز إجراء أية تعديلات في بنود وشروط الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكباري (المستفيدة)

947, A9

صافي القسط

وإذا كان المؤمن عليه أعسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات الملتصقة عليها بعالية بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.

٢ - الأطراف السفلى

٥٠٪	الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة
٤٠٪	الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة
٣٠٪	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع
٣٠٪	الفقد الكامل لحركة الحرقفة
٣٠٪	الفقد الكامل لحركة الركبة
١٥٪	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم
٨٪	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم

٣ - الكسور

٣٠٪	كسر لم يلتحم بالنسق
٢٠٪	كسر لم يلتحم بالقدم
٢٠٪	كسر لم يلتحم بالرسغ
٢٥٪	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل
١٠٪	كسر ضلعى يصحبه تشوه دائم فى الصدر واضطرابات وظيفية
٤٠٪	صمم تام
١٥٪	صمم إحدى الإذنين
١٥٪	الكماش طرف سفلى خمسه (٥) سنتيمترات على الأقل
٣٥٪	الفقد الكامل لعين واحدة

ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته فى حكم الطرف أو العضو المفقود فى تفسير هذه الوثيقة.

وفى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقد جازئياً بقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل. أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البلد فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من المتفق عليه ما يلى -

أ - إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء بحسب المبلغ المستحق فى هذه الحالة على أساس جملة النسب التى يمنحها هذا البلد عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى باى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستديم.

ب - لا يستحق للمؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا بحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

رابعاً : حالة العجز الكلى المؤقت

إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعى المتفق عليه بالجدول لحالة العجز الكلى المؤقت طوال المدة التى يلازم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التى حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة أى عمل كان . ويستحق هذا المبلغ الأسبوعى طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التى نفل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة (٧).

البند الثانى : الاستثناءات

أولاً : استثناءات عامة

لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية -

- ١ - تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التأمير ضد نظام الحكم وكذا الأفراد التابعين للقوات المسلحة أو الشرطة ما لم تكن التغطية لقيامهم بأعمال مدنية .
- ٢ - الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو لغايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها .

٣ - السفر على الطائرات الحربية .

٤ - التحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرادياً لخطر غير ضرورى (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفس بشرية) .

٥ - فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

٦ - استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية .

ثانياً : استثناءات لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل قسط اضافى)

لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية -

" ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل قسط اضافى - وفقاً لما ورد بالتغطيات الإضافية " .

١ - العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة .

٢ - النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى .

٣ - الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .

٤ - الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو أجنبى أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطه غاضبه أو التمرد أو الانقلابات العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان .

٥ - الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوابع والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر)

٦ - السفر على الطائرات الخاصة

٧ - الاشتراك فى مباريات الفرق الرياضية التى تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكن والبولي ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال و السباق والصيد و الغطس وركوب المظايد والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات او القيام بإجراء اختبارات السرعة .

٨ - مصاريف الجنازة .

البند الثالث : الحدود الجغرافية

جميع أنحاء العالم ما لم يلى على خلاف ذلك.

البند الرابع : الجمع بين مزاي التأمين

تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعى المنصوص عليه فى حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق له فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها فى حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد انفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه فى أى من حالتى العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الأثنى عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه فى حالة الوفاة مخصوماً منه المبلغ الذى سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق فى حالات العجز الكلى المؤقت .

البند الخامس : تغيير الخطر

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة فى جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاويلته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا فاه المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث .

البند السادس : الإخطارات

أ - جميع الإخطارات التى يلعبن إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابية وأن توجه إلى الجهة التى أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه

ب - لا تكون الشركة ملزمة باى حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا لتلزم بتجديدها ولا تكون أيضاً مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتأكد ذلك كتابة من قبل الشركة .

المقدمة

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له / و أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة المهندسين للتأمين والمنوه عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً من مملتها لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بجدول الوثيقة ،
للعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمية نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر يقع للشخص المؤمن عليه ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها .
ولا يتعدى التزام الشركة عن أي بلد من بلدان هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : حالة الوفاة

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بهائهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفي المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يسقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقي المستفيدين أو المستحقين .

ثانياً : حالة العجز الكلي المستديم

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كلياً مستديماً في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :

فقد إحصار العينين نهائياً
فقد إحصار القدمين
فقد ذراع وساق
فقد يد وساق
فقد يد وقدم

كما يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .
ولا يستحق للمضرور أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

ثالثاً : حالة العجز الجزئي المستديم

تؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم والمبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي

الأيسر	الأيمن	الأطراف العليا لغير الأعسر
١٥%	٦٠%	الفقد الكامل للذراع أو يد
٢٠%	٢٥%	الفقد الكامل لحركة الكتف
١٥%	٢٠%	الفقد الكامل لحركة المرفق
١٥%	٢٠%	الفقد الكامل لحركة المعصم
٢٥%	٣٠%	الفقد الكامل للإبهام والسبابة
٢٠%	٢٥%	الفقد الكامل للإصبع غير السبابة
١٥%	٢٠%	الفقد الكامل للإصبع غير الإبهام
٢٠%	٢٥%	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة
١٥%	٢٠%	الفقد الكامل للإبهام فقط
١٠%	١٥%	الفقد الكامل للسبابة فقط
٨%	١٠%	الفقد الكامل للوسطى فقط
٧%	٨%	الفقد الكامل للخنصر فقط
٦%	٧%	الفقد الكامل للخنصر فقط

البند السابع : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :

في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالقيام بما يلي :-
١ - إخطار الشركة فوراً بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .
٢ - تعيين على المؤمن له أو من ينوب عنه إلتحاق تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة الذي يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .
٣ - إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد القضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المؤمن عليه أو المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .

البند التاسع : الشرط الفاسخ

للشركة المؤمته في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد إستحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إندارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-

أ - إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمته على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .
ب - مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا الطوت على جناية أو جنحة عمديه .
ج - ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو لتطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً .

البند الحادي عشر : الحلول في الحقوق

للشركة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (في حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد أدتها بسبب أي حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة .

البند الثاني عشر : المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

البند الثالث عشر : التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدني المصري .

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بوجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head Office : 111 Meskha Sq. Dokki - Giza
PO BOX 162 ORMAN - EGYPT
Tel : 33368101 - 7
Fax : 33352937 - 33361365

www.mohins.com

19318

info@mohins.com

المركز الرئيسي : ٣١١ ميسكا - الجيزة
تلفون : ٣٣٣٦٨١٠١ - ٧
فاكس : ٣٣٣٥٢٩٣٧ - ٣٣٣٦١٣٦٥
www.mohins.com

هذه الوثيقة مؤمنة ومحفوظة

تقوم الشركة بمحاكمة مصلحة الضرائب على ضرورة الدفعة الضريبية والنوعية

وإذا كان المؤمن عليه أعسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات المنصوص عليها بعالية بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.

٢ - الأطراف السفلى

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة	٥٠٪
الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة	٤٠٪
البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	٣٠٪
الفقد الكامل لحركة الحرقفة	٣٠٪
الفقد الكامل لحركة الركبة	٣٠٪
الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	١٥٪
الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	٨٪

٣ - الكسور

كسر لم يلتحم بالساق	٣٠٪
كسر لم يلتحم بالقدم	٢٠٪
كسر لم يلتحم بالرسغ	٢٠٪
كسر لم يلتحم بالغك الأسفل	٢٥٪
كسر ضلعى يصحبه تشوه دائم فى الصدر واضطرابات وظيفية	١٠٪

٤ - الصمم والكماش الأطراف وفقد الإبصار

صمم تام	٤٠٪
صمم إحدى الإذنين	١٥٪
انكماش طرف سفلى خمسه (٥) سنتيمترات على الأقل	١٥٪
الفقد الكامل لعين واحدة	٣٥٪

وباعتبار عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته فى حكم الطرف أو العضو المفقود فى تفسير هذه الوثيقة.

وفى حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقد جزئياً يقدر مدى العجز فيه بالنسبة إلى الفقد الكامل. أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة فى هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من المتفق عليه ما يلى:-

أ - إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء بحسب المبلغ المستحق فى هذه الحالة على أساس جملة النسب التى يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستديم.

ب - لا يستحق للمؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا بحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

رابعاً : حالة العجز الكلى المؤقت

إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلى مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعى المتفق عليه بالجدول لحالة العجز الكلى المؤقت طوال المدة التى يلازم فيها الفراش وينتج أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ إعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التى حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة أى عمل كان . ويستحق هذا المبلغ الأسبوعى طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وبحسب المبلغ المستحق عن الأيام التى تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة (٧).

البند الثانى : الاستثناءات

أولاً : استثناءات عامة

لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية :-

- ١ - تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التأمر ضد نظام الحكم وكذا الأفراد التابعين للقوات المسلحة أو الشرطة ما لم تكن التغطية لقيامهم بأعمال مدنية .
- ٢ - الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها .

٣ - السفر على الطائرات الحربية .

٤ - انتحار أو محاولة انتحار أو لعدم الشخص المؤمن عليه إيداء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إرادياً لخطر غير ضرورى (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفس بشرية) .

٥ - فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

٦ - استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية .

ثانياً : استثناءات لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل قسط اضافى)

لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية :-

* ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل قسط اضافى - وفقاً لما ورد بالتغطيات الإضافية * .

١ - العلاج من الإصابة للحالات المعقدة بالوثيقة .

٢ - النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى .

٣ - الشعب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والإرهاب والتخريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .

٤ - الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو أجنبى أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أو لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تأمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطه غاصبه أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنه أو العصيان .

٥ - الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوابع والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر)

٦ - السفر على الطائرات الخاصة

٧ - الاشتراك فى مباريات الفرق الرياضية التى تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكن والبولى ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال و السباق والصيد و الغطس وركوب المناطيد والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات او القيام بإجراء اختبارات السرعة .

٨ - مصاريق الجازة .

البند الثالث : الحدود الجغرافية

جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك.

البند الرابع : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعى المنصوص عليه فى حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق له فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها فى حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه فى أى من حالتى العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الأثنى عشرة شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتؤدى الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه فى حالة الوفاة مخصوماً منه المبلغ الذى سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق فى حالات العجز الكلى المؤقت .

البند الخامس : تغيير الخطر

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة فى جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاومته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الاضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث .

البند السادس : الإخطارات

أ - جميع الإخطارات التى يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التى أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه

ب - لا تكون الشركة ملزمة بأى حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا بالتزام بتجديدها ولا تكون أيضاً مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتأكد ذلك كتابة من قبل الشركة .

المقدمة

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له و/ أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة المهندسين للتأمين والملتوه عليها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متكاملاً لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بجدول الوثيقة .

تعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسمية نتيجة حادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر يقع للشخص المؤمن عليه ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عليها .

ولا يتعدى التزام الشركة عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : حالة الوفاة

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفي المؤمن عليه بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو الملتزمين إليهم يسقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء إلى باقي المستفيدين أو المستحقين .

ثانياً : حالة العجز الكلي المستديم

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كلياً مستديماً في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :

فقد إحصاء العينين نهائياً	فقد الذراعين أو اليدين
فقد الساقين أو القدمين	فقد ذراع وساق
فقد ذراع وفـمـ	فقد يد وساق
فقد يد وفـمـ	

كما يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .
ولا يستحق للمضرور أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

ثالثاً : حالة العجز الجزئي المستديم

تؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلي المستديم والمبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

الأطراف العليا لغير الأعسر	الأيمن	الأيسر	نسبة العجز الجزئي
الفقد الكامل للذراع أو يد	٦٠٪	٥٠٪	
الفقد الكامل لحركة الكتف	٢٥٪	٢٠٪	
الفقد الكامل لحركة المرفق	٢٠٪	١٥٪	
الفقد الكامل لحركة المعصم	٢٠٪	١٥٪	
الفقد الكامل للإبهام والسبابة	٣٠٪	٢٥٪	
الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة	٢٥٪	٢٠٪	
الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام	٢٠٪	١٥٪	
الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة	٢٥٪	٢٠٪	
الفقد الكامل للإبهام فقط	٢٠٪	١٥٪	
الفقد الكامل للسبابة فقط	١٥٪	١٠٪	
الفقد الكامل للوسطى فقط	١٠٪	٨٪	
الفقد الكامل للبصر فقط	٨٪	٧٪	
الفقد الكامل للخصر فقط	٧٪	٦٪	

البند السابع : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :

- ١ - إخطار الشركة فوراً بالحادث خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .
- ٢ - يتعين على المؤمن له أو من يلوب عنه إتباع تعليمات الشركة بخصوص توقيع الكشف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة الذي يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتأكد من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .
- ٣ - إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

وإذا لم يقدم المؤمن له أو من يلوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان تعذر مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليه على آخر عنوان معروف له وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المتبقية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المؤمن عليه أو المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المتبقية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، وينشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .

البند التاسع : الشرط الفاسخ

للشركة المؤمّنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد إستحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إلزامهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يقدم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمؤمن عليه أو المستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المتبقية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر : سقوط الحق

يسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

- أ - إذا أدلى المؤمن له أو من يلوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمّنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .
- ب - مخالفة المؤمن له أو من يلوب عنه القوانين واللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة عمديه .
- ج - ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من يلوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مغفلعلاً .

البند الحادي عشر : الحلول في الحقوق

للشركة الحق في الرجوع على المتسبب من الغير في الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (في حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد أدلتها بسبب أي حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة .

البند الثاني عشر : المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة .

البند الثالث عشر : التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (٧٠٢) من القانون المدني المصري .

للحصول والإطلاع على دليل حماية المتعاملين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني www.mohins.com

Head Office : El Mohandes Sq. Dokki - Giza
PO BOX 42 GIZA - EGYPT
Tel : 33554197 - 7
Fax : 33554197 - 33553365

www.mohins.com

19318

المكتب الرئيسي : ٢٠ شارع المهندسين - الدقي - الجيزة
الهاتف : ٣٣٥٥٤١٩٧ - ٧
البريد : ١٢٠٣٣٣ - الدقي - الجيزة
فاكس : ٣٣٥٥٤١٩٧ - ٣٣٥٥٣٣٦٥

تقوم الشركة بحراسة مصلحة الضرائب على ضريبة الدخل والعمالة والتأمين

هذه الوثيقة مؤمّنة ومضمونة
