

تنفيذ : مكتب القمة للمقاولات العمومية


مستخلص جارى رقم (١)
المقاول : مكتب القمة للمقاولات العمومية رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٢٤)
عن المدة من بدأ الأعمال حتى (١٢ / ٩ / ٢٠٢٣)

بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
رقم بند	الكمية	الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	اعمال الحفر									
١٠٠	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة	م٣	20	16,200	0.00	9,912.00	198,240.00	0.00	198,240.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده
٢٠١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة	م٣	33	3,000	0.00	1,438.00	47,454.00	0.00	47,454.00	- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
٥	طبقات الاساس									
٣٠٠	المتر المكعب توريد وتنفيذ ورديم احجار بسمكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مرة من متخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفالية او بيت التمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع 3% اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الابد اعتماد الاحجار واعتماد عن EV12EV ٢,٥ التجارب العملية والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتاز kn باستخدام حمل مقدارة ٨ مسافة النقل ٢٠ كم- الفئة شاملة القيمة المادة المحجزة يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -	م٣	310	6,000	0	4,317.00	1,338,270.00	0.00	1,338,270.00	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب العملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	علاوة مسافة النقل ٩٠ كم = ١,٢*٩٠ = ٨٤ جنيه	م٣	84	6,000	0	4,317.00	362,628.00	0.00	362,628.00	- وثيقه التامين ساريه حتى ٢٠٢٤ / ٥ / ٤
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	م٣	25	6,000	0	4,317.00	107,925.00	0.00	107,925.00	- يراعى تطبيق نصوص العقد - الحاسب الالى غير متواجد
إجمالي قيمة المستخلص										
اثنان مليون و اربعة و خمسون الفا و خمسمائه وسبعة عشر جنيها مصريا فقط لا غير										

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مدير مشروع الهيئة

(SYSTRA) مستشار

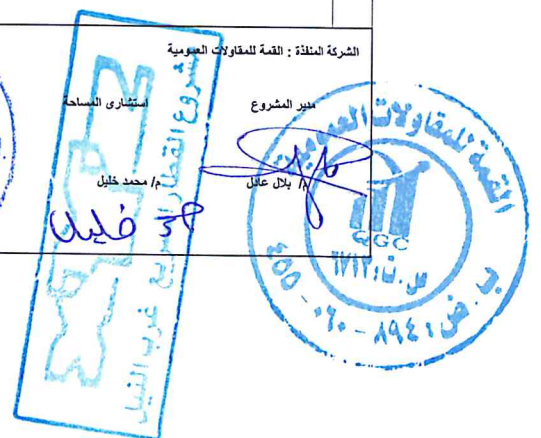

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

تحريرا فى

يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريرا فى :

مهندس / محمد حسنى قياض

م / مارجريت مجدى زاهر

تمت المراجعة الفنية فقط
