


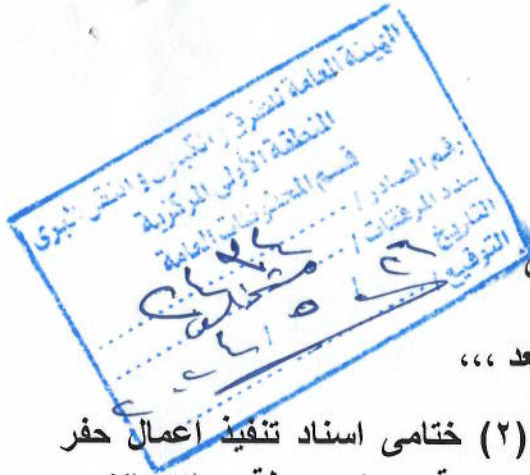

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامى اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (A06) من منسوب الارض الطبيعية حتى ٥م بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / مكتب المتميز لانشاء ورصف الطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر إعمال

كشف معدات / كشف مهندسين

محضر استلام ابتدائى

محضر تقييم

شهادة عملية/ شهادة معملية

شهادة مهندس/ شهادة محاجر

نموذج رقم (٢)

مقايضة ختامية

قوائم كميات ختامية

خطاب محملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ



Handwritten signature in blue ink.

رئيس القسم

۲.۱ $\frac{7}{\text{عدد کسر ها}}$

(ب) الكاتب المبرور

الختم ذو التاريخ

۹۱-ج

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠١

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجم فی ————— سنة ٢٠١

يعتدل سحاب

وكيل الحسابات

ففي سنة ٢٠١٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١٤ - ٢٠١٠

(2)

الختم ذو التاريخ

U

(۶) استقامت

رقم البند	نوع العمل	القيمة		كمية البند بالمقايمة المحملة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جانبية			ملاحظات
		قروش /	جنيه							استقطاع او حجز	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	
٣	المتن المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسكة (طفلة منحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلوزر) وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة المقصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة إلى الزاوية لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .												
	- يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلوزر .												
	- علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه / كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣												
	- يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه/٨ متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .												
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر (الكميات المنقذة قبل ٤/٥/٢٠٢٣)												
٤	المتن المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وحمل على البند الأتى : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أركعة الممول الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشجيرها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم إستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والكثاف (نسبة تحمل تكفيو زنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة المقصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .												
	- يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه/٨ متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية .												
	ذات إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) شهر فبراير												
	علاوة الحفر ٣ م / جنيه وذلك بعد أول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية												
	علاوة الحفر ٣ م / جنيه وذلك بعد أول ٨ متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية												
الإجمالي													
اجمالي قيمة الاعمال المنقذة حتى تاريخ المستخلص													
اجملى قيمة الاستقطاعات													
اجملى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجملى قيمة المستخلص رقم (٢)													



مدير عام الشؤون الإدارية
رئيس الإدارة المركزية

مدير عام المشروعات
مهندس

مدير عام الطرق والكبارى
مهندس

المستشار العام
مهندس

مهندس المكتب الفني (المستشار)
مهندس

مهندس المكتب الفني (المستشار)
مهندس

مهندس المكتب الفني (المستشار)
مهندس

مهندس المكتب الفني (المستشار)
مهندس

مهندس المكتب الفني (المستشار)
مهندس
