


عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٦+٣٥٠ إلى الكم ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم
عقد رقم (٢٠٢٥-٢٠٢٤-٩٦٨) (بالأمر المباشر) تنفيذ: شركة شريف عيسى محمد حسنين

المنطقة الأولى المركزية

بيان أعمال						
مستخلص جاري رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٥/٦/٤						
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الإجمالية المصروفة سابقاً	الكمية المدرجة بالمستخلص
٢-١ أعمال الحفر	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة السيول الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات الترسية بسك ٧ يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠%) ورشها بالعماء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٢,٥ جنيه/كم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم تصبح ٢,١٥ جنيه/كم	م³				
٢-٤-٢	ذات إجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم/سم²	م³	٨٩٦٦٧,٠٠	٨٩٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٠٠,٠٠
٤-٢	علاوة ٢,٥ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١,٥٠٢ = ١,٥ كم)	م³	٨٩٦٦٧,٠٠	٨٩٦٦٧,٠٠	٠,٠٠	٧٨٦٠٠,٠٠

مهندس الشركة المنفذة
م/ إبراهيم عياد محمد
التوقيع /

مستشاري المساحة
مكتب XYZ
م/ محمد عبدالرحمن

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
المكتب الفني
م/ أحمد عزب
التوقيع /

مدير المشروع
م/ محمود غريب
التوقيع /

يعتمد
مهندس الهيئة
م/ محمود حسين

مكتب مقاولات متكاملة
شريف عيسى محمد حسنين
س.ت / ٧٠٣٤٠

مشاريع تنميط السريعة
شركة شريف عيسى محمد حسنين

[illegible]

170,698.54
170,005.59
170,107.92
170,107.92
170,107.92

من القصة
في اربعين سنة مضت
قوله /

من القصة
في اربعين سنة مضت
قوله /

مكتب مقاول
شريف عيسى محمد حسين
س.ت. / ٧٠٣٤٠



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية: تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتحسينها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر		
خاص بسفلية: القطاع السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (١٧٥ + ٨٠٠ : ٢٢٤ + ٨٠٠) (القطاع بني مزار - منفلوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - على منسوب البنش الأول		
مقولة: شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة		
توريد: ٢٠٠٠٦٤٠٣٥٣٩	بتاريخ: ٢٠٢٤/١/٣	ممثل: ٢

نتائج الاختبارات

م	الابعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
1	10 x10 x10	196+380	86.55	28	280
2	10 x10 x10	196+390	86.46	40	400
3	10 x10 x10	196+400	86.4	28	280
4	10 x10 x10	196+410	86.24	28	280
5	10 x10 x10	196+420	86.17	33	330
6	10 x10 x10	196+430	86.18	33	330
7	10 x10 x10	196+440	86.11	28	280
8	10 x10 x10	196+450	86.27	40	400
9	10 x10 x10	196+460	86.65	29	290

* توريد العينة مسئولية المورد. دون أفضى مسئولية علي المعمل

* تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٠٢٥/١٢/١٢ ٢٩٦٠٩٠١٢٤١٠٢٧٥



المشرف على المعمل

التوقيع:

ففي المعمل

التوقيع:

ساعة الكلية: تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وفاعل على المنافسة في أسواق العمل
محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتنشيط والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي.

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتكليم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعبيرها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر		
خاص بمسلة : القطاع المربع (أكتوبر - أسوان) للقطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨٠٠ + ٢٢٤) (للقطاع بني مزار - منفلوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - علي منسوب البنش الأول مقاوله : شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة		
توريد : ٢٠٠٠٦٤٠٣٥٣٩	بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ٣	مسلسل : ٢

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهت الكسر كجم/سم
1	10 x10 x10	196+470	86.90	40	400
2	10 x10 x10	196+480	87.16	33	330
3	10 x10 x10	196+490	87.43	43	430
4	10 x10 x10	196+500	87.75	37	370
5	10 x10 x10	196+510	87.90	28	280
6	10 x10 x10	196+520	87.99	30	300
7	10 x10 x10	196+530	87.99	40	400
8	10 x10 x10	196+540	87.94	38	380
9	10 x10 x10	196+550	87.86	37	370

* توريد العينة مسئولية المورد . دون أدنى مسئولية علي المعمل

* تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠٢٧٥١٠١٢٤١٠٩٠٩٦٦



المشرف علي المعمل

في المعمل

التوقيع :

التوقيع :

وسالة الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتنشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتحسينها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر		
خاص بصفحة : القطار السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨٠٠ + ٢٢٤) (القطاع بني مزار - منفلوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - علي منسوب البنش الأول مقولة : شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة		
توريد : ٢٠٠٠٨٠١٣٩٨٠	بتاريخ : ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤	ممسلسل : ٢

نتائج الاختبارات

م	الابعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
1	10 x10 x10	196+560	87.61	44	440
2	10 x10 x10	196+570	87.27	31	310
3	10 x10 x10	196+580	86.84	34	340
4	10 x10 x10	196+590	85.60	40	400
5	10 x10 x10	196+600	80.13	33	330
6	10 x10 x10	196+610	84.87	39	390
7	10 x10 x10	196+620	84.18	38	380
8	10 x10 x10	196+630	78.95	34	340
9	10 x10 x10	196+640	78.97	40	400

* توريد العينة مسئولية المورد • دون أدنى مسئولية علي المعمل

* تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠٢٤١٠١٢٤١٠٩٠٢٩٦٠٩٠



المشرف علي المعمل

التوقيع :

فني المعمل

التوقيع :

وسالة الكلية : تتلزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتلزم بالتنشيط والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية: تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحرية عالية الجودة متميزة بتكليم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتصويرها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر		
خاص بعملية: القطار السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨١٠ + ٢٢٤) (القطاع بني مزار - منفلوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - علي منسوب البنش الأول مقولة: شركة شريف عيسى محمد حسنين للمقاولات العامة		
توريد: ٢٠٠٠٨٠١٣٩٨٠	بتاريخ: ٢٠٢٤/ ١/ ٢٤	مستسل: ٢

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
1	10 x10 x10	196+650	78.99	40	400
2	10 x10 x10	196+660	79.01	34	340
3	10 x10 x10	196+670	79.03	34	340
4	10 x10 x10	196+680	79.50	40	400
5	10 x10 x10	196+690	79.07	44	440
6	10 x10 x10	196+700	79.09	43	430
7	10 x10 x10	196+710	79.11	46	460
8	10 x10 x10	196+720	79.13	39	390
9	10 x10 x10	196+730	79.15	40	400

* توريد العينة مسئولية المورد ، دون أدنى مسئولية علي المعمل

* تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠٢٧٥١٠١٢٤١٠٩٠٩٦٦٠٩



المشرف على المعمل

التوقيع: /

فني المعمل

التوقيع: /

مقالة الكلية: تتلزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل
حلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتلزم بالتنشيط والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center
معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية: نسعى للكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية رفيعة عالية الجودة متفردة بتقديم خدمات مجتمعية لتلبية البيئة ونميتها

نتائج اختبارات عينات من كميات الحجر


خاص بسطية: القطر السريع (أكزور - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨٠٠ + ٢٣٤)			
(القطاع الثاني متر - منظر - منظر) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - على مفروب للبش الأول			
مقارنة: شركة شريف عيسى معد حصانين للمقاولات العامة			
مستل : ٢	بتاريخ : ٢٠٢٤/١/٢٤	توريد : ٢٠٠٠٨٠١٢٩٨٠	

نتائج الاختبارات

م	الابعاد / سم	المحطة	مفروب	حمل الكسر طن	اجهد الكسر كم/سم ^٢
1	10 x10 x10	196+830	79.35	28	280
2	10 x10 x10	196+840	79.37	40	400
3	10 x10 x10	196+850	79.39	28	280
4	10 x10 x10	196+860	79.41	28	280
5	10 x10 x10	196+870	79.43	33	330
6	10 x10 x10	196+880	79.45	33	330
7	10 x10 x10	196+890	79.47	44	440
8	10 x10 x10	196+900	79.49	40	400
9	10 x10 x10	196+910	79.56	38	380

• توريد العينة مسئولية المورد • دون التي مسئولية على المعمل

• تم توريد العينات بسرعة م / محمود الحفني ٢٧٥٠، ١٢٤١، ٢٩٦٠٩

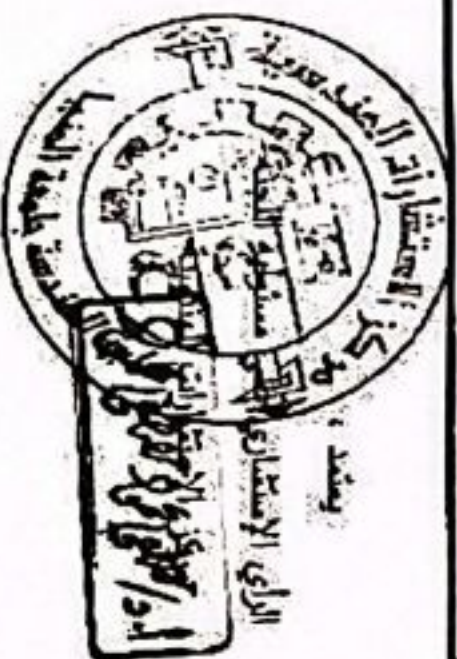

المشرف على المعمل

التوقيع:

في المعمل

التوقيع:

وسالة الكلية: تتقدم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتقدم بالشكر والتقدير والتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يقدمه للبيئة والتطوير التكنولوجي.

Tel: +2 (086) 2362083-2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية: تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحرية عالية الجودة متميزة بتكليم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتصورها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر		
خاص بسلية: القطار السريع (أكتوبر - أسيوط) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (١٧٥ + ٨٠٠ : ٣٣٤ + ٨٠٠) (القطاع بني مزار - منفلوط) من المحطة ١٩٧ + ٢٢٠ إلى المحطة ١٩٧ + ٨٥٠ - علي منصوب البش الأول مقابلة: شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة		
توريد: ٢٠٠٠٨٠١٣٩٨٠	بتاريخ: ٢٠٢٤/١/٢٤	مستلم: ٢

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
1	10 x 10 x 10	196+920	79.35	36	360
2	10 x 10 x 10	196+930	79.37	33	330
3	10 x 10 x 10	196+940	79.39	31	310
4	10 x 10 x 10	196+950	79.41	34	340
5	10 x 10 x 10	196+960	79.43	36	360
6	10 x 10 x 10	196+970	79.45	33	330
7	10 x 10 x 10	196+980	79.47	41	410
8	10 x 10 x 10	196+990	79.49	34	340
9	10 x 10 x 10	197+000	79.56	35	350

* توريد العينة مسئولية المورد، دون أدنى مسئولية علي المعمل

* تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠٢٤١٠١٢٩٦٠٩٠



المشرف على المعمل

أ. د.

التوقيع:

فني المعمل

التوقيع:

رسالة الكلية: تتلزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتلزم بالتنشيط والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي.

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتصميمها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر		
خاص بصلبة : القطر السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨٠٠ + ٢٢٤) (القطاع بني مزار - منفلوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - علي منسوب التشن الأول مقاوله : شركة شريف عيسى محمد حسنين للمقاولات العامة		
توريد : ٢٠٠٠٦٤٠٣٥٣٩	بتاريخ : ٢٠٢٤ / ١ / ٣	مسلسل : ٢

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
1	10 x10 x10	197+000	79.69	40	400
2	10 x10 x10	197+010	79.71	33	330
3	10 x10 x10	197+020	79.73	44	440
4	10 x10 x10	197+030	79.75	28	280
5	10 x10 x10	197+040	79.77	40	400
6	10 x10 x10	197+050	79.79	33	330
7	10 x10 x10	197+060	79.81	28	280
8	10 x10 x10	197+070	79.83	40	400
9	10 x10 x10	197+080	79.85	28	280

* توريد العينة مسئولية المورد • دون أدنى مسئولية علي المعمل

* تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠٢٤١٠١٢٤١٠٩٠٢٩٦٠٩



المشرف على المعمل

أ. د. /
التوقيع :

في المعمل
أ. د. /
التوقيع :

الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل
ليتميا وعالميا، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الدراسات الهندسية
Engineering Consultation Center
معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عليا الجودة مقبولة بتكليف خدمات مجتمعية لتلبية البيئة ونميتها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر

خاص بعملية : القطر السريع (أكثرير - أسرون) القاطع اللقي بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨٠٠ + ٣٢٤) (القاطع بني مزار - منظرط) من المحطة ٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - على مسرب للبش الأول مقارنة : شركة شريف عيسى محمد حاصلون للمقاولات العامة		
توريد : ٢٠٠٠٦٤٠٣٥٣٩	بتاريخ : ٢٠٢٤/١/٣	مسلل : ٢

نتائج الاختبارات

م	الابعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
1	10 x10 x10	197+090	79.87	38	380
2	10 x10 x10	197+100	79.89	31	310
3	10 x10 x10	197+110	79.91	43	430
4	10 x10 x10	197+120	79.93	37	370
5	10 x10 x10	197+130	79.95	31	310
6	10 x10 x10	197+140	79.97	33	330
7	10 x10 x10	197+150	79.99	40	400
8	10 x10 x10	197+160	80.01	28	280
9	10 x10 x10	197+170	80.03	37	370

* توريد الحطة مسئولية المورد ، دون انني مسئولية على المعمل
* تم توريد العينات بصورة م / محمود الحني ، ٢٧٥ ، ١٢٤١ ، ٩٠١٢٩٦



المشرف على المعمل
الدكتور /
التوقيع :
في المعمل
الدكتور /
التوقيع :

وساحة الكلية : تتلزم كلية الهندسة جامعة البتراء بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتلزم بالتشجيع والتطوير والتطوير في البحث العلمي بما يقدمه للبيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083 - 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center
معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عليا الجودة مكملة بتقديم خدمات مجتمعية لتلبية البيئة وتعميرها

نتائج اختبارات عينات من كميات الحجر

خاص بعملية : القطار السريع (أكتوبر - إبرون) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨١٠ + ٣٢٤) (القطاع بني مرار - منقروط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - على مسرب للبش الأول		
مقارنة : شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة		
توريد : ٢٠٠٦٤٠٣٥٣٩	بتاريخ : ٢٠٢٤/١/٣	مسلسل : ٢

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
1	10 x10 x10	197+180	80.05	36	360
2	10 x10 x10	197+190	80.07	31	310
3	10 x10 x10	197+200	80.09	35	350
4	10 x10 x10	197+210	80.11	40	400
5	10 x10 x10	197+220	80.13	32	320

• توريد العينة مستوردة الموردين : نون أدني مستوردة علي المعمل

• تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠١٢٤١٠٩٩٦٠٩



المشرف على المعمل
د. ا
التوقيع :
المعمل
د. ا
التوقيع :

رسالة الكلية : تتقدم كلية الهندسة جامعة الدنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعيار القومية لإعداد خريج مكنين وفكر على المنافسة في اسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتقدم بالشكر والتقدير في البحث العلمي بما يقدمه للبيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083-2348005 -2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحرية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتتبع البيئة وتعملها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر		
خضر بعملية : القطار المربع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨٠٠ + ٣٣٤) (القطاع بني مزار - منفوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - علي منسوب البنش الأول مؤولة : شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة		
توريد : ٢٠٠١٠٤٨٥٤٥٥	بتاريخ : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣	رقم القيد : ١

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
١	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٢٢٠	٨٨,٧٩	٣٥	٣٥٠
٢	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٢٣٠	٨٧,٨٩	٣٥	٣٥٠
٣	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٢٤٠	٨٧,٦٢	٤٤	٤٤٠
٤	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٢٥٠	٨٧,٧٢	٣٦	٣٦٠
٥	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٢٦٠	٨٧,٨٢	٤٠	٤٠٠
٦	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٢٧٠	٨٧,٧٧	٣٣	٣٣٠
٧	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٢٨٠	٨٧,٤٥	٢٨	٢٨٠
٨	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٢٩٠	٨٧,١٩	٢٩	٢٩٠
٩	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٣٠٠	٨٦,٩١	٣٧	٣٧٠

* توريد العينة مسئولية المورد . دون أدنى مسئولية على المعمل

* تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠٢٤١٠١٢٤١٠٩٠٩٦٦



المشرف على المعمل

د. ا

التوقيع :

فني المعمل

أ. هاشم السيد

التوقيع :

رسالة الكلية : تتلزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في أسواق العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتلزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثة عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتعميرها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر

خاص بعملية : القطر السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (١٧٥ + ٨٠٠ : ٣٣٤ + ٨٠٠)
(القطاع بني مزار - منفلوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - علي منسوب البنش الأول
مقولة : شركة شريف عيسى محمد حسنين للمقاولات العامة

رقم القيد : ١

بتاريخ : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣

تورين : ٢٠٠١٠٤٨٥٤٥٥

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
١	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣١٠	٨٦,٥٦	٣٨	٣٨٠
٢	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣٢٠	٨٦,٦٤	٤٠	٤٠٠
٣	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣٣٠	٨٦,٧	٤٣	٤٣٠
٤	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣٤٠	٨٦,٧١	٢٨	٢٨٠
٥	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣٥٠	٨٦,٧١	٣١	٣١٠
٦	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣٦٠	٨٦,٧٧	٣٣	٣٣٠
٧	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣٧٠	٨٦,٨٧	٣١	٣١٠
٨	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣٨٠	٨٧,٠١	٤٢	٤٢٠
٩	١٠ × ١٠ × ١٠	١٩٧+٣٩٠	٨٧,٥٣	٣٧	٣٧٠

* توريد العينة مسئولية المورد . دون أدنى مسئولية علي المعمل

تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠٢٤١٠١٢٩٠٩٢٩٦



يعتمد ،

الرأي الاستشاري

مسئولية اللجنة

أ.د/ محمد علي محمد

أ.د/ محمد علي محمد

المشرف على المعمل

أ.د/

التوقيع :

فني المعمل

أ.د/ محمد علي محمد

التوقيع :

كلية : تلتزم كلية الهندسة جامعه المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في اسواق العمل
ميا وعالميا، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center
معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية، نرى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عليا الجودة متميزة بتعليم خدمات مجتمعية لتتبع البيئة ونميرها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر

حاضر بصحبة : الدكتور السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٢٢٤)
(القطاع بني مزار - منقروط) من المحطة ٢٢٠ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - على منسوب البنى الأول
مقررة : شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقارلات العامة

تاريخ : ٢٠٠١٠٤٨٥٤٥٥	بتاريخ : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢	رقم القيد : ١
---------------------	-------------------------	---------------

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أبعاد الكسر / سم
١	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤٠٠	٨٨,١٨	٢٨	٢٨٠
٢	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤١٠	٨٨,٧٦	٤٠	٤٠٠
٣	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤٢٠	٨٨,٩٧	٢٥	٢٥٠
٤	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤٣٠	٨٨,٨٥	٢٦	٢٦٠
٥	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤٤٠	٨٨,٦٩	٢٢	٢٢٠
٦	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤٥٠	٨٨,٥٤	٤٠	٤٠٠
٧	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤٦٠	٨٨,٣٣	٢٨	٢٨٠
٨	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤٧٠	٨٨,٢٨	٢٤	٢٤٠
٩	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٤٨٠	٨٨,١٦	٢١	٢١٠

• توريد العينة مسئولية المورد • دون أدنى مسئولية على المعمل
• تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥٠٢٧٥١٢٤١٠٩٠٩١٦

المشرف على المعمل

أ.د. / التوقيع :

في المعمل

أ.د. / التوقيع :



وسالة الكلية : تتقدم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وتأخر على المنافسة في أسواق العمل
محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتقدم بالشكر والتقدير في البحث العلمي بما يقدمه للبيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية: تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة ونميتها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر

خاص بعملية: القطار السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨٠٠ + ٣٣٤)
(القطاع بني مزار - منفوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - على منسوب البنش الأول
مقنونة: شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة

توريد: ٢٠٠١٠٤٨٥٤٥٥ بتاريخ: ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢١ رقم القيد: ١

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	اجتهاد الكسر حجم/سم
١	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٤٩٠	٨٧,٧١	٣٨	٣٨٠
٢	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٥٠٠	٨٧,١٥	٤٤	٤٤٠
٣	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٥١٠	٨٦,٢٦	٣٦	٣٦٠
٤	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٥٢٠	٨٥,٣٧	٣٧	٣٧٠
٥	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٥٣٠	٨٥,١١	٣٥	٣٥٠
٦	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٥٤٠	٨٤,٨٦	٢٩	٢٩٠
٧	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٥٥٠	٨٤,٦١	٣١	٣١٠
٨	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٥٦٠	٨٤,٦٥	٣٢	٣٢٠
٩	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٥٧٠	٨٤,٠١	٤٠	٤٠٠

• توريد العينة مسئولية المورد، دون أدنى مسئولية علي المعمل

• تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٩٦٠٩٠١٢٤١٠٢٧٥



المشرف على المعمل

د. ا. التوقيع:

فني المعمل

التوقيع:

رسالة الكلية: تتنزه كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في اسواق العمل محنياً وإقليمياً وعالمياً، كما تتنزه بالتنشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي.

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center
معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية: نتمنى التلبية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية عليا الجودة متميزة بتعليم خدمات مجتمعية لتلبية البيئة وتغيرها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر

خاص بمنطقة: القطر السريع (أكوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (١٧٥ + ٨٠٠ : ٣٣٤)
(القطاع بني مزار - منفلوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - على منسوب البنى الأول

مقترنة: شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة

تأريخ: ٢٠٠١٠٤٨٥٤٥٥ بتاريخ: ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣ رقم القيد: ١

نتائج الاختبارات

م	البيك / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
١	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٥٨٠	٨٣,٧٣	٤٠	٤٠٠
٢	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٥٩٠	٨٣,٣٩	٣١	٣١٠
٣	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٠٠	٨٢,٥٧	٢٨	٢٨٠
٤	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦١٠	٨٢,٤٧	٣٥	٣٥٠
٥	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٢٠	٨٣,٠٢	٣٣	٣٣٠
٦	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٣٠	٨٢,٣٥	٢٩	٢٩٠
٧	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٤٠	٨١,٦٢	٣٥	٣٥٠
٨	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٥٠	٨١,٥	٣٣	٣٣٠
٩	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٦٠	٨١,٧٦	٤١	٤١٠

• توريد العينة مسئولية المورد • دون أدنى مسئولية علي المعمل

• تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحفي ٢٩٦٠٩٠١٢٤١٠٢٧٥

المشرف علي المعمل

في المعمل

التوقيع:

التوقيع:



رسالة الكلية: تتقدم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقا للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في اسواق العمل محبا واكاديميا وعالميا، كما تتقدم بالشكر والتقدير في البحث العلمي بما يقدمه البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center
معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : نسي الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية ربحية عالية الجودة متفيزة بتقديم خدمات مجتمعية لتعمية البيئة وتنميتها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر

خاص بعملية : القطار السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (٨٠٠ + ١٧٥ : ٨٠٠ + ٣٢٤)
(القطاع بني مزار - منقوط) من المحطة ٢٢ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - على منسوب النش الأول

مقارنة : شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة

رقم القيد : ١	بتاريخ : ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣	توريد : ٢٠٠١٠٤٨٥٤٥٥
---------------	-------------------------	---------------------

نتائج الاختبارات

م	الابعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
١	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٧٠	٨١,٤٨	٢٨	٢٨٠
٢	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٨٠	٨٤,٦٥	٤٠	٤٠٠
٣	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٦٩٠	٨٤,٠١	٢٨	٢٨٠
٤	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٧٠٠	٨٣,٧٣	٢٩	٢٩٠
٥	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٧١٠	٨٣,٣٩	٣٣	٣٣٠
٦	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٧٢٠	٨٢,٥٧	٣٣	٣٣٠
٧	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٧٣٠	٨٢,٤٧	٤٤	٤٤٠
٨	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٧٤٠	٨٣,٠٢	٢٠	٢٠٠
٩	١٠ X ١٠ X ١٠	١٩٧+٧٥٠	٨٢,٣٥	٢٨	٢٨٠

• توريد العينة مسئولية المورد • دون أدنى مسئولية على المعمل

• تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٩٦٠٩٠١٢٤١٠٢٧٥

المشرف على المعمل

في المعمل

د. أ. / التوقيع :

د. أ. / التوقيع :



رسالة الكلية : نلتزم كلية الهندسة جامعه المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقا للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في اسواق العمل محليا واكاديميا وعالميا، كما نلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674



مركز الاستشارات الهندسية
Engineering Consultation Center

معمل الخرسانة
Concrete plant



رؤية الكلية : تسعى الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحيثية عالية الجودة متميزة بتقديم خدمات مجتمعية لتنمية البيئة وتنميتها

نتائج اختبارات عينات من مكعبات الحجر		
خاص بعملية : القطار السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثاني بطول ١٥٨ كم (١٧٥ + ٨٠٠ : ٣٣٤ + ٨٠٠) (القطاع بني مزار - منفوط) من المحطة ٢٢٠ + ١٩٧ إلى المحطة ٨٥٠ + ١٩٧ - علي منصوب البنش الأول		
مقولة : شركة شريف عيسى محمد حسانين للمقاولات العامة		
توريد : ٢٠٠١٠٤٨٥٤٥٥	بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢١	رقم القيد : ١

نتائج الاختبارات

م	الأبعاد / سم	المحطة	منسوب	حمل الكسر طن	أجهاد الكسر كجم/سم ^٢
١	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٧٦٠	٨١,٦٢	٣٨	٣٨٠
٢	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٧٧٠	٨١,٥	٣٣	٣٣٠
٣	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٧٨٠	٨١,٧٦	٣١	٣١٠
٤	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٧٩٠	٨١,٤٨	٣٤	٣٤٠
٥	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٨٠٠	٨٨,٥٤	٣٥	٣٥٠
٦	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٨١٠	٨٨,٣٣	٣٢	٣٢٠
٧	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٨٢٠	٨٨,٢٨	٤١	٤١٠
٨	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٨٣٠	٨٨,١٦	٣٥	٣٥٠
٩	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٨٤٠	٨٧,٧١	٣٥	٣٥٠
١٠	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٨٥٠	٨٧,١٥	٤٠	٤٠٠
١١	١٠ x ١٠ x ١٠	١٩٧+٨٦٠	٨٦,٢٦	٢٩	٢٩٠

* توريد العينة مسئولية المورد . دون أدنى مسئولية علي المعمل

* تم توريد العينات بمعرفة م / محمود الحيني ٢٧٥ ١٢٤١٠ ٩٠٩٦٦٠٩٠



المشرف على المعمل

د. /
التوقيع :

فني المعمل

د. /
التوقيع :

سالة الكلية : تلتزم كلية الهندسة جامعة المنيا بتقديم برامج تعليمية وفقاً للمعايير القومية لإعداد خريج متميز وقادر على المنافسة في اسواق العمل حلياً وإقليمياً وعالمياً، كما تلتزم بالتشجيع والتطوير في البحث العلمي بما يخدم البيئة والتطور التكنولوجي .

Tel: +2 (086) 2362083- 2348005 - 2364420

Fax: (086) 2346674
