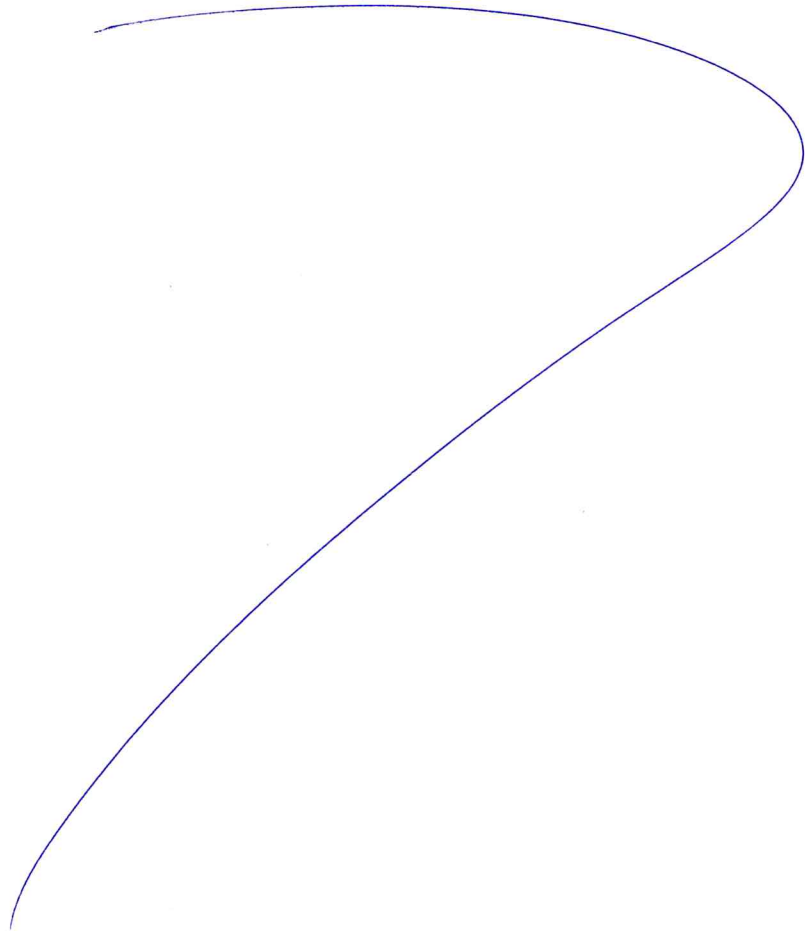


قائمة البنود لمحور (المريوطية الاوسطى)
تنفيذ اعمال تطوير القطاع الأول من محور المريوطية بطول 5 كم

منطوق البند						رقم البند	
بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعتراضات.						1	
		0.000	اجمالي ماسبق				
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	المحور		مسلسل
	إجمالي	طول					
	5,000.00	5000	1	م.ط	كامل القطاع		1
	5,000.00	3					
		5000.000 متر طولى فقط لا غير					



المهندس الإستشاري

مدير المشروع

مهندس المكتب الفني

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2019/10/19



3: بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بأمان ونقل المخلفات الي المقابل العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك .

الأبعاد				العدد	الوحدة	المجطة		
إجمالي	إرتفاع	عرض	طول			إلى	من	م
32.725	0.55	0.35	170	1	3م	2+550	2+380	1

32.725	إجمالي الصفحة
32.725	بالمتر المكعب إثنان وثلاثون و 725/100 فقط لا غير

مهندس الاستشاري

.....
.....

مدير المشروع

.....
.....

المكتب الفني

.....
.....
.....

قائمة البنود لمحور (المريوطية-الواسطي)
تنفيذ اعمال تطوير القطاع الأول من محور المريوطية بطول 5 كم

رقم البند	منطوق البند
4	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية او أرصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل حتى 30كم والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب . -- يتم احتساب 0.8 جنيهه للكيلومتر للزيادة أو النقص .
	</

المهندس الاستشاري

٣/٥/٢٠١٩
[Signature]

مدير المشروع

[Signature]

مهندس المكتب الفني

٢/٥/٢٠١٩
[Signature]
C. 02/019



6: بالمتر المكعب تكسير طبقة الاسفلت وطبقة الاساس بأي سمك ونقل المخلفات الي المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل
مما جميعة طبقاً للرسومات المعتمدة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

الأبعاد				العدد	الوحدة	المجطة		م
إجمالي	إرتفاع	عرض	طول					
2.4	0.3	2	2	2		بر غربي	بلاطة 10	15

59.412	إجمالي الصفحة							
59.412	بالمتر المكعب تسعة وخمسون و 41/100 فقط لا غير							

مهندس الاستشاري

.....
.....

مدير المشروع

.....
.....
.....

المكتب الفني

.....
.....
.....



10 : بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها في المقابل العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي بكامل حدود المشروع طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .

المجطة			الوحدة	العدد	الأبعاد		
م	من	إلى			مساحة	إرتفاع	إجمالي
1	0+025	0+050	2م	5	5		25
2	0+290	0+321	2م	1	31		31
3	2+500	2+600	2م	15	5		75
4	2+500	2+600	2م	25	5		125
5	3+550	3+650	2م	4	5		20
6	2+525	2+525	2م	2	5		10
7	0+000	0+000	2م	15	5		75
8	0+010	0+010	2م	1	5		5
9	1+025	1+085	2م	20	5		100
10	1+025	1+085	2م	1	720		720
11	0+600	0+650	2م	30	5		150

1336	إجمالي الصفحة
1336	بالمتر المسطح ألف وثلاثمائة وستة وثلاثون م2 فقط لا غير


مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني

12 : بالمتر الطولي جسات للكوبرى في جميع أنواع التربة حتى إجهاد 125 كجم/سم² عدا التربة الصخرية في البر بأعماق مختلفة عند كل محور من الكباري والانفاق علي أن يتم قياس الجسات من منسوب الارض الطبيعية في حالة البر وذلك طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

الأبعاد				الوحدة	العدد	البند	
إجمالي	إرتفاع	عرض	طول			المحطة	م
30	-	-	30	م.ط	1	كوبرى 1	1
30	-	-	30	م.ط	1		2
30	-	-	30	م.ط	1	كوبرى 2	3
30	-	-	30	م.ط	1		4
30	-	-	30	م.ط	1	كوبرى 3	5
30	-	-	30	م.ط	1		6
30	-	-	30	م.ط	1	كوبرى 4	7
30	-	-	30	م.ط	1		8
30	-	-	30	م.ط	1	كوبرى 5	9
30	-	-	30	م.ط	1		10
30	-	-	30	م.ط	1		11
30	-	-	30	م.ط	1		12
525	-	-	15	م.ط	35	كامل الطريق	13
390			30	م.ط	13	أماكن البلاطة علي خوازيق	14





1275	إجمالي الصفحة
1275	ألف ومائتان وخمسة وسبعون متراً طولياً لا غير

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني



14: بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية او معدات خفيفه في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة حتى إجهاد 125 كجم/سم² وفي أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالععمق المطلوب والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وإعادة الردم مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحفر ويتم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر الاستكشافي لتلاشي حدوث أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجود بالأسفل إن وجدت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

المجطة			الوحدة	العدد	الأبعاد			م
					طول	عرض	إرتفاع	
1	بلاطة 2	بر غربي	3م	2	5.3	1.5	1.6	25.44
2			3م	1	2	2	1.6	6.4
3	بلاطة 3	بر غربي	3م	2	2	2	1.7	13.6
4			3م	1	4.6	1.5	1.7	11.73
5	بلاطة 4	بر غربي	3م	3	2	2	1.9	22.8
6	بلاطة 5	بر غربي	3م	1	3.2	1.5	1.8	8.64
7			3م	1	2	2	1.8	7.2
8			3م	1	3	1.5	1.8	8.1
9	بلاطة 6	بر غربي	3م	1	2	2	1.7	6.8
10			3م	1	2	2	1.8 1.7	7.2
11			3م	1	2	2.5	1.8 1.7	9
12	بلاطة 7	بر غربي	3م	3	2	2	1.8	21.6
13	بلاطة 8	بر غربي	3م	3	2	2	1.8	21.6

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني

14: بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية او معدات خفيفه في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة حتى إجهاد 125 كجم/سم² وفي أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعمق المطلوب والبند يشمل المعدات اللازمة للحفر والأجهزة والأعمال المساحية اللازمة وإعادة الردم مرة أخرى بعد الانتهاء من أعمال الحفر ويتم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر الاستكشافي لتلاشي حدوث أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجود بالأسفل إن وجدت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

الأبعاد				العدد	الوحدة	المجطة		
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول					م
15.2	1.9	2	2	2	3م	بر غربي	بلاطة 9	14
8.55	1.9	1.5	3	1	3م			15
15.2	1.9	2	2	2	3م	بر غربي	بلاطة 10	16

209.06

إجمالي الصفحة

209.06

بالمتر المكعب مائتان وتسعة و 6/100 فقط لا غير

مهندس الاستشاري

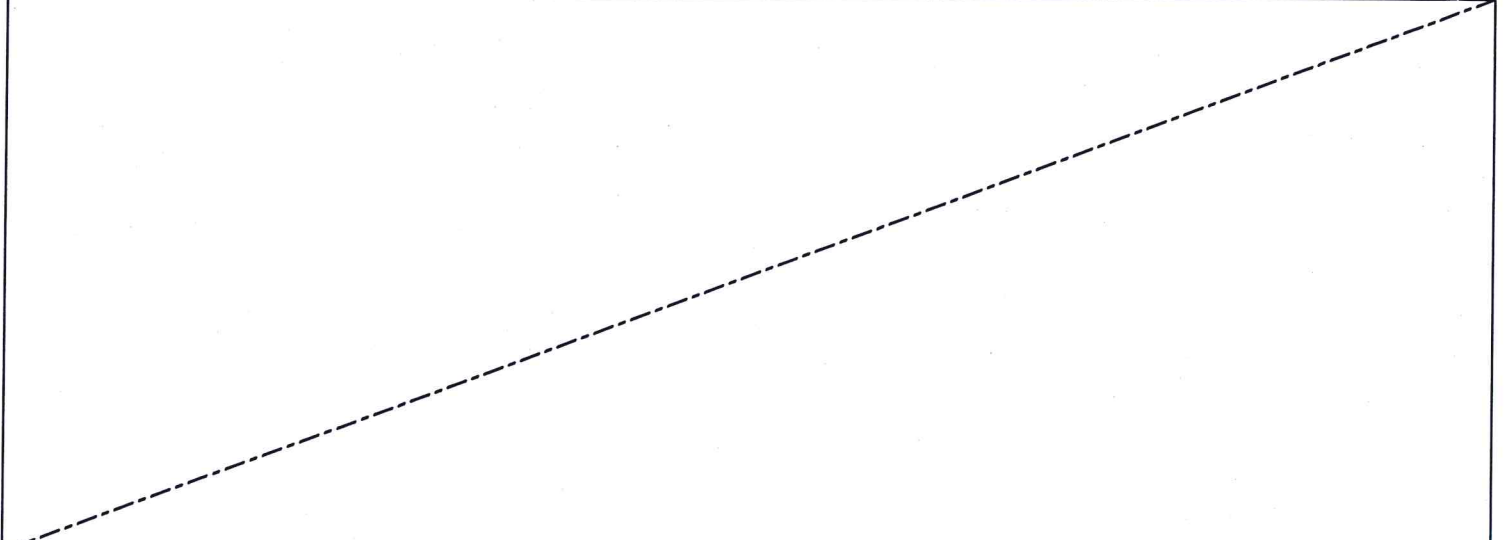
مدير المشروع

المكتب الفني

208.26

٢٠٢٢ / ١٨ / ٢٠


16 : بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات و طبقا لخطة الرفع والعمل بماكينة الخوازيق المعتمدة

م	البند	الوحدة	العدد	الأبعاد			إجمالي
				طول	عرض	ارتفاع	
1	البر الشرقي	عدد	1	-	-	-	1
2	البر الغربي	عدد	2	-	-	-	2
							
3	إجمالي الصفحة						3
3	بالعدد ثلاثة فقط لا غير						3


مهندس الاستشاري



مدير المشروع



المكتب الفني



17 : بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع و البند يشمل المعدات و الاوناش اللازمة للفك والتركيب

م	البند	الوحدة	العدد	الأبعاد			إجمالي
				طول	عرض	ارتفاع	
1	من كوبرى 3 لكوبرى 2 (بر غربي)	عدد	1	-	-	-	1
2	من كوبرى 2 لكوبرى 1 (بر غربي)	عدد	1	-	-	-	1
3	من كوبرى 1 غربي الي كوبرى 1 شرقي	عدد	1	-	-	-	1
4	من كوبرى 2 الي S.O.P (بر شرقي)	عدد	1	-	-	-	1
5	من S.O.P شرقي الي S.O.P غربي	عدد	1	-	-	-	1

5	إجمالي الصفحة
5	بالعدد خمسة فقط لا غير

مهندس الاستشاري

أ. م. / محمد دويش

مدير المشروع


أ. م. / محمد دويش

المكتب الفني

أ. م. / محمد دويش

18 : بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles)
أ- قطر 1.50 متر

م	البند	الوحدة	العدد	الأبعاد			إجمالي
				طول	عرض	إرتفاع	
1	كوبرى رقم 3 محور A1	م.ط	8	22.5	-	-	180
2	كوبرى رقم 3 محور A2	م.ط	7	22.5	-	-	157.5
3	كوبرى رقم 2 محور A1	م.ط	4	25.5	-	-	102
4	كوبرى رقم 2 محور A2	م.ط	4	25.5	-	-	102
5	كوبرى رقم 1 محور A1	م.ط	4	25.5	-	-	102
6	كوبرى رقم 1 محور A2	م.ط	4	25.5	-	-	102


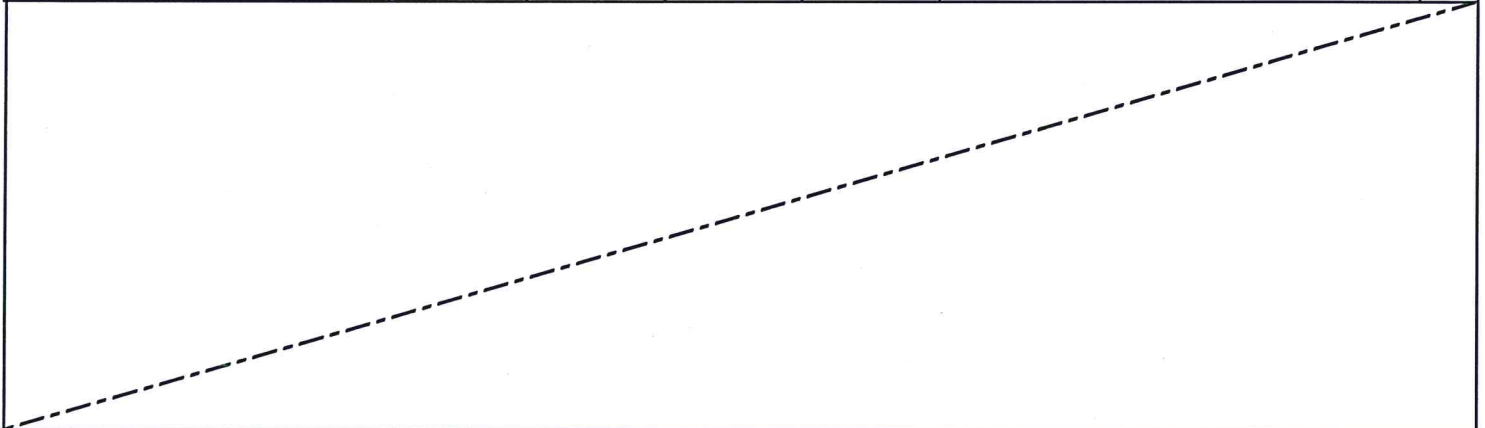


745.5	إجمالي الصفحة
745.5	سبعمائة وخمسة وأربعون و نصف متراً طولياً لا غير

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني

25 - بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية (الخوازيق والمخدرات والأعمدة والدعامات والأكتاف و الحوائط الساندة و الأنفاق و الهيكل العلوي)

البنء		الوحءة	الءءء	الوزن		م
الءوصف	إءمالى			الوزن	إءمالى	
كوبرى 3						
1	خوازىق محور A1	طن	8	12.943	103.54	
2	خوازىق محور A2	طن	7	12.943	90.60	
كوبرى 2						
3	خوازىق محور A1	طن	4	14.405	57.62	
4	خوازىق محور A2	طن	4	14.405	57.62	
كوبرى 1						
5	خوازىق محور A1	طن	4	13.286	53.14	
6	خوازىق محور A2	طن	4	13.286	53.14	
خوازىق 0.80 م						
7	خوازىق بطول 18م	طن	8	2.882	23.06	
8	خوازىق بطول 19م	طن	25	3.616	90.40	
9	خوازىق بطول 20م	طن	4	3.062	12.25	
10	خوازىق بطول 21م	طن	12	3.915	46.98	

588.357

إجمالي الصفحة

588.357


خمسمائة وثمانية وثمانون و 1000/357 طناً لا غير

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني







PILE 0.80m L=18m -100 t

العناصر	القطر (مم)	وزن المتر الطولي (كجم /م.ط)	العدد	طول السبيخ (م)	شكل السبيخ	الوزن الكلى (كجم)
1	32	6.32	20	12.00		1517.04
2	22	2.99	20	9.25		552.72
3	12	0.89	69	12.00		736.00
4	16	1.58	8	2.400		30.34
5	16	1.58	12	2.400		45.51
2881.60	إجمالى حديد التسليح بالكجم					
2.8816	إجمالى حديد التسليح بالطن					
8	عدد خوازيق S.O.P 0.80m L=18m					
23.0528	إجمالى حديد خوازيق S.O.P 0.80m L=18m					

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

م

المكتب الاستشاري
مكتب محرم باخوم الإستشاري

م / ٠٣ / ٢٠٢٠

الشركة المنفذة
جاما للبنية التحتية

م / ٠٣ / ٢٠٢٠

GAMA



PILE 0.80m L=19m -110 t

العناصر	القطر (مم)	وزن المتر الطولي (كجم /م.ط)	العدد	طول السبيخ (م)	شكل السبيخ	الوزن الكلي (كجم)
1	32	6.32	26	12.00		1972.15
2	22	2.99	26	10.25		796.21
3	12	0.89	72	12.00		768.00
4	16	1.58	9	2.400		34.13
5	16	1.58	12	2.400		45.51
3616.00	إجمالى حديد التسليح بالكجم					
3.6160	إجمالى حديد التسليح بالطن					
25	عدد خوازيق S.O.P 0.80m L=19m					
90.4001	إجمالى حديد خوازيق S.O.P 0.80m L=19m					

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المكتب الاستشاري
مكتب محرم باخوم الإستشاري

الشركة المنفذة
جاما للبنية التحتية

م

م / ٠٤ / ٢٠٢٠

م / ٠٤ / ٢٠٢٠

PILE 0.80m L=20m -125t

[illegible]

المالك

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المكتب الاستشاري
مكتب محرم باخوم الاستشاري



الشركة المنفذة
جاما للبنية التحتية

۱۴

20/05/2019

~~XXXXXXXXXX~~
C. C. / N. K.

PILE 0.80m L=21m -135 t

العناصر	القطر (مم)	وزن المتر الطولي (كجم /م.ط)	العدد	طول السيخ (م)	شكل السيخ	الوزن الكلي (كجم)
1	32	6.32	26	12.00		1972.15
2	22	2.99	26	12.00		932.15
3	22	2.99	26	1.50		116.52
4	16	1.58	10	2.400		37.93
5	16	1.58	12	2.400		45.51
6	12	0.89	76	12.00		810.67
إجمالي حديد التسليح بالكجم						
3914.92						
إجمالي حديد التسليح بالطن						
3.9149						
عدد خوازيق S.O.P 0.80m L=21m -135 t						
12						
إجمالي حديد خوازيق S.O.P 0.80m L=21m -135 t						
46.9790						

المالك
المهينة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المكتب الاستشاري
مكتب محرم باخوم الاستشاري

الشركة المنفذة
جاما للبنية التحتية

۱۴

2020.12.1

~~SECRET~~
C. 4 IN/4.



29 : بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles)
أ- قطر 0.80 متر

الأبعاد				العدد	الوحدة	البند	
إجمالي	إرتفاع	عرض	طول			التوصيف	م
						الاتجاه الشرقي	
72	-	-	18	4	م.ط	طرفي - S01	1
40	-	-	20	2	م.ط	وسطي - S01	2
76	-	-	19	4	م.ط	طرفي - S02	3
42	-	-	21	2	م.ط	وسطي - S02	4
38	-	-	19	2	م.ط	طرفي - S05	5
76	-	-	19	4	م.ط	طرفي - S06	6
42	-	-	21	2	م.ط	وسطي - S06	7
76	-	-	19	4	م.ط	طرفي - S07	8
42	-	-	21	2	م.ط	وسطي - S07	9
76	-	-	19	4	م.ط	طرفي - S08	10
42	-	-	21	2	م.ط	وسطي - S08	11
38	-	-	19	2	م.ط	طرفي - S09	12
19	-	-	19	1	م.ط	وسطي - S09	13
						الاتجاه الغربي	
72	-	-	18	4	م.ط	طرفي - S01	14

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني

29 : بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles)
أ- قطر 0.80 متر

الأبعاد				العدد	الوحدة	البند	
إجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف	م
40	-	-	20	2	م.ط	وسطى - S01	15
76	-	-	19	4	م.ط	طرفي - S02	16
42	-	-	21	2	م.ط	وسطى - S02	17
19	-	-	19	1	م.ط	طرفي - S03	18
21	-	-	21	1	م.ط	وسطى - S03	19

949

إجمالي الصفحة

949

تسعائة وتسعة وأربعون متراً طولياً لا غير

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني

م. محمد عبد الحليم
11/11/2017

11/11/2017
11/11/2017

11/11/2017
11/11/2017

31 : بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير أترية في القاع المائي للوصول للمناسيب التصميمية والسعر يشمل إزالة الحشائش والمواد العضوية وشامل نقل المخلفات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

الأبعاد				العدد	الوحدة	البند		
الإجمالي	ملاحظات	طول	مساحة			إلى المحطة	من المحطة	م
	بر شرقي							
374.3	قاع	10	37.43	1	3م	0+210	0+200	1
380.75	قاع	10	38.075	1	3م	0+220	0+210	2
384.2	قاع	10	38.42	1	3م	0+230	0+220	3
360.95	قاع	10	36.095	1	3م	0+240	0+230	4
330.4	قاع	10	33.04	1	3م	0+250	0+240	5
332.7	قاع	10	33.27	1	3م	0+260	0+250	6
340	قاع	10	34	1	3م	0+270	0+260	7
298	قاع	10	29.8	1	3م	0+340	0+330	8
316.45	قاع	10	31.645	1	3م	0+350	0+340	9
321.3	قاع	10	32.13	1	3م	0+360	0+350	10
319.45	قاع	10	31.945	1	3م	0+370	0+360	11
320.45	قاع	10	32.045	1	3م	0+380	0+370	12
323	قاع	10	32.3	1	3م	0+390	0+380	13
327.6	قاع	10	32.76	1	3م	0+400	0+390	14
256.8	قاع	10	25.68	1	3م	0+810	0+800	15
257.15	قاع	10	25.715	1	3م	0+820	0+810	16
257.45	قاع	10	25.745	1	3م	0+830	0+820	17
272	قاع	10	27.2	1	3م	0+840	0+830	18
296.35	قاع	10	29.635	1	3م	0+850	0+840	19
282.6	قاع	10	28.26	1	3م	0+860	0+850	20
280.6	قاع	10	28.06	1	3م	0+870	0+860	21
297.1	قاع	10	29.71	1	3م	0+880	0+870	22

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني

٢٠١٨/٨/٢٠

٢٠١٨/٨/٢٠

٢٠١٨/٨/٢٠



31 : بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير أترية في القاع المائي للوصول للمناسيب التصميمية والسعر يشمل إزالة الحشائش والمواد العضوية وشامل نقل المخلفات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

الأبعاد				العدد	الوحدة	البند		
الإجمالي	ملاحظات	طول	مساحة			إلى المحطة	من المحطة	م
304.6	قاع	10	30.46	1	3م	0+890	0+880	23
309.7	قاع	10	30.97	1	3م	0+900	0+890	24
302.15	قاع	10	30.215	1	3م	0+910	0+900	25
303.6	قاع	10	30.36	1	3م	1+610	1+600	26
348.2	قاع	10	34.82	1	3م	1+620	1+610	27
191.2	قاع	10	19.12	1	3م	1+630	1+620	28
149.125	قاع	10	14.9125	1	3م	1+660	1+650	29
149.125	قاع	10	14.9125	1	3م	1+670	1+660	30
149.125	قاع	10	14.9125	1	3م	1+680	1+670	31
149.125	قاع	10	14.9125	1	3م	1+690	1+680	32
107.05	قاع	10	10.705	1	3م	1+700	1+690	33
107.05	قاع	10	10.705	1	3م	1+710	1+700	34
107.05	قاع	10	10.705	1	3م	1+720	1+710	35
107.05	قاع	10	10.705	1	3م	1+730	1+720	36
بر غربي								
352.9	قاع	10	35.29	1	3م	0+210	0+200	37
368.25	قاع	10	36.825	1	3م	0+220	0+210	38
394.7	قاع	10	39.47	1	3م	0+230	0+220	39
386.1	قاع	10	38.61	1	3م	0+240	0+230	40
304.3	قاع	10	30.43	1	3م	0+250	0+240	41
261.25	قاع	10	26.125	1	3م	0+260	0+250	42
282.5	قاع	10	28.25	1	3م	0+270	0+260	43
278.55	قاع	10	27.855	1	3م	0+360	0+350	44

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني

31 : بالمتر المكعب حفر وتكريك وتطهير أتربة في القاع المائي للوصول للمناسيب التصميمية والسعر يشمل إزالة الحشائش والمواد العضوية وشامل نقل المخلفات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.




الأبعاد				العدد	الوحدة	البند		
الإجمالي	ملاحظات	طول	مساحة			إلى المحطة	من المحطة	م
281	قاع	10	28.1	1	3م	0+370	0+360	45
288.65	قاع	10	28.865	1	3م	0+380	0+370	46
292.7	قاع	10	29.27	1	3م	0+390	0+380	47
292.8	قاع	10	29.28	1	3م	0+400	0+390	48
309.45	قاع	10	30.945	1	3م	0+410	0+400	49
345.45	قاع	10	34.545	1	3م	0+420	0+410	50
330.4	قاع	10	33.04	1	3م	0+430	0+420	51
291.7	قاع	10	29.17	1	3م	0+440	0+430	52
354.3	قاع	10	35.43	1	3م	0+810	0+800	53
334.8	قاع	10	33.48	1	3م	0+820	0+810	54
304.95	قاع	10	30.495	1	3م	0+830	0+820	55
298.3	قاع	10	29.83	1	3م	0+840	0+830	56
288.35	قاع	10	28.835	1	3م	0+850	0+840	57
279.3	قاع	10	27.93	1	3م	0+860	0+850	58
277.25	قاع	10	27.725	1	3م	0+870	0+860	59
277.25	قاع	10	27.725	1	3م	1+690	1+680	60
277.25	قاع	10	27.725	1	3م	1+700	1+690	61
277.25	قاع	10	27.725	1	3م	1+710	1+700	62
277.25	قاع	10	27.725	1	3م	1+720	1+710	63

18020.70	إجمالي الصفحة
18020.70	ثمانية عشر ألفاً وعشرون و 70/100 فقط لاغير

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

المكتب الفني

34 - بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب أسفل المخدة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش او ما يماثلها)

الأبعاد				العدد	الوحدة	البند	
إجمالي	الكثافة (طن/م3)	الطول (م)	المساحة (م2)			التوصيف	م
كوبرى 3							
15.98	7.85	6.5	0.039156811	8	طن	خوازيق محور A1	1
13.99	7.85	6.5	0.039156811	7	طن	خوازيق محور A2	2
كوبرى 2							
7.75	7.85	6.3	0.039156811	4	طن	خوازيق محور A1	3
7.75	7.85	6.3	0.039156811	4	طن	خوازيق محور A2	4
كوبرى 1							
8.61	7.85	7	0.039156811	4	طن	خوازيق محور A1	5
8.61	7.85	7	0.039156811	4	طن	خوازيق محور A2	6


62.675

إجمالي الصفحة


62.675

إثنان وستون و 1000/675 طناً لا غير


مهندس الاستشاري



مدير المشروع




المكتب الفني



35 : بالمتر المكعب توريد ورى أحجار جيرية (دبش) فى مجرى الترعة مع تسوية القاع للوصول إلى المناسيب التصميمية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية والبند يشمل توريد الحجر من محاجر مختلفة

ملاحظات	الأبعاد				العدد	الوحدة	البند		
	الإجمالى	إرتفاع	عرض	طول			إلى المحطة	من المحطة	م
قاع البر الشرقى	507	1	7.8	65	1	3م	0+270	0+205	1
قاع البر الشرقى	624	1	7.8	80	1	3م	0+880	0+800	2
قاع البر الشرقى	234	1	7.8	30	1	3م	1+630	1+600	3
قاع البر الشرقى	468	1	7.8	60	1	3م	1+710	1+650	4
قاع البر الشرقى	78	1	7.8	10	1	3م	0+890	0+880	5
قاع البر الغربى	546	1	7.8	70	1	3م	0+270	0+200	6
قاع البر الغربى	312	1	7.8	40	1	3م	0+390	0+350	7
قاع البر الغربى	546	1	7.8	70	1	3م	0+870	0+800	8
قاع البر الغربى	234	1	7.8	30	1	3م	0+420	0+390	9

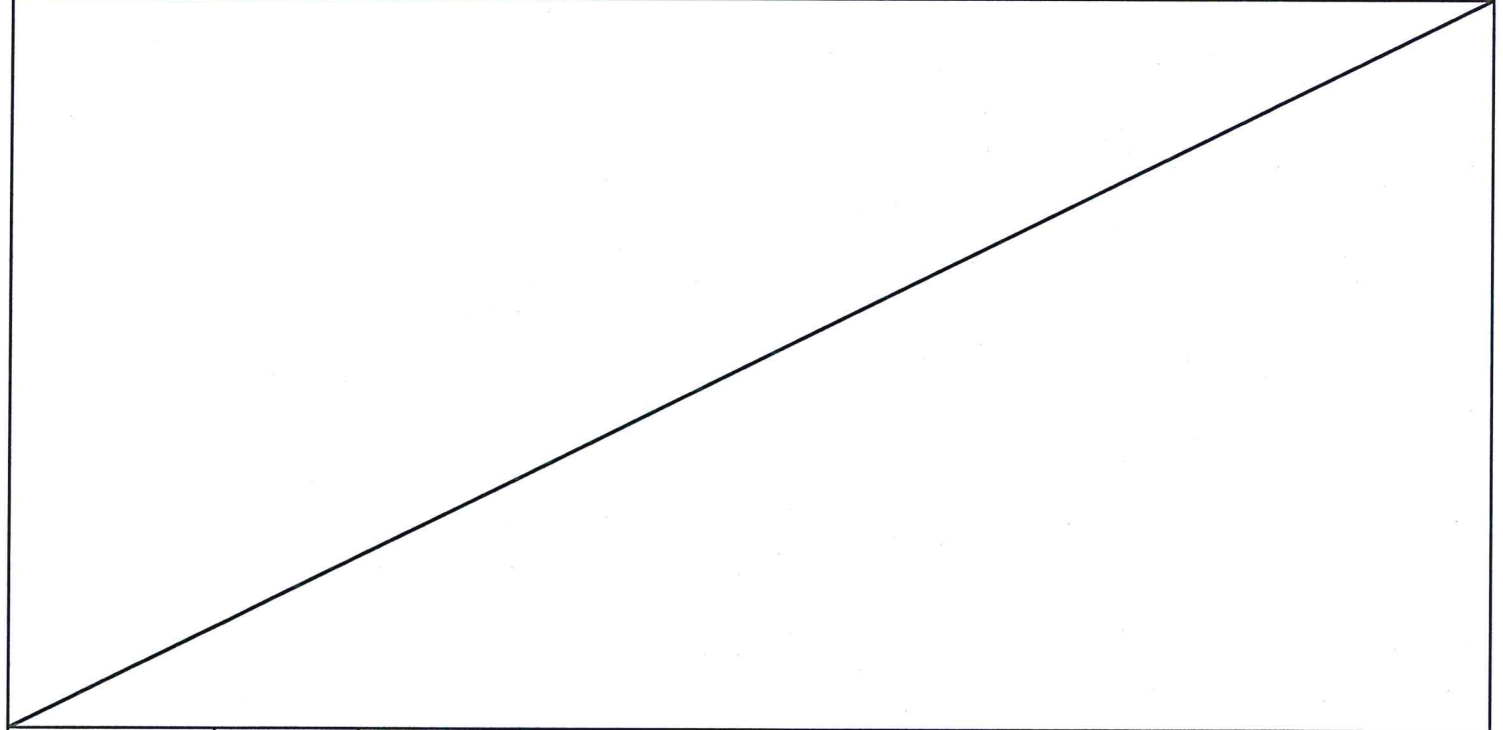

3549.00	إجمالي الصفحة
3549.00	ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة وعشرون م3 فقط لاغير


مهندس الاستشاري



مدير المشروع

.....

المكتب الفني



C. 02 / 18 / 20

إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري الأوسطي ومحاوره)
شركة جاما للبنية التحتية
الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم ٢
عن عملية " مقايسة مشروع تنفيذ اعمال تطوير القطاع الأول من محور
المريوطية بطول ٥ كم "

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى
بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شيك على الخارج
يسحب باسم شركة جاما للبنية التحتية
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
	٢٠٢٣/٠٩/١٢	٧,٩٥٣,٤٢٢,٠٠	
	الجملة	٧,٩٥٣,٤٢٢,٠٠	

رقم
الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠

فقط سبعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وإثنان وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير

تفيد في السجل برقم (ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	مستخلص رقم (٢) جاري عن عملية " مقايسة مشروع تنفيذ أعمال تطوير القطاع الأول من محور المريوطية بطول ٥ كم "	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	إجمالي الأصل					قرش
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش	
	دمغة توقيع					
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة
						

الختم ذو التاريخ
رؤج
رئيس المصلحة
.....

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....
علامة
في سنة ٢٠
(١) إقرار كاتب سجل الحجزات و التنازلات:
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
جاري بتاريخ
الإمضاء
الإمضاء
الإمضاء بتاريخ

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات في سنة ٢٠ بمبلغ
.....

(د) (١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع.ح ") توقيع الكاتب المنوط
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

الختم ذو التاريخ سحب
شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
الشكايات
الحوالات
شيك
إذن صرف
إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠
رقم تحت رقم
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
إمضاء الكاتب المنوط :
إمضاء الكاتب المنوط :

الاستقطاعات

ضمان اعمال ٥%

٣٩٧,٦٧١,١٠ ح م

فقط ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألفاً وستمائة وواحد وسبعون جنيهاً مصرياً وعشرة قروش لا غير

أرباح تجارية ٥,٠%

٣٩,٧٦٧,١١ ح م

فقط تسعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون جنيهاً مصرياً وأحد عشر قرشاً لا غير

الدمغة

١٩١,٤٩٨,١٣ ح م

فقط مائة وواحد وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً وثلاثة عشر قرشاً لا غير



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،

بالإشارة إلى مشروع تنفيذ اعمال تطوير القطاع الأول من محور المريوطية بطول ٥ كم . تنفيذ شركة جاما للبنية التحتية .

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٢) جارى بقيمة (٧,٩٥٣,٤٢٢,٠٠) عن العملية بعالية عن المدة من بدء العمل من ٢٠٢٣/٠٥/٠٩ حتي ٢٠٢٣/٠٩/١٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في ٢٠٢٣/٠٩/١٠

المرفقات : عدد (٤) مستخلص

عدد : (١) إستمارة ٥٠ ع ح

عدد : (١) دفتر حصر

عدد : (١) إيصالات توريد دبش

عدد : (١) إيصالات المقالب العمومية

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره
مهندس /
ضياء الدين مصطفى يوسف
