



محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين مطروح)
(قطاع العلمين فوكة) في المسافة من كم ٦٠٠ + ٢٥٥ إلى الكم ٦٠٠ + ٢٧٤ بطول ٢ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/١٨ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٣- السيد المهندس / شريف الهوارى مدير مشروع - شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات
٣-
٢-
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية

مهندس //

هاني محمد

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات - من المحطة 425+600 الى المحطة 427+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة |
| 4- السيد المهندس / شريف الهواري | مندوب شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات |

وتبين ان المحجر علي مسافة 154 كم من منتصف قطاع شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

احد اثني المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احد اثني منتصف القطاع $N 30^{\circ} 58' 15.05''$ $E 28^{\circ} 42' 22.61''$



وعلي ذلك تم توقيع،،

4-

3-

2-

1-

مركز استشارات الهندسية
SGAC للمقاولات العامة
للطرق والإنشاءات
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والمطارات والمطارات
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشني



الهيئة العامة
للمطارات والكباري
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي، فائق السرعة لقطاع (العلمين - لوكا)
المقايمة المستحدثة لنموذج الاعمال تنفيذ شركة داربو للمقاولات العامة والانشاءات للتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
١	أصل الحفر				
١.١	باعتبار المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. وفي حقل زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جلبة لكلومتر زيادة	م ^٣	٨٥٠٠٠	١٧	١,٤٤٥,٠٠٠
٢	أصل الإنارة والتطهير				
٢.٢	باعتبار المسطح أصل تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الملتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب الصومية تمهيدا لأصل الربع المسطح لكل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.	م ^٢	٦٠٠٠٠	٥	٣٠٠,٠٠٠
٣	أصل الردم				
١.٣	باعتبار المكعب أصل توريد وتنشيل التربة صلبة للردم و مطابقة للمواصفات والتنشيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء بجميع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو النقصان - السعر يشمل صل تشوينت وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم	م ^٣	٢٦٥٠٠٠	٨٥	٢٢,٥٢٥,٠٠٠
		م ^٣	٢٦٥٠٠٠	٢١٢,٨٠	٥٦,٣٩٢,٠٠٠
		م ^٣	٢٦٥٠٠٠	١٣	٣,٤٤٥,٠٠٠

مدير مشروعات (الهيئة)


م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ إبراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم



مدير المشروع المقاول





مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيهوشي



الهيئة العامة
للمنطق والكباري
(GARB)



مشروع القطر الكهربائي، فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايمة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات للاتجاهين
القطاع من المحطة ١٢٥+٦٠٠ الى ١٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي
١-٤	طبقات الاساس بالمتر المكعب اصصال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة العار من مخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٢٥ % والا يزيد نسبة الفلد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠٠ ميجاباسكال باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ٩٥ %) من الكثافة المصلية واللغة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حساسة التقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلا زيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٣م	١٦٠٧٤	٢٧٨	٤,١٦٨,٥٧٢
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١٦٠٧٤	١٨٠	٢,٨٩٣,٣٢٠
	علاوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	١٦٠٧٤	٢٥	٤٠١,٨٥٠
٢-٤	بالمتر المكعب اصصال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة لتحت تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة العار من مخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كلفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلد بجهز لوس تجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمية الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المصلية واللغة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف حساسة التقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بلا زيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٣م	١١٧١٠	٢٩٨	٣,٤٨٩,٥٨٠
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٣م	١١٧١٠	١٨٠	٢,١٠٧,٨٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	١١٧١٠	٢٥	٢٩٢,٧٥٠

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)


م/ ابراهيم الخوازي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ شريف الهواري





مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجيوشي



الهيئة العامة
للمطارات والكباري
(GARB)



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة المستحدثة لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريم للمقاولات العامة والانشاءات للاتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	المبلغ	الإجمالي
٥	البلاطات الخرسانية				
١٠٥	بلاطة المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لأرتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والمبول الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (إبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطرية الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المنسوب التصميمية على أن تحلق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتشطيب المسطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف . يتم إضافة علاوة قدره ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسى)	٢م	٩٥٢٩,٦٧٢	٣٥٥	٣,٣٨٦,٥٨٤
٢٠٥	بلاطة المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لفخمس الحمايات والمبول الجانبيه تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت متدرج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (إبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والتشديد وكل ما يلزم لنهوض العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المصنفة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف	٣م	١٢٠٠	٢٢٠٠	٢,٦٤٠,٠٠٠
	الإجمالي				١٠٣,٧٨٧,٤٥٦

(مائة وثلاثة مليون وسبع مائة وسبع وثمانون الف واربع مائة وستة وخمسون جنيه فقط لا غير)

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني شياض

مدير مشروع (الهيئة)


م / ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / شريف الكهراوي



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

جدول نسب التعويضات طبقاً للقانون رقم: (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
طبقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢

[illegible]

التاريخ الذي يعول عليه حساب التوقعات هو تاريخ فتح المطاروف الغربية بالنسبة للعائدات والممارسات بالزراعة والتاريخ النعدي المنبئية على إمر الإسناد المباشر

[illegible]

0999875

فرع الاصدار : المركز الرئيسي

اصدار 1281/2022

شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات
الاسماعيلية - مرك القل الكبير بملك لطفي محمد فرج عبد اللطيف .
اليهته العامه للطرق والكبارىاسم المشترك :
الحصان :
المستفيد :
التغطية التأمينية :

تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالاتى (عدد 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1سائق معدة + عدد 1عامل) عاملين لدى المشترك ، " يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك " ، بإجمالى مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس ، 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس ، 15,000 جم (خمسة عشر الف جنيه مصري لا غير) لسائق المعده ، 10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري لا غير) للعامل ، وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلى والجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب مزاولة اعمالهم داخل موقع العمل فقط (من تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (37 / 2022 / 2023) استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 425+600 الي الكم 427+600 بطول 2 كم (الاتجاهين) ، والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 1682-2022

حساب الاشتراك

410.00	الإشتراك الصافي :
2.05	نصف الحصة النسبية :
11.60	الضريبة النوعية :
72.66	مصاريف الاصدار
2.46	رسم الاشراف و الرقابة / ستة في الألف :
0.82	اشتراك صندوق حملة الوثائق/ أثنان في الألف :
0.41	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف :
500.00	اجمالى الاشتراك فقط خمسمائة جنيه مصري

مدة التأمين

من : 18/07/2022
الى : 17/07/2023

حدود التغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلى المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلى المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري 130,000.00 جم
فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري 130,000.00 جم

الحد الأقصى الذي تلتمزم به الشركة عن الحادث الواحد (بمبلغ عدد الأشخاص) :-

الحد الأقصى الذي تلتمزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

تحريراً في : 18/07/2022

تاريخ الطباعة : 18/07/2022

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



1 من 4



0999876

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1281/2022

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة.
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطي تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين

الاستثناءات


- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

18/07/2022 تحريراً في :

18/07/2022 تاريخ الطباعة :

إيه عماد الدين عبدالمجيد إعداد :

23697 كود المنتج : مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mosadok st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sodq Street - East Section - Alsafa Tower above Abu Dhebi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifa'i Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

2 من 4

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - النقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع وسط البلد : ٤٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

0999877

اصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1281/2022

* شرط إستثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الايراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشى عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو اعمال التطهير و/أو اعمال التحقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشى هذه الأمراض المعدية .

* شرط أستثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في : 18/07/2022

تاريخ الطباعة : 18/07/2022

إعداد: ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج: 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mofadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumlat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القنطرة - مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٨٨ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود مدني - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية للمالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بعوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاع أعلى برن تك كورنيش النيل - دمياط

0999878

مطالبة مداد

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 1281/2022

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات

العنوان : الاسماعيليه سمرك النل الكبير بملك لطفي محمد فرج عبد اللطيف .

لصالح : البيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 18/07/2022

إلى : 17/07/2023

العملة : جنيه مصري

جـم	410.00	:	الإشتراك الصافي
جـم	2.05	:	نصف الدمغة النسبية
جـم	11.60	:	الضريبة النوعية
جـم	72.66	:	مصاريف الاصدار
جـم	2.46	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
جـم	0.82	:	أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنتان في الألف
جـم	0.41	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
جـم	500.00	:	إجمالي الأشتراك
			فقط خمسمائة جنيه مصري

تحريرا في : 18/07/2022

تاريخ الطباعة : 18/07/2022

إعداد : ايه عماد الدين عبدالمجيد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات 41.00 10 %



4 من 4

Hotline: 19685 Fax: 37623271
www.facebook.com/wethaq

0999867

وثيقة جميع اخطار المقاولين

الجدول

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام ممداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

رقم الوثيقة	1682/2022	اصدار
اسم المشترك/ اوالمشاركين	شركة دارويو للمقاولات العامة والانشاءات	
العنوان	الاسماعيلية - مركز التل الكبير - منشية السلام	
اسم المستفيد	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقاول	ثامينا على عقد رقم (2023 / 2022 / 37) استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 425+600 الى الكم 427+600 بطول 2 كم (الاتجاهين)	
موقع العمل	مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)	
مدة التأمين		
أ) بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2022/07/18 وينتهي في : 2023/07/17	
ب) بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ التأمين في : وينتهي في :	
مبلغ التأمين	103,787,456.00	فقط مائة وثلاثة ملايين وسبعمئة وسبعة وثمانون ألفا وأربعمائة وستة وخمسون جنيه مصري
القسم الاول	الاضرار المادية	
القسم الثاني	المسئولية المدنية قبل الغير	

تحرير في 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

1 من 8



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsi st., Li Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masara and Mahmoud Sedky, Port Said
Ismailia Branch : Shablin Street Andalus Tower - Front of El Galsi Bank - Port Said
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Port - Port Said
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Street - Damietta

الخط الساخن
19685

www.welhaq-egypt.com E-mail:welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المتاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ١٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٨٨ شارع عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣/٢ شارع المأمون وسعيد صدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام الدورية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة " بناء على بينك كورنيش النيل - دمياط

0999868

تابع جدول وثيقة جميع اخطار المقاولين 1682/2022 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث يحد أدنى 100,000 جم	103,787,456.00 جم	1-1 قيمة العقد -
-	-	1-2 الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومعدات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وانحيار التربة - غير مغطى

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الخير

التحملات	حدود التعويض (2)	البنود المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث يحد أدنى 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

تحريرا في 18/07/2022
تاريخ الطباعة 18/07/2022
اسم المستخدم هاني عاطف



2 من 8

www.welhaq-egypt.com E-mail:welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Moasadik st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nohar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Hona Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al Maamour and Mahmoud Suley Road - East Section - Alsala Tower st. - El Abo Elhadi Bank - Port Said
Ismailia Branch : Shebin Sayel Andania Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Buildings, road to Sh. W. Governorate
Camietta Branch : Cornish El Nile Town Section, El Rifa' Road, above D. H. and W. B. Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٤٩ شارع نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع مؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٨٨ شارع مؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع بورسعيد : ٨٨ شارع مؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع الإسماعيلية : شارع ش. و. - الإسماعيلية
فرع الزقازيق : شارع ش. و. - الزقازيق
فرع دمياط : شارع ش. و. - دمياط

0999869

إصدار

تابع جدول وثيقة جميع اخطار المقاولين 1682/2022

حساب الاشتراك

10,790.00	الاشتراك الصافي
539.50	نصف الدفعة النسبية
23.20	الضريبة النوعية
50.19	مصاريف إصدار
64.74	رسم الإشراف والرقابة / سنة في الألف
21.58	اشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف
10.79	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
11,500.00	إجمالي الاشتراك
	جملة الاشتراك (فقط أحد عشر ألفا وخمسمائة جنيه مصري)

يحتبر متمم لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
وتعتبر الملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.



18/07/2022 تحرير في

18/07/2022 تاريخ الطباعة

اسم المستخدم هاني عاطف

3 من 8

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sadq Street - East Section - Abaza Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Damietta Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Darnia Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Darnia, El Riha Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٤٩ ش نوبار - ماديدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : مارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أمام البنك المصري الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : ش ٢ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال - شين الجمعية الزراعية بهوار ميتن محافظة الشرقية
فرع دمياط : ش ٢ شارع الأرقام أعلى بى تى كورتيز النيل - دمياط

0999870

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 1682/2022

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما فى ذلك الدعابات وخلافة - فى حالة استخدامها فى اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق فى الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفورى وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافى من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفورى
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع فى الاماكن المخلفة او التى يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم و المتفق عليه لا تسرى تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكره على العدد و التشوينات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح على الخفراء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك فى التعويض
من المعلوم و المتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطى خطرى الحريق و السطو
شرط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه فى حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
يستثنى تعويض الاجور الاضافية واجور العمال اثناء الليل واثاء العطلات الرسمية او اية اجور اخري
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعى
استثناء الممتلكات القائم والمحيطة بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أوغمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)



تحرير ا في 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم هاني عاطف

4 من 8

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Co. /emporat
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Fijal Building, above E-Tech and Wafa Bank

www.welhaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصنف - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع وسط البلد : ١٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : عمارة ١/٢ شارع التأمين ومحمود مدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبل - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيلش النيل - دمياط

0999870

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 1682/2022

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما فى ذلك الدعامات وخلافة - فى حالة استخدامها فى اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق فى الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفورى وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافى من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفورى
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع فى الاماكن المخلقة او التى يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكره على العدد والتشوينات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاتعاء المصلح على الخفاء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقط حق المشترك فى التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطى خطرى الحريق و السطو
شرط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولا منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه فى حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئه العامه للطرق والكبارى .
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئه العامه للطرق والكبارى .
يستثنى تعويض الاجور الاضافية واجور العمال اثناء الليل واثناء العطلات الرسمية او اية اجور اخري
استثناء العنف السياسى والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاطار الطبيعى
استثناء الممتلكات القانمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناءالخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالميه (مرفق)



تحريرا في 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم هاني عاطف

4 من 8

0999871

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 1682/2022

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد (مرفق)



18/07/2022 تحرير في

18/07/2022 تاريخ الطباعة

هاني عاطف اسم المستخدم

5 من 8

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horfa Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gash st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section - Abdo Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٨٨ شارع فؤاد - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ٢ / ٢ شارع الأمان ومحمود مدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم ٢ الدور الثانى عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

0999872

إصدار

مرفقات وثيقة جميع اخطار المقاولين 1682/2022

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئه العامه للرقابه الماليه لوثيقت جميع اخطار المقاولين والملاحق التاليه المرفقة جزء لا يتجزء من هذه الوثيقة .
* شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن: (أ) فيروس كورونا (COVID-19) (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
* شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحظتها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .
* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .
* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .
* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذ من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤوليه تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد

تحريرا في 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم هاني عاطف

6 من 8

www.welhaq-egypt.com E-mail:welhaq@welhaq-egypt.com www.facebook.com/welhaq

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nohar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section - Asafa Tower above El Ezz Bank - Port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorates
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank.

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٤٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع طراد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عرض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/أ شارع الأمان ومعمود مصفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طرس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شنين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنش النيل - دمياط

0999873

اصدار

مرفقات وثيقة جميع اخطار المقاولين 1682/2022

أنشئت على أقسام لا تتعدى فى مجموعها الأطوال المحدده ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أى حادث محددًا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها فى نفس الوقت.

- * ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد
انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك .
فان الشركة سوف تقوم بتعويض الممتلكات عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط بائشراط مايلي :-
(1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الاوقات مع تنكم العمل .
(2) ان يكون هناك خط مواشير مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل منود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى الصل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
(3) ان يتم فحص الصنانيق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفايات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
(4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الانشاء .
(5) ان يتم الغلق المؤقت لتفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التجييزات .
(6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المسلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجييزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل .
(7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اصال ينشأ عنها لىب) من اى نوع مثل :-
- عمليات الجلبخ ، التقطيع ، اللحام .
- استخدام لمبات اللحام الغازية او الكيرباتية .
- استعمال البيتومين الساخن .
- او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة .
(8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاصل التى ينشأ عنها لىب بعد انقضاءها بنساعة .
(9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
(10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحواظ مقاومة للحريق .
(11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لىب .
(12) تعيين منسق امان بالموقع .
(13) تركيب نظام يعتمد عليه للانداز من الحريق مع تجييز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
(14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
(15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
(16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
(17) ان يحاط بالموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
قيمة كل وحدة تخزين : 125,000 جم .

تحرير فى 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم هانى عاطف

7 من 8



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Down Town Branch : 49 Nobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiha st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alcula Tower above Abu Elkhair Park - Port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharika Government
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wadi Park

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ٤٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع ذواد - طريق الحرية - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عيسى الله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٢ شارع المأمون ومحمود مدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبان برج الأندلس - أمام الدورية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن توك كورنيش النيل - دمياط

0999874

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين

ملحق رقم :

وثيقة رقم 1682/2022

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه و الانشاءات

العنوان : الاسماعيليه - مركز التل الكبير - منشية السلام

لصالح : الهيئه العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 18/07/2022

الى : 17/07/2023

العملة : جنيه مصري

مبلغ التأمين : 103,787,456.00

فقط مائة وثلاثة ملايين و سبعمائة و سبعة و ثمانون ألفا و أربعمائة و ستة و خمسون جنيه مص

10,790.00	:	الاشتراك
539.50	:	نصف الدفعة النسبية
50.19	:	مصاريف الاصدار
23.20	:	الضريبة النوعية
64.74	:	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
21.58	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف
10.79	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
11,500.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط أحد عشر ألفا و خمسمائة جنيه مصري)

5 % 539.50

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات


8 من 8

تحرير في 18/07/2022

تاريخ الطباعة 18/07/2022

اسم المستخدم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Mosadik st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Naser City Branch : 6 Abbas El Agad st., Naser City - Cairo
Down Town Branch : 49 Hobar st., Abdeen - Down Town - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahnoud Sedqj Street - East Section- Absta Tower show Abu Dhanl Road, port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia University
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above 5-Tech

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع وسط البلد : ١٩ ش نوبار - عابدين - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود مدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طرس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورتش النيل - دمياط

بالوثيقة رقم / ١٣٨٤ / ٤.٤٤

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين إدارة بتاريخ ١٨ / ٧ / ٤٤٤٤

٤- (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعالجة الأخطار المؤهلة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم وللإلمة لتقييم الخطر. (ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريه يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥- وفي حالة وقوع حادث قد يلشأ عليه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أن يلوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً لتليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسببها.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشارك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦- يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو يتطلب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

٧- شرط سقوط الحق:

٨- شرط كافة حقوق المشارك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:-

(أ) إذا أدلى المشارك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في القرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفي عن الشركة بيانات جوهريه كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشارك أو من ينوب عنه للقوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا تطوت على جنائية أو جنحة عمدية.

حيث أن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المناهة عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للعقد وجزءاً متمماً للوثيقة. فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة:

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تآمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون لنيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تآمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وبنتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول. أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المشتركة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئولياتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة. وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجداول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتلفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثالثاً : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الجزئي	٢- الأطراف السفلي	
		الأيمن	اليسار
60%	50%	الفقد الكامل للذراع أو اليد	الفقد الكامل لطرف
25%	20%	الفقد الكامل لحركة الكف	الفقد الكامل لطرف
20%	15%	الفقد الكامل لحركة المرفق	الفقد الكامل لطرف
20%	15%	الفقد الكامل لحركة المعصم	الفقد الكامل لحركة
30%	25%	الفقد الكامل للإبهام و السبابة	الفقد الكامل لحركة
25%	20%	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة	الفقد الكامل لحركة
20%	15%	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الإبهام	الفقد الكامل لحركة
25%	20%	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة	الفقد الكامل لحركة
20%	15%	الفقد الكامل للإبهام فقط	الفقد الكامل لحركة
15%	10%	الفقد الكامل للسبابة فقط	الفقد الكامل لحركة
10%	8%	الفقد الكامل للوسطى فقط	الفقد الكامل لحركة
8%	7%	الفقد الكامل للبلعصر فقط	الفقد الكامل لحركة
7%	6%	الفقد الكامل للخنصر فقط	الفقد الكامل لحركة

وإذا كان المشتري أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعالیه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	40%	صمم احدي الاذنين	15%
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سليلمترات على الأقل	15%	انكماش الطرف لعين واحدة	35%

ويعتبر عجز البصر كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقد جزئياً بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

أما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

إذا بسبب ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف بحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البلد من جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

لا يستحق للمشتري أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناءً على البيانات والافقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والالتزامات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحق بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الملوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتري خلال مدة التأمين المبيلة بهذه الوثيقة أو أية مدد لاحقة يتفق عليها، أية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عليقة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدد المبيلة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بياهم بالجدول أو على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه إذا توفي المشتري بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين أو المستحقين.

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية :

- فقد إصبع العليلين لهاتياً .
- فقد الساقين أو القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين أو اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

ولا يستحق للمشتري أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة
المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة (٦٠٠+٤٢٥):(٦٠٠+٤٢٧)

لاستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

مارس ٢٠٢٢

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة "داريو" للمقاولات العامة، إلى المركز الهندسى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخصوص تحديد مدى صلاحية عدد ١ عينة من محجر أيمن السيوى مشروع محور القطر السريع (العلمين - فوكة الضبعة)، لإستخدامها في أعمال الردم بمشروع محور القطر السريع. تم توريد العينات الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالبي التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهرى .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الإختبارات :

العينة :

Light Brown pieces of calcerous cemented sand, some pebbles, med/fine silty sand.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبار التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

72.5%	نسبة المار من منخل $\frac{3}{4}$ %
10.8%	نسبة المار من منخل رقم 200 (%)

جدول رقم (١)



بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح حيث كانت النتائج كما يلي:

2.19	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
12%	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

4. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للردم:

GM	USCS	التصنيف
A-1-b	AASHTO	
صالحة	الصلاحية وفقا للتصنيف	

- لم يتم إجراء التحاليل الكيميائية على العينة الموردة، لعدم ورودها ضمن مواصفات المشروع المطلوبة.



مهندس المعمل

م. سمير محمد أبو الحسن



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University


Tel: (03) 592-5550 Fax: (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية

الهاتف ٥٩٢.٥٥٥٠ (٠٣) الفاكس ٥٩٢.١٨٥٣ (٠٣)

Project	مشروع محور القطار السريع (العلمين - فوكة الضبعة)	Proj. No.	2058-MTR
Client	شركة دارين للمقاولات العامة		
Description			

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

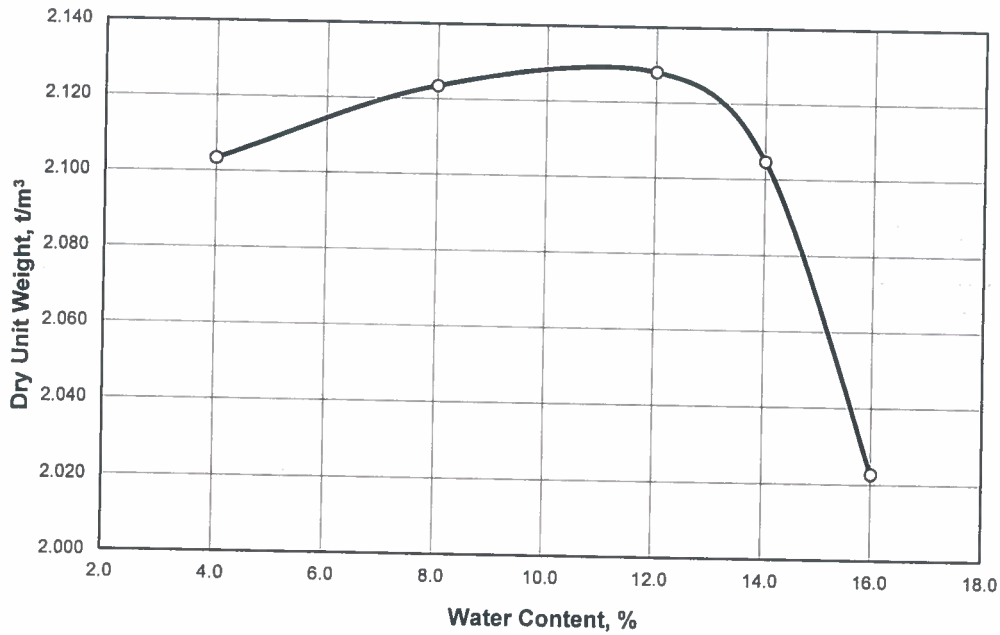

Sample	1	2	3	4	5			
Water Content	4.0	8.0	12.0	14.0	16.0			
Moist Unit Weight, t/m^3	2.19	2.29	2.38	2.40	2.35			
Dry Unit Weight, t/m^3	2.10	2.12	2.13	2.10	2.02			
Percentage of aggregate > 19mm						27.5%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.13	t/m^3	
Max Modified Unit weight						2.19	t/m^3	
Optimum moisture content						12.00	%	

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor it's suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية علي ذلك.

تحذير:




مهندس المعمل
م. سمير محمد ابو الحسن



Project	مشروع محور القطار السريع (العلمين - فوكة الضبعة)	Proj. No.	2058 - MTR
Client	شركة داريو للمقاولات العامة		
Classification	Light Brown pieces of calcerous cemented sand, some pebbles, med/fine silty sand.		

Sieve Analysis (ASTM D-1140)

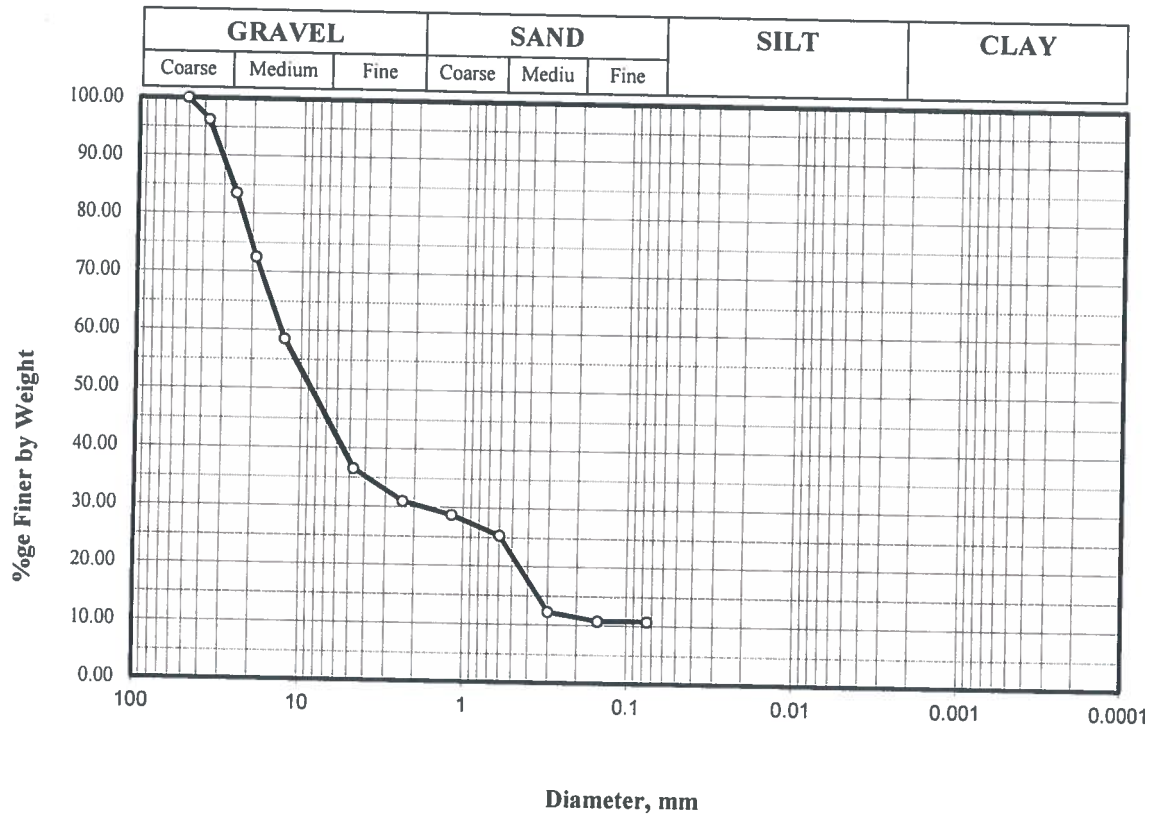

Sieve size (mm.)	37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
%ge Finer by weight	96.3	83.5	72.5	58.5	36.5	31.0	28.8	25.3
Sieve size (mm.)	0.30	0.15	0.075	0.063				
%ge Finer by weight	12.3	10.8	10.8	10.8				
Effective Diameter	N/A mm							
Uniformity Coefficient	N/A							
Passing sieve no. 200	10.8 %							

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو كريمة الوكيل
جامعة الإسكندرية

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة
المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة (٦٠٠+٤٢٥):(٦٠٠+٤٢٧)

لاستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

مارس ٢٠٢٢

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة "داريو" للمقاولات العامة، إلى المركز الهندسي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخصوص تحديد مدى صلاحية عدد ١ عينة من محجر أيمن السيوى مشروع محور القطار السريع (العلمين - فوكة الضبعة)، لإستخدامها في أعمال الردم بمشروع محور القطار السريع. تم توريد العينات الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالبى التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهرى .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الإختبارات :

العينة :

Tan pieces of crushed stones, med/ fine clayey sand.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبار التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

نسبة المار من منخل 3/4"	89.3%
نسبة المار من منخل رقم 200 (%)	14.5%

جدول رقم (١)



بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح حيث كانت النتائج كما يلي:

2.16	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
8%	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

4. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للردم:

GM	USCS	التصنيف
A-1-b	AASHTO	
صالحة	الصلاحية وفقا للتصنيف	

- لم يتم إجراء التحاليل الكيميائية على العينة الموردة، لعدم ورودها ضمن مواصفات المشروع المطلوبة.


مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الزكي
22/12/22
المعتمد
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية

مهندس المعمل
م. سمر محمد أبو الحسن



Project	مشروع محور القطار السريع (العلمين - فوكة الضبعة)	Proj. No.	2058 - MTR
Client	شركة داربو للمقاولات العامة		
Classification	Tan pieces of crushed stones, med/ fine clayey sand.		

Sieve Analysis (ASTM D-1140)

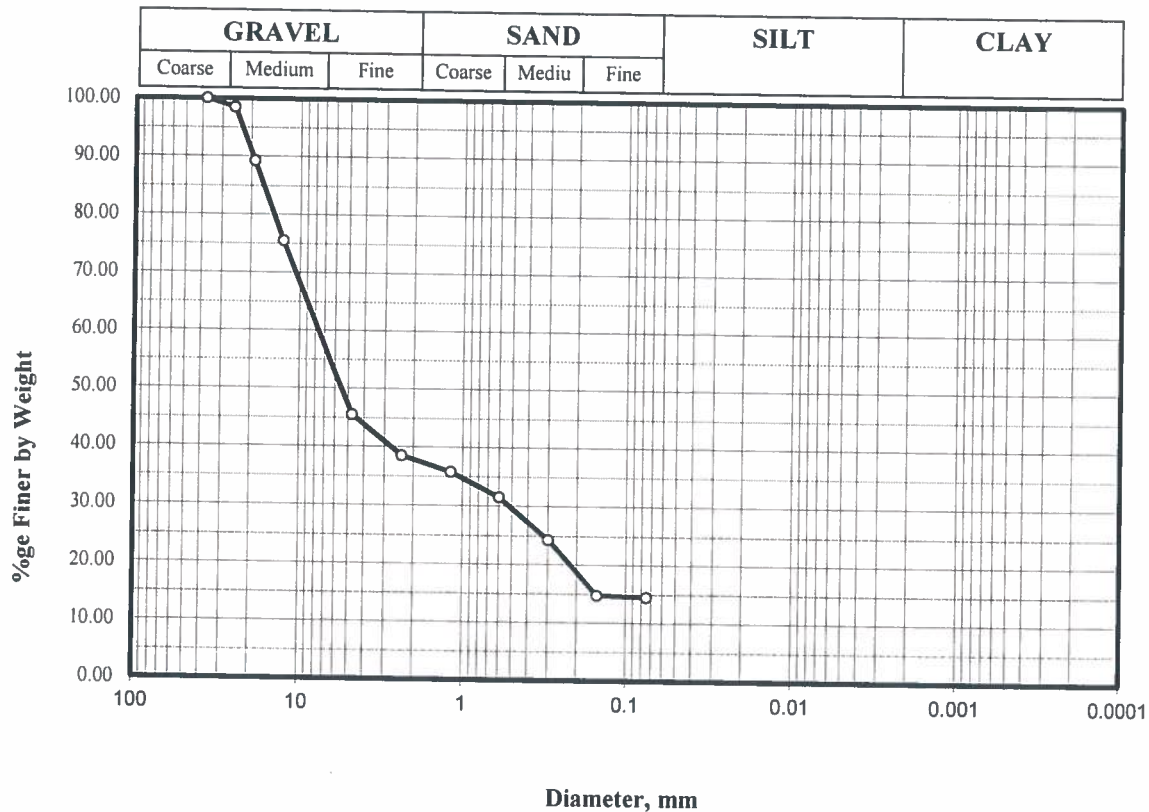

Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
% Finer by weight		100.0	98.5	89.3	75.5	45.5	38.5	35.8	31.5
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063				
% Finer by weight		24.3	14.8	14.5	14.5				
Effective Diameter		N/A	mm						
Uniformity Coefficient		N/A							
Passing sieve no. 200		14.5	%						

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor it's suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

تحذير:

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

Figure 1



Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University

Tel: (03) 592-5550 Fax: (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات


كلية الهندسة

جامعة الاسكندرية

تليفون ٥٩٢-٥٥٥٠ (٠٣) فاكس ٥٩٢-١٨٥٣ (٠٣)

Project	مشروع محور القطار السريع (العلمين - فوكة الضبعة)	Proj. No.	2058- MTR
Client	شركة داريو للمقاولات العامة		
Description			

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

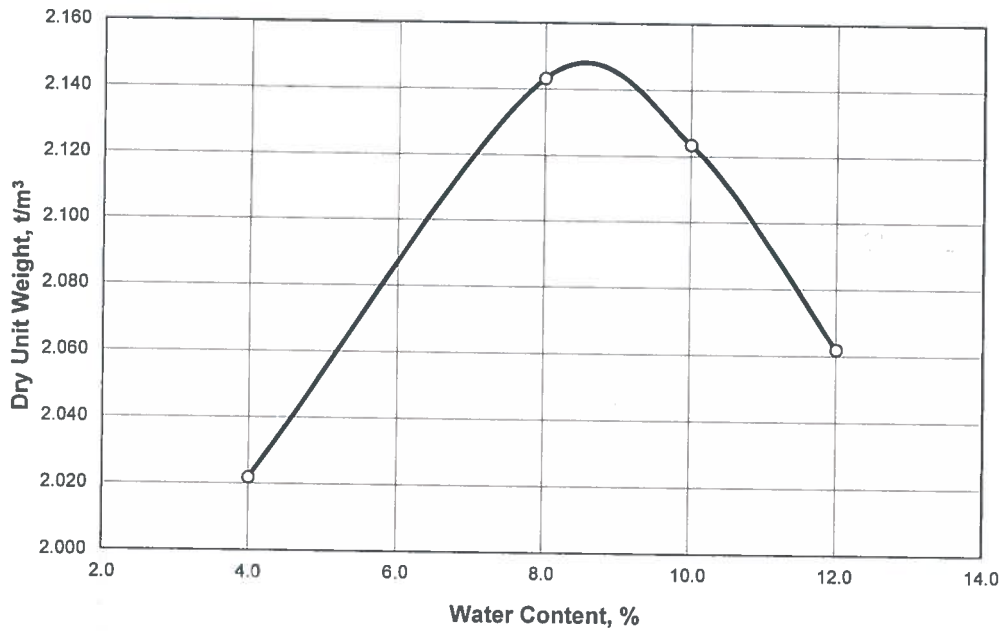

Sample	1	2	3	4				
Water Content	4.0	8.0	10.0	12.0				
Moist Unit Weight, t/m³	2.10	2.31	2.34	2.31				
Dry Unit Weight, t/m³	2.02	2.14	2.12	2.06				
Percentage of aggregate > 19mm	10.7%							
Maximum dry unit weight (γ_{max})	2.14 t/m³							
Max Modified Unit weight	2.16 t/m³							
Optimum moisture content	8.00 %							

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor it's suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

تحذير:

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل
م. سمر محمد ابو الحسن
