

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 390+000 الى الكم 391+600 بطول 1.6 كم ومن الكم 400+392 الى الكم 392+900 بطول 0.5
مرحلة استكمال أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة
رقم البند و بيانه : (1-5) اعمال توريد وتشغيل طبقة Prepared Subgrade مطابقة للموصفات
عن شهر فبراير 2023 طبقا للمفاضله بتاريخ 2023-12-18
تسفيد : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
705.60	3.92	180	5/2/2023	391+340	391+160	SG-15	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgra) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة ر من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل مل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميغاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى قة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
470.40	3.92	120	6/2/2023	391+160	391+040	SG-16	
470.40	3.92	120	8/2/2023	391+460	391+340	SG-17	
548.80	3.92	140	9/2/2023	391+600	391+460	SG-18	
2195.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
2195.20	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 390+000 الى الكم 391+600 بطول 1.6 كم ومن الكم 400+392 الى الكم 392+900 بطول 0.5
مرحلة أستكمال أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة

رقم البند و بيانه : (1-5) Prepared Subgarde
المادة المحجزة طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		ال	من		
705.60	3.92	180	5/2/2023	391+340	391+160	SG-15	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة لمار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % و الا يقل امل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميغاسكال ويتم فردها علي طيقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
470.40	3.92	120	6/2/2023	391+160	391+040	SG-16	
470.40	3.92	120	8/2/2023	391+460	391+340	SG-17	
548.80	3.92	140	9/2/2023	391+600	391+460	SG-18	
2195.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
2195.20	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة


م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ


م / محمد خليل



مهندس الشركة

م / محمد عادل

م / محمد عادل



مشروع : القطار الكهربائي السريع (عين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 390+000 الى الكم 391+600 بطول 1.6 كم ومن الكم 392+400 الى الكم 392+900 بطول 0.5
مرحلة أستكمال أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والترتية المسلحة

رقم البند و بيانه : Prepared Subgarde (1-5) (نسبة العلاوة 100%)
طبقا للمفاوضه بتاريخ 2023-12-18
تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
705.60	3.92	180	5/2/2023	391+340	391+160	SG-15	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
470.40	3.92	120	6/2/2023	391+160	391+040	SG-16	
470.40	3.92	120	8/2/2023	391+460	391+340	SG-17	
548.80	3.92	140	9/2/2023	391+600	391+460	SG-18	
2195.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)						
2195.20	الاجمالي الكلي (م3)						

مهندس الهيئة


م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري


مكتب XYZ

م / محمد خليل



مهندس الشركة

م / محمد عادل



مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 390+000 الى الكم 391+600 بطول 1.6 كم ومن الكم 392+400 الى الكم 392+900 بطول 0.5

مرحلة أستكمال أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة

رقم البند و بيانه : (1-5) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

طبقا للمفاضله بتاريخ 2023-12-18

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	البند
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
705.60	3.92	180	5/2/2023	391+340	391+160	SG-15	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد متصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل 80 , ميجاسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف
470.40	3.92	120	6/2/2023	391+160	391+040	SG-16	
470.40	3.92	120	8/2/2023	391+460	391+340	SG-17	
548.80	3.92	140	9/2/2023	391+600	391+460	SG-18	
2195.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
2195.20	الاجمالي الكلي (3م)						

مهندس الهيئة

م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري

مكتب ٧٧٢

م / محمد خليل



مهندس الشركة

م / محمد عادل

م / محمد عادل



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 390+000 الى الكم 391+600 بطول 1.6 كم ومن الكم 392+400 الى الكم 392+900 بطول 0.5
مرحلة استكمال أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة

رقم البند و بيانه : (2-11) بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل

تفصيل : شركة الصالحين للمقاولات العامة

3م 0.0


مقدار العمل السابق :

الكمية	الأبعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتري		رقم الطلب	بيان الأعمال بالمقايمة
	العرض	الطول		الى	من		
2210.00	27.63	80	26/11/2022	391+150	391+070	G-1	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري.
1080.00	27.00	40	01/01/2023	391+600	391+560	G-2	
5400.00	27.00	200	23/1/2023	392+900	392+700	G-3	
5400.00	27.00	200	30/1/2023	392+700	392+500	G-4	
2700.00	27.00	100	02/04/2023	392+500	392+400	G-5	
16790.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م²)						
16790.00	الاجمالي الكلي (م²)						

مهندس الهيئة
م / مارجريت مجدي



مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد طاهر



مهندس لشركة
م /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (برج العرب - العلمين)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد اعتماد لجنة المفاوضه
للقطاعات الآتية:

المسلسل	اسم الشركة	من المحطة	إلى المحطة	مرحلة
1	شركة الصالحين للمقاولات العامة	390+000	391+600	مرحلة استكمال أعمال الحفر
		392+400	392+900	والبلاطات الخرسانية

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

(Signature)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع الخامس ب (الحمام - العلمين)
المقاسمة المعدلة لبنود الأعمال شركة الصالحين للمقاولات العامة
القطاع من المحطة 390+000 إلى 391+600
ومن المحطة 392+400 إلى 392+900
أعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
5	طبقات الأساس				
5-1	بالمتر المكعب اصملا توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلولس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالماء الاصوي للوصل الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف ومسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	م3	2,196.00	136.80	300,413
	السعر خلال شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م3	2,196.00	161.00	353,556
	المادة المحجيرة طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	م3	2,196.00	118.3	259,787
	علاوة مسافة النقل 111 كم ((20-111)*1.3 = 118.3	م3	2,196.00	25	54,900
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	م3			
6	البلاطات الخرسانية				
6-1	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي و إضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب بالفواصل بسمك 2 سم والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتنظيف السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م2	32146.88	457	14,691,124
6-2	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقواعد الحمايات والميول الجانبية تتكون من 0.8 متر3 من دولوميت متدرج+ 0.4 متر3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري فيبر + سبكا على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب بالفواصل بسمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوض العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم/سم2 وملئ الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م3	1000	2665.2	2,665,200
11	أعمال التربة المسلحة				
11-2	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيو تيكستائل مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .	م2	16,800.00	42.00	705,600.00
	ذات وزن لا يقل عن 400 جم/م2	م2			
11-3	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيو جريد مستورد التداخل لا يقل عن 10% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري .	م2	12460	37	461,020
	ذات قوة شد 30 ك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial	م2			
	الإجمالي				19,491,600

(تسعة عشر مليوناً وأربعمئة وواحد وتسعون ألفاً وستمئة جنيه مصري فقط لا غير)

مدير مشروع الهيئة

مدير المشروع الهيئة

مدير المشروع الاستشاري

مدير المشروع المقاول

م/محمد حسني فياض

م / مارجریت مجدي زاهر

م/محمد عزيز مصطفى

م/ محمد عادل

بمعد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه"





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/29-11-2011

Rep. No.	553/03
Date of report	21/1/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة الصالحين للمقاولات العامة
Description of casting Element.	خرسانة حماية السيول الجانبية للقطار السريع - الاتجاه الأيسر
Station	St(390+000) to (391+600)

Type of curing	by contractor
casted by	Contractor
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/m3
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	23/12/2023	20/01/2024	28	Plain Concrete	8300	2.459	94150	418	381
2					8040	2.382	83730	372	
3					8240	2.441	79610	354	

Lab Director

Eman
Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

Fer. Dr. H.
Dr / Mohamed Mostafa Badry





COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/20-11-2011

Rep. No.	553/06
Date of report	23/1/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة المساحين للمقاولات العامة
Description of casting Element.	خرسانة حاملة للميول الحديدية للطريق السريع - الاتجاه الأيسر
Station	St(390+000) to (391+600)

type of curing	by contractor
casted by	Contractor
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/m ³
Required strength	250 kg/cm ²

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (kgf)	Strength (kg/cm ²)	Avg.
1	25/12/2023	22/01/2024	28	Plain Concrete	8450	2.504	67280	299	337
2					8100	2.400	79650	354	
3					8450	2.504	80780	359	

Lab Director

Eman
Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

For. Dr. H.
Dr / Mohamed Mostafa Badry



COMIBASSAL International Controllers

Internal inspection and laboratories sector

Accredited by : Egypton General Authority for Petroleum under No. 34/20-11-R011

Rep. No.	405/05
Date of report	23/1/2024

Report compressive Strength for Cube

Compression Machine: ADR 2000 standard Sr. No. 1708-3-5071

Project	Electric Express Train
General Consultant	SYSTRA
Consultant	SPECTRUM
Contractor	شركة الصالحين للمقاولات المدنية
Description of casting Element.	خرسانة حماية الميول الجانبية للطاير السريع - الاتجاه الأيسر
Station	St(390+000) to (391+600)

type of curing	by contractor
casted by	Contractor
cube dim.	(15*15*15) cm
cement content	350 kg/m3
Required strength	250 kg/cm2

Cube No.	Casting Date	Testing date	Age (days)	Concrete Type	Weight (gm)	Density (gm/cm3)	Load (kgf)	Strength (kg/cm2)	Avg.
1	25/12/2023	22/01/2024	28	Plain Concrete	7700	2.281	60600	269	272
2					7800	2.311	60600	269	
3					7500	2.222	62650	278	

Lab Director

Eman
Eng/ Eman E. Kandil



Geotechnical Consultant

Dr / Mohamed Mostafa Badry
Dr / Mohamed Mostafa Badry

Customer / Company Name	SALAMA TEX	
Sample type	GEOGRID-BLAKUAL - 30KN/M	
Test Results		
Test name	Average	
Tensile Strength (KN/m)	44.2	
Elongation (%)	13.29	
Declaration		
The laboratory is responsible only for the samples provided. The samples provided are the responsibility of the supplier The results have a tolerance $\pm 5\%$.		
Created by		
Approved by	Samar Ahmed Mohsen Abdelattif	



السادة / شركة الصالحين للمقاولات

تحية طيبة وبعد...

الموضوع :- بشأن الطلب المقدم من سيديتكم بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢ لأجر اختبار عينة جيو تيجريد تشي
العصب.



بالإشارة إلى الموضوع عثية. ننشرف بأن نرثي لسيديتكم التقارير الخاص بالموضوع المذكور عثية
والذي أعد بواسطة السيدة الأستاذ الدكتور/ سمر احمد محسن بنقسم هندسة الغزل والنسيج وذلك
من خلال المركز الهندسي.

مع خالص احترام وتقدير.

د. الفاتح محمد
المدير التنفيذي للمركز الهندسي
كلية الهندسة - جامعة الإسكندرية
د. محمد طارق الصياح

توقيع: د. محمد طارق الصياح

4-5/7

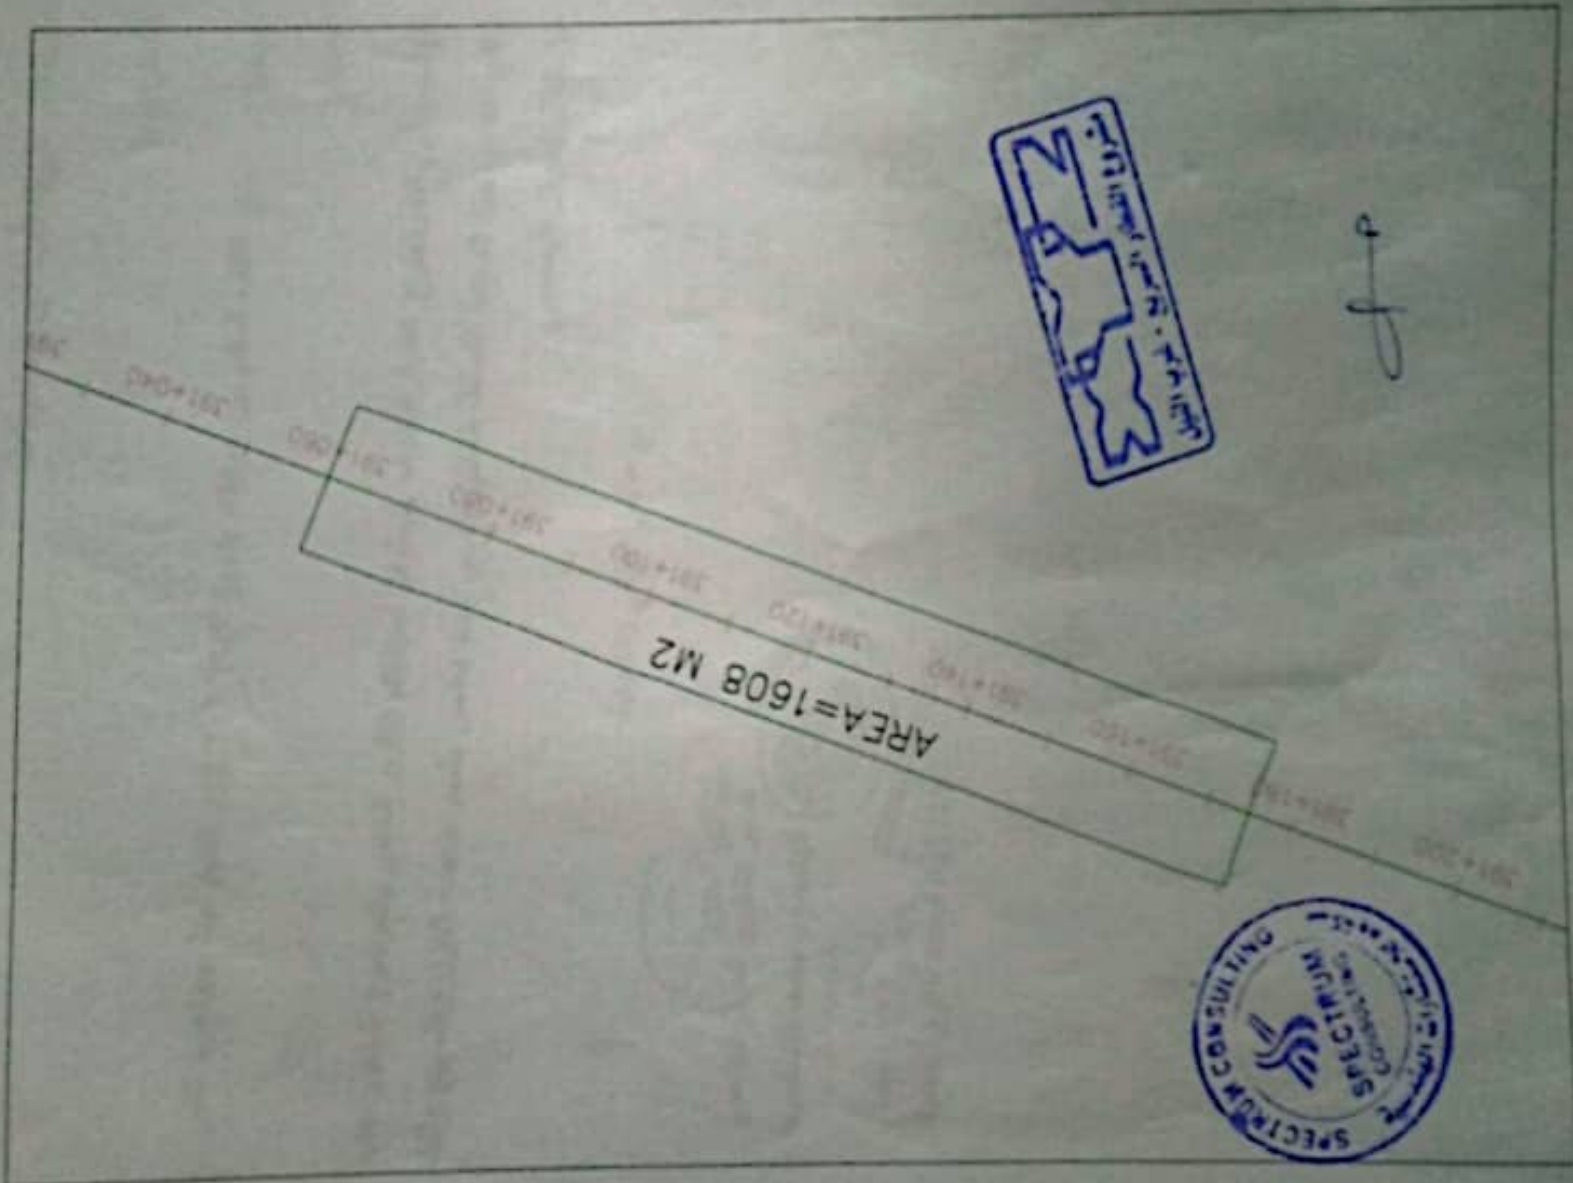

Handwritten signature or mark.



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



RECEIPT of NOTIFICATION-Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	EL SALHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING		Designer Company*	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office	
Issued by Contractor	Name	Eng. Mohamed Adel	Signature	Date	2/2023
	Sign	[Signature]		Time	12:00 PM
Received by GARB CONSULTANT	Name	Eng. Saied Salef	Signature	Date	4-2-2023
	Sign	[Signature]		Time	12:00 PM
CODE - 1	S1 to S21 Station Reference		D1 to D3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilo meter point only Start Km is used	
CODE - 2	Work Activity				
CODE - 3	Sub Element of Activity				

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	AREA
From St. 391+060 To St. 391+160	GEOGRID	1608 M2

INSPECTION DETAILS The following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached	Test Results Attached	Calibration Attached	Other as indicated
Drawing Reference	ITP References	MS Reference	
Plan and Profile REV. 31 1- PLAN	MAR () MIR (SG-11)	Specification: EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP. TECHNICAL REPORT (CG21-122.1) VERSION 1 BY CIVECON GROUP.	

Comments by Eng. Mohamed Mahmoud (XYZ)

1- Attached Master Sheet approved by SPECTRUM.

Comments by Eng. Saied Salef (SPECTRUM) (L)



Comments by Eng. Alaa Abd-Allah (ER)

- 1- Geogrid between SG1&SG2 according to GARB Eng. Instruction to contractor.
- 2- Quality test checked by third party lab.

INSPECTION RESULT

Organization	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
Contractor	Eng. MOHAMED ADEL	[Signature]			A	
KYZ Survey	Eng. Mohamed KHALIL	[Signature]			Awc	
QA/QC*	Eng. Saied Salef	[Signature]			A	
GARB**	Eng. Mohammed Fayad					
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allah	[Signature]	4-2-2023		Awc	

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



RECEIPT of NOTIFICATION-Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	EL SALHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING		Designer Company*	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time
	Eng. Mohamed Adel		02/2023 S5-B SA IR (G-G-1)	12:00 PM
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Saied Salef		C1 C2 C3 DD MM YY HH MM	
			391 EW CS 04 02 2023 12 00	

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to D3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilo meter point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	AREA
From St. 391+060 To St. 391+160	GEOGRID	1608 M2

INSPECTION DETAILS The following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached	Test Results Attached	Calibration Attached	Other as indicated
Drawing Reference	ITP References	MS Reference	
Plan and Profile REV. 31 1- PLAN	.MAR () .MR (SG-11)	-Specification: EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION2 BY CIVECON GROUP. -TECHNICAL REPORT (CG21-122.1) VERSION 1 BY CIVECON GROUP.	

Comments by Eng. Mohamed Mawla (XYZ)

1- Attached Material sheet approved by SPECTRUM.

Comments by Eng. Saied Salef (SPECTRUM)



Comments by: Eng. Alaa Abd-Allah (ER)

1- Geogrid between SG1&SG2 according to GARB Eng. Instruction to contractor.
2- Quality test checked by third party lab.

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
Contractor	Eng. MOHAMED ADEL				A	
XYZ Survey	Eng. Mohamed KHALIL				Awc	
QA/QC*	Eng. Saied Salef				A	
GARB**	Eng. Mohammed Fayad					
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allah		4-2-2023		Awc	

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours
The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown.

Contractor Company		EL SALHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING		Designer Company*		(SPECTRUM) Engineering Consulting Office	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time			
	Eng. Mohamed Adel		3/02/2023 IR (G-G1)	12:00 AM			
Received by GARB CONSULTANT	Eng. Saied Salef	Sign	UIR	C1	C2	C3	DD
				391	EW	CS	04
				MM	YY	HH	MM
				02	2023	12	00

CODE - 1	S1 to S21 Station Reference	D1 to D3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilo meter point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED		
Description	Element	AREA
From St. 391+060 To St. 391+160	GEOGRID	1608 M2


INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time	
Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate			
Checklist Attached	Test Results Attached	Calibration Attached	Other as indicated
Drawing Reference	ITP References	MS Reference	
Plan and Profile REV. 31 1- PLAN	MAR () MIR (11-SG)	-Specification: EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP. -TECHNICAL REPORT (CG21-122.1) VERSION 1 BY CIVECON GROUP.	

Comments by: Eng. Mohamed Mansour (XYZ)
1- Attached Master Sheet approved by SPECTRUM.

Comments by: Eng. Saied Salef (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allatif (ER)
 1- تم استلام القطاع فحص بم 2- تم مراجعة شيت المناظير	1- we need approved typical x sec to use geogrid between SG2 & SG2.1a work has been done according to instruction from garb to contractor & garb consultant. 2- X-sec./20m of rev 31 Should Approved from SYSTRA. 3- quality test checked by third party lab. 4- Final approval is subject to above mentioned comments.

INSPECTION RESULT						Approval Status	Please Tick if Not Attend
Organisation	Name	Sign	Date	Time		A-AWC-R	
Contractor	Eng. MOHAMED ADEL					A	
XYZ Survey	Eng. Mohamed KHALIL						
QA/QC*	Eng. Saied Salef						
GARB**	Eng. Mohammed Fayad						
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allatif		4-2-2023				

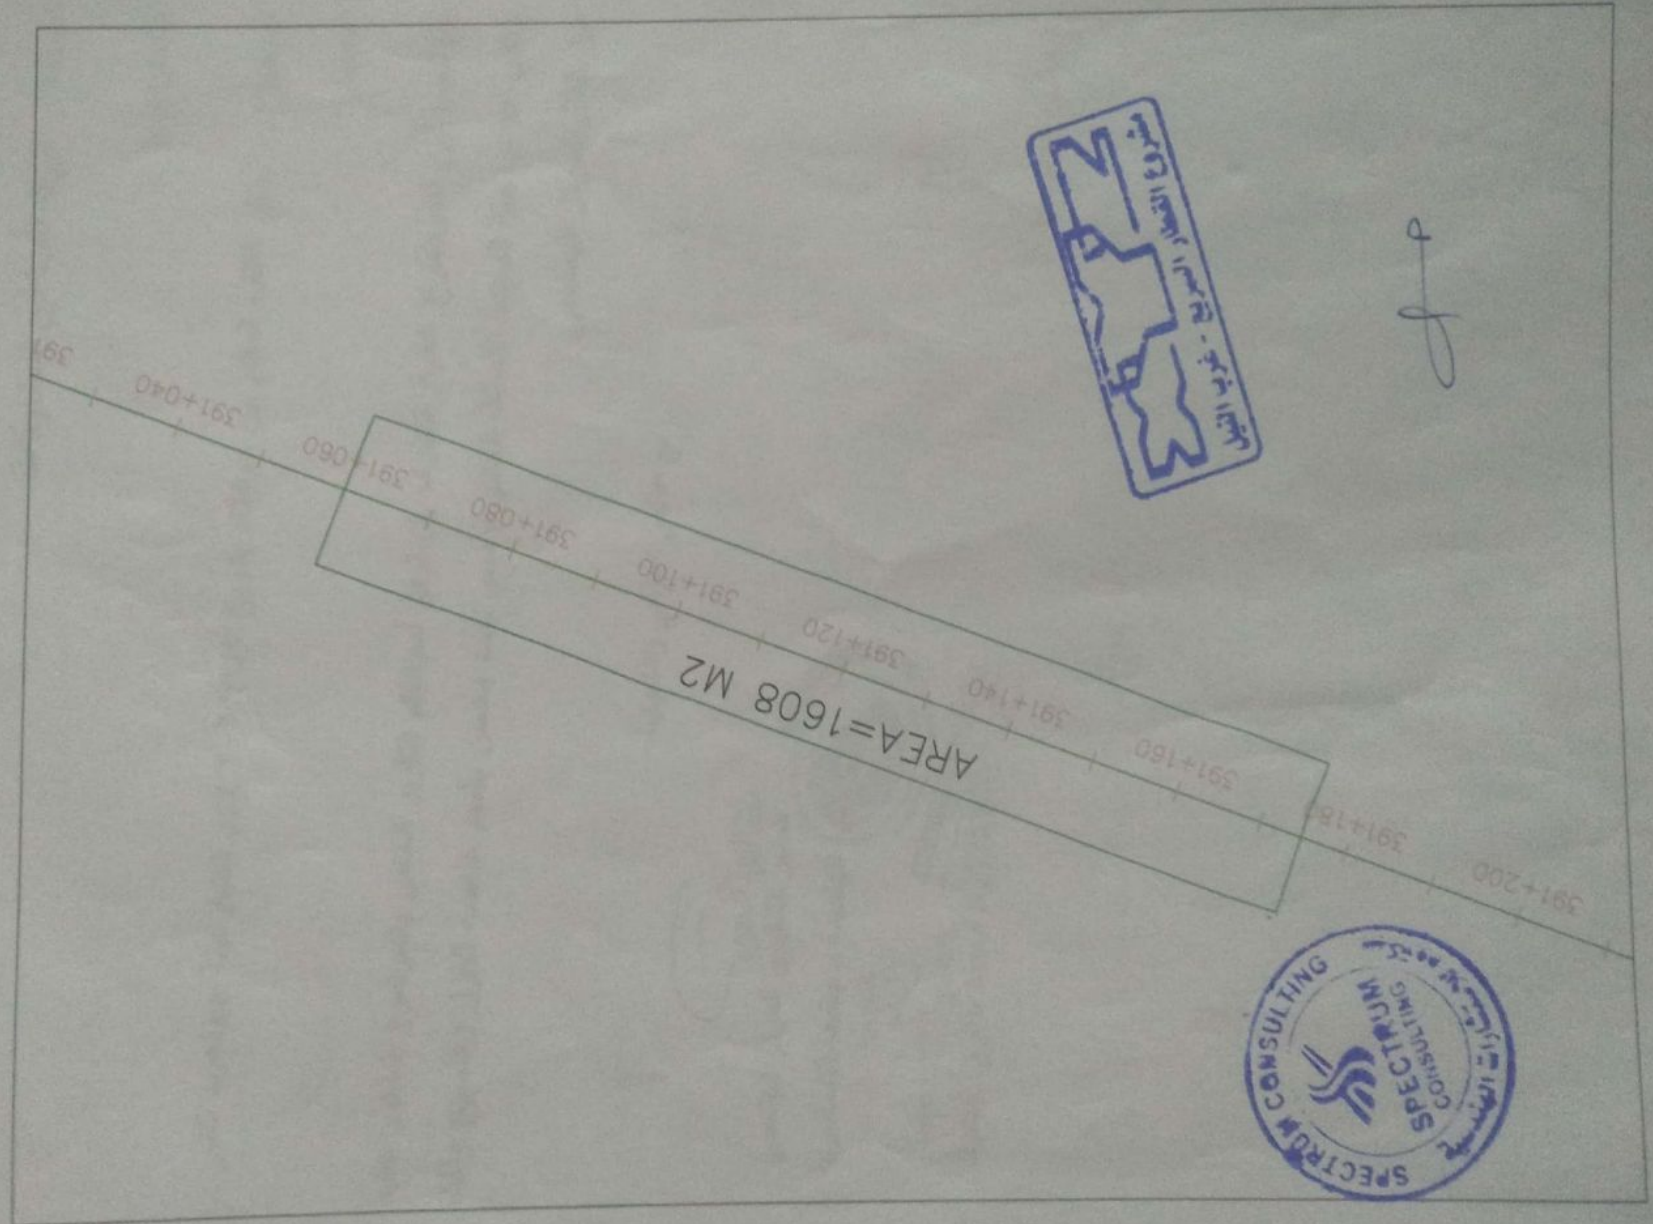

السادة / شركة الصالحين للمقاولات

تحية طيبة وبعد...

الموضوع :- بشأن الطلب المقدم من سيادتكم بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٢ لأجر اختبار عينة جيو توريد ثنائي العصب.

بالإشارة إلى الموضوع عاليه، نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التقرير الخاص بالموضوع المذكور عاليه والذي أعد بواسطة السيدة الأستاذ الدكتور/ سمر احمد محسن بقسم هندسة الغزل والنسيج وذلك من خلال المركز الهندسي.

مع خالص احترامي وتقديري،،

خالص حمدي
المدير التنفيذي للمركز الهندسي





كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية

١٥٠٤
٢٠٢٣
١٥/٧/٢٠٢٣
د. زياد محمد طارق الصياد

لعمري ١٢ شهر ٢٠٢٣
ح.د.

Customer / Company Name	SALAMA TEX	
Sample type	GEOGRID-BIAXIAL - 30KM/M	
Test Results		
Test name	Average	
Tensile Strength (KM/m)	44.2	
Elongation (%)	13.29	
Declaration		
The laboratory is responsible only for the samples provided. The samples provided are the responsibility of the supplier The results have a tolerance $\pm 5\%$.		
Created by		
Approved by	Samar Ahmed Mohsen Abdellatif	







Contractor Company		ELSALEEM COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING		Designer Company		SPECTRUM CONSULTING	
Name	Eng. Mohamed Adel	Signature		Signature		Date	2023/07/20
Reviewed by QA/QC	Eng. Mounir Elsayed	Signature		Signature		Date	2023/07/20


ELEM 1 Station Substructure	SS to SS Station Substructure	SS to SS Station Substructure	SS to SS Station Substructure
Sub Structure of Activity			

Description of Materials		First Prepared Subgrade	
Location to be Used	From	To	Notes
MASH & URB Approval No	URB 55-011	Date	2023/07/20
	M.A.R.55-2		2023/07/20
Supplier Name	QAM ELQALMA		
Test Requirement	F.D.T (ASTM D 1555)	Specification	Test Results (ASTM D 1555) & Test Results (ASTM D 1555)
Reference Photos	No/Yes	Other	
Item	Description	Unit	Quantity
1	SAND COM. TEST	NO. SAMPLE	34
2			
3			
4			

Comments by Eng. Mounir Elsayed (SPECTRUM) 1. F.D.T was carried out by material engineer for both contractor and QAM Consultant. 2. Results report attached and acceptable with project specifications. 3. First approval is subject to above mentioned comments.	Comments by Eng. Mounir Elsayed (SPECTRUM) 1. F.D.T was carried out by material engineer for both contractor and QAM Consultant. 2. Results report attached and acceptable with project specifications. 3. First approval is subject to above mentioned comments.
--	--

APPROVAL STATUS			
Organization	Name	Signature	Date
Contractor	Eng. Mohamed Adel		2023/07/20
QA/QC*	Eng. Mounir Elsayed		2023/07/20
QA/QC**	Eng. Mohamed Adel		2023/07/20
Employer Representative	Eng. Mounir Elsayed		2023/07/20

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



RECEIPT of NOTIFICATION-Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be completed and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	E.I. SALHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING				Designer Company*	(SPECTRUM) Engineering Consulting Office			
Issued by Contractor	Name	Sign	Date/Serial Number	Time					
	Eng. Mohamed Adel		5/02/2023 IR (SG-16)						
Received by GARIB CONSULTANT	Eng. Saeed Salef		391	06	02	2023	YY	MM	DD

S1 to S21 Station Reference	D1 to D3 Depot Reference	For Kilo meter point only Start Km is used
--------------------------------	--------------------------	--

CODE - 2 SYMBOL - 1	Work Activity
Sub Element of Activity	
EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED	
Description	Element
From St. 391+040 To St. 391+160	At level (+0.5) m
SECOND PREPARED SUBGRADE	

INSPECTION DETAILS The following will be ready at the Planned Inspection Time	Planned Inspection Time
---	-------------------------

COMPLIANCE EVIDENCE must be included as appropriate	
Checklist Attached	Test Results Attached
Drawing Reference Plan and Profile REV. 31	ITP References ..MAR (QT PREPARED SUBGRADE 2) ..MIR (11-SG)
1- Master SHEET	MS Reference -Specification: EARTHWORK SPECIFICATIONS & TESTING REPORT (CG21-41.2) VERSION 2 BY CIVECON GROUP
2- Level Sheet	-TECHNICAL REPORT (CG21-122.1) VERSION 1 BY CIVECON GROUP.
3- Coordinates Sheet	
4- Sand - Cone Test	

Comments by: Eng. Mohamed Mansour (XYZ)
1- Attached Master Sheet approved by SPECTRUM.

Comments by: Eng. Saeed Salef (SPECTRUM)	Comments by: Eng. Alaa Abd-Allah (ER)
1- تم استلام الخطة فتم فحصها 2- تم مراجعة شيفت الماسونير	1-coordinates & levels and width checked by GARIB 2- (REV. 31 & X-sec./20m) Should Approved from SYSTRA. 3-Final approval is subject to above mentioned comments.

INSPECTION RESULT			
Organisation	Name	Sign	Date
Contractor	Eng. MOHAMED ADEL		
XYZ Survey	Eng. Mohamed KHALIL		
QA/QC*	Eng. Saeed Salef		
GARIB**	Eng. Mohammed Fayed		
Employers Representative	Eng. Alaa Abd-Allah		06/02

فاتورة

2024/152	الرقم
2024/02/20	التاريخ

السادة	شركه انصالحين للمقاولات العامه (سليمان ابراهيم محمد ابراهيم وشريكه)
لصالح	الهيئة العامه للطرق والكبارى
العنوان	بنر الجند - قرية رمانه - محافظة شمال سيناء

الإشارة	البيان	المبلغ بالجنيه المصرى
رقم وثيقة أخطار مقاولين	القسط الصافي	جنية 4872
8/1/051/0000152	رسم الدمغة النسبية	90
	الضريبة النوعية + رسم تنمية موارد الدولة	268
	مصاريف الاشراف و الرقابه على الاف + 1 فى الاف مقابل خدمات اعتماد و تعديل وثائق + 2 فى الاف مقابل صندوق ضمان حملة الوثائق	43
	مصاريف الإصدار	85
		272
	الإجمالي	5500

نسبة العمولات الاساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات : 5%

المبلغ بالحروف	فقط خمسة الاف و خمسمائه جنية مصرى لا غير.
----------------	---

شركة رويال للتأمين - مصر



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة فى مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقا لأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This Debit or Credit Note is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذا الإشعار سواء مدين أو دالين لن يكون ساري المفعول ما لم يختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين



جدول وثيقة اخطار المقاولين

رقم الوثيقة	8/1/051 /0000152
اسم المؤمن له	شركة الصالحين للمقاولات العامة (سليمان ابراهيم محمد ابراهيم وشريكه)
لصالح	الهيئة العامة للطرق والكبارى
العنوان	بنز العبد - قرية رمانه - محافظة شمال سيناء
اسم الوسيط	سامية محمود اسماعيل خضر
رقم القيد بالهيئة	23826
وصف المشروع	مشروع تنفيذ اعمال الجسر الترابى لمشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) - قطاع برج العرب/العلمين - المسافه من الكيلو 390.00 الى الكيلو 391.600 بطول 1.600 كم والمسافه من الكيلو 392.400 الى الكيلو 392.900 بطول 0.500 كم (استكمال اعمال حمايه الميول والبلاطات الخرسانيه والتزبيه المسلحه) (العقد رقم 2024/2023/1083)
موقع المشروع	قطاع برج العرب - العلمين
مدة التأمين	12 شهر من : 2024/01/31 الى : 2025/01/30
مبلغ التأمين	" 19,491,600 جم " (فقط تسعة عشر مليون اربعمائه واحد و تسعون ألف و ستمائه جنية مصرى لا غير)

القسم الأول : الاضرار المادية

البنود المؤمن عليها	مبلغ التأمين بالجنية المصرى	التحمل عن كل حادث
1- اعمال المقاوله : (الاعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد)		
1 / 1 - قيمة العقد	19,491,600	
2 / 1 - الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.	-----	يتحمل المؤمن له
2 - أدوات ومهمات التشييد.	-----	50% الاولى بحد ادنى
3- المنشآت المؤقتة	-----	35000 جم من قيمة
4 - آلات ومعدات المقاولين البرية	-----	كل خسارة من حوادث
5- ازاله الانتقاض	-----	اعمال العقد
اجمالى مبلغ تأمين القسم الاول : "19,491,600" جم (فقط تسعة عشر مليون اربعمائه واحد و تسعون ألف و ستمائه جنية مصرى لا غير)		

الأخطار الطبيعية	حدود التعويض	التحمل عن كل حادث
1 - الزلازل / البراكين / الأعاصير.	غير مغطى	غير مغطى
2 - العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه/ انزلاق وانهيار التربة .	غير مغطى	غير مغطى
* حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد غير مغطى		



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة فى مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقا لاحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

القسم الثاني : المسؤولية المدنية قبل الغير

البند المؤمن عليها	حدود التعويض	التحمل عن كل حادث
1 - الإصابات الجسمية		يتحمل المؤمن له 20% الأولى
1 / 1 - للشخص الواحد	100,000	بحد أدنى 20000 جم من قيمة
2 / 1 - للحادث الواحد - مهما كان عدد الأشخاص	200,000	كل خسارة من حوادث المسؤولية المدنية (عن الأضرار المادية فقط)
2 - الأضرار المادية للممتلكات للحادث الواحد	200,000	
3- اجمالي التزام الشركة عن الإصابات الجسمية والأضرار الشركة خلال مدة التأمين 1,000,000 جنية مصرى		

القسط	4872.90
نصف الدفعة النسبية	268.00
الضريبة النوعية + رسم تنمية موارد الدولة	43.50
مصاريف الإشراف و رقابه على الألف + 1 في الألف مقابل خدمات ائتمه و تحيل وتنفذ + 2 في الألف مقابل صندوق ضمان حصة الفوتو	43.85
مصاريف الإصدار	272.65
الأجمالى	5500.00

تخضع هذه الوثيقة إلى الشروط، والاشتراطات والاستثناءات والملاحق التالية:

- ملحق رقم (112) الشروط الخاصة المتعلقة بتجهيزات مكافحة الحريق
- ملحق رقم (9) استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل .
- ملحق رقم (10) استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن الفيضان و غمر المياه.
- ملحق رقم (12) استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناتجة عن العواصف.
- ملحق رقم (102) اشتراط خاص بالكابلات و المواسير و المرفق الأخرى تحت ارض.
- ملحق رقم (103) استثناء الخسارة و الأضرار التى تقع للمحاصيل و الغابات و الزراعات.
- ملحق رقم (109) اشتراط بخصوص مواد الانشاء.
- ملحق رقم (114) اشتراط بخصوص الخسائر المتكرره
- من المعلوم و المتفق عليه :-
- لا يجوز اجراء اى تعديل او الغاء لهذه الوثيقة الا بعد موافقه كتابيه من الهيئه العامه للطرق و الكبارى.
- فى حالة وقوع اى حادث او ايه خساره او فقد للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة , تدفع كافة التعويضات مباشراً لصالح الهيئه العامه للطرق و الكبارى.
- تقتصر مسئولية الشركة بالنسبة لحوادث السطو الى تقع لمهمات المشروع اثناء تواجدها داخل مخزن مسور و توجد عليه حراسه طوال الـ 24 ساعه و يستثنى كليا من هذه التغطيه حوادث السرقة.
- أن التغطيه الممنوحه بموجب هذه الوثيقة تنحصر فى الأضرار و الخسائر التى تحدث لاعمال العقد المبين بجدول الوثيقة فقط دون اى اضرار تحدث للمباني او المنشآت القائمة قبل بدء سريان هذه الوثيقة و ذلك مع عدم الإخلال بشروط و بنود و استثناءات هذه الوثيقة أو الملحقه بها.
- لن يتم التعويض عن اى حوادث نتيجة الاهمال الجسيم و المستمر و عدم توفر الرقابه الامنيه المستمره على المشروع.
- يعتبر شرطاً أساسياً لضمان سريان التغطيه التأمينيه اتخاذ كافة الاجراءات الوقائيه و الاحتياطات اللازمه لمكافحة الحريق و الغير.
- عدد كافى من طفايات الحريق التى تغطى موقع العمل بالكامل.
- يشترط عدم وقوع اى حوادث حتى تاريخ تحرير هذه الوثيقة.
- أن هذه الوثيقة تشمل ضمن تغطيتها التأمين ضد اخطار الحريق و السطو و دون الإخلال بشروط و بنود الوثيقة.



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.

ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

مسجلة فى مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقاً للأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

هذه الوثيقة تخصص للاستثناءات الإضافية التالية :

- 1- استثناء خطر الإشعاع / الطاقة النووية
- 2- استثناء خطر الإرهاب و الأعمال التخريبية.
- 3- استثناء الأخطار الإلكترونية
- 4- استثناء أخطار الحروب والدوافع السياسية
- 5- استثناء السفالات و الأدوات المستخدمة من قبل منفذ المشروع.
- 6- استثناء انهيار التربة
- 7- استثناء الاهتزاز و ازاله أو اصطفاغ الدعامات
- 8- استثناء الخساره أو الاضرار التي تقع للمحاصيل و الغابات و الزراعات
- 9- استثناء أخطاء التصميم
- 10- استثناء التسرب و التلوث الصناعي و التلوث الإشعاعي
- 11- استثناء اية عقوبات أو جزاءات تأديبيه أو غرامات
- 12- استثناء الخسائر التبعيه من اى نوع
- 13- استثناء الات و معدات المقاول.
- 14- استثناء المسئوليه المدنية للسيارات.
- 15- استثناء الممتلكات المورده من المالك و التي لا توجد قيمتها ضمن مبلغ التأمين.
- 16- استثناء الممتلكات القائمة و المحيطه الخاصه بالمالك.
- 17- استثناء المسئوليات الناشئه عن الامراض الساريه.
- 18- استثناء العقوبات الدوليه.
- 19- استثناء المشاريع منتصفه المده/النسبه المنجزه قبل تاريخ بدء التأمين.
- 20- استثناء الشغب و الاضرار بالعماليه و المدنيه

تحريرا في 20 / 02 / 2024

شركة رويال للتأمين مصر
مصر



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقا للأحكام قانون رقم ١٩٨١ / ١٥٩
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

ملحق رقم 112

شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق

والامان من الحريق فى مواقع التشييد

أنه من المفهزم و المتفق عليه و مع عدم الاخلال بالشروط و الاستثناءات و الاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة أو الملحقه بها عدا ذلك فإن الشركه سوف تقوم بتعويض المؤمن له عن الخساره أو التلف المتسبب بصفة مباشره أو غير مباشره عن الحريق أو الانفجار و ذلك فقط بأشترط ما يلى :-

- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب و وسائل الاطفاء الكافية الصالحه للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل.
- (2) أن يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزه فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به و أن يكون مغلق بأغطية مؤقتة.
- (3) أن يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق و طفايات الحريق اليدويه على فترات منتظمه و بما لا يقل عن مرتين كل اسبوع.
- (4) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبه وفقا للانظمة المحليه بأسرع ما يمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الانشاء.
- (5) أن يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد , أنابيب الخدمات و أى فراغات أخرى بأسرع ما يمكن و بما لا يجاوز البدء فى أعمال التجهيزات.
- (6) أن يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابله للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها و ذلك فى نهاية كل يوم عمل.
- (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من أى نوع مثل :-

- عمليات الجلب , التقطيع , اللحام
- استخدام لمبات الغازيه أو الكهربائيه



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة فى مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقا لاحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تكتب من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

- استعمال البيئومين الساخن
- أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونه
- (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق و مدرب على مكافحة الحريق على أن يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعه.
- (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحده تخزين.
- (10) كل وحده تخزين مستقلة يجب أن تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو أن تفصل بحوائط مقاومه للحريق.
- (11) يتم تخزين جميع المواد القابله للاشتعال و خاصه السوائل أو الغازات القابله للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيره مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء أو التركيب أو أى اعمال ينشأ عنها لهب.
- (12) تعيين منسق امان بالموقع.
- (13) تركيب نظام يعتمد عليه للانذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى أمكن ذلك.
- (14) تنفيذ خطه حماية من الحريق و خطه مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام.
- (15) أن يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق و ان تتم التدريبات العمليه اسبوعيا.
- (16) أن يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع و ان تكون هناك مداخل جاهزه له فى جميع الاوقات.
- (17) ان يحاط الموقع بسور و تكون المداخل تحت المراقبة.

قيمة كل وحدة تخزين : 1000000 جنية مصرى



(9) ملحق رقم 009

استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الأخلال بالشروط و الإستثناءات و الأحكام والإشترطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحقه بها، ان الشركة ليست مسئولة عن تعويض المؤمن له عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل.

(10) ملحق رقم 010

استثناء الخسارة أوالضرر أو المسؤولية
الناشئة عن الفيضان أوغمر المياه

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الأخلال بالشروط و الإستثناءات و الأحكام والإشترطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحقه بها، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المؤمن له عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقا لأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

ملحق رقم 102

اشتراط خاص بالكابلات والمواسير

والمرافق الأخرى تحت الأرض

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تعوض المؤمن له فقط عن التلف أو الخسارة للكابلات و/أو المواسير أو المرافق تحت الأرض وذلك فقط فى حالة قيام المؤمن له بالاستعلام من الجهات المختصة قبل بدء تنفيذ الأعمال عن الأماكن المحددة لتلك الكابلات أو المواسير أو المرافق الأخرى تحت الأرض و اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادى أى خسارة لها.

- المطالبات المتعلقة بالخسارة أو التلف للمرافق تحت الأرض فى نفس الموقع المحدد بالخرائط (الرسومات الدالة على أماكن المرافق تحت الأرض) سوف يتم سدادها بعد تطبيق تحمل بواقع 20% من قيمة الخسارة أو التحمل المحدد بالبند (أ) ادناه أيهما أكبر.

- المطالبات المتعلقة بالخسارة أو التلف للمرافق تحت الأرض والواردة فى الخرائط بصورة غير صحيحة سوف يتم سدادها بعد تطبيق التحمل الوارد بالبند (ب) أدناه.

وفى جميع الأحوال يكون التعويض مقصورا على تكاليف اصلاح تلك الكابلات أو المواسير أو المرافق تحت الأرض ويستثنى من ذلك أية خسائر أو انحرافات خارج نطاق التغطية.

التحمل : أ) 20% من مبلغ الخسارة بحد أدنى 40,000 جم للحادث الواحد

(14) ملحق رقم 103

استثناء الخسائر والأضرار التى تقع للمحاصيل

والغابات والزراعات

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى هذه الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة لن تعوض المؤمن له عن أية خسائر أو أضرار أو مسئولية مباشرة أو غير مباشرة قد تحدث للمحاصيل أو الغابات أو اية زراعات أخرى أثناء تنفيذ أعمال العقد.

Egypt C.R. No 7457/2001
Law 159/1981
Order no: 18 by the
Financial Supervisory Authority



مسجلة فى مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقا للأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.

ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

ملحق رقم 109

اشتراط بخصوص مواد الانشاء

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحقة بها ، فإن الشركة سوف تعوض المؤمن له فقط عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة التي تحدث لمواد الانشاء بسبب الفيضان وغمر المياه وذلك فقط اذا كانت هذه المواد لا تزيد على احتياجات ثلاثة أيام وتكون الكميات التي تزيد على ذلك قد حفظت في مناطق لم تتعرض لخطر الفيضان منذ 10 سنوات.



ملحق رقم 114

الخسائر المتكررة

من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشرط التالي يطبق على هذا التأمين:
الخسارة أو الضرر الناتج عن خطأ التصميم (إذا كانت مغطاة بملحق) المواد و/أو الصنعة المعيبة الناشئة عن ذات السبب لهيكل المبنى /أجزاء من هيكل المبنى ، الآلات أو المعدات التي من نفس النوع سوف يتم تعويضها طبقاً للنسب التالية وذلك بعد تطبيق التحملات الواردة بالوثيقة على كل خسارة :-

لأول خسارتين	%100
للخسارة الثالثة	%80
للخسارة الرابعة	%60
للخسارة الخامسة	%50

* لا يتم التعويض عن الخسائر الأكثر من ذلك



وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

حيث أن المؤمن له الوارد بجدول الوثيقة قدم إلى شركة رويال للتأمين المنوه عنها فيما بعد "بالشركة" طلبا كتابيا يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المؤمن له أساسا للتعاقد وجزءا متمما للوثيقة.
فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة، مقابل سداد المؤمن له القسط المبين بالجدول وطبقا للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أوفي الملاحق المكمل لها بتعويض المؤمن له بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

- لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلقيات أو المسؤوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:
- أ- حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تآمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط لجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن هيئات سياسية أو علي صلة بها تآمر ضد الحكومة مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلف أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.
 - ب- التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.
 - ج- الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المؤمن له أو ممثليه.
 - د- توقف العمل سواء كلياً أو جزئياً.
- في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المؤمن له.

مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل أو بعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لإجراء عقد المقاول المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين علي أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.
أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

القسم الأول - الأضرار المادية

- تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمؤمن له علي أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة علي وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال.
- تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.
 - يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلي ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمين الموضحة بالجدول.
 - وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المؤمن له عن تكلفة إزالة الأنقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول:

- لا تكون الشركة مسؤولة في جميع الأحوال عما يلي:
- أ- المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.
 - ب- الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.
 - ج- الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.
 - د- تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة و/ أو المصنعية المعيبة علي أن هذا الاستثناء يقتصر فقط علي البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.
 - هـ- الاستهلاك العادي والتآكل والصدأ أو التآكل والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.
 - و- الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/ أو الميكانيكي، قصور، كسر أو خلل، تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث وفتح عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.
 - ز- الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.
 - ح- الخسائر والتلفيات للملفات والرسوم والحسابات والفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود ومستندات الديون والأوراق المالية والتجارية وخطابات الضمان والشيكات.
 - ط- الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقاً للأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب ألا تقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:
بالنسبة للبنود الأولى:

إجمالي قيمة عقد المعاولة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبندين الثاني والثالث
القيمة الاستبدالية لمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببند جديدة من ذات النوع ونفس الكفاءة. ويتعهد المؤمن له بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة. وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المؤمن له يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً - أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

أ- في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات مستقطعة منه قيمة المخلفات.

ب- في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة مستقطعة منه قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون المؤمن له قد أنفق المبالغ ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي ثبت أن الإصلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة. هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوى أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب) وتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة

القسم الثاني: مسؤولية مدينة قبل الغير

تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له وبحد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المؤمن له مسؤولاً عن دفعها قانوناً كتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشديد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها

أ- الإصابات الجسدية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا)

ب- الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المؤمن له عن:

أ- كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المؤمن له

ب- كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة

ويشترط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى بالجدول



استثناءات خاصة بالقسم الثاني:

لا تتلزم الشركة المؤمن له عن :

- 1 - المبلغ / أو المبالغ التي يتحملها المؤمن له عن أي حادث والمذكور بجدول الوثيقة.
- 2 - المصاريف التي تتفق في إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.
- 3 - التلغيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أرض أو مبان بسبب الذنبيات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلغيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنتج عن مثل هذه التلغيات (ما لم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق)
- 4 - المسؤوليات الناتجة عن :
 - أ- الإصابات الجسدية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.
 - ب- الخسارة أو التلغيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.
 - ج - أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام / أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات.
 - د - أي اتفاق يبرمه المؤمن له ويلزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك ما لم يكن هذا الالتزام قائماً هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة بتطبيق على القسم الثاني

- 1 - يجب على المؤمن له أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير باسم المؤمن له أو نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى باسم المؤمن له في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.
- 2 - يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث تبرأ ذمة الشركة من أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الشروط العامة لوثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

(1) الإيصالات

لا يكون الوفاء بأي قسط ملزماً للشركة ما لم يسلم المؤمن له إيصال مطبوع موقع عليه من أحد مستخدمى الشركة المصرح لهم بذلك ومختوم بخاتم الشركة.

(2) التقيد بالأحكام والشروط

من الشروط السابقة لتحقيق أي التزام على الشركة أن يكون المؤمن له قد نفذ وتقيّد تماماً بتلك الأحكام والشروط الواردة بالوثيقة والتي تتعلق بأي أمر من الأمور الواجب عليه القيام أو الالتزام بها.

(3) الاحتياطات المعقولة

يتوجب على المؤمن له في جميع الأوقات أن يأخذ الخطوات للمدى المعقول عملياً لحماية الممتلكات المؤمن عليها وأن يبقوها في حالة سليمة وصالحة. كما وعلى المؤمن له أن يأخذ الخطوات اللازمة نحو تطبيق التقيد بكل التدابير الاحتياطية المطلوبة نظاماً وتوصيات المصنّعين والتعليمات الأخرى المتعلقة بسلامة واستخدام وفحص الممتلكات المؤمن عليها.

(4) المعاينة

يحق لممثلي الشركة - في أي وقت مناسب - معاينة وفحص الخطر المؤمن عليه، كما يجب على المؤمن له أن يقدم لممثلي الشركة كافة التفاصيل والمعلومات اللازمة لتقييم الخطر.

(5) التغيير

يجب على المؤمن له إخطار الشركة على الفور عن طريق الفاكس أو الهاتف مع تعزيز ذلك كتابةً بأي تغيير ملموس في الخطر وسببه وذلك على حسابه الخاص، وعليه فإن الاحتياطات الإضافية التي ستتخذ تبعاً للظروف بغرض ضمان التشغيل الآمن للبنود المؤمن عليها ومجال التغطية و/أو القسط قد يتم تعديلهم تبعاً لذلك عند اللزوم. ولا يحق للمؤمن له المباشرة في أو إقرار أي تعديل ملموس قد يزيد من احتمال وقوع الخطر إلا بعد تأكيد الشركة كتابةً على استمرار التأمين.

(6) المصلحة التأمينية

يتعين توافر مصلحة تأمينية مشروع للمؤمن له - طبقاً للقانون - في الشيء موضوع التأمين على أن تستمر تلك المصلحة التأمينية منذ بدء التعاقد وخلال سريان الوثيقة للمؤمن له ، وإذا انتقلت المصلحة التأمينية التي تكون للمؤمن له في الأشياء المؤمن عليها إلى الغير أثناء سريان الوثيقة سواء لانقضاء الملكية للغير أو لإفلاس المؤمن له فإن عقد التأمين يصبح بعد ذلك التاريخ لاغياً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ما لم يحصل المؤمن له أو الغير الذي انتقلت إليه المصلحة التأمينية على موافقة الشركة بمقتضى ملحق للوثيقة. ومع ذلك فإنه في انتقال المصلحة التأمينية إلى الخلف العام سواء بالوصية أو الميراث فإنه يكون لهؤلاء الورثة أو الورثة من جهة مهلة شهرين من تاريخ الانتقال لإبلاغ صفحتهم وطلب إثباتها بمقتضى ملحق للوثيقة وإلا اعتبر العقد لاغياً من تلقاء نفسه دون الحاجة تنبيه أو إنذار من قبل الشركة. انتهاء هذه المهلة.

Incorporated in Egypt C.E. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقاً لأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

(7) التزامات المؤمن له

أولاً خلال مدة التأمين

- 1- تعتبر التزامات المؤمن له الواردة فيما بعد سابقة على التزام الشركة بآية تعويضات تخص هذه الوثيقة:-
- 2- اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على الأشياء التي يشملها هذا التأمين كما لو لم يكن مؤمناً له بموجب هذا التأمين وتوفير وسائل الوقاية اللازمة مع المحافظة عليها في حالة جيدة واتخاذ إجراءات الصيانة الدورية اللازمة.
- 3- لممثل الشركة الحق في معاينة الأخطار المؤمن عليها في أي وقت مناسب ووضع التوصيات اللازمة لتحسين الخطر، وعلى المؤمن له تقديم كافة أوجه المعاونة والمستندات اللازمة.
- 4- يجب على المؤمن له إخطار الشركة فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة.
- 5- مراعاة أن يكون مبلغ التأمين مساوياً للقيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وفي وقت إبرام العقد وكذا أثناء سريان العقد.

ثانياً: في حالة وقوع حادث

- 1- إخطار الشركة فوراً بالحادث أو وفقاً لما هو محدد بالوثيقة وتعزيز ذلك كتابة وأن يسمح لممثل الشركة بإجراء المعاينة اللازمة.
- 2- إخطار السلطات العامة المختصة فوراً أو وفقاً لما هو محدد بالوثيقة.
- 3- أن يقوم خلال 15 يوماً أو أي مدة أطول تمنحها له الشركة من تاريخ وقوع الحادث على نفقته الخاصة بموافاة الشركة بما يلي:-
- كشفاً مفصلاً بملف محتويات المكان موضوع التأمين قبل الحادث وقيمتها مؤيدة بالمستندات.
- كشفاً مفصلاً وديقاً بالخسائر أو الأضرار التي نشأت عن الحادث وقيمتها وقت الحادث مؤيدة بالفواتير والمستندات (دون إضافة أي ربح)
- بياناً مفصلاً لجميع التأمينات الأخرى التي تكون قد أبرمت على الأشياء موضوع التأمين بمعرفته أو بمعرفة المستفيد (إن وجد).
- 4- اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للعمل على تقليل حجم الخسائر والأضرار للمحافظة على الأشياء التي أصابها التلف أو التي ظلت سليمة وتمكين ممثل الشركة من معاينتها وفحصها.
- 5- عدم قيام المؤمن له بإجراء أية إصلاحات أو الاعتراف بآية مسؤولية أو التفاوض بشأن أية مطالبة دون موافقة رسمية من الشركة.
- 6- تحويل أي خطاب أو إنذار أو دعوى قضائية وكافة المستندات اللازمة للدفاع عنه.
- 7- للشركة الحق في مباشرة الدعاوى الخاصة بهذه الوثيقة باسم المؤمن له أو التدخل فيها في أي مرحلة من مراحلها ويجب على المؤمن له تقديم كافة المستندات اللازمة وكافة أوجه المعاونة للدفاع عنه.
- 8- وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات السابقة أو تأخر في القيام بها سقط حقه في التعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول

(8) حقوق الشركة

- أ- للشركة الحق بمجرد وقوع حادث نتج عنه خسائر أو أضراراً للأشياء المضمونة بمقتضى هذه الوثيقة:-
- ب- أن تدخل المباني أو الامكنة التي وقع فيها الحادث وأن تشرف عليها وتتصرف فيها تصرفاً مطلقاً.
- ج- أن تتسلم أو تطالب بتسلم أي من الأشياء التي أصابها التلف والمضمونة بمقتضى هذه الوثيقة والتي كانت موجودة وقت الحادث في تلك المباني أو الامكنة.
- د- أن تتبع الأشياء المذكورة أو تتصرف فيها بآية كيفية أخرى لحساب من يكون له الحق فيها.
- 1- وللشركة مباشرة الحقوق المخولة لها بمقتضى هذا الشرط في أي وقت طالما:-
- 2- أن المطالبة لم تسوى نهائياً.
- 3- أن المؤمن له لم يخطر بها كتابة بأنه لن يتقدم بآية مطالبة بموجب هذه الوثيقة.
- 4- أن العميل تنازل نهائياً عن المطالبة التي يكون قد تقدم بها.
- 5- ولا تتحمل الشركة أية مسؤولية إزاء المؤمن له عن أي عمل تقوم به في مباشرة هذه الحقوق أو بقصد مباشرتها كما لا يخل ذلك على أي وجه بحقها في التمسك بأي حكم منصوص عنه في هذه الوثيقة دفعاً لآية مطالبة بالتعويض.
- 6- وإذا لم ينفذ المؤمن له أو ممثليه طلبات الشركة أو منعها من مباشرة الحقوق المخولة لها في هذا الشرط أو أثار عقبات في سبيلها سقط ما له ولخلفائه من حقوق بمقتضى هذه الوثيقة.
- 7- ولا يكون للمؤمن له الحق مطلقاً في أن يتخلى للشركة عن أي من الأشياء المؤمن عليها التي كانت بمكان الحادث سواء دخلت حيازتها أم لا.

(9) مبدأ التعويض وقاعدة النسبية

- 1- لا يجوز أن يكون التأمين بأي حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له، وإنما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي لحقت بالأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقية وقت وقوع الحادث.
- 2- ونتيجة لذلك إذا اتضح من التقدير الودي بين طرفي العقد أو من تقدير الخبراء أن قيمة الأشياء المؤمن عليها أقل من المبلغ المؤمن به عليها فإن المؤمن له لا يستحق تعويضاً إلا عن الخسائر الفعلية.

(10) إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية على أثر وقوع الحادث

- 1- بعد كل حادث يخفض المبلغ المؤمن به بمقتضى هذه الوثيقة تلقائياً بما يعادل قيمة الأضرار التي أقرتها الشركة أو دفعت تعويضاً عنها و يجوز بناء على طلب المؤمن له إعادة مبلغ التأمين إلى قيمته الأصلية أو ما يزيد وذلك نظير دفع قسط تأمين نسبي عن المدة المتبقية لحين انتهاء الوثيقة



(11) سقوط الحق

- أ- تسقط كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية:
إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلانها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين
- ب- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمديه.
- و يسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تتطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليس أو إذا كان الحادث مفتعلاً.

(12) إلغاء التأمين

- يجوز للشركة أن تلغى هذه الوثيقة بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.
- كما يجوز للمؤمن له طلب الإلغاء بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة بعد خصم مصاريف المعالجة التي صرفتها الشركة في حالة المعالجة بالاستعانة بالخبرة الخارجية عند إصدار الوثيقة ، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثرت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

(13) الحلول في الحقوق

- يجب على المؤمن له قبل حصوله على التعويض من الشركة أو بعد ذلك أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام ، على نفقة الشركة، بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق لمباشرة الدعاوى التي تحمل فيها محل المؤمن له والحصول من الغير على ابراء الذمة أو التعويضات التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمؤمن له بمقتضى هذه الوثيقة.

(14) المشاركة في التأمين

- إذا وجد سارياً وقت الحادث المؤمن عليه بمقتضى هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى ضامنة لنفس الأشياء ويكون المؤمن له أو أي شخص آخر قد أبرمها لحساب المؤمن له فإن الشركة لا تلتزم بتعويض هذه الخسائر أو الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها لجملة المبالغ المؤمن بها على الخطر المؤمن منه.

(15) إنهاء الأعمال أو الانسحاب

- في حالة قيام مالك المشروع بإنهاء عقد المقاوله و/ أو في حالة انسحاب المقاول الرئيسي من ذلك العقد تتوقف الوثيقة ما لم تسمح الشركة باستمرار التغطية بموجب ملحق للوثيقة.

(16) المحاكم المختصة

- كل المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحكمة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

(17) التقادم

- تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً لنص المادة (752) من القانون المدني المصري

(18) الإخطارات

- أ- جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه.
- ب- لا تكون الشركة ملزمة في أي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموعد انتهاء مدة الوثيقة ولا تكون أيضاً مسئولة عن أي حادث قد ينشأ بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة.

(19) الشرط الفاسخ

- للشركة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد القسط في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجود سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا يعتبر العقد مفسوخاً - فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد في خلال الفترة الممنوحة له فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول -
- و في جميع الأحوال تحتفظ الشركة بجزء نسبي من القسط عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد وحتى تاريخ الفسخ

(20) شرط التحكيم

- كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو تطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقاً لأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

فاتورة

رقم الوثيقة	:	5/1/051/0000908
المؤمن له	:	شركة الصالحين للمقاولات العامة (سليمان ابراهيم محمد ابراهيم و شريكه)
العنوان	:	بئر العبد - قرية رمانه - محافظة شمال سيناء
تاريخ السريان	:	2024 / 02 / 20
تاريخ الإنتهاء	:	2025 / 02 / 19

نرجو ملاحظة أن المبالغ المذكورة أدناه متوجبة الدفع فوراً

جنيه	قرش	
390	00	القسط الصافي
03	90	رسم الدمغة النسبية
29	00	الضريبة النوعية
02	34	مصاريف الإشراف والرقابة 6 %
00	39	خدمات اعتماد و تعديل الوثائق 1 %
00	78	صندوق ضمان حملة الوثائق 2 %
173	59	مصاريف الإصدار
600	00	الجملة
قيمة العمولات الاساسية المنصوص عليها بهيكل العمولات المعتمد للشركة قبل الاستقطاعات : 10%		

المبلغ بالحروف: فقط ستمائة جنيها مصريا لا غير

تحريراً في : 2024 / 02 / 20

شركة رويال للتأمين
Signature
Underwriting Department
ROYAL INSURANCE CO. EGYPT
مصر - القاهرة
القاهرة - مصر

Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقاً للأحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This Debit or Credit Note is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذا الإشعار سواء مدين أو دائن لن يكون ساري المفعول ما لم يختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين



ROYAL
INSURANCE

شركة رويال للتأمين (ش.م.م)
ROYAL INSURANCE CO
ممثل شبكة رويال أند صن الاندس للتأمين بمصر
Egypt Network Partner of R S A
Hotline 16902

وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية


المقدمة

بناء على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/أو المؤمن عليه والمقدم إلى الشركة، والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، مقابل سداد التأمين المبين في جدول الوثيقة.
تتعهد شركة رويال للتأمين - المنوه عنها فيما بعد بالشركة - بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه - طبقاً لما هو مبين فيما بعد - وذلك عن أية إصابة جسمانية نتيجة حادث مغطى بالوثيقة ويشترط أن يكون الحادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر والذي يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها .
ولا يتعدى التزام الشركة أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند.

جدول الوثيقة

إجمالي القسط المستحق على المؤمن له			رقم الوثيقة 5/1/051/0000908
			اسم المؤمن له: شركة الصالحين للمقاولات العامة (سليمان ابراهيم محمد ابراهيم وشريكه)
			عنوانه: بئر العبد - قرية رمانه - محافظة شمال سيناء
			موضوع التأمين:
			تأميناً على عدد (4) أفراد غير محددين الاسماء وفقاً للكشف المرفق بمبلغ تأمين وفقاً للكشف المرفق
			وصف المشروع : مشروع تنفيذ أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع خط (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكيلو 390.00 الى الكيلو 391.600 بطول 1.600 كم والمسافة من الكيلو 392.400 الى الكيلو 392.900 بطول 0.500 كم (استكمال اعمال حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة) (عقد رقم 2024/2023/1083)
جنية	قرش	بالجنية المصري	إجمالي مبلغ التأمين: 130,000 جم (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري)
390	00	القسط الصافي	السن: أكبر من 16 عام واقل من 65 عام
03	90	رسم الدمغة النسبية	أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن عليه وصلة كل منهم به:
29	00	الضريبة النوعية	الهيئة العامة للطرق والكبارى
02	34	مصاريف الإشراف والرقابة 6 %	مدة التأمين : 12 شهراً ميلادياً
00	39	خدمات اعتماد وتعديل الوثائق 1 %	يبدأ التأمين
00	78	صندوق ضمان حملة الوثائق 2 %	وينتهي
173	59	مصاريف الإصدار	
600	00	الجملة	
			في يوم 2024/02/20 م
			في يوم 2025/02/19 م كلا اليومين مشمولين

Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٢٠٠٢٠٧٤٥٧
وفقاً للأحكام قانون رقم ١٩٨١ / ١٥٩
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

التغطيات	مبلغ التأمين
إذا توفي المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي للمستفيدين مبلغ وقدره وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (أولاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.	وفقاً للكشف المرفق
إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغاً وقدره وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثانياً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.	وفقاً للكشف المرفق
إذا أصيب المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث يؤدي له مبلغاً يحدد وفقاً لما جاء بالبند الأول (ثالثاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.	وفقاً للشروط
إذا أصيب المؤمن عليه بعجز كلي مؤقت عقب الحادث يؤدي له مبلغاً وقدره (-) أسبوعياً بواقع 5 في الألف من مبلغ التأمين في حالة العجز الكلي المستديم الوارد بالبند ثانياً من هذا الجدول طوال مدة العجز وبحد أقصى 52 أسبوعاً من تاريخ وقوع الحادث له وذلك وفقاً لما جاء بالبند الأول (رابعاً) من الشروط العامة لهذه الوثيقة.	غير مغطى
تغطية استبدال المفتاح وفقاً للشروط المرفقة	غير مغطى

الشروط الخاصة بوثيقة الحوادث الشخصية

- 1- الحد الأقصى للتعويض للفرد الواحد هو مبلغ التأمين لكل فرد وفقاً للكشف المرفق
- 2- الحد الأقصى للتعويض للحوادث الواحد مهما بلغ عدد الافراد هو وفقاً للكشف المرفق
- 3- يشترط لسريان التغطية التأمينية ان يكون عدد العاملين لدى الشركة هو كامل السعة الوظيفية المؤمن عليها و في حالة اختلاف العدد عن العدد المبلغ للشركة يشترط اخطار الشركة بالعدد الجديد حتى يتم احتساب القسط وفقاً لذلك.
- 4- السعر التأميني تم احتسابه بعد خصم كافة الخصومات الممنوحة.
- 5- يشترط ان يكون المؤمن عليهم من العمالة الدائمة بشركة المؤمن له و مؤمن عليهم إجتماعياً لدى هيئة التأمينات الاجتماعية و خاضعين لقانون العمل
- 6- من المعلوم والمتفق عليه ان التغطية التأمينية تقتصر على الحوادث التي تقع اثناء و بسبب العمل فقط.
- 7- الحد الأقصى للتعويض للفرد الواحد للحوادث الواحد هو مبلغ التأمين لكل فرد كما هو موضح بالكشف المرفق.
- 8- يشترط لسريان التغطية التأمينية ان يكون عدد العاملين لدى الشركة بكل مسمى وظيفي هو كامل السعة الوظيفية المؤمن عليها و في حالة اختلاف العدد عن العدد المبلغ للشركة يشترط اخطار الشركة بالعدد الجديد حتى يتم احتساب القسط وفقاً لذلك.
- 9- السعر التأميني تم احتسابه بعد خصم كافة الخصومات الممنوحة.
- 10- من المعلوم والمتفق عليه انه يشترط لصرف اى تعويض قد يستحق بموجب هذه الوثيقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى ان يتم موافاتنا بما يفيد قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد تلك التعويضات للمؤمن عليه في حالة حياته أو للورثة الشرعيون في حالة وفاته.
- 11- من المعلوم والمتفق عليه ان التغطية التأمينية تقتصر على الحوادث التي تقع اثناء و بسبب العمل فقط.



1. خطر الحروب والدوافع السياسية كما هو موضح:

"يستثنى من هذه الوثيقة الخسارة والهلاك والتلف الحادث بسبب أو من خلال أو كنتيجة لما يلي على نحو مباشر أو غير مباشر:
حرب أو غزو أو عمل يقوم به أعداء أجنبية أو أعمال عداوية أو عمليات شبيهة بالحروب (سواء أعلنت حالة حرب أم لا) أو حرب أهلية
التمرد أو العصيان المدني في حجم أو يصل إلى انتفاضة شعبية أو انتفاضة عسكرية أو عصيان مسلح أو تمرد أو ثورة أو اغتصاب السلطة أو أي عمل يقوم به أي شخص يعمل لحساب أو له علاقة بأي منظمة ذات نشاط موجّه إلى تسخير القوة في إسقاط الحكومة الشرعية أو القائمة أو إلى التأثير عليها عن طريق ممارسة الإرهاب أو العنف أو القانون العسكرية أو مصادرة الممتلكات أو التأميم أو الاستيلاء على المال، الخاص أو تدمير أو إلحاق التلف بالممتلكات من خلال أو بموجب أمر أي حكومة أو سلطة شعبية أو محلية".

2. خطر الإرهاب كما هو موضح:

بخلاف ما ورد في نص هذا التأمين أو أي ملحق تابع له، من المتفق عليه أن هذا التأمين يستثنى الخسارة أو التلف أو التكلفة أو المصروفات أيا كانت طبيعتها تسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر عمل إرهابي أو نتجت عنه أو اتصلت به بغض النظر عن أي سبب أو حدث آخر يسهم فيها أو أي نتيجة تترتب على الخسارة.
يقصد بالعمل الإرهابي في سياق هذا الملحق العمل الذي يتضمن ولا يقتصر على استخدام القوة أو العنف و/أو التلويح بهما، الصادر عن أي شخص أو مجموعة (مجموعات) من الأشخاص الذين يتحركون بمفردهم أو يمثلون تنظيمًا (تنظيمات) أو حكومة (حكومات) أو على صلة بها، وقد ارتكب بغية أغراض سياسية أو دينية أو أيولوجية أو ما شابه ذلك متضمنة تعمد التأثير على أي حكومة و/أو ترويع الشعب أو فئة منه.
يستثنى هذا الملحق أيضا الخسارة أو التلف أو التكلفة أو المصروفات أيا كانت طبيعتها المتسببة بشكل مباشر أو غير مباشر عن أي إجراء يُتخذ بصدد مكافحة العمل الإرهابي أو منعه أو قمعه أو تتعلق به بشكل أو بآخر.
في حالة ادعاء الجهات المؤمنة عدم تغطية التأمين أية خسائر أو تلفيات أو تكاليف أو مصروفات بسبب هذا الاستثناء، فإن مسؤولية إثبات ما هو خلاف ذلك تقع على عاتق المؤمن له.
في حالة ثبوت أن أي جزء من هذا الاستثناء غير ساري أو غير قابل للتنفيذ، تكون الأجزاء الباقية سارية ونافاذة على نحو كامل.

اسم وسيط التأمين : ساميه محمود اسماعيل خضر
رقم القيد بالهيئة : 23826

تحريراً في 2024/02/20



Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority



مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقا للحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملحوظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تختم من قبل إدارة الإصدار بشركة رويال للتأمين

كشف مرفق للوثيقة رقم 5/1/051/0000908

مبلغ التأمين "جم"	وظيفة المؤمن عليه	العدد	م
75,000	مهندس	1	1
30,000	مساعد فني أو ملاحظ فني	1	2
15,000	سائق	1	3
10,000	عامل	1	4
130,000	الإجمالي		

شركة رويال للتأمين
مصر
15/1/2001

Incorporated in Egypt C.R. No. 7457/2001
Regulated by law 159/1981
Registered under no. 16 by the
Egyptian Financial Supervisory Authority

Important Note: This policy is not valid unless stamped by the Underwriting Department of Royal Insurance Co.
ملاحظة هامة: هذه الوثيقة غير سارية المفعول ما لم تفتح من قبل إدارة الاصدار بشركة رويال للتأمين.



مسجلة في مصر تحت س.ت. رقم ٧٤٥٧ / ٢٠٠١
وفقا لاحكام قانون رقم ١٥٩ / ١٩٨١
مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم ١٦

المقدمة

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين وأو المؤمن عليه والمقدم إلى الشركة والذي يعتبر جزءاً متمماً لهذه الوثيقة، مقابل سداد التأمين الجزئي في حدود الوثيقة تتعهد شركة رويال للتأمين - المنوه عنها فيما بعد بالشركة - بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه - طبقاً لما هو مبين فيما بعد - وذلك عن أية إصابة حتمية نتيجة حادث مغفط بالوثيقة ويستلزم أن يكون الحادث فجائي عارض عنيف خارجي وظاهر ومستقل عن أي سبب آخر والذي يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبيّنة في الجدول ويتربط عليها وحدها الوفاة أو العجز وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والأحكام والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها وذلك خلال مدة التأمين المبيّنة بحدود الوثيقة أو أي مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها ولا يتعدى التزام الشركة عن أي بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند

الشروط العامة

البنود الأولى: الحالات التي يشتملها التأمين

الكلّي المستديم المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي:

(١) الأطراف العليا:	نسبة العجز - الجزئي	نسبة العجز - الجزئي	نسبة العجز - الجزئي	نسبة العجز - الجزئي
الفقد الكامل لذراع أو يد	٪٦٠	٪٥٠	الفقد الكامل	٪٢٥
الفقد الكامل لحركة الكتف	٪٢٥	٪٢٠	ثلاثة أضعاف غير الإبهام والسبابة	٪٢٥
الفقد الكامل لحركة المعصم	٪٢٠	٪١٥	الفقد الكامل للإبهام فقط	٪٢٠
الفقد الكامل لحركة المرفق	٪٢٠	٪١٥	الفقد الكامل للسبابة فقط	٪١٥
الفقد الكامل للإبهام والسبابة	٪٢٠	٪١٥	الفقد الكامل للوسطى فقط	٪١٥
الفقد الكامل للإبهام والأصبع	٪٢٥	٪٢٠	الفقد الكامل للوسطى فقط	٪١٥
غير السبابة	٪٢٠	٪١٥	الفقد الكامل للإبهام فقط	٪٢٠
الفقد الكامل للسبابة والأصبع	٪٢٠	٪١٥	الفقد الكامل للوسطى فقط	٪١٥
غير الإبهام	٪٢٠	٪١٥	الفقد الكامل للإبهام فقط	٪٢٠

ثانياً- حالة العجز الكلّي المستديم:

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية:

فقد إبط العينين نهائياً

فقد الساقين أو القدمين

فقد ذراع وقدم

فقد يد وقدم

كما يعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة ولا يستحق للمضروب المؤمن عليه أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً.

ثالثاً: - حالة العجز الجزئي المستديم:

تؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز



المركز الرئيسي
العنوان : ٤٨ شارع مصر، الجبل، أبو العز - الجيزة
الهاتف : ٠٢ ٣٣٣١٩٩٩
فاكس : ٠٢ ٣٦٥٩٦٨٥

Tel.: + (02) 33312999

Fax: + (02) 3760 9685

Head Office
Address: 48 Mohie Eldin Abou Elezz st., Dokki, Giza
PO: Box 46, Dokki 12311

HOT LINE 16902

التي لها علاقة بالسلامة على طلب المؤمن له

البند السابع: وقوع الحادث

تعتبر سلامة المؤمن له من أهم أهداف التأمين. ويجب أن تكون الوثيقة بليغاً في بيانها لخطر وقوع الحادث. ويجب أن تكون الوثيقة بليغاً في بيانها لخطر وقوع الحادث. ويجب أن تكون الوثيقة بليغاً في بيانها لخطر وقوع الحادث.

أولاً: يجب على المؤمن له أو من يتوسط عنه التمتع بتعليمات الشركة بخصوص توقيف الكشف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة الذي يقوم بفحص المؤمن عليه متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة

(ج) ان يقدم للشركة كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة واية مستندات متعلقة بالإصابة او الوفاة

وإذا لم يقدم المؤمن له او من يتوسط عنه بالالتزامات المذكورة اعلاه او تأخر في القيام بها يسقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يتبين من الظروف ان تأخره كان لعذر مقبول

البند الثامن: الغاء التأمين

يجوز للشركة ان تلغي هذه الوثيقة بعد انقضاء عشرة ايام من إخطار المؤمن له بخطاب موصى عليه يرسل اليه على آخر عنوان معروف له، وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له الأقساط المدفوعة بعد خصم الجزء من القسط المناسب مع المدة التي كانت فيها الوثيقة سارية المفعول.

كما يجوز للمؤمن له ان يطلب الغاء هذه الوثيقة في أي وقت ويكون الإلغاء من يوم وصول الطلب للشركة وفي هذه الحالة ترد الشركة إلى المؤمن له القسط بعد خصم الجزء المناسب مع المدة التي كانت الوثيقة سارية فيها حسب فئات التأمين القصيرة الأجل بشرط الا تكون هناك مطالبة قد اثرت خلال مدة سريان الوثيقة وان يقدم الشركة إقرار بسلامة عهددة المؤمن عليه ولا يحق للمؤمن له المطالبة بآية تعويضات تم إكشافها بعد الغاء الوثيقة.

البند التاسع: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تصديق الشيك المخرر بقيمة القسط لسبب يرجع اليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقوف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فrazاً لم يقدم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له و المستفيد بفسخ العقد و ذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

5 الإخطار الطبيعية (الفيضانات والبراغيث والعواصف والبراغيث والزلزال والسيول وحركة المد والجزر)

6 السفر على الطائرات الخاصة

7 ممارسة الأنشطة الرياضية التي قد تعرض لمخاطرها مثل المصارعة والملاكمة واليهوكي والبول ورياضة القذف و تسلق الجبال والسيان والصيد والعطس وركوب المظلات والركوب وركوب الطائرة الشراعية والاهليجات بالمطارات او القيام بأجراء اصدار تصاريح السفر

8 مصادر الجسارة

البند العاشر: التعويض والتعويضات

جميع انحاء العالم من جميع انحاء ذلك

البند الحادي عشر: التجميع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت المبين بالجدول بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو العجز في المستقبل. ولا يجوز التجميع بين المزايا المنصوص عليها لحالات الوفاة والعجز الكلي أو العجز في المستقبل. فإذا كان المؤمن عليه قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في آيا من حالاتي العجز المستندي وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة خلال فترة الاثني عشر شهراً التالية لوقوع الحادث المؤدي إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مضموماً منه المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستندي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستندي أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الثاني عشر: تغيير الخطر

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأي عمل خلاف المذكور مراححة في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المؤمن عليه تسقط كافة الحقوق في أي تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أي حادث يقع بسبب مزاوته لهذا العمل الجديد. الا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابية على هذا التعديل مع سداد القسط الإنشائي المناسب على ان يتم ذلك جميعه قبل وقوع أي حادث.

البند الثالث عشر: الاخطارات

(أ) جميع الاخطارات التي يتعين إبلاغها الى الشركة يجب ان تكون كتابية وان توجه الى الجهة التي اصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية او خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه
(ب) لا تكون الشركة ملزمة بأي حال من الاحوال بإخطار المؤمن له بوعود انتهاء مدة الوثيقة ولا تلزم بتجديدها ولا تكون ايضاً مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة

وإذا كان المؤمن عليه أعسر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي فإن الفئات المخصوص عنها وعالية بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.

(٢١) الأطراف السفلى:			
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما فوق الركبة	٥٠٪	الفقد الكامل لحركة الركبة	٣٠٪
الفقد الكامل لطرف سفلي إلى ما تحت الركبة	٤٠٪	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	١٥٪
الشرخ العميق في القدم	٢٠٪	الشرخ العميق في القدم	٨٪
الفقد الكامل لحركة الحرقفة	٢٠٪		

(٢٢) المرسور:			
كسر لم يلتحم بالساق	٣٠٪	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	٢٥٪
كسر لم يلتحم بالقدم	٢٠٪	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضطرابات وظيفية	١٠٪
كسر لم يلتحم بالرسغ	٢٠٪		

(٤) الصمم وانكماش الأطراف وفقد الأبصار:			
الصمم التام	٤٠٪	انكماش طرف سفلي خمسة (٥) سنتيمترات على الأقل	١٥٪
صمم إحدى الأذنين	١٥٪	الفقد الكامل لعين واحدة	٢٥٪

ويعتبر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف والعضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف أو الاعضاء كله أو بعضه فقداً جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل، أما بالنسبة لحالات العجز المستديم الغير واردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط أن يقرها طبيب الشركة على أنه من المتفق عليه ما يلي:

١. إنه إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أي أجزاء من أحد الأطراف أو الاعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى بأي حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلي المستديم. ٢. لا يستحق للمؤمن عليه أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف أو أعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

رابعاً: - حالة العجز الكلي المؤقت:

تؤدي الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعي المبين بجدول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بالعجز الكلي المؤقت بواقع (٥ في الالف)

من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلي المستديم وبعد اقص ٧٠٪ من الاجر الأسبوعي طوال المدة التي يلازم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة أي عمل كان، ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبي ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة. ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة (٧).

البند الثاني: الاستثناءات

أولاً: استثناءات عامة

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عن أي من الحالات الآتية:

١. بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التآمر ضد نظام الحكم وكذا الافراد التابعين للقوات المسلحة أو الشرطة ما لم تكن التغطية لقيامهم بأعمال مدنية
٢. الاشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعي من أي وقود نووي أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أي اجزاء منها
٣. السفر على الطائرات الحربية.
٤. انتحار أو محاولة انتحار أو تعمد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أعمال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه ارادياً لخطر غير ضروري (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص انقاذ نفس بشرية)
٥. فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر.
٦. استخدام الاسلحة الكيماوية أو البيولوجية

ثانياً: استثناءات لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل قسط إضافي) لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو العجز الكلي المؤقت التي تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عن أي من الحالات الآتية: * ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمؤمن عليه مقابل قسط إضافي - وفقاً لما ورد بالتغطيات الإضافية:

١. العلاج من الإصابة للحالات المغطاة بالوثيقة
٢. النقل بالإسعاف من موقع الحادث الى أقرب مستشفى
٣. الشغب والاضطرابات الاهلية والاضرابات العمالية والارهاب والتخريب شريطة ان يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الاعمال وليس مشاركاً فيها
٤. الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن أو حرب اهلية أو ثورة أو تآمر أو اعمال قوة عسكرية أو سلطة غاشية أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتنة أو العصيان

محضر إستلام موقع

مشروع: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة القطاع
من المحطة 390+000 الي 391+600 ومن المحطة 392+400 إلى 392+900 أعمال
حماية الميول والبلاطات الخرسانية والتربة المسلحة
تنفيذ: شركة الصالحين للمقاولات العامة

إشراف : المنطقة الخامسة – منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (1083/2023/2024) بتاريخ 2024/1/31

إنه في يوم/ الخميس الموافق 2024/02/22 اجتمع كلاً من:-

- 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 2- السيد المهندس /مارجريت مجدي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 3- السيد المهندس / محمد عادل مدير مشروع الشركة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لإستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداة في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2024/02/22 هو تاريخ إستلام الموقع وبداة الأعمال بالعملية.
وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3-

2-

1-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

