

محضر الاستلام الابتدائي

الخاص بعملية أعمال كوبري دوران للخلف كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية

ضمن مشروع تطوير طريق وادي النطرون - العلمين

تنفيذ شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/ ٩/ ٨ وبناء على موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عالية اجتمع كل من السادة الاتي أسمائهم.

اللجنة :-

١	السيد المهندس / محمد محمود محمد اباظة	رئيسا
٢	السيد المهندس / وليد عبد العزيز	عضوا
٣	السيد المهندس / محمد فوزي	عضوا
٤	السيد المهندس / احمد ندا	عضوا
٥	السيد المهندس / محمد حاتم عبدالعليم	جهاز الاشراف
٦	السيد المهندس / حسام نزيه وهبة عيسى	الشركة المنفذة

توصيات اللجنة : السيد المهندس / محمد صلاح محمد حسين استشاري كباري (مصر - باحوم)

أولاً : الأعمال المدنية

- يتم خصم مبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠) عشرون ألفاً جنيه مصري فقط لا غير نتيجة عدم استكمال بعض الملاحظات للأعمال المدنية والتي لا تؤثر على أعمال الاستلام الابتدائي للمشروع.

ثانياً : أعمال الطرق :

- أعمال سطح الطريق يتم تنفيذها بواسطة شركة اخرى
- أعمال الحميات الخرسانية - مقبولة بصفة عامه فيما عدا ما تلاحظ من وجود بعض الشروخ العرضية وبعض الخشونة والتكشيف وعدم استواء السطح والمناسيب في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بخصم مبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠) عشرون ألفاً جنيه مصري فقط لا غير

ثالثاً : أعمال الكهرباء :

- يتم خصم مبلغ وقدرة (٦٠٠٠) جنيه ستة الاف جنيه مصري فقط لا غير نتيجة سوء مصنعية عدد (٢) قاعدة خرسانية لعمود من أعمدة الانارة
- قامت الشركة المنفذة لأعمال منظومة الطاقة الشمسية بتقديم شهادة ضمان للمنظومة (إنارة الطاقة الشمسية) لمدة ٥ سنوات يتم خلالها الاستبدال والتركيب ضد عيوب الصناعة أو أي مشاكل تظهر خلال هذه الفترة (مرفق صورة)

وبالمعينة الظاهرية على الطبيعة تبين ان جميع الأعمال بحالة جيدة ، لذا ترى اللجنة بانه لا مانع من استلام الأعمال استلاماً ابتدائياً لجميع الأعمال مع الأخذ في الاعتبار لتوصيات اللجنة .

وتحرر محضرا بذلك واستلم كل طرف صورة للعمل بها

اللجنة

جهاز الإشراف

الشركة المنفذة

١- السيد
٢- السيد
٣- السيد
٤- السيد
٥- السيد
٦- السيد

١- السيد

١- السيد

استشاري كباري
(مصر - باحوم)
ع / محمد صالح

شهادة ضمان

عدد كشافات الإنارة: 65 كشاف

تاريخ التسليم: 1 يونيه 2024

بيانات العميل

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري
المقاول الرئيسي: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
العنوان: كباري دوران خلف ضمن مشروع تطوير بطريق وادي النطرون-العلمين

بنود وشروط الضمان

1- الضمان:


تضمن شركة سولير إيجيبت لحلول توليد الطاقة (ش.م.م.) كشافات الطاقة الشمسية ومشتملاتها ضد عيوب الصناعة والتشغيل الناتج عن خطأ في التصميم أو التركيب أو المواد المستخدمة التي تدخل في نطاق هذا المشروع، الذي تمتد فترة ضمانه لمدة خمسة أعوام علي النظام بالكامل ويتم تفعيلها من تاريخ التسليم الابتدائي لاستشاري المشروع و صرف كامل مستحققاتنا ، ويشتمل الضمان على الإصلاح إن أمكن للأجزاء المعيبة أو التالفة من المكونات خلال فترة الضمان أو إستبدالها في حالة الضرورة على نفقة شركة سولير إيجيبت الخاصه خلال فترة أقصاها أسبوعين من وقت إبلاغ العميل عن العطل أو المشكلة التي يواجهها.

لا يمتد أو يسرى الضمان نتيجة العيوب الناتجة عن عدم العناية أو المناولة أو الصيانة بواسطة أفراد لا يعملون لدي سولير إيجيبت .

2- شروط عامة:

في حالة تقديم بلاغ بعطل لشركة سولير إيجيبت يتم تشكيل لجنة فنية من المقاول الرئيسي و ممثل العميل لمعاينه ومعرفة نوع العطل واسبابه وما إذا كان العطل ناجم عن عيب صناعة أم سوء إستخدام او صيانه. وعرض تقرير اللجنة على إدارة شركة سولير إيجيبت لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر وإبلاغ العميل بها في مدة لا تزيد على 48 ساعه أيام من تاريخ صدور تقرير اللجنة. وإذا أثبت التقرير وجود عيب صناعة أو تركيب تلتزم شركة سولير إيجيبت بتغيير أو إصلاح القطعة المطلوبة (بشرط وجود النظام في فترة الضمان).

رئيس مجلس الإدارة



المهندس / إبراهيم سامح على حسب الله

مقايمة ختامية

بخصوص :- اعمال كوبرى دوران للخلف عند الكم ٦٦,٢٠٠ بدون اعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى
النظرون العلمين

مقاوله :- شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامى

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم أعداد المقايسة الختامية المرفقه لكافة بنود العملية

باجمالى مبلغ ٦٥٦٠٧٩٢٠,٣٧٠ جنيها (فقط وقدره ستمائة ستة وخمسون مليون تسعة وسبعون الف تسعمائة

وعشرون جنيها و٣٧٠/١٠٠ لا غير)

مهندس / مدير عام المشروعات

الاسم : محمد هسي باب

التوقيع : ع

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم : م/ ٥٦٩

التوقيع : ع

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالإسكندرية/ مرسى مطروح)

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

المالك: وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقايمة ختامية أعمال كوبرى الدوران للخلف رقم ٥ (كم ٢٠٠+٦٦) بدون اعمال المداخل الترابية

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	ثمنه (جنيه)	الاجملى (جنيه)
أعمال الكبارى					
	بالمقنطرة عمل تحويلية منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور	مقطوعة	١,٠٠	٥,٥٥٠	٥,٥٥٠
١	بالمتر الطولى أعمال الرقع المساحى للمرافق والمعارضات	م.مط	١٠٠,٠٠	١١	١١٠٠
٢	أعمال الجسات بالبر للتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	م.مط	٢٨٠,٠٠	٣٨٥	١٠٧٨٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل نهائياً وإيلا والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٠	٧٥	٠
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهيو العمل والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل ١٠ كم . علاوة ١ : جنية لكل كيلو متر بالزيادة والتقصان .	م.م	٠	٦٠	٠
٥	بالعد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والادوات اللازمة لتفك والتكريب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفك الماكينة واعادة تجميعها بالموقع في حالة الامان الضيقة أو استخدام أوناش بكمولات مختلفة لتزليل الماكينة وملحقها أو أي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة واستمرارها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع التكرات اللازمة	عدد	٠	٥,٥٥٠	٠
٦	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	عدد	١,٠٠	٢٤٦,٠٠٠	٢٤٦,٠٠٠
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سن على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المسانحة (السعر لا يشمل الحديد) ونهيو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.مط	٦٧٩,٣٥٠	٤٥٩٠	٣١١٨٢١٦,٥٠
٨	بالعد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر بحمل ١٥٠ ٪ من حمل التشغيل والبند يشمل نهيو العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	عدد	١,٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدن جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٦١٥,٠٠	٧٠	٤٣٠,٥٠
١٠	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدن جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٠	١٠٠	٠
١١	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٣٨,٠٠	٩٠	٣٤٢٠
١٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لتقوية المصبوبة للخوازيق المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدن جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جمية طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٦٦٢,٥٠	٩٠	٥٩٦٢٥٠
١٣	بالمتر المكعب توريد ودم رمال نظيفة أو تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى القصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٢٤٠,٠٠	١٤٥	٣٤٨٠٠
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م.م	٣٢,٤٦٤٠	١٨٠٠	٥٨٤٣٥,٢٠
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م.م	٤٩٩,٣٧٠	٢٤٨٠	١٢٣٨٤٣٧,٦٠
١٦	بالعد نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى	م.م	٤٩٩,٣٧٠	١٥٠	٧٤٩٠٥,٥٠
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاصعدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوي الاسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة أو منزلقة بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . (حتى متر)	م.م	١٣,٧٢٣	٣١٥٠	٤٣٢٢٧,٤٥٠
١٨	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر	م.م	١٨٦,٥٥٠	٣٢٥٠	٦٠٦٢٨٧,٥٠

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى قياض

مدير المشروع
مهندس / محمد حاتم عبدالعليم

استشارى المشروع (محرر-باجوم)
مهندس /

مهندس /

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع



الشركة المنفذة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

المالك : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايضة ختامية أعمال كوبري الدوران للخلف رقم ٥ (كم ٢٠٠+٦٦) بدون اعمال المداخل الترابية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة (جنية)	الاجملى (جنية)
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكاي فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٠	٣٣٨٠	٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م ^٣	١٥٥٨,١٠	٣٤٨٠	٥٤٢٢١٨٨
	علو نتيجة زيادة الابهاد الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	م ^٣	١٥٥٨,١٠	٧٥	١١٦٨٥٧,٥٠
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكاي فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٠	٣٢٨٠	٠
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	م ^٣	١٩٣,٨١٠	٣٣٨٠	٦٥٥٠٧٧,٨٠
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكر سابق الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكاي فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٣٣٥,٢٨٠	٤٠٦٠	١٣٦١٢٣٦,٨٠
٢٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب واعلى الكمرات المعدنية لجهاد ٤٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبكاي فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفتنة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .	م ^٣	٢٩٩,٩٠	٢٥٦٠	٧٦٧٧٤٤
٢١	بالمتر توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لن ترد برسومات السطء السعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة للتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للتعامل نهوا كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١١٦٧,١٤٣٠	٣٧٩٠٠	٤٤٢٣٤٧١٩,٧٠
٢٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على الجار والسعر يشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم للعمل نهوا كاملا والقياس هندسي طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٧٥٠	٥٠	٣٧٥٠٠
٢٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات اساس الاكثريك ماثعة للتلفاضة لعزل جسم الكوبري والتاج احدي الشراكات المتخصصة وعمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخدمات قبل التوريد .	م ^٢	٥٤٧٧,٠٤٤٠	١٠٥	٥٧٥٠٨٩,٦٢٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز طبقاً للمواصفات واشترطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يعادلها من الشراكات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث الانزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترتفع من الطءاء التكنولوجيات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استحداثها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها طبقاً لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحموله والفتنة تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ورفع جميع الكارئات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث وكل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٠	٠	٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز بدون جوايط C4 حمولة ٢٥٠ طن	عدد	٢٠,٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠٠
	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة بجوايط C2 مقاس حمولة ٥٥٠ طن	عدد	٤,٠٠	٨٦٠٠٠	٣٤٤٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفتة طبقاً للحركة الطبيعية بابعاد (10 سم عرض * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخدمات المستعمدة من الاستشاري قبل التنفيذ والفتنة تشمل اعمال التفسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة واصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح + - ٥ سم .	م ^ط	٦٢,٠٠	٤٤٠٠	٢٧٢٨٠٠
٢٦	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبرين مسلح بعرض + - ٥ سم	م ^ط	٠	٦٥٠٠	٠
٢٧	بالعدد تجربة تحميل استاتيكي للكوبري قبل الفتحاة للاجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع ادوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لاختبار التحميل والبند يشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٠	١٠٠٠٠٠	٠
	بالمتر المسطح اعمال تطهير وتمهيد الموقع العام تمهيدا لاعمال الرقع المساحي شامل النقل للمقالب العمومية والفتنة تشمل عمل كل ما يلزم للعمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٠	٥	٠
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢٠) بوصة وكل ما يلزم للعمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^ط	٢٤٦٠,٠٠	٢٠٠	٤٩٢٠٠٠
	اجملى اعمال الكباري				٦٠٥٥٥٠١٨,١٧٠

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسني فياض

مدير المشروع
مهندس / محمد حاتم عبدالعليم

استشاري المشروع (محرم باخوم)

الشركة المنفذة

التوقيع

التوقيع / 2

1/23/2019

$\Delta \cdot Y = Y$

الشركة المنفذة: فأصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

المالك : وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى

مقايمة ختامية أعمال كوبرى الدوران للخلف رقم ٥ (كم ٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	لغة (جنيه)	الاجملى (جنيه)
أعمال الطرق					
١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	٢٥	٢٥	٠
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	٨,٣٥	٨,٣٥	٠
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها واللفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	١٣١	١٣١	٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها واللفة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	١٢٥	١٢٥	٠
٥	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات وعلى ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) محتوي اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² واللفة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار (١٠ Ø 10) / م ² ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٧٥٩,٦٦٠	٥٥٠	٤١٧٨١٣
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٨٠,٨ م ³ من دولوميت متدرج ٠,٤+ ٣ م ³ رمل حرش ٢٥٠+ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والزلزال خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² وتنشيط السطح والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	١٠٨٧٢,٧٢٠	٢٣٥	٢٥٥٥٠٨٩,٢٠
اجملى أعمال الطرق					٢٩٧٢٩,٠٢,٢٠
الأعمال الكهربائية					
١	بعد توريد وتركيب واختبار عمود انارة من الحديد المجلفن بطريقة الغمر على الساخن بارتفاع ٩ متر ذراع بطول ١ متر على ان تكون الاعمدة ملحمة طوليا وسلويه بقطر ٨ / ٣ بوصة ويسمك ٤ مم وسمك فتحة العمود ١٥ مم ويتحمل شدة الرياح فى حدود ١٤٠ كم / ساعة ومجهز لتثبيت صندوق البطارية ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخلية الشمسية على ان تكون متعددة او احادية التبولون بنظام high efficiency poly crystalline silicon solar cell لتحويل الطاقة الشمسية الى طاقة كهربائية وعلى ان يكون التيار ١٠ امبير وبدرجة حماية ip66 والبطارية تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر على البند وحدة التحكم charge controller لكل عمود تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن ٢٠ امبير ومحمل على البند كشاف من نوع ليد الامونيوم المسبوك والغطاء من الزجاج وبدرجة حماية لا تقل عن ip65 وقدرة الكشاف لا تقل عن ٨٠ وات طراز شوارع والعاكس شديد المعان وبدرجة حرارة اللون ٤٠٠٠ ك ك ولا يقل العمر الافتراضى عن ٥٠٠٠٠ ويضمان ٣ سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الاتواع ومحمل على البند القاعد الخرسانيه شامله الجوايط بقطر ٢٤ مم وبطول ٨٥ سم وابعاد القاعد ١٢٠*٦٠*٦٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع نهو العمل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم اعتماد العينة من المهندس المشرف .	عدد	٣٢,٠٠	٦٥٠٠٠	٢٠٨٠٠٠٠
اجملى الأعمال الكهربائية					٢٠٨٠٠٠٠,٠٠
الاجملى الى الكلى					٦٥٦٠٧٩٢٠,٣٧٠

خمسة وستون مليون وستمئة وسبعة الف وتسعمائة وعشرون جنيها و سبعة وثلاثون قرش فقط

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد حسنى قياض

التوقيع

مدير المشروع
مهندس / محمد حاتم عبد العليم

التوقيع

استشارى المشروع (مخرج-بايوم)
مهندس /

التوقيع

رئيس الادارة المركزية منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

التوقيع



نموذج رقم ٢

الهيئة العامة
للطرق والجسور
(GARB)



بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

القيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة
التاريخ : / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

اعمال كوبرى دوران للخلف عند الكم ٦٦,٢٠٠ بدون اعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى النظرون / العلمين تنفيذ شركة / شركة قاصد خير للتوريدات العمومية عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١١٢

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة ببيانها كالآتى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	م ٢	٤٦٦٧,٨٦	كسارة
٢	اتربة	م ٢		محجر المصرية
٣	رمل	م ٢	٢٥٧٤,٠٩	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من (كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
 للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

المنطقة الخامسة

قطاع المشروعات

إفادة

مشروع/ اعمال كوبرى الدوران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن
اعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

العقد رقم: (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١١١٢)

مقاول شركة: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات.

اشراف استشارى: المهندسون الاستشاريون العرب محرم - باخوم

كمية سن ١+سن ٢ المستخدمة فى المشروع: ٦٦٧,٨٦ م٣

كمية الرمل المستخدمة للمشروع: ٢٥٧٤,٠٩ م٣

يرجى العلم أنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببيونات رسمية معتمدة وقام استشارى المشروع بمراجعة جميع
البونات مع محطات الخرسانة والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات

مدير مشروع الهيئة

مدير مشروع الاستشارى


مدير مشروع الشركة:

(محرم-باخوم)

م/محمد حسنى فياض

م/محمد حاتم عبدالعليم

م/محمد باخوم



رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس

"هانى محمد محمود طه" ٢٠٢٢



KASSED KHAIR
GENERAL SUPPLIES AND CONTRACTING



اتأوة المحاجر

عن كميات المواد التي تم استخدامها

مشروع/ اعمال كوبرى الدوران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن اعمال
تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

تنفيذ: قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

كمية سن ١+ سن ٢ المستخدمة فى أعمال الخرسانة:

رقم البند فى المستخلص	جارى ٢	نهائى	الاجمـالى
7	٣م 614.03	٣م 0.32	٣م 614.35
14	٣م 25.60	٣م 0.37	٣م 25.97
15	٣م 399.20	٣م 0.30	٣م 399.50
16	٣م 159.20	٣م 1.02	٣م 160.22
17	٣م 1246.40	٣م 0.08	٣م 1246.48
18	٣م 154.40	٣م 0.65	٣م 155.05
19	٣م 268.00	٣م 0.22	٣م 268.22
20	٣م 239.20	٣م 0.72	٣م 239.92
5 (اعمال الطرق)	٣م 253.20	٣م 0.22	٣م 253.42
6 (اعمال الطرق)	٣م 1304.64	٣م 0.0864	٣م 1304.73
الأجمـالى			٣م 4667.86

كمية الرمل المستخدمة فى أعمال الخرسانة:

رقم البند فى المستخلص	جارى ٢	نهائى	الاجمـالى
7	٣م 307.02	٣م 0.32	٣م 307.33
14	٣م 12.80	٣م 0.19	٣م 12.99
15	٣م 199.60	٣م 0.15	٣م 199.75
16	٣م 79.60	٣م 0.51	٣م 80.11
17	٣م 623.20	٣م 0.04	٣م 623.24
18	٣م 77.20	٣م 0.32	٣م 77.52
19	٣م 134.00	٣م 0.11	٣م 134.11
20	٣م 119.60	٣م 0.36	٣م 119.96
5 (اعمال الطرق)	٣م 126.60	٣م 0.11	٣م 126.71
6 (اعمال الطرق)	٣م 652.32	٣م 0.043	٣م 652.36
الأجمـالى			٣م 2334.09


كمية الرمل المستخدمة في الردم حول الأساسات:

رقم البند في المستخلص	جارى ٢	نهائى	الاجمالى
13	٢٤٠ م٣	٠.٠٠ م٣	٢٤٠.٠٠ م٣


اجمالى كمية المواد المحجرية التى تم استخدامها :

السن	٤٦٦٧.٨٦ م٣
الرمل	٢٥٧٤.٠٩ م٣

مدير مشروع الهيئة

١/ 

مدير مشروع الاستشارى (محرم-باخوم)

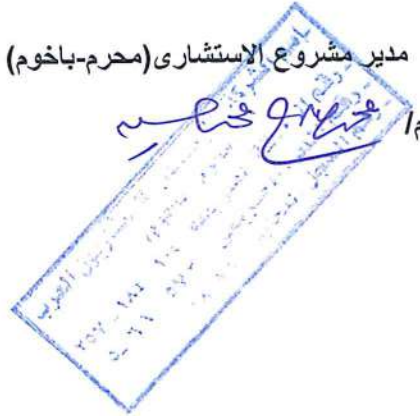١/ 


مدير مشروع الشركة:



تنفيذ: شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابيه ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العلمين

بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور

رقم البند وبيانه : ()

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

عدد	العدد	الابعاد			بيان الاعمال
		سمك	عرض	طول	
١	٠		١		بالمقطوعة عمل تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور
١					الاجمالى

عن الهيئة

3

عن الاستشاري



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العلمين

بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمتعارضات

رقم البند وبيانه : (١)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالى (م ط)	العدد	الابعاد	بيان الاعمال بالمقايسة
		م.ط	
١٠٠	١	١٠٠	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمتعارضات
١٠٠			الاجمالى

عن الهيئة

3

عن الاستشاري

عبدالله



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

رقم البند وبيانه : (٢)	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري
--------------------------	--


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالى (م ط)	العدد	الابعاد	بيان الاعمال بالمقايضة
		م.ط	
٢٨٠	٧	٤٠	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري
٢٨٠			الاجمالى

عن الهيئة

3

عن الاستشاري



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابيه ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)

رقم البند وبيانه : (٦)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالى (عدد)	العدد	الابعاد			الموقع الكيلو مترى		بيان الاعمال بالمقاييس
		سمك	عرض	طول	الى	من	
١	١						اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)
١		الاجمالى					

عن الهيئة

✓

عن الاستشاري



عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

رقم البند وبيانه : (٧)	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سن على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل الحديد) ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق
--------------------------	--

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الابعاد			الاجمالى (م.ط)
		طول	عرض	سمك	
بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سن على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل الحديد) ونهيو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	A01-A07	٢١,٥			١٧٢
	A02-A06	١٩,٢٥			١٩٢,٥
	A03	٢٢,٢٥			١١١,٢٥
	A05	٣٥,٢			١٠٥,٦
	A04	٢٤,٥			٩٨
الاجمالى					٦٧٩,٣٥

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
٢٥٧ - ١٨١ - ١٥٤
٥ - ٦٤ - ١٨٠٦٦



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالير بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	رقم البند وبيانه : (٨)
--	--------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الكمية بالمقايضة	١	مقدار العمل السابق	١	١
بيان الاعمال بالمقايضة	المحور	الابعاد	العدد	الاجمالى (عدد)
		طول	عرض	سمك
بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالير بحمل ١٥٠ % من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	A02-P06			
الاجمالى				١,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مركز الدراسات والبحوث
الطريق رقم ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢
٥٠ - ٧٤ - ٥٧٢ ١٨٠٠٠
٥٠ - ٧٤ - ٥٧٢ ١٨٠٠٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مركز الدراسات والبحوث
الطريق رقم ١٠٢ - ١٠٢ - ١٠٢
٥٠ - ٧٤ - ٥٧٢ ١٨٠٠٠
٥٠ - ٧٤ - ٥٧٢ ١٨٠٠٠

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

رقم البند وبيانه : (٩)	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياة الرش إذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل ممل جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
--------------------------	---

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م)
بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياة الرش إذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل ممل جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		٦١٥	١	٦١٥
الاجمالى				٦١٥,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	رقم البند وبيانه : (١١)
--	---------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	كمية	العدد	الاجمالى (م)
بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	A01	١٤	١	١٤
بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	A02	١٢	١	١٢
بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية الكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	A03	١٢	١	١٢
الاجمالى				٣٨,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائي بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادي النطرون / العلمين

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه : (١٢)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالي (م)	العدد	الايعاد	المحور	بيان الاعمال بالمقاييس
		الحجم		
٧١٩	١	٧١٩		بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
٧١٩,٠٠				

الاجمالي

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائي بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الموران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادي النظرون / العثمين


رقم البند وبيانه : (١٣)	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلظية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
---------------------------	--

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايضة	المحور	الابعاد	الاجمالى (م)	العدد
		الحجم		
بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة أو تربة زلظية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		٢٤٠	١	٢٤٠
الاجمالى			٢٤٠,٠٠	

عن الهيئة

عن الاستشاري

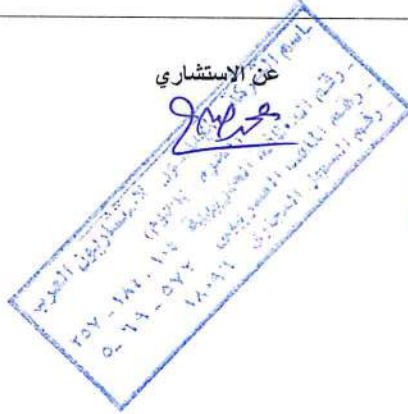

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

رقم البند وبيانه : (١٤)	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم ^٢
---------------------------	---

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايمة	المحور	الايعاد	العدد	الاجمالى (م ^٣)
بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم ^٢	A02	٤,٦١٨	١	٤,٦١٨
	A03	٤,٦١٨	١	٤,٦١٨
	A04	٢,٢٥١	١	٢,٢٥١
	A05	٢,٩٨٩	١	٢,٩٨٩
	A06	٤,٦١٨	١	٤,٦١٨
	بلاطة التغطية A01-A07	١٣,٣٧	١	١٣,٣٧
الاجمالى				٣٢,٤٦٤

عن الهيئة

عن الاستشاري



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

بالمتر المكعب اعمال خرساتية مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بروتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	رقم البند وبيانه : (١٥)
--	---------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	كمية	العند	الاجمالى (م)
بالمتر المكعب اعمال خرساتية مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بروتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	A02	١١٠,٢٥	١	١١٠,٢٥
	A03	١١٠,٢٥	١	١١٠,٢٥
	A04	٥٠	١	٥٠
	A05	٧٠,٣٨	١	٧٠,٣٨
	A06	١١٠,٢٥	١	١١٠,٢٥
	A01-A07 بلاطات انتقالية	٤٨,٢٤	١	٤٨,٢٤
الاجمالى				٤٩٩,٣٧

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العلمين

رقم البند وبيانه : (١٥)	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى
---------------------------	--

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	كمية	العدد	الاجمالى (م)
بالمتر المكعب اعمال خرسانية مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بروتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/م ^٢ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى	A02	١١٠,٢٥	١	١١٠,٢٥
	A03	١١٠,٢٥	١	١١٠,٢٥
	A04	٥٠	١	٥٠
	A05	٧٠,٣٨	١	٧٠,٣٨
	A06	١١٠,٢٥	١	١١٠,٢٥
	بلاطات انتقالية A01-A07	٤٨,٢٤	١	٤٨,٢٤
الاجمالى				٤٩٩,٣٧

عن الهيئة

عن الاستشاري

اسم الشركة : كاسد خير
رقم الان : ١٨٢ - ١٨٢ - ١٨٢
رقم الهاتف : ٠٥ - ٦٦٠ - ٥٧٢
رقم الفاكس : ٠٥ - ٦٦٠ - ٥٧٢
البريد الإلكتروني : kased.khair@gmail.com



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العلمين

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة فوق منشوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المكددة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (حتى ٦ متر)

رقم البند وبيانه : (١٦)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات


بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م٣)
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأصدة فوق منشوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزلقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المكددة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (حتى ٦ متر)	A01	١٣,٧٢٣	١	١٣,٧٢٣
				الاجمالى
				١٣,٧٢٣

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

١٣

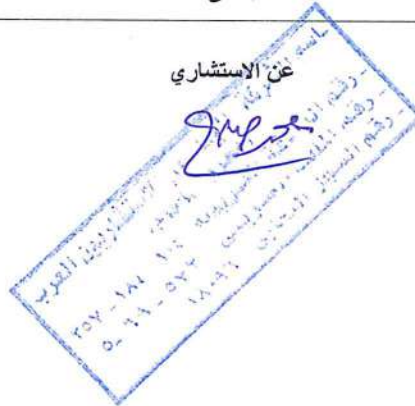

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العلمين

رقم البند وبيانه : (١٦)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعددة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح. (اعلى ٦ متر)
---------------------------	---

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م)
A01	١٣,٤٤	١	١٣,٤٤	
A02	٢٩,٥١٨٨	١	٢٩,٥١٨٨	
A03	٢٧,٩٥	١	٢٧,٩٥	
A04	٢٤,٦٦٤٤	١	٢٤,٦٦٤٤	
A05	٢٧,٤٤٦٨	١	٢٧,٤٤٦٨	
A06	٣١,٩٧٥٦	١	٣١,٩٧٥٦	
A07	٣١,٥٤٩٥	١	٣١,٥٤٩٥	
الاجمالى				١٨٦,٥٥

عن الهيئة

عن الاستشاري



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العمين

بالمتر المكعب اصعال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة اعني من ٦ متر .	رقم البند وبيانه : (١٧)
--	---------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م ^٣)
بالمتر المكعب اصعال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (اعني من ٦ متر .	A01 to A03	٧٧٩,٠٥	١	٧٧٩,٠٥
	A05 to A07	٧٧٩,٠٥	١	٧٧٩,٠٥
الاجمالى				١٥٥٨,١٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عدد كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى التطرون / العمين

بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبك فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/م^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/سم^٢ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .

رقم البند وبيانه : (١٧)


تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايضة	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م ^٣)
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبك فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	A01 to A03	٧٧٩,٠٥	١	٧٧٩,٠٥
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سبك فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٥٠٠ كجم/م ^٣ وزيادة محتوى الاسمنت الى ٥٠٠ كجم/سم ^٢ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري .	A05 to A07	٧٧٩,٠٥	١	٧٧٩,٠٥
الاجمالى				١٥٥٨,١٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبرى الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العمين

بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر .

رقم البند وبيانه : (١٨)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م ^٣)
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر .	A01	٦٠,١٢	١	٦٠,١٢
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر .	A04	٧٣,٥٧	١	٧٣,٥٧
بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح . علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر .	A07	٦٠,١٢	١	٦٠,١٢
				١٩٣,٨١

عن الهيئة

3

عن الاستشاري

عن الشركة

الاجمالى
عن الاستشاري
عن الشركة

عن الشركة
KASED KHAIR
١٠٢٨١

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبرى الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكر سابق الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .

رقم البند وبيانه : (١٩)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات


بيان الاعمال بالمقايضة	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م)
بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكر سابق الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح .	type (1)	٣٢,٨٦	٢	٦٥,٧٢
	type (2)	٣٢,٨٦	٦	١٩٧,١٦
	type (3)	٣٦,٢	٢	٧٢,٤
				٣٣٥,٢٨

الاجمالى

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

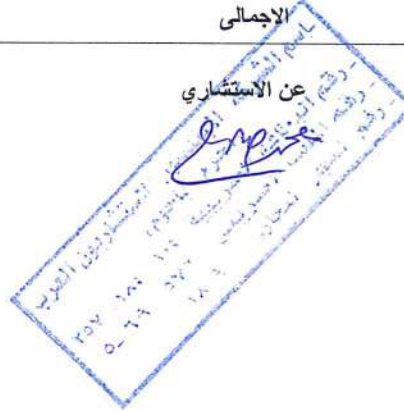

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب واعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم^٢ ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .

رقم البند وبيانه : (٢٠)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	المحور	الكمية	العدد	الاجمالى (م ^٣)
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب واعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .	A03-A04	١٤٩,٩٥	١	١٤٩,٩٥
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب واعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والفئة تشمل كل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح .	A04-A05	١٤٩,٩٥	١	١٤٩,٩٥
				٢٩٩,٩٠

الاجمالى

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العمين

رقم البند وبيانه : (٢١)	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايذا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
----------------------------------	--

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايسة	العنصر	الكمية	العدد	الاجمالى (طن)
	خوازيق	١٢٥,١٨٧	١	١٢٥,١٨٧
	قواعد	٦٧,١٠٥	١	٦٧,١٠٥
	أعد	٦٨,٦٢٤	١	٦٨,٦٢٤
	فريجات	٤٧,٣١١	١	٤٧,٣١١
	كمر سابق الصب	١٢٠,٥٦٦	١	١٢٠,٥٦٦
	قطاع صندوقي	٥٨٤,١٨٧	١	٥٨٤,١٨٧
	بلاطة أعني الكمر	٧٩,٣٧٢	١	٧٩,٣٧٢
	نيوجيرسي	٥٩,٥٤٤	١	٥٩,٥٤٤
	بلاطات انتقالية	١٥,٢٤٧	١	١٥,٢٤٧
	الاجمالى			١١٦٧,١٤٣

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
٢٠٧ - ١٨٤ - ٥٧٤
٥٠ - ٦١ - ١٠٠

شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
٢٠٧ - ١٨٤ - ٥٧٤
٥٠ - ٦١ - ١٠٠

قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

بالمتر المربع عمل طبقة عزلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه : (٢٢)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	العنصر	الكمية	الاجمالى (م)
بالمتر المربع عمل طبقة عزلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا والقياس هندسي طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	الفراغ	٤٧٧	٤٧٧
	الاعددة	١٤٧	١٤٧
	الفريمت	١٧٠	١٧٠
	الاجمالى		٧٩٤,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العطين

رقم البند وبيانه : (٢٣)	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات اساس اكليريك مائة للتفادية لعزل جسم الكوبري وانتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهولا كاملا واليوند شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد .
---------------------------	--

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايضة	العنصر	الكمية	العدد	الاجمالى (م)
بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للتآكل ذات اساس اكليريك مائة للتفادية لعزل جسم الكوبري وانتاج احدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهولا كاملا واليوند شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد الخامات قبل التوريد .	أصدة	٢٩٥,٣٤	١	٢٩٥,٣٤
	فريجات	٩٠,١٣٢	١	٩٠,١٣٢
	كمر	١٧٣٠,٣٨	١	١٧٣٠,٣٨
	قطاع صندوقي	٢٢٦٣,٤١٤	١	٢٢٦٣,٤١٤
	نيوجيرسي	١٠٩٧,٧٧٨	١	١٠٩٧,٧٧٨
الاجمالى				٥٤٧٧,٠٤٤

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العمين

بالبعد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والإشراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقل واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المونة والمتاخذ مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبيرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يماثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز وبراى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتيوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث التزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفع مع الطاء الشاؤجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها ويقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تاثر خصائصها بمرور الزمن استخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة والفة تشمل طبقة جروات اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكراتات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث وكل مايلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند وبيانه : (٢٤)

تفليذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايسة	العنصر	الابعاد				الاجملى (عدد)
		طول	عرض	سمك	الكمية	
بالبعد توريد وتركيب ركائز بدون جوابط. C4 حمولة ٢٥٠ طن	كمر سابق الصب				٠	٢٠
بالبعد توريد وتركيب ركائز حمولة بجوابط C2 مقاس حمولة ٥٥٠ طن	قطاع صندوقي				٠	٤
الاجملى						٢٤,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة

باسم السيد المهندس / قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات
رقم البند ٢٤ - ٢٠٢٤ - ٩ - ٩
رقم الملف ١٨٤ - ١٨٤ - ٥٧٤
٥ - ٦٤ - ١٨٤ - ٥٧٤



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

بالحد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقل واعداد الاسطح اسفل الركائز. تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المعززة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الاتواع المركبة بين طبقات التيوبيرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يمثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتيوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث الزلاقي بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقى مع الطاء الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الالغفل تحت الاحمال وعدم تآثر خصائصها بمرور الزمن استخدامتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملاتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة واللغة تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكارتات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومي للبحوث وكل مايلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	رقم البند وبيانه : (٢٤)
--	---------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايمة	العنصر	الابعاد				الاجمالى (عدد)
		طول	عرض	سمك	الكمية	
بالحد توريد وتركيب ركائز بدون جوايطر C4 حمولة ٢٥٠ طن	كمر سابق الصب				٠	٢٠
						٢٠,٠٠
						الاجمالى

عن الهيئة

عن الاستشاري



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٢٠٠+٦٦) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى التطرون / الخمين

بالعدد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز. تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليميرات المعرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التوبيرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة EN1337-3 والحاملة العلامة التجارية ساسكو او ما يماثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والتوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث التزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقى مع العطاء الكشوفات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الالتصاق تحت الاحمال وعدم تآثر خصائصها بمرور الزمن استخداماتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حدة اختلاف حملاتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة والفة تشمل طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكارتات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومى للبحوث وكل مايلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	رقم البند وبيانه : (٢٤)
--	---------------------------

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	العنصر	الايعاد				الاجمالى (عدد)
		طول	عرض	سمك	الكمية	
بالعدد توريد وتركيب ركائز حاملة جراب C2 مقاس حمولة ٥٥٠ طن	قطاع صندوقى				٠	٤
الاجمالى						٤,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عدد كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العلمين

رقم البند وبيانه : (٢٥)	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفة للحركة الطبيعية بأبعاد (10 سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخدمات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح + ٥ سم .
---------------------------	---

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايضة	العنصر	الابعاد	العدد	الاجملى (عدد)
		طول		
بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفة للحركة الطبيعية بأبعاد (10 سم عمق * ٤٠ سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفواصل طريق التوسعة على ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخدمات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح + ٥ سم .		٦٢	١	٦٢
الاجملى				٦٢,٠٠

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة
KASSED KHAIR
٢٠٠ - ٦٠٧ - ٩٨٨
١٠٢٨١ : ١٠٢٨١
٥ - ٦٩



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / العطين

بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢) بوصة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند وبيانه : (٢٩)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالى (عدد)	العدد	الابعاد				العنصر	بيان الاعمال بالمقايضة
		الكمية	سمك	عرض	طول		
٢٤٦٠	١	٠			٢٤٦٠		بالمتر الطولي لتوريد وتركيب مواسير PVC قطر (٢) بوصة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف
٢٤٦٠,٠٠					الاجمالى		

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٢٠٢٤-٩-٩

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النظرون / الغمين

بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات وعلى ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م³ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦ Ø 10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه : (٥)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقاييس	العنصر	الابعاد				العدد	الاجمالى (عدد)
		طول	عرض	سمك	الكمية		
بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات وعلى ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يحتوي اسمتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ³ وباجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ² والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ² والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦ Ø 10) / م.ط ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .					٧٥٩,٦٥٦	١	٧٥٩,٦٥٦
							٧٥٩,٦٦
الاجمالى							

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائى بتاريخ ٩-٩-٢٠٢٤

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادى النطرون / العلمين

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ من دولوميت متدرج ٣ م ٠,٤+ ٣ م رمل حرش ٢٥٠+ كجم
أسمنت بورتلاند عادي على أن يكون السن نظيف ومفصول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة
الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات
التوصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

رقم البند وبيانه : (٦)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

بيان الاعمال بالمقايضة	العصر	الايعاد				الاجمالى (عدد)
		طول	عرض	سمك	الكمية	
بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣ م ٠,٨ من دولوميت متدرج ٣ م ٠,٤+ ٣ م رمل حرش ٢٥٠+ كجم أسمنت بورتلاند عادي على أن يكون السن نظيف ومفصول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز وإستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التوصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .					١٠٨٧٢,٧٢	١
					١٠٨٧٢,٧٢	١٠٨٧٢,٧٢
						الاجمالى

عن الهيئة

عن الاستشاري

عن الشركة



قائمة كميات مستخلص نهائي بتاريخ ۹-۹-۲۰۲۴

عملية : أعمال كوبري الدوران للخلف عند كم (٦٦+٢٠٠) بدون أعمال المداخل الترابية ضمن أعمال تطوير طريق وادي النطرون / العلمين

[illegible]

رقم البند وبيانه : (١)

تنفيذ شركة : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

الاجمالي (عدد)	العدد	الابعاد				العنصر	بيان الاعمال بالمقايسة
		الكمية	سمك	عرض	طول		
٣٢	٣٢					أصدة الإنارة	بالحدود لتوريد وتركيب واختيار عبود النار من الحديد المجلفن بطريقة الغفر على الساخن بارتفاع ٩ متر ثراج بطول ١ متر على ان تكون الاضدة ملحمة طوليا ومسوية بقطر ٨ / ٣ بوصة وبسمك ٤ سم وسمك قنشة العبود ١٥ مم ويتحمل شدة الرياح في حدود ١٤٠ كم / ساعة ومجهزه لتثبيت صندوق البطارية ووحدة التحكم والكشاف ومحمل على البند الخلية الشمسية على ان تكون متحدة او احادية التباور بنظام high efficiency poly crystalline silicon solar cell لتحويل الطاقة الشمسية الي طاقة كهربيه وعلى ان يكون التيار ١٠ امبير وبدرجة حماية ip66 والبطارية تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وعلى البند وحدة التحكم charge controller لكل عبود تعمل على جهد ١٢ فولت تيار مستمر وتيار الشحن لا يقل عن ٢٠ امبير ومحمل على البند كشاف من نوع ليد الايومونيوم المسيوك والغطاء من الزجاج وبدرجة حماية لا تقل عن ip65 ودرجة الكشاف لا تقل عن ٨٠ وات طراز شوارع والمكاسن شديد المعادن ودرجة حرارة اللون ٤٠٠٠ ك ولا يقل العمر الافتراضي عن ٥٠٠٠ وبضمان ٣ سنوات على ان تكون جميع المكونات من اجود الانواع ومحمل على البند القاعد الخزاسية شمله الجوايط بقطر ٢٤ مم وبطول ٨٥ سم وابعاد القاعده ١٢.٠٠*٦.٠٠ سم والبند يشمل كل ما يلزم التركيب مع نيو الصل كالمواصفات الفنية واصول الصناعة على ان يتم اعتماد النعينة من المهندس المشرف
٣٢,٠٠						الاجمالي	

عن الهيئة

عن الاستثنائي



وثيقة تأمين جميع أخطار المقاتلين الوثيقة ١٩٥٢/٢٠٢٢

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.
٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إبلاغ توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمستويات.
٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم والالزمة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريّة يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.
٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالهم تتسبب الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاهد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تآمر - تمرد - شعب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبة - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تآمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلف أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليته.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفرغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

٧ - شرط سقوط الحق:

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية: -

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

٨ - إذا وجد سارياً وقت وقوع الحادث الذى نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطى نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التلغيات أو المسؤوليات إلا بالنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم عملاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون المحلى المصري

١٠- كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١- يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢- للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخاً ، فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول

الأضرار المادية:

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعى الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشترك عن هذه الخسارة أو التلف وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يتراءى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند، ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع

التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمينات الموضحة بالجدول.

وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن تكلفة إزالة الأنقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول

لا تكون الشركة مسئولة في جميع الأحوال عما يلي:

(أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بالجدول الوثيقة.

(ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.

(ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.

(د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناتجة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التأكسد، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكنات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي قصور أو خسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أي سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن في حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل في حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير في الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب الأثقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن: بالنسبة للبند (١):

إجمالي قيمة عقد المقاول عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصارييف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبند (٢، ٣):

القيمة الإستبدالية للمعدات ومهمات وآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة. ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تغيرات جوهرية في الأجر والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة.

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلّفات.

(ب) الخسارة أو التلغيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقاً.

(ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مائية أو طائرات. (د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائماً أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة تنطبق على القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من يمثلته عدم الإقرار بأي مسؤولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير بإسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى بإسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢ - يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسؤولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي: - تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشترك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠٪ من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بديل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

(ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصاً قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي قبلها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلغيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلغيات تساوي أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلغيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني

المسؤولية المدنية قبل الغير:

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبعد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسؤولاً عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتشديد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

(ب) الخسائر والتلغيات التي تلحق بممتلكات الغير. وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المشترك.

(ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.

ويشترط دائماً ألا تزيد مسؤولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تتفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلغيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مباني بسبب الخدشات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلغيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنتج عن مثل هذه التلغيات (مالم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسؤوليات الناتجة عن:

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٦- (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
٧- (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

صندوق حملة الوثائق: هو مجموعه من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبه ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

أجر المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجدى عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠
موافقة هيئة الرقابة الشرعية:

تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ١٠/٢٠٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي
يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم
كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.
- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.
أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشاركين: يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعلمت من هيئة

- الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر. ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع

1194114

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والأحكام والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة :	1952/2023	اصدار
اسم المشترك / او المشتركين :	قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات	
العنوان :	75 شارع فوزى معاذ - سموحة - سيدى جابر - الاسكندرية	
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى	
اسم المقاول :	تأميناً على عقد رقم (2023/2022/1112) تنفيذ أعمال كبرى دوران للخلف كم 66+200 بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى النطرون - العلمين	
موقع العمل :	طريق وادى النطرون - العلمين	
مدة التأمين :		
أ - بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2023/02/21	
	وينتهي في : 2024/02/20	
ب - بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من : وتنتهى في :	
مبلغ التأمين :	77,279,000.00	فقط سبعة وسبعون مليوناً ومائتان وتسعة وسبعون ألفاً جنيه مصري
القسم الاول :	الأضرار المادية	
القسم الثانى :	المسئولية المدنية قبل الغير	



تحرير في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم هانى عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Faray Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiash st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsefa Tower above Abu Dhebi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصداق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود سدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المائية
 فرع الدقهلية : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كوريتش النيل - دمياط

1194115

القسم الأول: الأضرار المادية

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقولة (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 30% من اجمالي مبلغ التأمين	77,279,000.00 جم	1-1 قيمة العقد -
-	-	1-2 الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى
	77,279,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الأول

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايح / الفيضانات / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى (1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (2)	البند المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسمية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	1-2 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد ادنى 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
	400,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaqتحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafo Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Sheblin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
2 من 9

www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بي تك كورتيك النيل - دمياط

1194116

حساب الاشتراك

11,259.00	الاشتراك الصافي
562.95	نصف الدفعة التأسيسية
26.10	الضريبة النوعية
50.62	مصاريف إصدار
67.55	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
22.52	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
11.26	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
12,000.00	اجمالي الاشتراك

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685
3 من 9

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moez Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندس حسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحبوب صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طليح - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن تك كورنيش النيل - دمياط

1194117

يعتبر متمما لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرققة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq

تحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساكن
19685
4 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصديق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليج - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع شيبان بروج الامون ومحمود صديق - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طين - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبان بروج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورنيش النيل - دمياط

1194118

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى أو المياني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بأجهزة مقاومة الحريق في الموقع وإن تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الأماكن المغلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيته خطر السطو و / أو السرقة بالاكراه علي العدد والتشوينات والمؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح علي الخفراء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة علي المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء علي الشروط العامة لوثيقة جميع اخطار المقاولين ان الوثيقة تغطي خطري الحريق و السطو
شروط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع علي كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء علي هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والافاضات الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف او الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



تحريراً في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Farzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gai'sh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alasfa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
5 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع صدوق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ١/٢ شارع المأمون ومعمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طنبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المائية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تى كورتيش النيل - دمياط

1194119

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 | شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد (مرفق)

ملحق 12 | الشروط الخاصة المتعلقة بأعمال الأعمدة والأساسات والدعامات (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

تحريرا فى 21/02/2023

تاريخ الطباعة 21/02/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadok st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fauzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awwad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section - Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

6 من 9

المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصدق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٣ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الاسماعيلية : شارع شدين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورتش النيل - دمياط

1194120

المرفقات

- * تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .
- * شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
- * شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .
- * ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
- * ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسئولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .
- * ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .
- * ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذة
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والإستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقواطع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة ادناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددًا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .
- * ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد
انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلي :-
(1) توفر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل .
(2) ان يكون هناك خط ماسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة .
(3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
(4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الانشاء .
(5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات وى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات .
(6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaqتحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685
7 من 9

Head Office : 25 Mosaddek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Faray Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصديق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عزيز الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢/أ شارع المأمون ومحمود مصدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طين - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد القادر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بلك كورنيش النيل - دمياط

1194121

- (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من أى نوع مثل :-
- عمليات الجلب ، التقطيع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربية .
 - استعمال البيتومين الساخن .
 - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
- (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
- (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
- (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أى اعمال ينشأ عنها لهب .
- (12) تعيين منسق امان بالموقع .
- (13) تركيب نظام يعتمد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 150,000 جم .

* ملحق 121 الشروط الخاصة المتعلقة بأعمال الأعمدة والأساسات والدعامات
انه من المتفق عليه والمفهوم أنه بخلاف الخضوع للبيود، الإستثناءات، الأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة أو الملحق بها ألا تقوم الشركة بتعويض المشترك فيما يتعلق بالمصاريف الخاصة بـ:

- 1 - إحلال أو إصلاح الأعمدة أو عناصر الدعامات:
 - (أ) التى وضعت في مكان خاطئ أو إحتقرت أثناء عملية البناء.
 - (ب) التى فقدت أو تركت أو تضررت أثناء الحفر أو الإقتلاع، أو
 - (ج) التى تم إعاقتها أو تلفت بسبب معدات الأعمدة أو طريقة التنفيذ.
 - 2 - لإصلاح الأعمدة المنفصلة؛
 - 3 - لإصلاح أى تسرب أو أرشاح من أى نوع للمواد؛
 - 4 - لملئ الفجوات أو إستبدال البيتومين المفقود؛
 - 5 - كنتيجة لعدم تحمل أى أعمدة أو أساسات لإختبار التحمل أو عدم وصولهم للقدرة التحميلية الواردة في التصميم؛
 - 6 - بغرض إعادة المواصفات أو الأبعاد؛
- لا يطبق هذا الملحق على أى خسارة أو ضرر ناتج عن الأخطار الطبيعية.
- تقع مسؤولية إثبات أن هذه الخسارة أو الضرر يندرج تحت الغطاء التأمينى على المشترك.

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر



تحريرا في 21/02/2023
تاريخ الطباعة 21/02/2023
اسم المستخدم هانى عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsefa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Port said Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumliatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685
8 من 9

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصداق - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع التجمع ٥ : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢ / شارع المأمون ومحمود مدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورتيش النيل - دمياط

1194122

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقولين

وثيقة رقم : 1952/2023

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

العنوان : 75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندريه

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/02/2023

الى : 20/02/2024

العملة : جنيه مصري

مبلغ التأمين : 77,279,000.00

فقط سبعة و سبعون مليوناً و مائتان و تسعة و سبعون ألفاً جنيه مصري

11,259.00	:	الاشتراك
562.95	:	نصف الدفعة النسبية
50.62	:	مصاريف الاصدار
26.10	:	الضريبة النوعية
67.55	:	رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف
22.52	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
11.26	:	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف
12,000.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط اثنا عشر ألفاً جنيه مصري)



تحريرا في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

اسم المستخدم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 %

562.95

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

www.wethaq-egypt.com



Head Office : 65 Mosadak St., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedki Street - East Section- Alsafo Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحه : ٩٠ شارع فوزى معاذ - سموحه - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع الأمان ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طين - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثانياً: في حالة العجز الجزئي المستديم:

تؤدي الشركة للمشتري مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي:-

نسبة العجز الجزئي	الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		الأطراف العليا
		الأيمن	اليسار	
50%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	60%	50%	الفقد الكامل للذراع او اليد
40%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	25%	20%	الفقد الكامل لحركة الكتف
30%	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	20%	15%	الفقد الكامل لحركة المرفق
30%	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	20%	15%	الفقد الكامل لحركة المعصم
30%	الفقد الكامل لحركة الركبة	30%	25%	الفقد الكامل للإبهام والسبابة
15%	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	25%	20%	الفقد الكامل للإبهام والأصبع غير السبابة
8%	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	20%	15%	الفقد الكامل للسبابة والأصبع غير الإبهام
٣- الخسور		25%	20%	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة
30%	خسر لم يلتحم بالساق	20%	15%	الفقد الكامل للإبهام فقط
20%	خسر لم يلتحم بالقدم	15%	10%	الفقد الكامل للسبابة فقط
20%	خسر لم يلتحم بالرسغة	10%	8%	الفقد الكامل للوسطى فقط
25%	خسر لم يلتحم بالفك الأسفل	8%	7%	الفقد الكامل للينصر فقط
10%	خسر ضلعي يصعب تشويه دائم في الصدر وأضراس وطرفته	7%	6%	الفقد الكامل للخنصر فقط

وإذا كان المشترك أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها.

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الإبصار .

صمم تام	40%	صمم احدي الاذنين	15%
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سنتيمترات على الأقل -	15%	الفقد الكامل لعين واحدة -	35%

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة. وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقداً جزئياً بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل.

اما بالنسبة لكالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة علي انه من المتفق عليه ما يلي:

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم.

- لا يستحق للمشارك أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناء على البيانات والقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ او المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة او الملحقه بها.

تعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسؤوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته او للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشارك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة او اية مدد لاحقة يتفق عليها، اية إصابة جسمية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب اخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة او العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بياتهم بالجدول او على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه إذا توفي المشارك بفعل متعمد من أي من المستفيدين او المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين او المستحقين.

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشارك او المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية:

- فقد إبصار العينين نهائياً .
- فقد الساقين او القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين او اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله او بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يستحق للمشارك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلى المؤقت بالوثيقة بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي المستديم.

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد التفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالات العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الستة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما أكبر بالإضافة إلى المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلى المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته أو مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.

ويحق للشركة عندئذ أن توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وأن تقوم بتخفيض مبلغ التأمين أو أن تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد إلى المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته أو مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخفف مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سداده.

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية :

(أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنابة أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك أن يخطر الشركة في مركزها الرئيسي أو في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له، ويجب عليه أيضاً أن يضع نفسه في أقرب فرصة تحت إشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة أيام من وقوع الحادث فإن المطالبة تكون غير مقبولة ما لم يقدم المشترك عذراً مقبولا للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين إلا إذا سمح لطبيب الشركة أو مندوبها المكلف بذلك بفحص المشترك متي رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة.

رابعا : في حالة العجز الكلى المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلى المؤقت طوال المدة التي يلازم فيها الفراش، ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاولة عمله.

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على ألا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما أن المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابة وحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام إلى سبعة.

البند الثاني : الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار إلى نوعين :

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو لتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية:

- الوفاة الطبيعية.
- بسبب تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التامر ضد نظام الحكم.
- الاخطار الخرية أو التفاعلات النووية أيا كان سببها أو مصدرها وقت السلم أو الحرب.
- السفر على الطائرات الحربية.
- الانتحار أو الشروع فيه سواء كان عن وعي وادراك أو عن غير وعي وادراك.
- تعمد المشترك إصابة نفسه أو تعريضها لخطر غير مادي أو بسبب ارتكابه جريمة أو الشروع فيها.
- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير المخدرات أو مسكر.

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة إلا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي المستديم أو العجز المؤقت التي تنشأ عن أو لتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

١- الحرب أو الغزو أو أي عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) والشغب والاضطرابات والثورات الأهلية والاضرابات العمالية .

٢- الإرهاب والتخريب .

٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول .

٤- السفر على الطائرات الخاصة .

٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس أو القيام بإجراء اختبارات السرعة.

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي:

طبقا لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والملوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:

- تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المدقق بصفتها مضارباً وتتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشارك بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن 80% من صافي الفائض التأميني المدقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق.

- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسباً من أموال المساهمين يستند من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- **مفهوم نظام المضاربة:** تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المدقق بصفتها مضارباً.

- **أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك:** يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

البند السابع: مدة العقد

لا تلزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويشترط سداد اشتراك التأمين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري.

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بموجب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام، وإلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

• **توزيع الفائض التأميني :** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكهم دون التفريق بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

• **أجر المضاربة :** تدبر الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني.

• **هيئة الرقابة الشرعية :** تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من :-

١- الأستاذ الدكتور/ سعد الدين مسعد أحمد هلالى
رئيس اللجنة
٢- فضيلة الشيخ/ خالد عبد المحسن الجندي
عضو اللجنة
٣- الأستاذ الدكتور/ السيد على السيد محمد عبد المطلب
عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠

• **موافقة هيئة الرقابة الشرعية :** تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٥

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي:

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شرط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



• **السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر :** يتم استثمار أموال حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

• ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية :

١. (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢. (١٥%) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣. (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥. (٣٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٦. (٥٠%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧. (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

• **صندوق حملة الوثائق :** هو مجموعة من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائد حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي :-

• تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد .

• الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) وببواب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠% من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ٥٠% للعام الثاني، ١٠٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة .

1182997

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1604/2023	اصدار	فرع الاصدار : المركز الرئيسي
اسم المشترك :	قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات		
العنوان :	75 شارع فوزى معاذ - سموحة - سيدى جابر - الاسكندرية		
المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى		
التغطية التأمينية :	تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مضمين كالاتى (عدد 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1سائق معدة + عدد 1عامل) عاملين لدى المشترك , بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لا غير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون الف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهندس, 15,000 جم (خمسة عشر الف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة, 10,000 جم (عشرة الاف جنيه مصري لا غير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلي والجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك اثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تنفيذ اعمال مشروع عقد رقم (2023/2022/1112) تنفيذ أعمال كوبرى دوران للخلف كم 200+66 بدون أعمال المداخل الترابية ضمن مشروع تطوير طريق وادى التطرون - العلمين , والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2023/1952 والمصدرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر .		
مدة التأمين	حساب الاشتراك		
من : 21/02/2023	الإشتراك الصاقى :	430.00	جم
الى : 20/02/2024	نصف الدفعة النسبية :	2.15	جم
	الضريبة النوعية :	11.60	جم
	مصاريف الإصدار	52.38	جم
	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف :	2.58	جم
	اشتراك صندوق حملة الوثائق/ أثنان في الألف :	0.86	جم
	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف :	0.43	جم
	اجمالي الاشتراك فقط خمسمائة جنيه مصري	500.00	جم

حدود التغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
 130,000.00 جم فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري
 130,000.00 جم فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-



تحريراً في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : نور هان رافت

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiatt, El Rifal Building, above B-Tech and Wafa Bank



المركز الرئيسى : ٢٥ شارع مصداق - الدقى - الجيزة
 فرع المهندسين : ٢٠ وادى النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عزيز الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع المأمون ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طه - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بلك كورثيس النيل - دمياط

1182998

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1604/2023

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 16 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريراً في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : نور هان رافت

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



2 من 4

1182999

اصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1604/2023

* شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .



تحريرا في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : نور هان رافت

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

3 من 4



Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street-Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sadi Street - East Section- Al-Kafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فروع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فروع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فروع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فروع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فروع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فروع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع الأمان ومجموعه مدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
فروع الإسماعيلية : شارع شهبان برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فروع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فروع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1183000

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (----)

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

وثيقة رقم : 1604/2023

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

العنوان : 75 شارع فوزى معاذ - سموحه - سيدى جابر - الاسكندرية

لصالح : المهينة العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/02/2023

إلى : 20/02/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	430.00	جم
نصف الدفعة النسبية	:	2.15	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	52.38	جم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	:	2.58	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	:	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جم
إجمالي الأشتراك	:	500.00	جم
فقط خمسمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 21/02/2023

تاريخ الطباعة : 21/02/2023

إعداد : نورهان رافت

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

43.00

10 %

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

4 من 4

SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب
(محرم - باخوم)الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOM**PROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (5)**

To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ 2022 / 11 / 09

تعديل :

رقم مسلسل :

اسم المشروع : كباري طريق وادي النطرون - العلمين
رقم المشروع : كوبري دوران رقم (5) عند الكيلو 66+200 - العلمين - محافظة مطروح
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري : المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المقاول : شركة قاصد خير

الوصف : نطاق توريد كبري لاصار كالج للمحيطات و ليل على
500 متر - المخطط انشائي A01-A03
- المخطط الضمني A05-A07
- مخطط انشائي A05-A07

☐ عينة ☐ طبقا للقائمة المعتمدة
☐ مواد موردة بالموقع ☐ اقتراح جديد

مكان الاستخدام / المبنى : كبري لاصار (5)

بند رقم : صفحه من بداول الكميات

رقم المواصفة : الكود المصري رقم البند :

اسم المورد : شركة المتحرة للخرسانة الجاهزة

اسم المصنع : شركة المتحرة للخرسانة الجاهزة

مرفق :

- ☐ عينات
☐ كتالوجات
☐ لوحات
☒ تقرير فني
☐ بنود ملحقة

مدير المكتب الفني للمقاول

الاسم : التاريخ : 2022/11/09

التوقيع : التاريخ : 2022/11/09

التاريخ : 2022/11/09

قرار المهندس (الاستشاري)

☐

معتمد

قرار المهندس (المالك)

☐

معتمد بملاحظات

الاسم :

☐

معتمد مبدئيا ويعاد التقديم

التاريخ : 2022/...../.....

☐

غير معتمد

التوقيع :

الاسم :

التاريخ : 2022/...../.....

التوقيع :

التعليق :

كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - ياخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 26/10/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : بلاطة سفليه A5-A7

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wright Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
بلاطة سفليه	28/9/2022	26/10/2022	8153	2415.7	1198.0	542.7	534.5	106.9
			8124	2407.1	1174.0	531.8		
			8169	2420.4	1168.0	529.1		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم

المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 26/10/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : بلاطه سفليه A5-A7

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سنة ١
0	سنة ٢
13	مادة
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
بلاطه سفليه	28/9/2022	26/10/2022	8132	2409.5	1147.0	519.6	524.6	104.9
			8124	2407.1	1154.0	522.8		
			8151	2415.1	1173.0	531.4		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 28/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : A1-A3 بلاطه سفليه

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
بلاطه سفليه	31/10/2022	28/11/2022	8135	2410.4	1201.0	544.1	536.8	107.4
			8124	2407.1	1169.0	529.6		
			8151	2415.1	1185.0	536.8		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم

المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 28/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : بلاطة سفليه A1-A3

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wiegth Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
بلاطة سفليه	31/10/2022	28/11/2022	8196	2428.4	1136.0	514.6	532.0	106.4
			8157	2416.9	1189.0	538.6		
			8195	2428.1	1198.0	542.7		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم

المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 2/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : ويات A5-A7

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سنة ١
0	سنة ٢
13	مادة
165	ماء


CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
ويات A5-A7	5/10/2022	2/11/2022	8147	2413.9	1159.0	525.0	517.9	103.6
			8154	2416.0	1134.0	513.7		
			8169	2420.4	1137.0	515.1		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC . Lab:



كبارى طريق وادى النطرون -العلمين (u-turne 5)

الشركه المنفذه
قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات



استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -باخوم



المالك
وزارة النقل الهيئه العامه للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 2/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : ويات A5-A7


الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمله
1020	سيز ١
0	سيز ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wiegth Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3		Kg/cm2		
ويات A5-A7	5/10/2022	2/11/2022	8165	2419.3	1198.0	542.7	530.0	106.0
			8198	2429.0	1174.0	531.8		
			8174	2421.9	1138.0	515.5		

المهندسون الاستشاريون العرب



كبارى طريق وادى النطرون - العلمين (u-turne 5)

الشركة المنفذة
قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات

استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب - باخوم

المالك
وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى



Field / Lab. Testing : 2/11/2022

Type of Sample / Field Test : Compressive Strength (500kg/cm²) - Cube 15*15*15

Sample Location : ويات A5-A7

الوزن	العنصر
500	اسمنت
740	رمل
1020	سن ١
0	سن ٢
13	ماده
165	ماء

CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH

28-Days

Sample ID	Casting date	Testing date	Wieght Kg	Unit Weight	Load	Strength	Average	Average %
				Kg/cm3	KN	Kg/cm2		
ويات A5-A7	5/10/2022	2/11/2022	8154	2416.0	1152.0	521.9	525.8	105.2
			8175	2422.2	1141.0	516.9		
			8169	2420.4	1189.0	538.6		

المهندسون الاستشاريون العرب

QC. Lab.



SUBMATEL REQUEST

شركة قاصد خير للتوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المهندسون الإستشاريون العرب
(محرم - باخوم)الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)ARAB CONSULTING ENGINEERS
ASSOCIATIONPROJECT : BRIGES WADI ELNATRUN - ALAMIEN ROAD U-TURN (5)
To be filled by Kased Khair Contracting company

نموذج اعتماد

التاريخ: 2022 / 11 / 10

تعديل:

رقم مسلسل:

اسم المشروع: كباري طريق وادي النطرون - العلمين
رقم المشروع: كوبري دوران رقم (5) عند الكيلو 66+200 - العلمين - محافظة مطروح
المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الاستشاري: المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المقاول: شركة قاصد خير

الوصف: تنسيق تخطيطات لعدد 08 رقم للبريد العلمين
عدد 500 ومبنى 1525
- البنية العامة (A5-A7)

☐ طبقاً للقائمة المعتمدة

عينة

☐

اقترح جديد

مواد موردة بالموقع

مكان الاستخدام / المبنى:

كوبري دوران 0

بند رقم: صفحة من بجدول الكميات

رقم البند:

رقم المواصفة: الاسم:
.....اسم المورد:
.....اسم المصنع:
.....

مرفق:

☐

- عينات

☐

- كتالوجات

☐

- لوحات

☐

- تقرير فني

☐

- بنود ملحقة

التوقيع:
.....

التاريخ: 2022 / 11 / 10

مدير المكتب الفني للمقاول

الاسم:
.....

قرار المهندس (الاستشاري)

☐

معتمد

☐

معتمد بملاحظات

☐

معتمد مبدئياً ويعاد التقديم

☐

غير معتمد

الاسم:
.....التاريخ: 2022 / /
.....التوقيع:
.....

قرار المهندس (المالك)

الاسم:
.....التاريخ: 2022 / /
.....التوقيع:
.....التعليق:
.....



المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - ياخوم



KASSED KHAIR
GENERAL SUPPLIES AND CONTRACTS

DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CUBES


Test Standard BS 1881

CLIENT	kased khair	SAMPLED BY _____ ;	Unimix
PROJECT	كباري وادي النطرون-العلمين-كوبري دوران 5	SAMPLING METHOD _____ ;	BS 1881
CONSULTANT	ACE	Cement Conten/Type	525/OPC
OWNER	الهيئة العامة للطرق والكباري	STRUCTURE TYPE _____ ;	علوية A5:A7
DATE OF CASTING	22-Oct-2022	SPECIFIED STRENGTH :	500 kg/cm2
POURED QUANTITY	294 m3	NO. OF CUBES MADE _____ ;	
CONCRETE SLUMP	185 mm	date of test	19/11/2022
TARGET SLUMP	160:200mm	CONCRETE TEMP (°C) _____ ;	25

Specimen Reference	1	2	3			
Age of Test (Days)	28	28	28			
Average Dimension (mm)	150	150	150			
Weight (g)	8254	8311	8267			
Density (kg/m³)	2446	2463	2449			
Failure Load (kN)	1335	1411	1423			
Comp. Strength Kg/cm²	605	640	645			
Mode of Failure	A	A	A			
Average 28 Days	630					
Ratio%	126					

MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part 116 : 1983

Satisfactory MODES OF FAILURE AS PER BS 1881 : Part Unsatisfactory



Remarks :

Density measurement is carried out in accordance with BS 1881:Part 114 in the as received condition for moist specimens and in the saturated condition for laboratory cured specimens

Note : T indicates tensile cracking

Remarks : Specified Loading Rate Range = 4.5kN/S to 9.0 kN/S or (6.8kN/S)

Lab Technician	Lab Incharge	QC Engineer	QC Consultant

