

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 25/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature /
رئيس التسجيل رقم ١٣٣٧ - ١٣٣٨ - ١٣٣٩
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	93.4
25	89.9
19	87.4
12.50	67.8
9.50	52.3
4.75	33.1
2.36	30.2
2.00	28.9
1.18	24.0
0.600	19.3
0.425	16.6
0.300	14.2
0.150	12.7

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
إ.ع. حسن أسعد طة
رام الله - عمان - 0277 - 091 - 27363093
الشارع الملك فيصل - الزمالة - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	10.5

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المنطقة الشمالية
رام الله - القدس 027 - 091 - 010
ص.ب. 1 : شارع الملك فيصل - الزمالة - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (ميناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
رأى المهندس / 
210-004-0000 : 210-004-0000
3 شارع الملك الأفدال - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (ميناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	28.9	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	16.6	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.5	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التمثيل الشمالي
بم شحاتة - ٥٥٥٤ - ٥٥٥٤ - ٥٥٥٤
فيلد رقم ١٠ - المنطقة الصناعية - المنطقة - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 25/01/2023
Reporting Date : 31/01/2023
Reporting No. : 13
Sample No. : 13

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

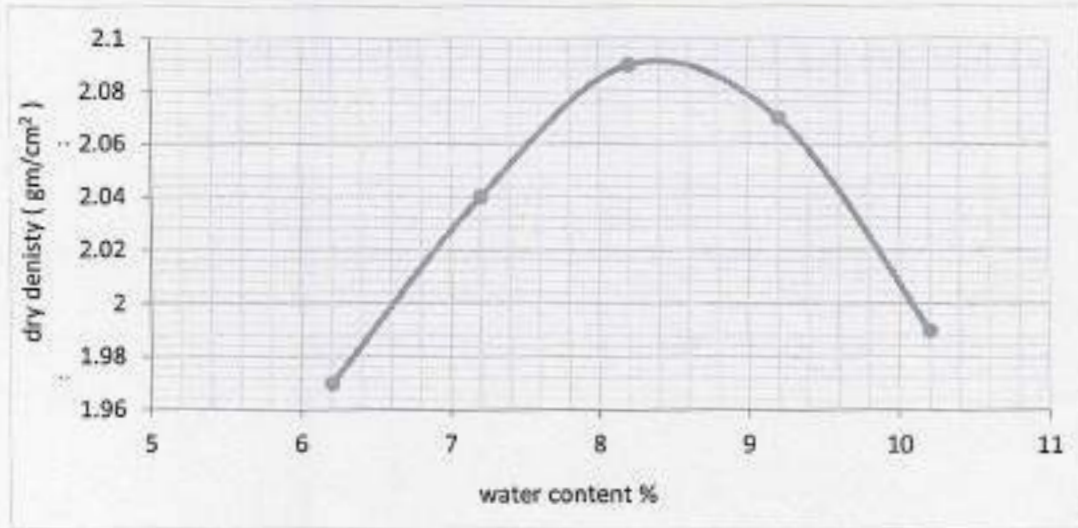

- Max dry density (gm/cm³) : 2.09
- Optimum moisture content % : 8.2

Signature /

CEL
مكتب استشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل في مصر 557 - 559 - 510
البريد الإلكتروني : 5 شارع الملك الفاضل - القاهرة - 11562

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 09/02/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Signature

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.2
25	88.1
19	83.6
12.50	69.1
9.50	54.6
4.75	36.1
2.36	33.0
2.00	25.6
1.18	22.2
0.600	19.7
0.425	18.1
0.300	15.0
0.150	13.7

Signature /



Company Name : حسن أسعد طه (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ m (No.200)	11.3

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (ميناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	25.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	18.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.3	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الضاحي الشيماني
رئيس قسم الاختبارات
الضاحي الشيماني - الزمالة - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
Sample No. : 14

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

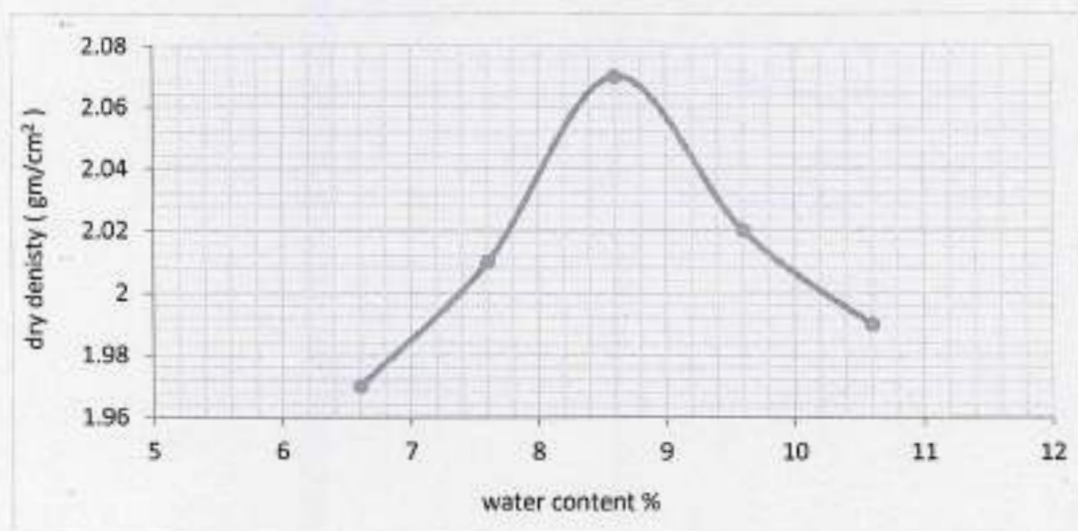

- Max dry density (gm/cm²) : 2.07
- Optimum moisture content % : 8.6

Signature



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (472+100) : (473+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 09/02/2023
 Reporting Date : 15/02/2023
 Reporting No. : 14
 Sample No. : 14

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	1.85
1.27	0.050	2.18
1.91	0.075	2.69
2.54	0.100	3.12
3.18	0.125	3.47
3.81	0.150	3.73
4.45	0.175	3.98
5.08	0.200	4.23
5.71	0.225	4.51
6.35	0.250	4.74

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	45.2
	6.90	3.12	


Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.07(gm /cm³) at 6.6% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.55 kg

Signature

م.م. محمد عبد الحليم
 مدير المختبر
 رقم الترخيص: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
 القاهرة - مصر

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/02/2023
Reporting Date : 15/02/2023
Reporting No. : 14
- Sample No. : 14

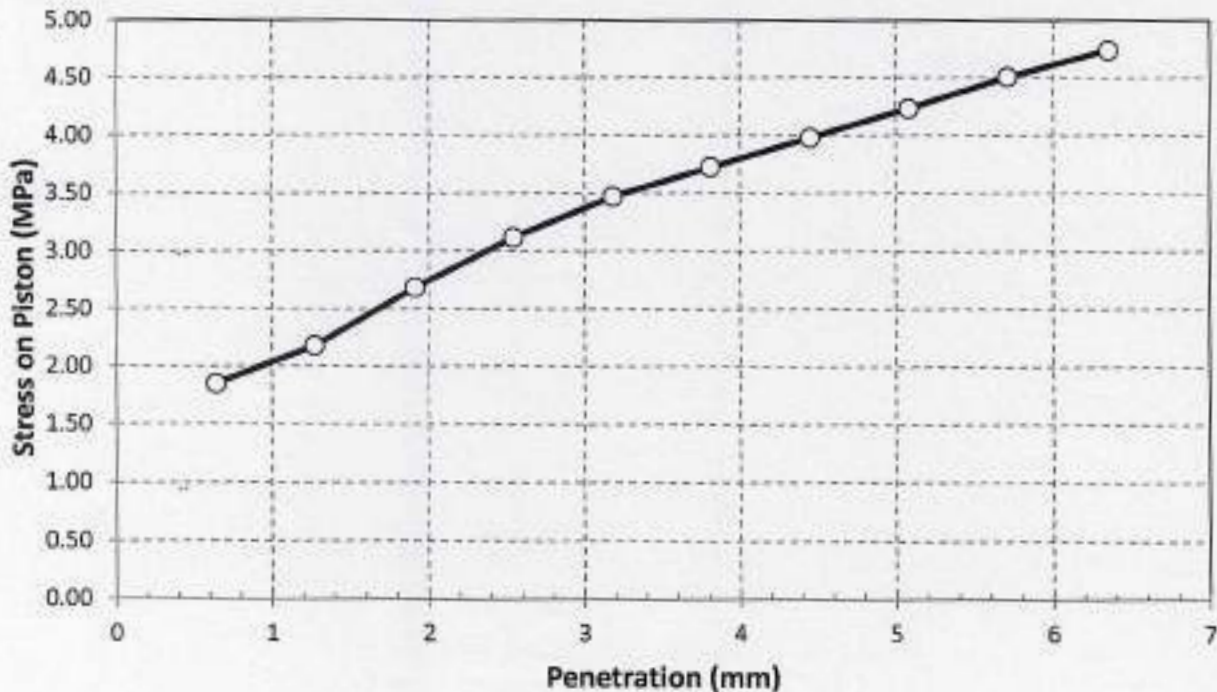Load Penetration Curve of CBR Test**ASTM D-1883**

Signature /



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 20/02/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / ...



Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (472+100) : (473+100)
 Type of sample : Soil Embankment
 Delivery Date : 20/02/2023
 Reporting Date : 26/02/2023
 Reporting No. : 15
 Sample No. : 15

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	92.0
25	87.1
19	79.6
12.50	67.2
9.50	58.1
4.75	48.9
2.36	42.8
2.00	37.1
1.18	34.4
0.600	30.2
0.425	26.0
0.300	23.1
0.150	16.0

Signature /



Sample No. : 15

by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μM (No.200)	13.1

رقم الترخيص: ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩
الجهة المانحة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
التمثيل القانوني
م. شمس الدين
200 - 001 - 657
3 شارع بنك الإفيل - الزمالك - القاهرة

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	37.1	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	26.0	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	13.1	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits


Signature


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com
الهاتف: 27367231 - 27363093
الفاكس: 27367231 - 27363093
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

5

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 20/02/2023
Reporting Date : 26/02/2023
Reporting No. : 15
Sample No. : 15

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

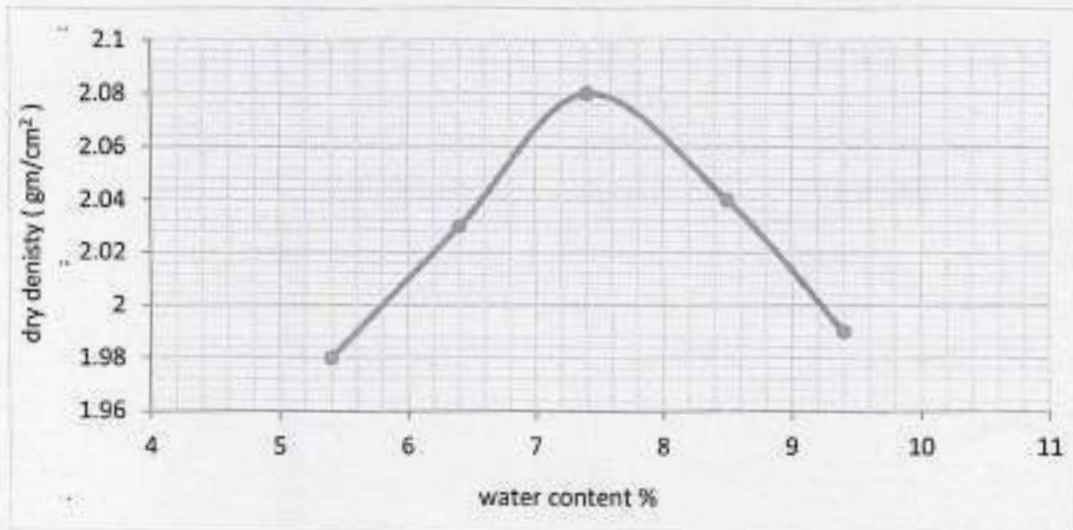

- Max dry density (gm/cm³) : 2.08
- Optimum moisture content % : 7.4

Signature /



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : حسن أسعد طه (سبنا للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 09/01/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /


3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

٣ ش الملك الأفضل
الزمالة - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.2
25	92.3
19	88.2
12.50	71.3
9.50	56.3
4.75	42.3
2.36	40.0
2.00	36.6
1.18	32.0
0.600	24.1
0.425	20.1
0.300	18.8
0.150	14.2

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المنطقة الشمالية
بمصر الجديدة
Signature /

Company Name : حسن أسعد طة (مستشار للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	12.1

Signature /



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16


**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /
المستشار
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
219 - 501 - 537
شارع شبراخيت - شبراخيت - الدقهية

Company Name : حسن أسعد طه (سنوات للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

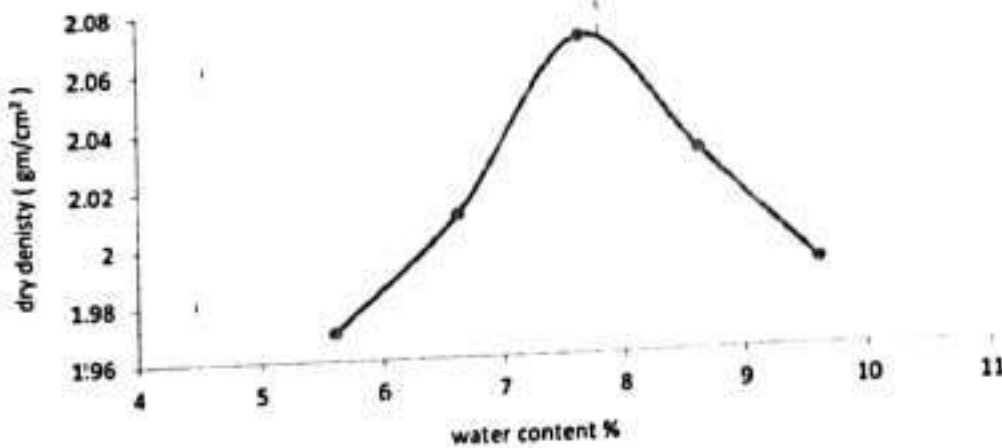

- Max dry density (gm/cm³) : 2.07
- Optimum moisture content % : 7.6

Signature / The stamp is an oval shape containing the CEL logo at the top. Below the logo, the text reads 'مكتب معامل الاستشارات الهندسية' (Consulting Engineering Bureau & Laboratories) and 'الممثل القانوني' (Legal Representative). At the bottom, there is a signature and the text 'بموجب قرار رقم 25 لسنة 2012' (By decision No. 25 of 2012).

Company Name : حسن أسعد طة (سيناء للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.18
1.27	0.050	2.42
1.91	0.075	2.69
2.54	0.100	2.97
3.18	0.125	3.20
3.81	0.150	3.48
4.45	0.175	3.73
5.08	0.200	3.94
5.71	0.225	4.13
6.35	0.250	4.26

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	43.1
	6.90	2.97	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.07(gm /cm³) at 1.6% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 kg

Signature /
م. أسعد طة
م. أسعد طة
م. أسعد طة


CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : حسن أسعد طه (مهندس للمقاولات)
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Location : St. (472+100) : (473+100)
Type of sample : Soil Embankment
Delivery Date : 09/01/2023
Reporting Date : 15/01/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 16

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883

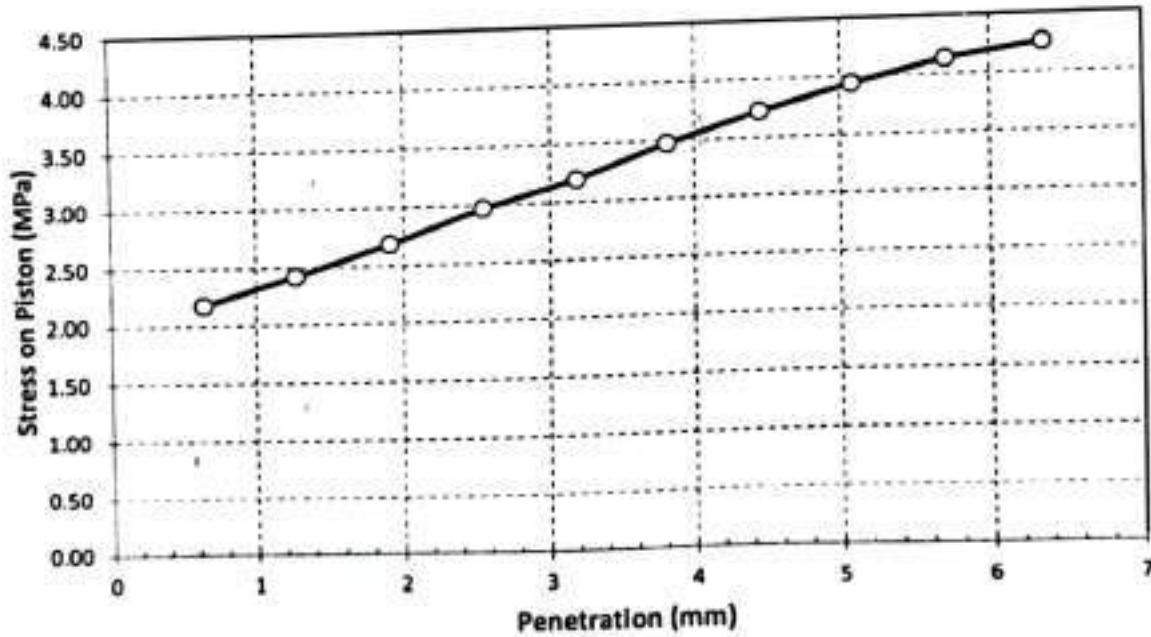

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الزمالك - القاهرة
رقم الترخيص 227 - 215-001
إبراهيم شمس ، م. فرج الله الأفلح - إيهاب - فادي

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

ش. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

المؤلف: د. محمد عبد الحليم

Scanned with CamScanner

٢٠٠٥/٢٠٠٥

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

٢٠٠٥/٢٠٠٥

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.

٢ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيد المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

٤ - (أ) لممثلة الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم والالتزام بتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك، وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريّة يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً لتبلغوها أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر والأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبائها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلة الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة دعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد اسمه بجدول الوثيقة قدمه إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المؤمّن عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للعقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يعطى هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلفيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شعب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة عاصية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - الانفجارات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثله.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبرة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد لتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

1314942

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة لم الاتفاق بين شركة وثائق التأمين (المعروف عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على أن تتعهد الشركة وفقاً لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المسجل بجدول الوثيقة بتعويض المشارك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المحددة في الوثيقة. ملاحظة: إزاء ذلك، في حدود شروط الاشتراكات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة		رقم الوثيقة :
اصدار	2205/2023	اسم المشترك/ اوالمشتركين :
شركة حسن أسعد طه سليم - سياء للمقاولات		العضوان :
الشرقية مركز أبو حماد ش المستشار صفوت فهمي		اسم المستفيد :
الهيئة العامة للطرق والكبارى		اسم المقاوله :
تأسسنا على عقد رقم (488 / 2023 / 2024) أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (الحين المنفذه - مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابى) قطاع العطين - فوكه المسافة من الكم 472,400 الى الكم 472,700 بطول 0.300 كم .		موقع العمل :
الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابى) قطاع العطين - فوكه		مدة التأمين :
2023/10/09	يبدأ التأمين فى :	أ- بالنسبة للأعمال
2024/10/08	ويتمهى فى :	ب- بالنسبة لأعمال الصيانة
	تبدأ من :	
	وتتمهى فى :	
فقط لمدعشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري	11,500,000.00	مبلغ التأمين :
الاضرار المدنية		القسم الاول :
المسئولية المدنية قبل الغير		القسم الثانى :



09/10/2023 تحرير افى

اسم المستخدم	كلمة السر
admin	admin
user	user
guest	guest
...	...

مصطفى محمد مصطفى	23697	كود المنتج
------------------	-------	------------

شركة وثائق للتأمين التكافلي - مصر

وہناو
wethao

Head Office : 25 Mustafa St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch : 6 Abbasi El Agad st., Near City - Cairo
 Alexandria Branch : 89 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Suez Branch : 16 Fawky West Street - Suez - El Gater Station Area
 El Mansoura Branch : Aved Alfa Building 2, El Gharb st., El Mansoura
 Port Said Branch : Block 3/A, AlHaramain and Melwood Bldg Street - East Section - Kaaba Tower above Abu Ghail Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Antakia Tower - Front of Financial Directorate
 Port Salf Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkin Government
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourh Section, Damietta El Elhi Building, above El-Tech and Wafa Bank

[illegible]

1314943

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2205/2023 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية		
التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقاولات
-	-	(الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -
يتحمل المشترك 20% من اجمالي مبلغ التأمين	11,500,000.00 جم	1-1 قيمة العقد -
-	-	1-2 الأثاث والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين
-	-	2- أدوات ومعدات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4 - إزالة الانقاض - غير مغطى
-	11,500,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول

التحملات	حدود التعويض (1)	الأخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير
-	-	2- العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / إزلاق وانهيار التربة - غير مغطى

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلطة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير		
التحملات	حدود التعويض (2)	البند المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	1-2 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك 20% من كل حادث بعد ائتي 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
-	400,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من المواقف الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تاريخ افي

هاني عاطف

اسم الممثل



1314944

تأريخ جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 2205/2023 إصدار

حساب الاشتراك		
الاشتراك المساهمي	1,056.00	جـم
نصف التغطية التأمينية	58.08	جـم
العمولة النوعية	26.10	جـم
مصاريف إصدار	50.32	جـم
رسم الاشتراك و الرافعة / مئة في الألف	6.34	جـم
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف	2.11	جـم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	1.06	جـم
اجمالي الاشتراك	1,200.00	جـم

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 09/10/2023
اسم المستفيد هاني عاطف

Head Office : 25 Masadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Ward el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aged st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Shoubra Branch : 30 Pansy Nasr Street - Shoubra El Khayma
 El Mansoura Branch : Awad Ali Building 2, El Gish st., El Mansoura
 Port said Branch : Elad 31A, Al-Masara and Mahmoud Sedig Street - East Sector - Alula Town above El Shadi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shoubra Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shoubra Governorate
 Damietta Branch : Central El Nila Fourth Section, Damietta El Rika Building, above B-Tech and Wata Bank

خط الساخن
19685
من 3

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الفرع الرئيسي : 25 شارع مسادك - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : 20 شارع ورد النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - القلعة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع شبراخيت : 30 شارع ناسر - شبراخيت - شبراخيت
 فرع المنصورة : 30 شارع ناسر - المنصورة - المنصورة
 فرع بورسعيد : 31A شارع أحمد زعيم - شرق بورسعيد - بورسعيد
 فرع إسماعيلية : 31 شارع شهاب - إسماعيلية - إسماعيلية
 فرع دمياط : 31 شارع عبد القادر - دمياط - دمياط
 فرع دمنيات : 31 شارع عبد القادر - دمنيات - دمنيات

1314945

و تعتبر الملاحق التالية والمنكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

شركة وثائق التأمين التكافلي - مصر

09/10/2023	تحرير الفاي
عائز عايط	اسم المستخدم



www.wefhaq-egypt.com E-mail:wefhaq@wefhaq-egypt.com www.facebook.com/wefhaq

Head Office: 35 Masoud St., Dokki - Giza
 Mohandessin Branch: 20 Wadi El Nil St., Mohandessin - Giza
 Near City Branch: 6 Abbasi El Aged St., Near City - Giza
 Alexandria Branch: 58 Fouad St., El Horra Road, Alexandria
 Smouha Branch: 50 Pasha Street - Smouha-Sid Golden Station Area
 El Mansara Branch: Awad Alla Building 2, El Gharbi St., El Mansara
 Port Said Branch: Dock 2/A, Ashmouni and Mohamed Sedig Street - East Section - Ashmouni (near El Khay Bank - port Said)
 Ismailia Branch: North Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port Said Branch: General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharika Government
 Damietta Branch: Gharbi El Nile Fourth Section, Damietta El Hake Building, above B-Tech and Wala Bank

19685

[illegible]

1314946

تأجيل جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم: 2205/2023 إصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبني أو المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بأجهزة مقاومة الحريق في الموقع وأن تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام صليات الحام والتطعيم في الأماكن المغلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمقرر عليه لا تسري تغطيته خطر السقوط / أو السرفه بالاكراه على العدد والتشويبات والمؤمن عليها إلا داخل المخازن قطاراً بالاعتناء المسلح على الخفراء أو أفراد الأمن المكلين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والأماكن سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمقرر عليه وبناء على الشروط العامة لوثيقة جميع أخطار المقاولين أن الوثيقة تغطي خطرى الحريق والسقوط
شروط الإطلاع : يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات. أنه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لمصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والأرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية والأخطار الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وإزالة الانقاض والحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يحتمل بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المتفردة (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

09/10/2023

تحريراً في

هاني عاطف

اسم المستند



Head Office : 25 Mosadak St., Dokki - Giza
 Mahandessan Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandessan - Giza
 Naar City Branch : 6 Abbas El Agad St., Naar City - Cairo
 Alexandria Branch : 55 Fouad St., (El Hada Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fouad St., (El Hada Road) - Alexandria
 El Mansara Branch : 4000 El Mansara St., El Mansara - Giza
 Port Said Branch : 1000 El Mansara St., Port Said - Matruh
 Ismailia Branch : 1000 El Mansara St., Ismailia - Matruh
 Port Said Branch : 1000 El Mansara St., Port Said - Matruh
 Damietta Branch : 1000 El Mansara St., Damietta - Matruh

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685 من 5

الفرع الرئيسي : 25 شارع مسدك - الدقي - الجيزة
 فرع القاهرة - 20 شارع وادي النيل - المحندسان - الجيزة
 فرع مدينة نصر - 6 شارع عباس - النجدة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية - 55 شارع فؤاد (شارع الحداد) - الإسكندرية
 فرع سموحة - 90 شارع فؤاد (شارع الحداد) - سموحة - شبراخيت - الإسكندرية
 فرع القصيرة - 4000 شارع المنصورة - القصيرة - الجيزة
 فرع بورسعيد - 1000 شارع المنصورة - بورسعيد - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية - 1000 شارع المنصورة - الإسماعيلية - الإسماعيلية
 فرع الزقازيق - 1000 شارع المنصورة - الزقازيق - الزقازيق
 فرع دمياط - 1000 شارع المنصورة - دمياط - دمياط

1314947

تاريخ جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2205/2023 اصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مراق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

تحريرا في 09/10/2023

اسم المستخدم هاني عاطف



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 26 Mosadik st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Naser City Branch : 6 Abbas El Agad st., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Suez Branch : 60 Fouad St - Suez - El Gharbiyeh
El Mansourah Branch : Awad Ali Building 2, El Gharbiyeh, El Mansourah
Port Said Branch : Dock 3/A, Al-Masara and Mohamed Sedky Street - East Sector - North Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shaban Street - Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port Said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governorate
Damietta Branch : Gharbiyeh El Nile Fourth Section, Damietta El Rika Building, above B-Tech and Wafa Bank

شبكة التامين
19685 من 6

المركز الرئيسي : ٢٦ شارع مسديك - الدقي - الجيزة
فرع لكهنه مسديك : ٢٠ شارع وادي النيل - الكهنه - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس الاعداد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الاسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الاسكندرية
فرع السويس : ٦٠ شارع فؤاد - السويس - سويفه - قسم سوي جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : ٦٠ شارع فؤاد - المنصورة - قسم سوي جابر - الاسكندرية
فرع بورسعيد : قلعة ١٢ شارع الامون ومحمود سديك - قسم شرق - برج القضاة على مصرف ابو ظبي - بورسعيد
فرع اسيوط : شارع شين برج الاندلس - امام الدورية الثانية
فرع الزقازيق : شارع سيد القاصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة القضاة على طريق كوكب الشرق - دمياط

1314948

مرقعات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2205/2023 اصدار

المرفقات

- | |
|--|
| <p>* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة لجميع أطراف المتأثرين و الملاحق. اتفاقية المرفقة جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة .</p> |
| <p>* شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التامين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو لنسج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .</p> |
| <p>* شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فانه يستثنى كافة الخسائر والأضرار و فقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقشي هذه الأمراض المعدية .</p> |
| <p>* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المشيئة من أو الناتجة عن الزلازل .</p> |
| <p>* ملحق رقم 110 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المشيئة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .</p> |
| <p>* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه
من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بيرفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف يسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .</p> |
| <p>* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بلطوال الأقسام المتفد
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات و الأحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحت مباشرة أو غير مباشرة للقصور و القواطع و الشدات والمصارف و القنات واصل الطرق أو أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة اثناء ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محددًا بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .</p> |

شركة وثائق التأمين التكافلي - مصر

09/10/2023 تحرير في
اسم المستخدم هاشم عاتق



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office : 28 Mohamed Ali, Dokki - Giza
 Mahandessin Branch : 20 Wadi el Nil st., Mahandessin - Giza
 Nasr City Branch : 5 Abbas El Agad st., Nasr City - Giza
 Alexandria Branch : 60 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Suez Branch : 98 Pasha Most Street - Suez - El Gaber Station Area
 El Mansoura Branch : Almet Rifa Building 2, El Gish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Muhamm and Mahmoud Sadi Street - Gulf Section - Asafa Tower above Abu Diwak Bank - (Port Said)
 Ismailia Branch : Station Street - Asafiya Tower - Port of Financial Directorate
 Port said Branch : General Abdel Hameed Street - Agricultural Society Building, next to Shamma Government
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section - Cornish El Giza Building, (opposite El Nile and El Mansoura)

[illegible]

1314949

إصدار

2205/2023

مرفقات وثيقة تأمين جميع الخطوط المقاولين

الحد الأقصى لطول القسم 250 متر + وبعد أقصى 3 القسم ويتم العمل فيها في نفس الوقت.
ملحق رقم 12 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستقائات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتوفير المشترك عن الخسارة او التلث التسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراك مالى :- (1) تراعى مددات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع تقدم العمل . (2) ان يكون هناك خط مواصلات مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون منقذ بالخطية مؤقتة . (3) ان يتم فحص المستلزمات المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائف الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع . (4) ان يتم تركيب اواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة القشور المستخدمة في الإنشاء . (5) ان يتم إغلاق الوقت لفترات إيقار المصاعد ، فانيب الخزانات وى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات . (6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الانوار التى يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل . (7) اتباع نظام (التسريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من أى نوع مثل :- - عمليات الجلف ، التسليخ ، اللحام ، - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية . - استعمال البيلوسمين الساخن . - او أى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة . (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة . (9) عند تخزين المواد المستخدمة في التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لانتجار القيمة المبيدة لانداء لكل وحدة تخزين . (10) كل وحدة تخزين مسئلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق . (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة المواد او الفلزات القابلة للاشتعال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء او التركيب او أى اعمال ينشأ عنها لهب . (12) تعيين منسق امان بالموقع . (13) تركيب نظام يعتمد عليه لانتذار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع ارب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك . (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند افرع حريق مع تحديثها بانتظام . (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم تدريبات العملية اسبوعيا . (16) ان يكون ارب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له في جميع الاوقات . (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة . قيمة كل وحدة تخزين : 125,000 جم .

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

09/10/2023

تحريرا في

هلى عاطف

اسم المستخدم



www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

شركة التأمين
19685
من 8

Head Office : 25 Moadaklat, Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Vied el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch : 6 Abbas El Agid st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horo Road) - Alexandria
Suez Branch : 90 Fawzy Mawt St. - Suez - Sid Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Akad Aka Building 3, El Besh st., El Mansoura
Port said Branch : Blok 3/A, Al-Mansour and Bahmad Sedy Street - East Sidiou - Asha Tower above Abu Othay Bank - port said
Ismailia Branch : Sheikh Street Andalus Tower - Front of Financial Gasstation
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agoufahel Society Building, next to Shadia Governate
Damietta Branch : Cornish El Nil Fourth Section Damietta El Rifa Building, above B-Tech and Wala Bank

الوكلاء الرسميين : ٢٥ شارع صدقي - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القطار - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع هادي (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع السويس : ٩٠ شارع فاروقى - سuez - محطة - قسم سوي - الجسر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٩٠ شارع فاروقى - المنصورة - قسم سوي - الجسر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : ٨٨ شارع أمين - بورسعيد - قسم الشرق - برج المينا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج القدس - إسماعيلية - المدينة الجديدة
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر - مينا الجديدة الزقازيق - بورسعيد - محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٤ الدور الرابع عمارة القمامى على شق كوكب النيل - دمياط

1314950

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : أخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع لخطار المتداولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم 2205/2023

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة حسن أسعد طه سليم - ميناء للمقاولات

العنوان : الشرقية مركز أبو حماد ش المستقبل صفوت فهمي

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدة التأمين : من : 09/10/2023

إلى : 08/10/2024


العملة : ج.م

مبلغ التأمين : 11,500,000.00

فقط أحد عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه مصري

ج.م	1,056.00	:	الإشتراك
ج.م	58.08	:	نصف الدفعة التأسيسية
ج.م	50.32	:	مصاريف الاصدار
ج.م	26.10	:	الضريبة النوعية
ج.م	6.34	:	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
ج.م	2.11	:	إشتراك صندوق حملة اللوائق / أثنان في الألف
ج.م	1.06	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
ج.م	1,200.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط ألف ومائتان جنيه مصري)



تحريرا في 09/10/2023

اسم المستند : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Head Office : 25 Mesadak St., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil St., Mohandeseen - Giza
 New City Branch : 5 Abbas El Agha St., New City - Giza
 Alexandria Branch : 88 Fouad St., (off Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fouad St., Smouha - El Gharbiya
 El Mansoura Branch : Al-Azhar Bldg 3, El Gharbi St., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, El-Masara and El-Masara St., Port Said
 Ismailia Branch : Shaban St., Aridkha Tower - Port of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Shadia Government
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Rifa Building, above El-Tech and Welo Bank

5 % 52.80

9 من 9
19685

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

المركز الرئيسي : 88 شارع ميساد - الدقي - الجيزة
 فرع القاهرة : 20 شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 5 شارع عباس - القاهرة - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (مقابل هوريا) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع فؤاد - سموحة - الجيزة
 فرع المنصورة : 3 شارع أبو حنيفة - المنصورة - الجيزة
 فرع بورسعيد : 5 شارع أبو حنيفة - بورسعيد - بورسعيد
 فرع إسماعيلية : 3 شارع شهاب - إسماعيلية - بورسعيد
 فرع بورسعيد : 5 شارع أبو حنيفة - بورسعيد - بورسعيد
 فرع بورسعيد : 5 شارع أبو حنيفة - بورسعيد - بورسعيد

السيد/السادة/ شركة حسن اسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2205 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2023/10/09 إلى 08/10/2024 بإجمالي مبلغ تأمين 11500000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيدكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وآثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها لوجه عنايتكم سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إعادتنا برغيبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين لو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 09/10/2023

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثانياً: في حالة العجز الجزئي المستديم:

تؤدي الشركة للمشتراك مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي:-

نسبة العجز الجزئي	2- الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		1- الأطراف العليا
		اليد	الرجل	
50%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	50%	60%	الفقد الكامل للذراع أو اليد
40%	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	20%	25%	الفقد الكامل لحركة الكتف
30%	الفقد الجزئي للقدم وتشمل لجميع الأصابع	15%	20%	الفقد الكامل لحركة المرفق
30%	الفقد الكامل لحركة الكتف	15%	20%	الفقد الكامل لحركة المعصم
30%	الفقد الكامل لحركة الركبة	25%	30%	الفقد الكامل للعضلات والسبابة
15%	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	20%	25%	الفقد الكامل للعضلات والأصابع غير السبابة
8%	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	15%	20%	الفقد الكامل للسبابة والأصابع غير الإبهام
3- الكسور		20%	25%	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة
30%	كسر ثم يلتئم بالنسج فقط	15%	20%	الفقد الكامل للعضلات فقط
20%	كسر ثم يلتئم بالقدم فقط	10%	15%	الفقد الكامل للسبابة فقط
20%	كسر ثم يلتئم بالرصعة فقط	8%	10%	الفقد الكامل للعضلات فقط
25%	كسر ثم يلتئم بالفتك الأسفل	7%	8%	الفقد الكامل للعضلات فقط
10%	كسر ثم يلتئم بالفتك العلوي أو الكسر الشظوي أو الكسر في العظام والعضلات والوظيفة	6%	7%	الفقد الكامل للعضلات فقط

وإذا كان المشترك أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى لتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى الملاحظة لها.

الصمم وانكماش الأطراف وفقد الابصار.

صمم تام	40%	صمم احدى الاذان	15%
انكماش طرف سفلي خمسة (5) سنتمترات على الأقل	35%	الفقد الكامل لعين واحدة	35%

ويعتبر عجز البصر كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نشأاً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقد جازياً بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل.

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي:

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يملكها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم.

- لا يستحق للمشتراك أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المسدق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً أو عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها.

بناءً على البيانات والأقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، ووفقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحق بها.

تعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات الملوحة عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتراك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة أو أية مدد لاحقة بتفكيك إصابته جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستتعة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة.

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولاً: في حالة الوفاة:

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بيانهم بالجدول أو على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم بسقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين أو المستحقين.

ثانياً: في حالة العجز الكلي المستديم:

تؤدي الشركة للمشتراك أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية:

- فقد ابصار العينين نهائياً.
- فقد الساقين أو القدمين.
- فقد ذراع وقدم.
- فقد يد وقدم.
- فقد الذراعين أو اليدين.
- فقد ذراع وساق.
- فقد يد وساق.

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نشأاً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة. ولا يستحق للمشتراك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً.



1339241

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة :	1866/2023	فرع الإصدار : المركز الرئيسي
اسم المشترك :	شركة حسن أحمد طه سليم - ميلاء للمقاولات	
العنوان :	الشرفية مركز أبو حماد ش. المستشار صولت فهمي	
المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكباري	
التغطية التأمينية :	تأميناً على عدد 4 أفراد غير محندي الأسماء مقسمين كالآتي (عدد 1 مهنتس + عدد 1 مساعد مهنتس + عدد 1 سائق معدة + عدد 1 عامل) عشرين لدى المشترك، بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 ج.م (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) بواقع 75,000 ج.م (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهنتس، 30,000 ج.م (ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) لمساعد المهنتس، 15,000 ج.م (خمس عشرة ألف جنيه مصري لا غير) لسائق المعدة، 10,000 ج.م (عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) للعامل، وذلك عند خطر (الوقوع + العجز الكلي والجزئي المستقيم) نتيجة حادث وذلك أثناء وجوب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من تلقاء أعمال مشروع عند رقم (488 / 2023 / 2024) أصل الجسر الكباري والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (البن السخنة - مطروح) لخط الأول (مرحلة تشكيل الجسر الكباري) قطاع العلين - فقرة المسافة من الكم 472,400 إلى الكم 472,700 بطول 0,300 كم . والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أنظار المتأولين رقم 2023/2205 والمصدرة من شركة وثق لتأمين التكافلي - مصر .	
مدة التأمين	من : 09/10/2023 إلى : 08/10/2024	حساب الأشتراك
		الإشتراك السنوي : 430.00 ج.م
		نصف التغطية السنوية : 4.30 ج.م
		الجزئية الشهرية : 11.80 ج.م
		مصاريف الإصدار : 50.23 ج.م
		رسم الأشراف و الرقابة / سنة في الألف : 2.58 ج.م
		اشراف صندوق حصة الوثائق / أثنان في الألف : 0.86 ج.م
		مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف : 0.43 ج.م
		أجمالي الأشتراك : 500.00 ج.م
		فقط خمسمائة جنيه مصري

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوقوع نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستقيم نتيجة حادث
طبقاً لنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئي المستقيم نتيجة حادث
غير مفصّل	العجز الكلي المؤقت نتيجة حادث
غير مفصّل	إرجاع التغطيات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة من الحادث الواحد (بمبالغ عند الأضرار) :-
 130,000.00 ج.م فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري
 130,000.00 ج.م فقط مائة وثلاثون ألفاً جنيه مصري

الحد الأقصى الذي تتلزم به الشركة خلال مدة التأمين :-



مرفقات هذه الوثيقة :
 أ - الشروط العامة للوثيقة
 ب - تلعب لجدول الوثيقة

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

Head Office
 Mohandessen Branch
 Nasr City Branch
 Alexandria Branch
 Sousse Branch
 El Mansoura Branch
 Port said Branch
 Ismailia Branch
 Port said Branch
 Damietta Branch

25 Masadek st., Dokki - Giza
 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 6 Abbas El Agad st., Near City - Cairo
 68 Fouad st., (El Hara Hospital) Alexandria
 98 Fouad St. Sousse - El Bahi Station Area
 Aved Alta Building 2, El Gharb st., El Mansoura
 Block 3/A, Al-Hamam and Mahmoud Bady Street - East Section - Alata Tower above the State Bank - Port Said
 Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Government
 Cornish El Nile Fourth Section, Omnia El Rifa Building, above El Tech and Wafa Bank



19685

1 من 4

تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : لدى محمد فهمي أحمد

مصطفى محمد مصطفى

كود المنتج : 23697

المركز الرئيسي : 25 شارع مصطفی - الدقي - الجيزة
 فرع القاهرة : 20 شارع وادي النيل - المحند حسن - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - البساتين - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 68 شارع فؤاد (جانب السيرة) - الإسكندرية
 فرع سويس : 98 شارع فؤاد - سويس - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : 9 شارع موشى الله رقم 2 ش. الجبل على البنت العسرى الخليلي - المنصورة
 فرع بورسعيد : 6 شارع موشى الله رقم 2 ش. الجبل على البنت العسرى الخليلي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : 6 شارع موشى الله رقم 2 ش. الجبل على البنت العسرى الخليلي - الإسماعيلية
 فرع الزقازيق : 6 شارع موشى الله رقم 2 ش. الجبل على البنت العسرى الخليلي - الزقازيق
 فرع دمياط : 6 شارع موشى الله رقم 2 ش. الجبل على البنت العسرى الخليلي - دمياط

1339242

اسداس

تاريخ جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1866/2023

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم من 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي بمتطلباته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة.
- يشترط أن يكون عدد الأفراد القعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض.
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة.
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط.
- يتعين أن يُلخّص المشترك كافة الاتصالات والاشتراكات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم.
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى لتقع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين.
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك.
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE".

الاستثناءات

- استثناء الأخطار الميامية.
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)



تحريراً في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : ندى محمد فؤاد أحمد

كرد المنتج : مصطفى محمد مصطفى 23697

2 من 4

1339243

اصدار

مرفقات وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1866/2023

• شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام و الاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

3 من 4



Head Office : 25 Mostak el., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Nasr City Branch : 8 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Giza Branch : 90 Farag Mostaf Street - Smouha-Sid Gaber-Sid El-Azhar
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gahat st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sodey Street - East Sodey - Asafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Sharikin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : General Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharia Governance
Dahietta Branch : Corniche El Nile Fourth Section, Damsat El Rizal Building, above G-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

الفرع الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندeseen : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٨ شارع عباس - قنطرة مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق هادي - سموحة - قسم سيد جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٢٠ شارع جيتو - رقم ٢ في الجيتو أعلى البنك المصري التلغراف - المنصورة
فرع بورسعيد : ٨٣ شارع المأمون وبخيت مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الدلتا - أمام المديرية التالية
فرع الزقازيق : شارع جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بوزار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : ٢ شارع رقم ٢ قنطرة عمارة قرقاش أعلى من قنطرة كورتش النيل - دمياط

1339244

مطالبة سداد

إصدار

نوع الإصدار : حوالت علمة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 1866/2023

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة حسن أسعد طه سليم - سيناء للمقاولات

العنوان : الشرقية مركز أبو حماد ش المستشار صفوت فهمي

أصالح : الهيئة العامة للطرق والكباري

مدة التأمين : من : 09/10/2023

إلى : 08/10/2024

العملة : جنيه مصري


الإشتراك السنوي	:	430.00	جم
نصف الدفعة السنوية	:	4.30	جم
الضريبة التوعية	:	11.60	جم
مصاريف الإصدار	:	50.23	جم
رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف	:	2.58	جم
لشتر الك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	:	0.86	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جم
إجمالي الأشتراك	:	500.00	جم
قطر خمسمائة جنيه مصري			

تحرير في : 09/10/2023

تاريخ الطباعة : 09/10/2023

إعداد : ندى محمد فهمي احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات 43.00 10 % شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

4 من 4



محضر استلام موقع

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم
472+400 الى الكم 472+700 بطول 0.3 كيلو متر

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/488) بتاريخ 2023/10/08

إنه في يوم الاحد الموافق 2023/10/15 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس /محمد حسني فياض مهندس عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس / عبدالمنعم محمد مدير مشروع - شركة حسن أسعد طة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2023/10/15 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- عبد المنعم محمد

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى

مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة حسن أسعد طه سليم للمقاولات العامة - من المحطة 100 + 472 الى المحطة 100 + 473

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2023/02/01

- بناء على طلب المقاول شركة سيناء للمقاولات العامة (حسن أسعد طه سليم) لتحديد مسافة نقل من
محجر (المصرية) .

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / كمال نجيب | مندوب الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / احمد علاء الدين | مندوب شركة حسن أسعد طه سليم للمقاولات العامة |
| 4- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب |


(Xyz)


وتبين ان المحجر علي مسافة 204 كم من منتصف قطاع شركة حسن اسعد طه للمقاولات العامة


احد اثي المحجر N 30 ° 33 ' 19.7" E 53 ° 54 ' 7 "

احداثي منتصف القطاع N 31 ° 02 ' 35.01 " E 28 ° 14 ' 14.27 "

وعلي ذلك تم توقيع،،

4 - 

3 - 

2 - 

1 - 
