

مقايضة معدلة

عملية استكمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي	اسم العمارة
شركة الفاتح للمقاولات العامة	اسم الشركة
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣	رقم عقد العمل
سنة اشهر	مدة المشروع
١٩٩٤٦٦٥,٠٠ جنيه	قيمة العمل حسب العقد
٢٠٢٤ / ٠٩ / ١٠	تاريخ بدء العمل
٢٠٢٥ / ٠٣ / ٩	تاريخ النتهاء
المنطقة الثامنة	المقايضة
١٩٩٤٦٦٥,٠٠ جنيه	قيمة المقايضة طبقاً للمقايضة المعدلة
٠,٠٠ جنيه	قيمة الزيادة عن المقايضة المعتمدة
٠,٠٠ %	نسبة الزيادة عن المقايضة المعتمدة
مبررات المقايضة المعدلة - طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة ودفاتر الحصر للاعمال والمعتمد من المنطقة .	
مهندس / أحمد محمد النوبسي	مهندس المشروع
مهندس / محمد محمود محمد اباظة	مدير عام تنفيذ وصيانة الكباري
مهندس / عماد محمد حسنين	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
الأستاذ / شعري فؤاد شعري	رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري والإتشاءات
الأستاذ / تامر ربدت محمود	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح


التوقيع : ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

يحتفظ

التوقيع : ()
لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد الشريف
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مقايضة معدلة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق لنا / الاقصير الصحراوي الشمالي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	اللمة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة
الاعمال الانشائية						
١	بالمتر المكعب تكسير الأسفلت بأى سمك حتى اقرب طبقة اساس ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٠	١٥٠	٣	١٥٠,٠٠
٢	بالمتر الطولي فك وازاله بردورات بأى ابعاد والفئة تشمل الفك ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية.	م.ط	١٠	٧٠	٠	٠,٠٠
٣	بالمتر المسطح فك وازالة انتروك للأرصفة مع اعادة التركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٦	٩٠	٠	٠,٠٠
٤	بالمتر الطولي عمل جسات لاختبار نوع التربة بعمق لا يقل عن ١٠ م لتحديد جهد وعق التأسيس والفئة تشمل اجراءات والتحليل اللازمة وعمل التقرير النهائي للتصميم في التربة العادية والمتاسكة حتى اجهاد ٢٥٠ كجم/م ^٢ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	٦٥٠	٢٠	١٣,٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات وخلافه فى أى نوع من أنواع التربة ما عدا التربة الصخرية إلى أى عمق حتى الوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس، والسعر يشمل دمك تربة التأسيس ونقل ناتج الحفر الزائد والغير صالح للردم إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥٥٣	١٠٠	٧٣٣	٧٣,٣٠٠,٠٠
٦	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه مورده خاليه من المواد العضويه طبقا للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة ٢٥ سم مع غمرها بالمياه والدمك الجيد ميكانيكيا وكافة التجارب العملية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنية لكل كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنية لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم	م ^٣	٣٥٠	١٩٠	٤١٠	٧٧,٩٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات من خرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب ولا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٠٥	٢١٥٥	١٣٠	٢٨٠,١٥٠,٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارصفة بسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٠,٨ م ^٣ ركام طبيعي نظيف متدرج + ٣ م ^٣ رمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٥٠	٢١٥	٢٣٩	٥١,٣٨٥,٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الاساسات (القواعد والسملات ورقابي الاعمدة) لا تقل المقاومة المميزة للخرسانة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوما وذات محتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية المتينة والفئة لا تشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٦٩	٢٩٩٠	٧٣	٢١٨,٢٧٠,٠٠
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والسلالم والأسقف وبروزاتها والكمرات والبلاطات والطبقات والدرابى ذات رتبة ٣٠٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والفئة لا تشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٦٦	٣٨٤٥	٧١	٢٧٢,٩٩٥,٠٠

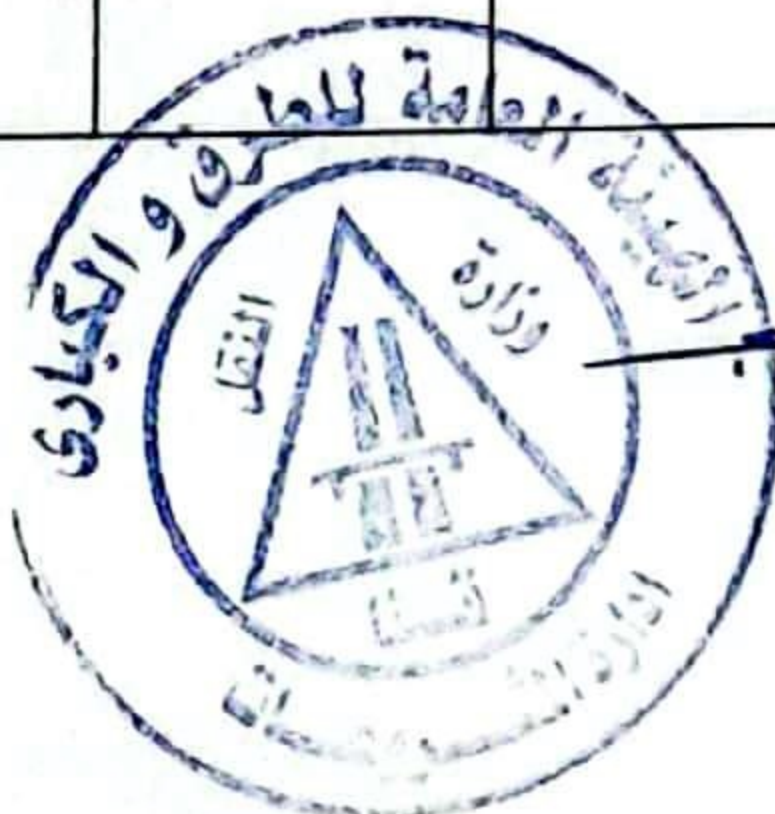

مقايضة معدلة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	اللمة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة
١١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة بيتومين بارد وجهين متعامدين لزوم اسطح خرسانية الاساسات المسلحة ومباني قصبة الردم الملاصقان للردم طبقا لتقارير ابحاث التربة المعتمدة وطبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤٥٠	٨٠	٤١٦	٣٣,٢٨٠,٠٠٠
١٢	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجوري عن ٣ سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف.	م ^٢	٦٥	١٥٠	٤٩	٧,٣٥٠,٠٠٠
١٣	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة طبقة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوي من الانسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٠ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم واللحام بالبشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٦٥	٢٢٠	١٣٢	٢٩,٠٤٠,٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافة لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠	٢٠٠	٤٩	٩,٨٠٠,٠٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبه من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت/م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٥	٢٤٥٠	.	٠,٠٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني سمك نص طوبه من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م ^٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٥	٢٩٠	.	٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني بالطوب الاسمنتى المصمت لزوم قصبة المباني ويكون الطوب من النوع الكبس الالى والفئة تشمل جميع المواد والمصنوعات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	٢٥٠	٢٨٥٠	١٦٦	٤٧٣,١٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعيه (بازلت) او ما يماثلها وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠	٧٤٥	٢١	١٥,٦٤٥,٠٠٠
١٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ١٥×٣٠×٥٠ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م ^٣ , ٨٠ زلط + ٣م ^٣ , ٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكية احدهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٦٠	٢٥٠	١١١	٢٧,٧٥٠,٠٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك بالشكل المطلوب سمك ٦ سم ومحمل علي البند طبقة رمال اسفل الانترلوك وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٥٠	٢٦٠	١٩٤	٥٠,٤٤٠,٠٠٠




نماذج



م

مقايضة معدلة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امنى بجوار كوبرى البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق لنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	اللمة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة
٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز أول من اجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب بالمونة الاسمنتية والرمال وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٩	٢٩٠	٧٠	٢٠,٣٠٠,٠٠٠
٢٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات (كليوباترا - او مايمائلة) من اجود الاتواع فرز اول بسمك لا يقل عن ٦ مم مطابق للمواصفات القياسية المصرية باللون المطلوب (على أن يتم التركيب بمونة سمك ٢ سم مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل نظيف والسقية بلباتى الاسمنت الابيض والفئة تشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة للتركيب والرمل اللازم للحصول على المناسب المطلوبة للحصول على سطح ناعم مستوى تماما والبند لا تشمل الوزرات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٥	٤٤٠	٤٦	٢٠,٢٤٠,٠٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط بأي مقاس (كليوباترا - او مايمائلة) من اجود الاتواع فرز اول باللون المطلوب والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقيه الحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٦٠	٤٦٥	٥٥	٢٥,٥٧٥,٠٠٠
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزر سيراميك ١٠ سم والبند يشمل المونة الاسمنتية والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٥٠	٥٥	٧٢	٣,٩٦٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢ سم والناتمة سمك ٤ سم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند عمل وزرة من الجهتين (ترابيس) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠	١٤٠٠	٦	٨,٤٠٠,٠٠٠
٢٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للواجهات الخارجية ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة العمومية بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل البطانة بسمك ١,٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم ٣ م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ سم ٣ م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١١٠٠	٢٣٠	١١٣٥	٢٦١,٠٥٠,٠٠٠
٢٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية و الأسقف ودروة السطح من الداخل بسمك ٢ سم، والفئة تشمل الطرشرة العمومية للحوائط سمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت/م ٣ رمل وطبقة الزهرة بسمك ١,٥ سم بمونة الاسمنت والرمل على أن تخدم بالمحارة جيدا لتعطى سطحا مستويا تماما وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٤٠	١٧٠	٣٤١	٥٧,٩٧٠,٠٠٠
٢٨	دهان للواجهات الخارجية جيرفيا تو وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١١٠٠	٢٠٠	١٢٩٥	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠
٢٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوة البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم (سايبس او ما يماثلها) والفئة تشمل (التجهيز +وجه برايمر ماتي ٣+ سكاكين معجون +وجهين باللون المطلوب) وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	٢٤٠	١٧٠	١٧٦	٢٩,٩٢٠,٠٠٠

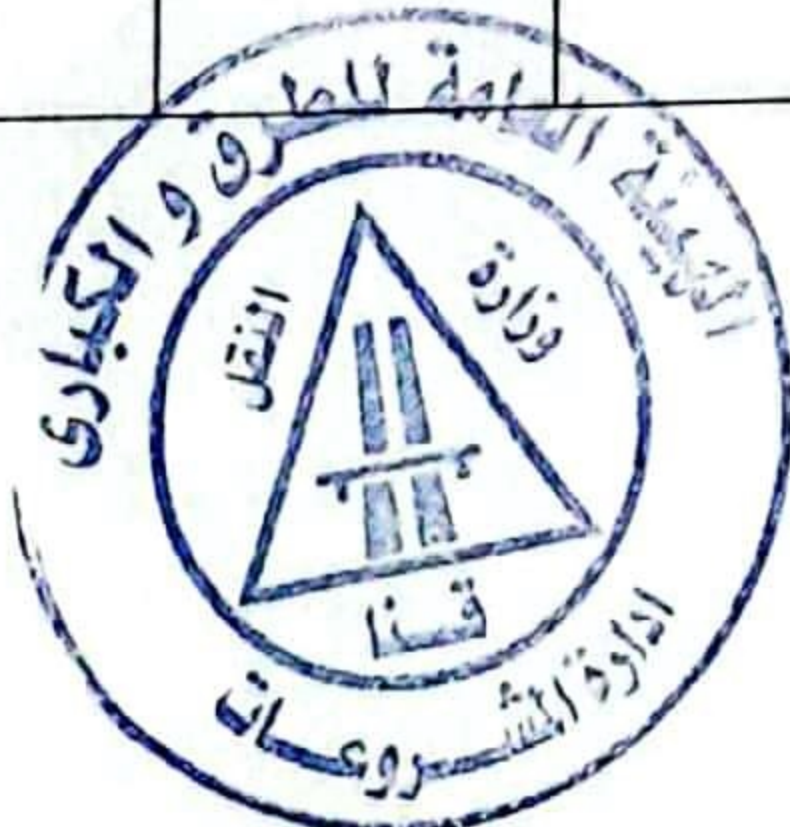

ف. الفاتح



مقايضة معدلة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق لنا / الاقصير الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشبية كبس او حشوات مكونة من قوائم ورووس من الخشب الموسكي وسواصات من الخشب الموسكي مقاس ١,٥ * ٢ * ٢ وكبس قشرة ارو علي MDF سمك ٦ مم بها تجاويف طبقا للهيئة المعمدة وفشاط من الخشب الزان والسعر يشمل جميع الاكسسوار اللازم والبر بعرض حتي ٥ سم والدهان باللون المطلوب والقياس علي الطبيعة بداية من حدود الحلق الخشب من الخارج وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٣	٧٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب ودهان كورنيشة قطاع من ٥ : ١٠ سم للأسقف فيوتك او خشب وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٠	١٥٠	١٦	٢,٤٠٠,٠٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب او شبابيك من قطاعات الومنيوم P.S الثقيلة زجاج عاكس ٦ مم ومظلي بداهات الكتروسناتيك والسعر يشمل توريد وتركيب ضلفة بسلك الومنيوم وجميع الخردوات والكوالين من اجود الأنواع والحلق من الخشب الموسكي قطاع ١,٥ * ٦ بوصة والبرور من الالومنيوم وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	١٦	٥٤٠٠	١٧	٩١,٨٠٠,٠٠٠
٣٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب تسليح (٣٧ / ٥٢) لزوم الخرسانة المسلحة والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	١٥	٥٨٠٠٠	١٩	١,١٠٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالكيلوجرام توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم البوابات وشبابيك الحماية والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب والتثبيت والدهان بوجهين بريمر ووجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب وكذلك الكوالين والمفصلات مخرطة والخردوات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	كجم	٢٠٠٠	١٠٥	٢١٤٩	٢٢٥,٦٤٥,٠٠٠
٣٥	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج مجلفن سمك ١,٥ مم والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٠,٣٠	٦٤٠٠٠	١	٦٤,٠٠٠,٠٠٠
٣٦	بالعدد توريد وتركيب اشاير حديد تسليح لربط الاعمدة بالمباني قطر ٨ ملي الكانات المعدنية بطول لا يقل عن ٣٠ سم وبمسافات من ٤٠ : ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣٤٨	١٥	٥٢٨	٧,٩٢٠,٠٠٠
٣٧	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي من فخار المطلي صيني فرز اول (كليبواترا - ديورافيت - او مايماثله) والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الساخنة والباردة والصرف حتى اقرب سيلفون ارضي او جاليتراب او عمود صرف وفك القديم ان وجد والسعر لايشمل الخلط وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٤٤٠٠	٢	٨,٨٠٠,٠٠٠
٣٨	بالعدد توريد وتركيب مرحاض افرنجي فخار مطلي صيني فرز اول (كليبواترا - ديورافيت - او مايماثله) بصندوق طرد واطي من الصيني والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش على ان تكون ماكينة الكومبينشن من اجود الأنواع وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٠٠٠	١	٧,٠٠٠,٠٠٠



فخاطة



مقايضة معدلة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادى ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	اللنة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة
٣٩	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من اجود الانواع من الفخار المطلي صيني لفرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطبقة والسلسلة الفلنة تشمل التوريد وتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش وفك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٢٧٠٠	١	٢,٧٠٠,٠٠٠
٤٠	بالعدد توريد وتركيب مبلولة معلقة من الفخار المطلي صيني لفرز اول (كليبواترا - ديورافيت - او مايمائله) والفلنة تشمل التوريد وتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرفة تفتيش او عامود صرف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٦٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٤١	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز والفلنة تشمل السماعاة والخلاط والتوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٣	٣٣٠٠	٢	٦,٦٠٠,٠٠٠
٤٢	بالعدد توريد وتركيب خلاط مياه لحوض غسيل الايدي والفلنة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٧٥٠	٤	١١,٠٠٠,٠٠٠
٤٣	بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام ٤ قطع وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١١٠٠	٢	٢,٢٠٠,٠٠٠
٤٤	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٤	١٤٠	٧	٩٨٠,٠٠٠
٤٥	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٦٠	٢	٣٢٠,٠٠٠
٤٦	بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي من اجود الانواع والفلنة تشمل التوريد وتركيب والتغذية من والي الشطاف وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٦٣٠	٢	١,٢٦٠,٠٠٠
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيلفون ارضيه بلاستيك قطر ٣" و الفلنة تشمل التوريد وتركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب او عامود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استئلس استئلس وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٠٠	١	٧٠٠,٠٠٠
٤٨	بالعدد توريد وتركيب سيلفون جاليتراب من PVC قطر ٦" / ٤" وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من وله مصفاة فوق فرشاة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم والفلنة تشمل التوريد وتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٥٦٠	١	١,٥٦٠,٠٠٠
٤٩	بالعدد توريد وتركيب مزارب جرجوري لصرف مياه الامطار من PVC بمصفاة وعامود الطرف من البلاستيك قطر ٣ بوصة من اجود الانواع والفلنة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت وعمل الميول الطولية والعرضية اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٠٠٠	٢	٢,٠٠٠,٠٠٠



فخالة



مقاومة معدلة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمون املح بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق لنا / الاقصر الصحراوي الجديد))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الكمية المعدلة	القيمة المعدلة
٥٠	بالعدد توريد و بناء غرفة تلفون مقياس ٠,٦٤,٠,٦ م و لاي عملي و الفنة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوبة ٢٥ سم من الطوب الاسمنتي فوق فرشاة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الابعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بتخلية ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل عزل حرجي بين حوائط باردة و داخلي بمادة سبكا ١٠٧ و عمل المجاري اللازمة و الفنة تشمل الغطاء ٦٠ سم من GRP و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٥٧٥٠	٥	٢٨,٧٥٠,٠٠٠
٥١	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ " من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب ومشتبك (تي) بمن داخلتي نحاس و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٧٥	١	٢٧٥,٠٠٠
٥٢	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب وكوع بمن داخلتي نحاس ١ " و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٥٠	٢	٩٠٠,٠٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ " من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٤	٥٥٥	١٣	٧,٦١٥,٠٠٠
٥٤	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ١ " من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٥٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٥	محبس بلية ٢ لأكور ٣٢ " مم من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٧٥٠	٦	١,٥٠٠,٠٠٠
٥٦	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية ٢ " ٦٣ مم ٢ لأكور من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢٩٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٧	بالعدد توريد وتركيب محبس بوابة تركي حديد زهر ٤ " بفلاتشات ضغط ١٦ بار والقلب استاتلس ستيل من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٧٠٠٠	٠	٠,٠٠٠
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " بسمك ٣ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - GM - او ما يماثلة) و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الرقايع و الخردوات و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٨	٢٣٠	١٧	٣,٩١٠,٠٠٠
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " بسمك ٤ مم (مصر الحجاز - الشريف - سمات - او ما يماثلة) و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط و الرقايع من كيعان ومشتراكات وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم علي الماسورة برمال نظيفة و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤	٥٥٠	٠	٠,٠٠٠
٦٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٦ " ضغط بضغط لا يقل عن ١٠ بار والبند يشمل الحفر اليدوي لوجود كابلات اشارة وكهرباء خاصة بالقوات المسلحة والفنة تشمل التوريد و التركيب و الرقايع وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم علي الماسورة برمال نظيفة و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٧٠	٧٢٠	١٨	١٢,٩٦٠,٠٠٠



فخامة



مقارنة معدلة مشروع
(استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري البغدادي ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصير الصحراوي الشرقي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم البند	بند الاعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الكمية المعدلة	اجمالي الكميات المعدلة
٦١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١" (BR - بالجر - او مايائلة) و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٣٠	٢٧٠	٣٠	٨٠,١٠٠,٠٠٠
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين ضغط ٦ بار قطر ٢" (BR - بالجر - او مايائلة) و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرفايع من كيعان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥٠	٦٧٥	٢٥٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٦٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PR قطر ٤" بسمك ٤ مم ضغط ١٠ بار لزوم خط المياه الرئيسي و الفنة تشمل التوريد و التركيب والرفايع من كيعان وخلافه من نفس نوعية المواسير والردم علي الماسورة برمال نظيفة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤	١١٥٠	٤	٠,٠٠٠
٦٤	بالعدد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك المقوى بولي بروبيلين على قاعدة من الخرسانة العادية بارتفاع ٣٠ سم و الفنة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	١٣٠٠٠	٢	٢٦,٠٠٠,٠٠٠
اعمال الكهرباء						
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ أمبير MCCB عدد ١٨ مفتاح احادي ٢٢٠-١٠ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة . وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١	٨٥٠٠٠	١	٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي ٣٢ أمبير MCCB عدد ٤ مفتاح احادي ٢٥-١٠ أمبير محمل علي البند الباربات بقطاعات مناسبة . و كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٤	١٠٠٠٠	٤	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٢٠×٣) مم ^٢ الومنيوم مسلح ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٠٠	١٢٥٠	٥٠	٦٢,٥٠٠,٠٠٠
٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦×٤ مم ^٢ الومنيوم مسلح ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١٨٠	٤١٠	١٧٩	٧٣,٣٩٠,٠٠٠
٥	بالعدد توريد وتركيب مخرج (انارة - مروحة) ومحمل علي البند مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥	١٣٥٠	٦٣	٨٥,٠٥٠,٠٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة - شفاط) ومحمل علي البند مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم ^٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بيت الهندسة -وما يماثله) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١٥	١٦٠٠	٣٤	٥٤,٤٠٠,٠٠٠



ف.ع.ع.



مقابلة معاملة مشروع
((استكمال اعمال الشبكات ضمن تطوير طريق قنا / الاصر الصخراوي الشرقي))
شركة / المقاولات العامة

رقم الطلب	بند الاصل	الكمية	الوحدة	القيمة المضافة	القيمة المضافة
٧	بالعدد توريد وتركيب مخرج (بريزة قوي) ومحمل على البند مقطع مسك التوصيل ٣×٢ مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بييت الهندسة -سوما يملته) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	١	عدد	١٥٠٠	١٥٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج (تكييف - مسخن) ومحمل على البند مقطع مسك التوصيل ٣×٢ مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بييت الهندسة -سوما يملته) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	١	عدد	٢٩٠٠	٢٩٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفون ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل ومقطع المسك ٢ جوز ٦×٠ نحاس مقصفر داخل مواسير مرنة ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بييت الهندسة -سوما يملته) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	١	عدد	٢٤٠٠	٢٤٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة معلومات ومحمل على البند مسك CAT 6 داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بييت الهندسة -سوما يملته) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	١	عدد	١٩٥٠	١٩٥٠
١١	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزة تليفزيون (دش) ومحمل على البند مسك من اجود الاتواع داخل مواسير ١٦ مم (علاء الدين -مصطفى محمود -بييت الهندسة -سوما يملته) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال .	١	عدد	١٩٥٠	١٩٥٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز انفاق كامل بالمكونات واللمبة بقوة ١٠٠ وات مقف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٣٢ مم لتخذية كشافات الانارة وكابل نحاس ٣×٣ مم ومحمل على البند المواسير وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	١	عدد	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية Ip 65 كامل بالمكونات واللمبة بقوة ١٠٠ وات LED وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥	عدد	١٠٠٠٠	٢٥٠٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من اجود الاتواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	٢	عدد	٢٥٥٠	٥١٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٣٠ سم من اجود الاتواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	١	عدد	٢٢٥٠	٢٢٥٠
١٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٥ سم من اجود الاتواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	٢	عدد	١٩٠٠	٣٨٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف (بلفونية) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الاتواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	٤	عدد	١٦٠٠	٦٤٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠×١ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	٢	عدد	١٥٠٠	٣٠٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠×٦٠ سم وبدرجة حمايه IP65 كامل باللمبة و الدويل و الترانس وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	١٢	عدد	٤٥٠٠	٥٤٠٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بنشينو ٢٦×٢ امبير من اجود الاتواع وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	٤	عدد	٢١٠٠	٨٤٠٠



مخالف



مقايضة معدلة مشروع
((استكمال اعمال انشاء كمين امني بجوار كوبري بغداد ضمن اعمال تطوير طريق لنا / الاصر الصخراوي الشرفي))
شركة / الفاتح للمقاولات العامة

رقم الوحدة	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية	الكمية	اجمالي التكاليف المعدلة
٢١	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة احادي ماجيك ١٠ امبير غاطس قطعة واحدة او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٣٢٠	٦٤٠,٠٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك ١٠ امبير غاطس او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٥٥٠	١,١٠٠,٠٠٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي ١٠ امبير غاطس محمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٦	٦٢٠	٦,٨٨٠,٠٠٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A و محمل على البند وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢٠	٣٢٠	٦,٤٠٠,٠٠٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الاتواع و محمل على البند وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٣١٠	١,٢٤٠,٠٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة معلومات و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٣١٠	١,٢٤٠,٠٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون و محمل على البند كل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	٣١٠	٩٦٠,٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ذر جرس من اجود الاتواع و محمل على البند الجرس من نوعية جيدة وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٣	٨٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ١ حصان من اجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	٢	٢٩٠٠٠	٥٨,٠٠٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياة قدرة ٢ حصان من اجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والبالونه والاتوماتيك و عمل صندوق حماية من الحديد لحماية الموتور وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٣٧٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٠٠٠
٣١	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر (تورنيدو-فريش-اوليمبك-اومايثلها) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٩٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠
٣٢	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر (تورنيدو-فريش-اوليمبك-اومايثلها) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٦٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠
٣٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت بونت بقدرة ١,٥ حصان بارد (كارير-توشيبا-فريش-اومايثلها) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٤٠٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٣٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت بونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد (كارير-توشيبا-فريش-اومايثلها) وكل ما يلزم لنهوا الاعمال وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	٥٦٠٠٠	٥٦,٠٠٠,٠٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ " من اجود الاتواع وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	١٠٠	٣٥٠	٦٢,٦٥٠,٠٠٠
٣٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٥ " من اجود الاتواع وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	٥٠	٤٨٠	٤٨,٠٠٠,٠٠٠
اجمالي المقايضة المعدلة (اربعة مليون واربعمائة وتسعة وتسعون وستمائة وخمسة وستون جنيتها فقط لاغير)					٤,٩٩٤,٦٦٥,٠٠٠

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

محمد





الطريق و الكمارى و النقل البحرى

رقم حد	بند الأعمال	الوحدة	مصدر الأصل	اجملي الكميات	تحويل المستلزمات			فرق الكميات		كمية خارج المطابقة والمستلزمات		الكميات	
					كمية المستلزمات	الذات	اجملي المستلزمات	كمية المطابقة	التجاوز	كمية	قيمة	سلك (م ٢)	حصى
٣٠	بالحدود المستطحة توريد وتركيب أبواب خشب موسى نهدي أو حشو	١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣١	بالحدود الطولي توريد وتركيب ودعان حور نشة قطاع من ١٠٠ سم لالاسلف فورت أو خشب	بذ	١٥,٥٢	١٥,٥٢	٠,٤٨	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٥,٥٢	٠,٤٨	٧٨,٠٠	٠,٥٢	١٥,٠٠	٠,٠٠٠
٣٢	بالحدود المستطحة توريد وتركيب أبواب أو شبيك من قطاعات الرغوم	١٠	١٦,٤٠	١٦,٤٠	٠,٦٠	١٧,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٤٠	٠,٦٠	٢١٦,٠٠٠	٠,٤٠	١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٣	بالحدود توريد وتشطيب وتركيب صلب شليخ (٣٧ / ٥٢) لزوم الفرسنة المسلحة	طن	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٤	بالحدود توريد وتركيب حديد مصبعت لزوم الياويك وشبيك الصمالية	متر	٢١٤٩,٠٠	٢١٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٤٩,٠٠	٢١٤٩,٠٠	٢١٤٩,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٥	بالحدود توريد وتركيب الفراخ من الصاج المخرج سمك ١٠ سم	طن	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٦	بالحدود عمل شاش حديد شليخ نبط الاصدة بالحدود لطر ٨ ملى	متر	٥٣١,٠٠	٥٣١,٠٠	٠,٠٠٠	٥٣١,٠٠	٥٣١,٠٠	٥٣١,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤٩,٠٠	١٧٩,٠٠
٣٧	بالحدود توريد وتركيب حوض حديد ليد من الفلار المطلى صيني	متر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٨	بالحدود توريد وتركيب مرصع الفلار المطلى صيني لفرز أول	متر	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣٩	بالحدود توريد وتركيب مرصع بلدى من ابيدو الانواع من الفلار المطلى صيني	متر	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٠	بالحدود توريد وتركيب ميوحة حوض معلقة من الحديد لفرز أول	متر	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤١	بالحدود توريد وتركيب دش كامل بالمسورة والطنسة والتقليز	متر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٢	بالحدود توريد وتركيب خلاط حوض وجه	متر	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٣	بالحدود توريد وتركيب وتشطيب الكسور حمام ٤ قطع	متر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٤	بالحدود توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم من ابيدو الانواع	متر	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٤٥	بالحدود توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من ابيدو الانواع	متر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٦	بالحدود توريد وتركيب شطوط خارجي من ابيدو الانواع	متر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٧	بالحدود توريد وتركيب سيلون ارضيه بلاستيك قطر ٢"	متر	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٨	بالحدود توريد وتركيب سيلون جشتراب من PVC	متر	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤٩	بالحدود توريد وتركيب مزراب جروجورى انصرف مياه الانطار من PVC	متر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٠	بالحدود توريد وبناء غرفة تقشيش ملئس ١٠٠٠ م ٠٠٠ م ولاي عمل	متر	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠	٢٨٧٥,٠٠٠
٥١	بالحدود توريد وتركيب خلية بنية ٣/١ من ابيدو الانواع	متر	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠
٥٢	بالحدود توريد وتركيب مطبخ بنية ٢ من ابيدو الانواع	متر	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
٥٣	بالحدود توريد وتركيب مطبخ بنية ٣ من ابيدو الانواع	متر	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢١٥,٠٠	٧٢١٥,٠٠
٥٤	بالحدود توريد وتركيب مطبخ بنية ٤ من ابيدو الانواع	متر	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠



مهندسين الشركة



إمارة الشارقة
الطرق والكباري و العمل البنى


رقم	بند الأعمال	الوحدة	مصدر الإنشاء نوع التجهيز	إجمالي الكميات	نوع الكميات			تجهيز المستلزمات			كمية خارج المظلة والمستخلص		ملاحظات	
					كمية نظيفة	التجهيز	كمية المستلزمات	القيمة	كمية	قيمة	ملاحظات	ملاحظات		
٥٥	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥٠	١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٦	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ٢ - من اجود الانواع	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٧	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٨	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٢٣٠	٣٩١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥٩	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٠	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	١٧,٥٠٠	٧٢٠	١٢٢٤٠,٠٠٠	٠,٥٠٠	٣٦٠,٠٠٠	٠,٥٠٠	١٧,٥٠٠	٠,٥٠٠
٦١	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٢٩,٢٠٠	٢٩,٢٠٠	٢٩,٢٠٠	٢٩,٢٠٠	٢٩,٢٠٠	٢٧٠	٧٨٣٠,٠٠٠	٠,٢٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٠,٢٠٠	٢٩,٢٠٠	٠,٢٠٠
٦٢	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٧٥٠	١٣٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٣	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦٤	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٣٠٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥	اصال التجهيز													
١	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	١٢٥٠	٦٢٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠
٤	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	١٧٩,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	٤١٠	٧٣٣٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	١٣٥٠	٨٥٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
٦	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	١٦٠٠	٥٤٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٥٤٠	٢٥٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٣٢٠٠	١٢٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
٩	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٢٣٠٠	٩٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٠	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٩٥٠	٧٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠
١١	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٩٥٠	٣٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٣	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٤	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٢٥٥٠	٧٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٥	بالحدود توريد وتركيب حديد سلكي ٢ لكر ١ - من اجود الانواع	م	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠



مهندس الشركة

مجلس الهيئة

مهندس المعماري

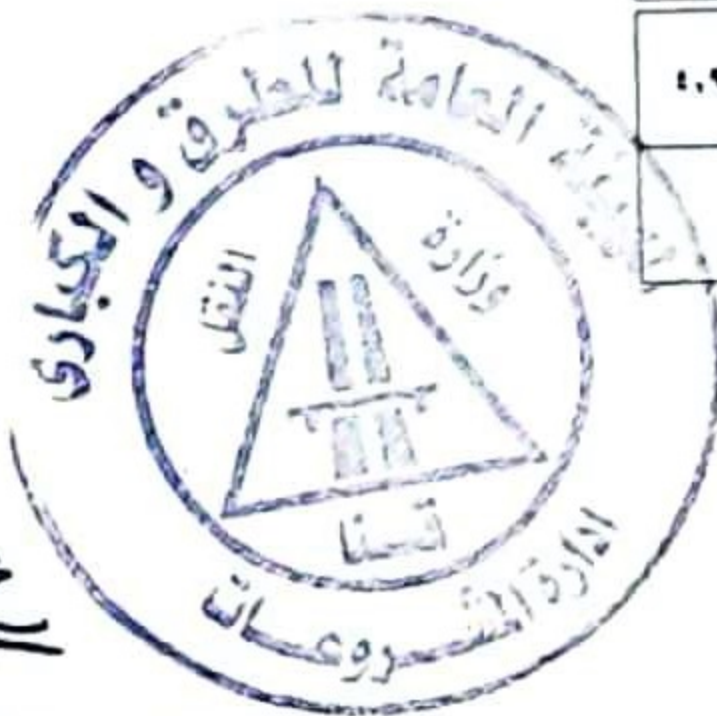

مهندس الهيئة
نور الدين
