

MATERIAL INSPECTION REQUEST

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والطارات والطرق
(خبراء دوليين)
دكتور/ سمير الجيوشي



Contractor Company	شرق بورسعيد للمقاولات العامة		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name صبري حامد	Sign 	Date 19/09/2022	Time 15.00																
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP496</td> <td>K.W</td> <td>C.S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP496	K.W	C.S						
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP496	K.W	C.S																		

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill material results				
Location to be Used	32-From station(497+000)to station(497+240)(-4.50				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification			Clause	
Reference Photos	Yes attached / No			Other	
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3 (NP)	5000		
2	Proctor	m3 (2.09)	5000		
3	Classification	A(1-b)	5000		
4	Seive analysis NO.200	m3 (11.6)%	5000		
Comments by:			Comments by:		
A sample has been taken from fill material by SGAC office to (مكتب معامل الإستشارات الهندسية) (CEL) lab and the results founded meet the specifictions and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor			19/9/2022	A	
QA/QC *	Ramel		20/9/2022	A	
GARB**	M. Hegm		21/9/2022	A	
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 12/09/2022
Reporting Date : 19/09/2022
Reporting No. : 21
- Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 12/09/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /



1

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 12/09/2022
Reporting Date : 19/09/2022
Reporting No. : 21
Sample No. : 01

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.1
25	86.2
19	73.7
12.50	65.4
9.50	58.2
4.75	43.6
2.36	40.0
2.00	36.8
1.18	34.4
0.600	32.0
0.425	31.4
0.300	22.2
0.150	14.0

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 12/09/2022
Reporting Date : 19/09/2022
Reporting No. : 21
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	11.6

Signature /...



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 12/09/2022
Reporting Date : 19/09/2022
Reporting No. : 21
Sample No. : 01

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشرقي
رقم التسجيل الهندسي ٢٧٣٦٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١
المركز الرئيسي : شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 12/09/2022
Reporting Date : 19/09/2022
Reporting No. : 21
Sample No. : 01

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	36.8	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	31.4	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.6	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /


5

Company Name : شرق بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Embankment
 Location : St. (496+000) : (498+000)
 Delivery Date : 12/09/2022
 Reporting Date : 19/09/2022
 Reporting No. : 21
 Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

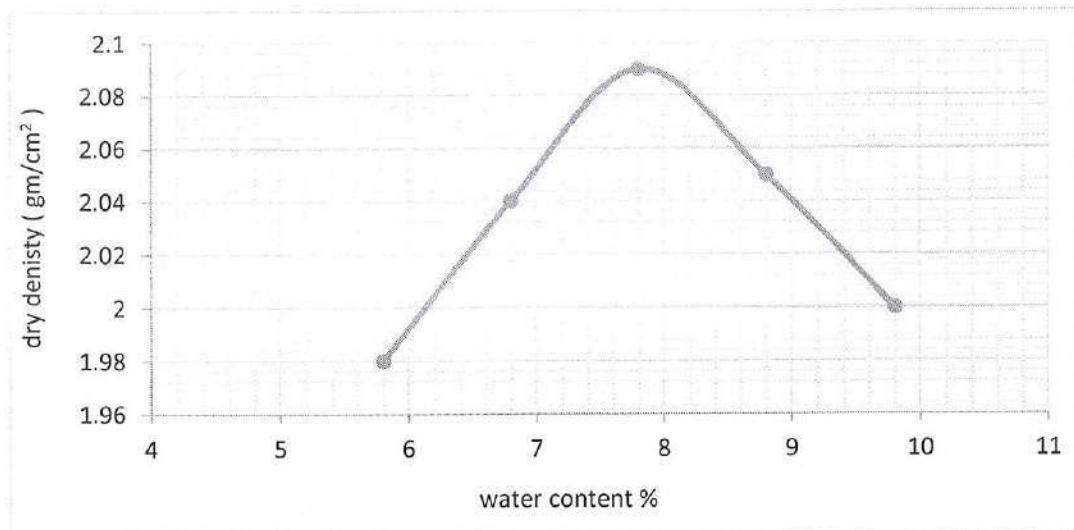

- Max dry density (gm/cm²) : 2.09
- Optimum moisture content % : 7.8

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

السيد / المهندس /

رغم التوقيع الإلكتروني 219-084-0237

المركز الرئيسي: 3 شارع الملك الأفطال - الزمالك - القاهرة

MATERIAL INSPECTION REQUEST					

Contractor Company	شرق بورسعيد للمقاولات العامة		Designer Company	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time
	صبري حامد		24/09/2022	15.00
Received by ER			MIR	
	C1	C2	C3	DD
	KP496	K.W	C.S	

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill material results				
Location to be Used	33-From station(497+640)to station(498+000)(-1.50)				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification			Clause	
Reference Photos	Yes attached / No			Other	
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3 (NP)	5000		
2	Proctor	m3 (2.06)	5000		
3	Classification	A(1-b)	5000		
4	Seive analysis NO.200	m3 (14.8)%	5000		
Comments by:			Comments by:		
A sample has been taken from fill material by SGAC office to (مكتب معامل الهندسية) (CEL) lab and the results founded meet the specifications and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor			24/9/2022	A	
QA/QC *	Ramel		25/9/2022	A	
GARB**	M-Hegm		26/9/2022	A	
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 17/09/2022
Reporting Date : 24/09/2022
Reporting No. : 22
Sample No. : 02

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 17/09/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557.
6. CBR according to ASTM D-1883.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 17/09/2022
Reporting Date : 24/09/2022
Reporting No. : 22
Sample No. : 02

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	94.6
25	89.1
19	83.1
12.50	76.2
9.50	63.4
4.75	50.9
2.36	47.0
2.00	43.2
1.18	38.9
0.600	35.0
0.425	32.4
0.300	23.9
0.150	16.2

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
السجل التجاري: 219-091-837
رأى التسجيل رقم: 219-091-837
المركز الرئيسي: 3 شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 17/09/2022
Reporting Date : 24/09/2022
Reporting No. : 22
Sample No. : 02

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	14.8

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 17/09/2022
Reporting Date : 24/09/2022
Reporting No. : 22
Sample No. : 02

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature / ...



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 17/09/2022
Reporting Date : 24/09/2022
Reporting No. : 22
Sample No. : 02

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-b)		
2.00 mm (No.10).	43.2	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	32.4	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	14.8	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 17/09/2022
Reporting Date : 24/09/2022
Reporting No. : 22
Sample No. : 02

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

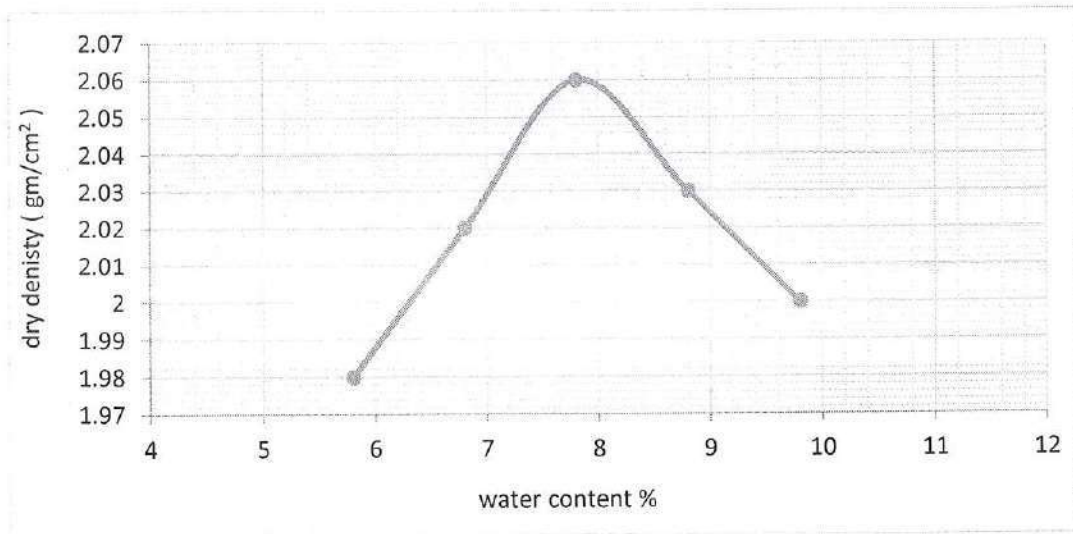

- Max dry density (gm/cm²) : 2.06
- Optimum moisture content % : 7.8

Signature



MATERIAL INSPECTION REQUEST	الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)	وزارة النقل	SGAC	مركز الاستشارات الهندسية للمنقل والطرق (خبراء دوليين) دكتور/ سعد الجبوشي	وزارة النقل MINISTRY OF TRANSPORT	الخط الكهربائي السريع Electric Express Train SYSTRA SHAKER

Contractor Company	شرق بورسعيد للمقاولات العامة		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name صبري حامد	Sign 	Date 26/09/2022	Time 15.00																
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP496</td> <td>K.W</td> <td>C.S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP496	K.W	C.S						
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP496	K.W	C.S																		

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill material results				
Location to be Used	34-From station(496+300)to station(496+600)(-5.50)				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification		Clause		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3 (NP)	5000		
2	Proctor	m3 (2.08)	5000		
3	Classification	A(1-b)	5000		
4	Seive analysis NO.200	m3 (12.7)%	5000		
Comments by:		Comments by:			
A sample has been taken from fill material by SGAC office to (مكتب معامل الاستشارات الهندسية) (CEL) lab and the results founded meet the specifictions and accepted					

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor			26/9/2022	A
QA/QC *	Kamal		26/9/2022	A
GARB**	M-Negm		28/9/2022	A
Comment by ER				
Employers Representative				

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 23
Sample No. : 03

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 19/09/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / ...



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 23
Sample No. : 03

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.6
25	88.3
19	84.12
12.50	74.2
9.50	62.2
4.75	51.2
2.36	47.8
2.00	45.2
1.18	40.3
0.600	38.8
0.425	35.1
0.300	27.7
0.150	14.5

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 23
Sample No. : 03

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	12.7

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 23
-Sample No. : 03

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم الترخيص: 837-834-818
المركز الرئيسي : 3 شارع الملك الأفط - الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 23
Sample No. : 03

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	45.2	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	35.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	12.7	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 23
Sample No. : 03

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

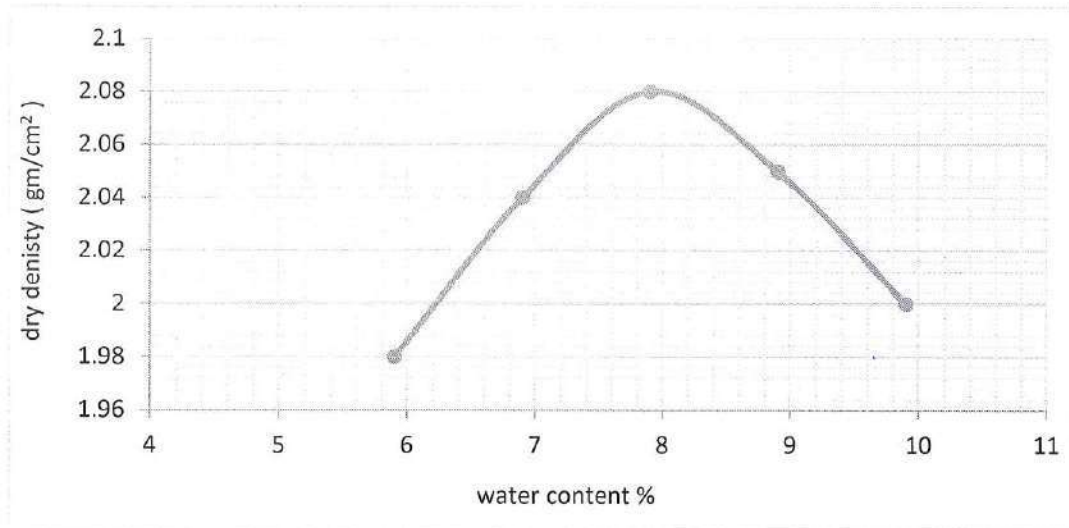

- Max dry density (gm/cm³) : 2.08
- Optimum moisture content % : 7.9

Signature



MATERIAL INSPECTION REQUEST

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مركز الأبحاث الهندسية
للجسور والطرق
(أخبره دوليون)
دكتور/ سعد الجبوشي



Contractor Company	شرق بورسعيد للمقاولات العامة		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name صبري حامد	Sign 	Date 26/09/2022	Time 15.00																
Received by ER			MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP496</td> <td>K.W</td> <td>C.S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP496	K.W	C.S					
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP496	K.W	C.S																		

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE-2	Work Activity		
CODE-3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill material results				
Location to be Used	35-From station(496+600)to station(496+800)(-5.50)				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification			Clause	
Reference Photos	Yes attached / No			Other	
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3 (NP)	5000		
2	Proctor	m3 (2.08)	5000		
3	Classification	A(1-a)	5000		
4	Seive analysis NO.200	m3 (11.4)%	5000		
Comments by:			Comments by:		
A sample has been taken from fill material by SGAC office to (مكتب معامل الأبحاث الهندسية) (CEL) lab and the results founded meet the specifications and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor			26/9/2022	A	
QA/QC *	Ramel		27/9/2022	A	
GARB**	M. Hegm		28/9/2022	A	
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 24
Sample No. : 04

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 17/09/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557.
6. CBR according to ASTM D-1883.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / ...



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 24
Sample No. : 04

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	92.8
25	88.1
19	78.9
12.50	70.3
9.50	59.1
4.75	44.9
2.36	41.0
2.00	39.6
1.18	35.2
0.600	30.9
0.425	29.8
0.300	24.2
0.150	14.4

Signature /
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل الخاص: 210-001-037
المركز الرئيسي: 3 شارع الملك ابي الفضل - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 24
Sample No. : 04

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	11.4

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 24
Sample No. : 04

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 24
Sample No. : 04

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	39.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	29.8	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.4	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
- Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المسجل في السجل التجاري
رقم التسجيل: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
المركز الرئيسي: ١ شارع الملك الأفندي، الزمالك - القاهرة

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 19/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 24
Sample No. : 04

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

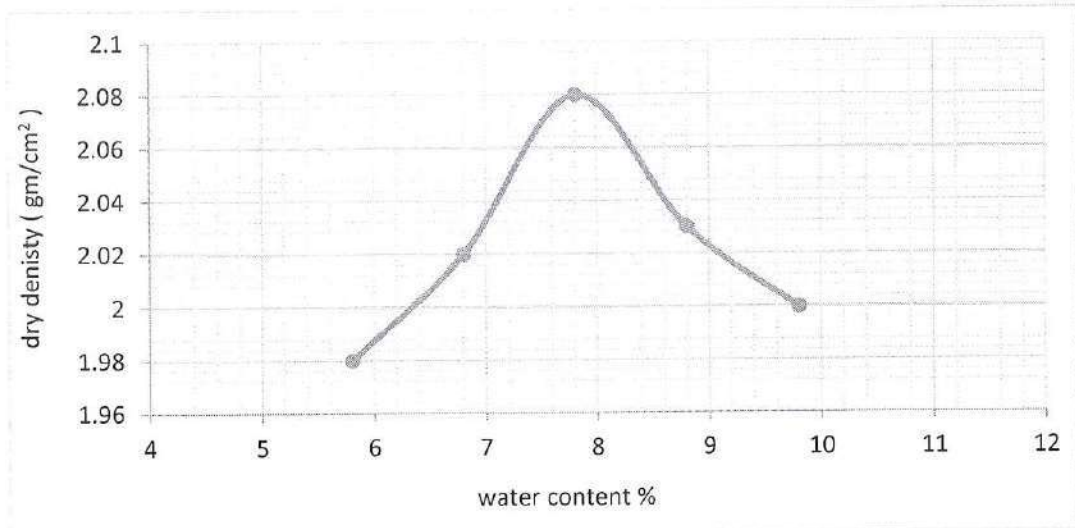

- Max dry density (gm/cm²) : 2.08
- Optimum moisture content % : 7.8

Signature: 

MATERIAL INSPECTION REQUEST

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARB)



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطرق
(خود دوليون)
دكتور/ سعد الجبوشي



Contractor Company	شرق بورسعيد للمقاولات العامة		Designer Company																	
Issued by Contractor	Name صبري حامد	Sign 	Date 26/09/2022	Time 15.00																
Received by ER		MIR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td>KP496</td> <td>K.W</td> <td>C.S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	KP496	K.W	C.S						
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM													
KP496	K.W	C.S																		

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill material results				
Location to be Used	37-From station(496+000)to station(496+300)(-5.00)				
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement	Specification		Clause		
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	m3 (NP)	5000		
2	Proctor	m3 (2.11)	5000		
3	Classification	A(1-b)	5000		
4	Seive analysis NO.200	m3 (14.8)%	5000		
Comments by:		Comments by:			
Asample has been taken form fill material by SGAC office to (مكتب معامل الاستشارات الهندسية) (CEL) lab and the results founded meet the specifcontions and accepted					
APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor			26/9/2022	A	
QA/QC *	Kamel		26/9/2022	A	
GARB**	M. Hegm		28/9/2022	A	
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer

** Alignment / Bridges: Culvert Only

Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 20/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 25
Sample No. : 05

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 20/09/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Location : St. (496+000) : (498+000)

Delivery Date : 20/09/2022

Reporting Date : 26/09/2022

Reporting No. : 25

Sample No. : 05

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.1
25	88.5
19	83.7
12.50	70.8
9.50	65.5
4.75	50.1
2.36	46.1
2.00	42.9
1.18	38.2
0.600	34.5
0.425	32.4
0.300	28.8
0.150	20.9

Signature /



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 20/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 25
Sample No. : 05

Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	14.8

Signature



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 20/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 25
Sample No. : 05

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature



Company Name : شرق بورسعيد
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Embankment
 Location : St. (496+000) : (498+000)
 Delivery Date : 20/09/2022
 Reporting Date : 26/09/2022
 Reporting No. : 25
 Sample No. : 05

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	42.9	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	32.4	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	14.8	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature



Company Name : شرق بورسعيد
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (496+000) : (498+000)
Delivery Date : 20/09/2022
Reporting Date : 26/09/2022
Reporting No. : 25
Sample No. : 05

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

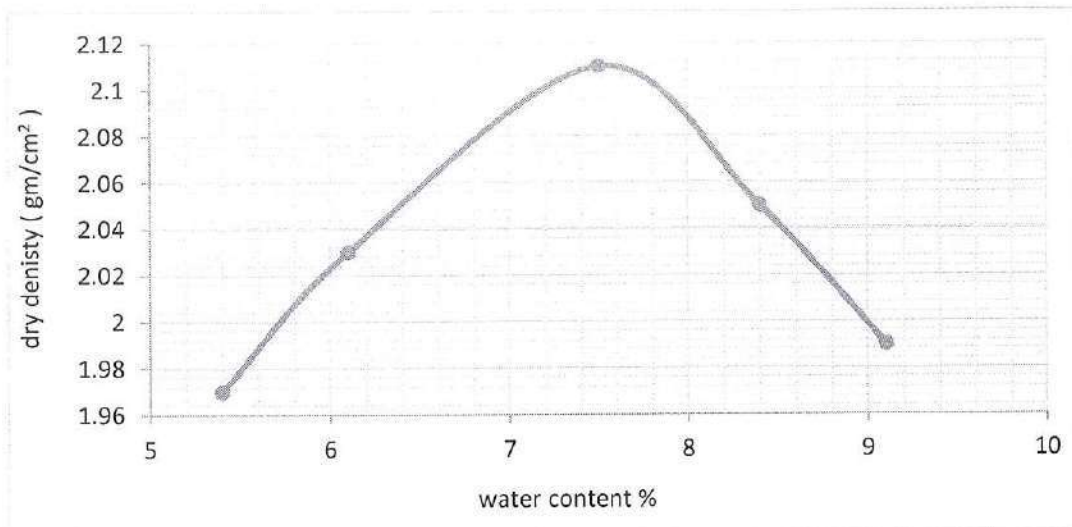

- Max dry density (gm/cm²) : 2.11
- Optimum moisture content % : 7.5

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل رقم 219-984-537
المرکز الرئيسي : 3 شارع الملك الأفندي - الزمالك - القاهرة

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٩٦+٠٠٠ الى الكم ٤٩٨+٠٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه النجيلة

رقم البند و بيانه : (٣- ١) تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : ٣ م ٠,٠

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٢٧٠,٩٦	٢٠,٩٠٣	٣٠٠	٤٩٦+٣٠٠	٤٩٦+٠٠٠	القطاع الأول
٦٢١,٩٩	٣,١١٠	٢٠٠	٤٩٧+٢٠٠	٤٩٧+٠٠٠	القطاع الثاني
٦٠١٤,٠٤	٢٥,٠٥٩	٢٤٠	٤٩٧+٤٤٠	٤٩٧+٢٠٠	القطاع الثالث
٧٢٢,٨٥٢١٨	٤,٠١٦	١٨٠	٤٩٧+٦٢٠	٤٩٧+٤٤٠	القطاع الرابع
١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الكنوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٤٩٦+٠٠٠ الى الكم ٤٩٨+٠٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه النجيلة

رقم البند و بيانه : (٣- ١) علاوة مسافة النقل ٢١١ كم
تـنـفـيـذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٢٧٠,٩٦	٢٠,٩٠٣	٣٠٠	٤٩٦+٣٠٠	٤٩٦+٠٠٠	القطاع الأول
٦٢١,٩٩	٣,١١٠	٢٠٠	٤٩٧+٢٠٠	٤٩٧+٠٠٠	القطاع الثاني
٦٠١٤,٠٤	٢٥,٠٥٩	٢٤٠	٤٩٧+٤٤٠	٤٩٧+٢٠٠	القطاع الثالث
٧٢٢,٨٥٢١٨	٤,٠١٦	١٨٠	٤٩٧+٦٢٠	٤٩٧+٤٤٠	القطاع الرابع
١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة علي

علاء سلامة علي

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٤٩٦+٠٠٠ الى الكم ٤٩٨+٠٠٠ بطول ٢ كيلو متر اتجاه النجيلة .

رقم البند و بيانه : (١ - ٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تـنـفـيـذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايمة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٦٢٧٠,٩٦	٢٠,٩٠٣	٣٠٠	٤٩٦+٣٠٠	٤٩٦+٠٠٠	القطاع الأول
٦٢١,٩٩	٣,١١٠	٢٠٠	٤٩٧+٢٠٠	٤٩٧+٠٠٠	القطاع الثاني
٦٠١٤,٠٤	٢٥,٠٥٩	٢٤٠	٤٩٧+٤٤٠	٤٩٧+٢٠٠	القطاع الثالث
٧٢٢,٨٥٢١٨	٤,٠١٦	١٨٠	٤٩٧+٦٢٠	٤٩٧+٤٤٠	القطاع الرابع
١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / علاء سلامة على

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة من المحطة 496+000 الى المحطة 498+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل أتربة صالحة للردم)

انه في يوم الاحد الموافق :- 2022/06/19

- بناء على طلب المقاول شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل أتربة صالحة للردم من محجر (كسارة المصرية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة Xyz |
| 4- السيد المهندس / علاء سلامة علي | مندوب شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة |

وتبين ان المحجر علي مسافة 211 كم من منتصف قطاع شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

احد اثني محجر التراب المصرية	N 92 ° 70 ' 06.28 "	E 29 ° 45 ' 06.7 "
احداثي منتصف القطاع	N 31 ° 2 ' 43.95 "	E 27 ° 59 ' 38.61 "

وعلي ذلك تم توقيع،،

4 - علاء سلامة علي

3 - محمد خليل

2 -

1 -

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ للقطاع الآتي:

مستسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	الاتجاه
١	شرق بورسعيد للمقاولات العامة	٤٩٦+٠٠٠	٤٩٨+٠٠٠	النجيلة

وذلك لصالح انتهاء اجراءات التعاقد طبقاً للمفاوضة الصادرة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطة والتوجيه بالازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"





مركز الاستشارات الهندسية
للتنقل والمطارات والطرق
(خبراء دوليون)
دكتور/ سعد الجبوشي



الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)



وزارة النقل
MINISTRY OF TRANSPORT



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

مقايضة معدلة بعد المفاوضات بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨ لبنود الاعمال تنفيذ شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة اتجاه النجيلة
القطاع من المحطة ٤٩٦+٠٠٠ الى ٤٩٨+٠٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القيمة	الإجمالي
٣	اصال الردم				
٣-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% وحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١٠٥ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة المادة المحجورية علاوة مسافة النقل ٢١١ كم علاوة حصول رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	م ^٣	١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	٩١,٧٠	١,٢٤٩,٨٥٦,٥٢٨
		م ^٣	١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	٣١٣,٥	٤,٢٧٢,٩٥٥,٥٢٣
		م ^٣	١٣٦٢٩,٨٤٢١٨	١٣	١٧٧١٨٧,٩٤٨
	الإجمالي				٥,٧٠٠,٠٠٠
	(خمسة مليون وسبع مائة الف جنيها فقط لا غير)				

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)
م/ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري د/سعد الجبوشي
م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول
م / علاء سلامة على

مركز الاستشارات الهندسية
للمطارات والطرق والكباري
دكتور/ سعد الجبوشي
مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

مركز الاستشارات الهندسية
للمطارات والطرق والكباري
دكتور/ سعد الجبوشي
مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه

1410252

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

رقم الوثيقة:	2003/2024 اصدار	فرع الاصدار : المركز الرئيسي
اسم المشترك:	شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة	
العنوان:	بئر العبد قرية بالوظة بملك سلامة على علاوى - شمال سيناء	
المستفيد:	اليهه العامه للطرق والكبارى	
التغطية التأمينية:	تأميناً على عدد 4 افراد غير محددى الاسماء مقسمين كالآتى (عدد 1مهندس + عدد 1مساعد مهندس + عدد 1سائق معدة + عدد 1عامل) عاملين لدى المشترك , بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لاغير) بواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لاغير) للمهندس , 30,000 جم (ثلاثون ألف جنيه مصري لاغير) للمساعد المهندس, 15,000 جم (خمس عشرة ألف جنيه مصري لاغير) لسائق المعدة, 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري لاغير) للعامل, وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز الكلى والعجز الجزئى المستديم) نتيجة حادث وذلك أثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط من "تنفيذ أعمال مشروع عقد رقم (2023/2022/1040) أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم 496,000 الى الكم 498,000 بطول 2 كم اتجاه سيدى عبد الرحمن , والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقاولين رقم 2024/2374 والمصنوعة من شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر	
مدة التأمين:	من : 30/01/2024 الى : 29/01/2025	حساب الاشتراك
	الإشتراك الصافى :	479.00 جم
	تصف الذمعة النسبية :	4.79 جم
	الضريبة الفرعية :	11.60 جم
	مصاريف الاصدار :	100.30 جم
	رسم الاشراف و الرقابة / ستة فى الألف :	2.87 جم
	اشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان فى الألف :	0.96 جم
	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد فى الألف :	0.48 جم
	اجمالى الاشتراك فقط ستمائة جنيه مصري	600.00 جم

حدود التغطية :-

الحدود للفرع	التغطية
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلى المستديم نتيجة حادث
طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئى المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز الكلى الموقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع النفقات الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :- 130,000.00 جم فقط مائة و ثلاثون ألفا جنيه مصري

الحد الأقصى الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :- 130,000.00 جم فقط مائة و ثلاثون ألفا جنيه مصري

مرفقات هذه الوثيقة :
الشروط العامة للوثيقة
جدول الوثيقة



تحريرا فى : 30/01/2024
تاريخ الطباعة : 30/01/2024

إعداد : رانا عماد الدين حسين محمود
كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Aila Building 2, El Gaiash st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun end Mahmoud Sadij Street - East Section- Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Zagazig Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزى ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش اعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢ / ٢ شارع برج الامين ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا اعلى مصرف ابو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الاندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى اعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

اصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 2003/2024

1410253

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الاطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بغاية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبول منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عدد الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض
- تقتصر التغطية التأمينية للسادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والإجراءات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم
- في حالة الوفاة نتيجة حادث معطى تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك.
- لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الإستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

تحريرا في : 30/01/2024

تاريخ الطباعة : 30/01/2024

إعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



2 من 4



Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galsh st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sadi Street - East Section - Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Zagazig Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

19685

المركز الرئيسي : To شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع المهندسين : 20 ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم 2 ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة 3/أ شارع التأمين ومجموعه سدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبين برج الأندلس - أمام الدورية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بهوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

1410254

* شرط استثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والاضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغيرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

تحريرا في : 30/01/2024

تاريخ الطباعة : 30/01/2024

إعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



3 من 4



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shabin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Zagazag Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq



المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طوبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شابين برج الاندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بي تك كورنيش النيل - دمياط

مطالبة سداد

1410255

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 2003/2024

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

العنوان : بئر العبد قرية بالوطة بملك سلامة على علوى - شمال سيناء

لصالح : الهيئه العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 30/01/2024

إلى : 29/01/2025

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	479.00	جم
نصف الدفعة النسبية	:	4.79	جم
الضريبة النوعية	:	11.60	جم
مصاريف الاصدار	:	100.30	جم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	:	2.87	جم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف	:	0.96	جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.48	جم
إجمالي الأشتراك	:	600.00	جم
فقط ستمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 30/01/2024

تاريخ الطباعة : 30/01/2024

إعداد : رانا عماد الدين حسين محمود

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى



10 %

47.90

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

4 من 4

حماية سرية البيانات / Confidentiality Data Protecting

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- **The company's hotline: 19685**
- **The company's WhatsApp: 01050833160**
- **The company's e-mail address:**
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- **The company's hotline: 19685**
- **The company's e-mail address:**
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- **الخط الساخن للشركة: 19685**
- **خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160**
- **البريد الإلكتروني للشركة:**
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- **الخط الساخن: 19685**
- **البريد الإلكتروني للشركة:**
wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة



وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه. ٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إبلاغ توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمستوليات. ٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم والالزمة لتقييم الخطر.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقيا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريه يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي:-

(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونيا أو برقيا وتعزيز ذلك كتابة متضمنا المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكانه للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.

(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.

(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.

(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.

ولا تكون الشركة مسئولة بأية حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدال لأي تلفيات بسيطة.

وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو يتطلب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدمه إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (الممنوه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للعقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فإنه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكتملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شعب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون ليلاب عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثليه.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقاوله المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.

٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متمماً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٦ - (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.

٧ - (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.

- صندوق حملة الوثائق هو مجموعة من الحسابات التي تنشأها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي:-

- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.

- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويؤوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصصاً لضمان لرصيد القرض بنسبة ٥٠٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

- توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني الخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.

- أجزء المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠٪ من الفائض التأميني

هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من:

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة

٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي عضو اللجنة

٣- الأستاذ الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٩

موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ١٠/٢٠/٢٠٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه بناء على اتفاقهم إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسدد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.

- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.

- مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً.

أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك: يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة

- الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.

ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١- (٢٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.

٢- (١٥٪) على الأكثر في سندات وبيشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٣- (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبيشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.

٤- ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.

٥- (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بـشروط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع

1368400

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشارك الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام سداد الاشتراك المبين بجدول وإيصال الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2374/2024 اصدار
اسم المشترك / او المشتركين :	شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة
العنوان :	بنز العبد قرية بالوظة بملك سلامة على علوى - شمال سيناء
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقولة :	تأميناً على عقد رقم (2023/2022/1040) أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم 496,000 الى الكم 498,000 بطول 2 كم اتجاه سيدى عبد الرحمن
موقع العمل :	اتجاه سيدى عبد الرحمن
مدة التأمين :	
أ - بالنسبة للأعمال	يبدأ التأمين في : 2024/01/30 وينتهي في : 2025/01/29
ب - بالنسبة لأعمال الصيانة	تبدأ من : وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	5,700,000.00 فقط خمسة ملايين و سبعمائة ألف جنيه مصري
القسم الاول :	الاضرار المادية
القسم الثانى :	المسئولية المدنية قبل الغير



تحريرا في 30/01/2024
اسم المستخدم هاني عاطف
كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Stop Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masmoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section - Alsafer Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المرکز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفی - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي ممد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / أ شارع للمؤمن ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بي تيك كورنيش النيل - دمياط

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

1368401

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2374/2024 اصدار

القسم الاول: الأضرار المادية		
البند المؤمن عليها	مبلغ التأمين	التحمل عن كل حادث
1- أعمال المقاوله (الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) - 1-1 قيمة العقد -	-	-
2- الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأمين	5,700,000.00 جم	يتحمل المشترك الـ 20% من اجمالي مبلغ التأمين
2- ادوات ومهمات التشييد - غير مغطى	-	-
3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى	-	-
4 - إزالة الأنقاض - غير مغطى	-	-
اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول	5,700,000.00	

الأخطار الطبيعية	حدود التعويض (1)	التحملات
1- الزلازل / البراكين / الأعاصير 2- العواصف / الزوايع / الفيضانات / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى	-	-

(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد .

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير		
البند المؤمن عليها	حدود التعويض (2)	التحملات
1- الإصابات الجسدية - 1-1 للشخص الواحد -	-	-
2-1 مهما كان عدد الأشخاص -	100,000.00	-
2- الأضرار المادية للممتلكات -	200,000.00	-
اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم	200,000.00	يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث يحد ادنى 40,000 جم
	400,000.00	

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

30/01/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



1368402

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2374/2024 اصدار

حساب الاشتراك	
الاشتراك الصافي	727.00 جم
نصف الدفعة النسبية	39.99 جم
الضريبة النوعية	26.10 جم
مصاريف إصدار	100.37 جم
رسم الإشراف و الرقابة / مئة في الألف	4.36 جم
اشتراك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف	1.45 جم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	0.73 جم
اجمالي الاشتراك	900.00 جم

يعتبر ممثما لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

30/01/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 86 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Mostaf Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank



3 من 8

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصديق - الدقي - الجيزة
فرع المهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المتصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المتصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢ / شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

1368403

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2374/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الالواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بجهاز مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الاماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / او السرقة بالاكره علي العدد والتشوينات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح علي الخفراء او افراد الامن المكلفين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه علي المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطي خطري الحريق و السطو
شرط الاطلاع : يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تقي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات. انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح \$\$\$.
انه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من \$\$\$.
استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والافطار الطبيعى
استثناء الممتلكات قائمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

30/01/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Agad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Meamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section - Alsafta Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq



4 من 8

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع الهندس : ٢٠ ش وادى النيل - الهندس - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : ٩٠ شارع عوض الله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطنة ٢ / شارع المليون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن تلة كورنيش النيل - دمياط

1368404

تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2374/2024 اصدار

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

HA

30/01/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



1368405

إصدار


2374/2024

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار المقاولين و الملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .
* شرط استثناء فيروس كورونا هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن: (أ) فيروس كورونا (COVID-19) (ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2) (د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .
* شرط استثناء الأمراض المعدية من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من نقشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع نقشي هذه الأمراض المعدية .
* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .
* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر بالمياه .
* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورت (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .
* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذة من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والإستثناءات والأحكام والإشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسؤولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور و القناتع و الشدات والمصارف و القناتع وأعمال الطرق قد أنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة أدناه ، وذلك بغض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محدد بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



30/01/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



Head Office	: 25 Mosaddek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	: 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch	: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch	: 88 Fouad st., (El Horla Road) - Alexandria
Smouha Branch	: 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch	: Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch	: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafia Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch	: Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	: Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq



6 من 8

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
 فرع الهندسين : ٢٠ ش وادى النيل - الهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القناتع - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قلعة ٢/٢ شارع المأمون ومحمود صدقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شيبين برج الاندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بى تك كورنيش النيل - دمياط

1368406

إصدار

2374/2024

مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبعد أقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها فى نفس الوقت.
* ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق فى مواقع التشييد انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها فى الوثيقة او الملحق بها وفيما عدا ذلك . فان الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلى :- (1) توفر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الاطفاء الكافية الصالحة للتشغيل فى جميع الاوقات مع تقدم العمل . (2) ان يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة فى وضع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وان يكون مغلق باغطية مؤقتة . (3) ان يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطفائيات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع . (4) ان يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا لللائحة المحلية بأسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة فى الانشاء . (5) ان يتم الغلق المؤقت لفتحات ابواب المصاعد ، انابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء فى اعمال التجهيزات . (6) ان يتم ازالة المخلفات بانتظام - ازالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التى يتم تجهيزها وذلك فى نهاية كل يوم عمل . (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من اى نوع مثل :- - عمليات الجلف ، التقطيع ، اللحام . - استخدام لمبات اللحام الغازية او الكهربائية . - استعمال البيتومين الساخن . - او اى عمليات اخرى ينتج عنها سخونة . (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بيساعة . (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين . (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر او ان تفصل بحواجز مقاومة للحريق . (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل او الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الانشاء او التركيب او اى اعمال ينشأ عنها لهب . (12) تعيين منسق امان بالموقع . (13) تركيب نظام يعتمد عليه للاندثار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك . (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام . (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا . (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات . (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة . قيمة كل وحدة تخزين : 75,000 جم .

شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر

30/01/2024

تحريرا فى

هاني عاطف

اسم المستخدم



1368407

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :

وثيقة رقم : 2374/2024

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

العنوان : بنر العبد قرية بالوطة بملك سلامة على علاوى - شمال سيناء

لصالح : الهيئه العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من 30/01/2024

إلى 29/01/2025

العملة : جم

مبلغ التأمين : 5,700,000.00

فقط خمسة ملايين وسبعمائة ألف جنيه مصري

الاشتراك	:	727.00	ج
نصف الدفعة النسبية	:	39.99	ج
مصاريف الاصدار	:	100.37	ج
الضريبة النوعية	:	26.10	ج
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	:	4.36	ج
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	:	1.45	ج
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.73	ج
إجمالي الاشتراك	:	900.00	ج
(فقط تسعمائة جنيه مصري)			



تحريرا في 30/01/2024

إسم المستخدم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 %

36.35

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

www.wethaq-egypt.com

8 خط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصدق - الدقي - الجيزة
 فرع الهندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومجمود صدقي - قسم الشرق - برج الضفا أعلى مصرف أبو قلبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
 فرع الزقازيق : ش جمال عيد القناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
 Smouha Branch : 60 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
 El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

السيد/السادة/ شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع اخطار المقاولين رقم 2374 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2024/01/30 إلى 29/01/2025 بإجمالي مبلغ تأمين 5700000 يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيديكم علما بأنه نظرا للتغيرات المتلاحقة والمستمرة في المتغيرات الاقتصادية الكلية وآثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عناية سيادتكم أنه في حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إفادتنا برغبتكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 31/01/2024

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب انضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة
