

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه: (١-١) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية
الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٣ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٥٥٧٣	٥١,١٥	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٤٢٤١	٢٨,٤٨	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٣٧٢٢	٢٧,٤٤	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٢٢٩١٨	٤٥,٨٤	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٧٦٤٥٤,٣١	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٧٦٤٥٤,٣١	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-١) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية
الكمية المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٠٤٤,٨	٢,٠٩	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٨٣٥,٥	١,٦٧	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٨٠٣,٩	١,٦١	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٤٤٥,٠	٠,٨٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٣١٢٩,٢٣	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٣١٢٩,٢٣	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه: (١-١) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٢٢٢,٩	١٧,٤١	٣٠٠	٤٢٦+٢٤٠	٤٢٥+٩٤٠	القطاع الأول
١٩٣,٥	٠,٦٠	٣٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٦+٢٨٠	القطاع الثاني
٥٤١٦,٤٦	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٤١٦,٤٦	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخولى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥+٦٠٠ الى الكم ٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٥٤٥٨	٥٠,٩٢	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٠٩٥٢	٢١,٩٠	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٩٩٠١	١٩,٨٠	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٦٥١٠	١٣,٠٢	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٥٢٨٢١,٤٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٢٨٢١,٤٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٨٤٦٦	١٦,٩٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٤٣٨٣	٨,٧٧	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٤٧٧٥	٩,٥٥	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٣٨٤٨	٧,٧٠	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٢١٤٧٢,٢٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢١٤٧٢,٢٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

تحفييل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال سبتمبر ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٦٣١٥,٢	٧٢,٦٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٨٦٦,٧	٢٣,٧٣	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٦٦٧٥,٠	٣٣,٣٥	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
١٠٩٦٢,٨	٢١,٩٣	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٧٥٨١٩,٦٢	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٧٥٨١٩,٦٢	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٢٨٥٩٤,١	٥٧,١٩	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٠٦٣٤,٠	٢١,٢٧	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٢٧٥٤,١	٢٥,٥١	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٨٣٩٨,٨	١٦,٨٠	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٦٠٣٨٠,٩٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٦٠٣٨٠,٩٥	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢

تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٦٤٥٢,٩	٣٢,٩١	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٨٦٠٦,٥٩	١٧,٢١	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٠٣٣٣,٩	٢٠,٦٧	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
١٠٠٠٠,٨	٢٠,٠٠	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٤٥٣٩٤,١٩	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٤٥٣٩٤,١٩	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم العنلاوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٧١٣,٥٥	٧,٤٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٥٦,٥٦	٣,١١	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٨٩٥,٧٧	٣,٧٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
١٩٤٥,٧٦	٣,٨٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٩١١١,٦٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٩١١١,٦٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٧١٣,٥٥	٧,٤٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٥٦,٥٦	٣,١١	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٨٩٥,٧٧	٣,٧٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٢٥٧٨٣,١٢	٥١٥,٦٧	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٢٦٥٠٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٦٥٠٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم العنواوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٣٧١٣,٥٥	٧,٤٣	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٥٥٦,٥٦	٣,١١	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
١٨٩٥,٧٧	٣,٧٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٢٥٧٨٣٤,١٢	٥١٥,٦٧	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
٢٦٥٠٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٦٥٠٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخواوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade)
من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣
تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٤٠٠,١٢	٤,١١٨	٣٤٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+٢٦٠	القطاع الأول
٤٥٠٠,٧٢	٨,٠٣٧	٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثاني
٣٣٧٥,٥٤	٨,٠٣٧	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
٩٢٧٦,٣٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٩٢٧٦,٣٨	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخنولي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade)
من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٣٠٤,٤٢	٨,٠٣٧	٦٦٠	٤٢٦+٢٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٣٣٢,٤٦	٣,٩١٩	٣٤٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+٢٦٠	القطاع الثاني
٦٦٣٦,٨٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٦٦٣٦,٨٨	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥٠+٦٠٠ الى الكم ٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade)
من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
الكميات المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٦٠,٧٤	٨,٠٣٧	٢٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٧+١٤٠	القطاع الأول
١٦٠,٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٦٠,٧٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) قيمة المادة المحجيرة

تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٩٥٩,٥٠	٣,٩١٩	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٥٣٠٤,٤٢	٤,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٤٧٩١,٥٨	٥,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
١٦٠٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٦٠٧٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٩٥٩,٥٠	٣,٩١٩	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٥٣٠٤,٤٢	٤,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٤٧٩١,٥٨	٥,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
١٦٠٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٦٠٧٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٠١٨,٥٠	٨,٠٣٧	٥٠٠	٤٢٦+١٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٩٥٩,٥٠	٣,٩١٩	٥٠٠	٤٢٦+٦٠٠	٤٢٦+١٠٠	القطاع الثاني
٥٣٠٤,٤٢	٤,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+١٠٠	٤٢٦+٦٠٠	القطاع الثالث
٤٧٩١,٥٨	٥,٩١٩	٥٠٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٠٠	القطاع الرابع
١٦٠٧٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٦٠٧٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات الكميات المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣
تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٦٦٥,٩٦	٢,٩٩١	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١٢٥٦,٢٢	٢,٩٩١	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثاني
٥٩٢٢,١٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٩٢٢,١٨	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات الكميات المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٤٦٨	٢,٨٦٤	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٧,١٠	٥,٨٥٥	٢٠	٤٢٧+١٨٠	٤٢٧+١٦٠	القطاع الثاني
١٢٠٢,٨٨	٢,٨٦٤	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
٤٢٧٦,٦٥٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٤٢٧٦,٦٥٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم

تـ نـ فـ يـ ذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

٠,٠٠ ٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٤٦٨	٢,٨٦٤	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٧,١٠	٥,٨٥٥	٢٠	٤٢٧+١٨٠	٤٢٧+١٦٠	القطاع الثاني
٥٦١٣,٨٩	٢,٨٦٤	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
١٠١٩٨,٨٣٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٠١٩٨,٨٣٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٤) قيمة الماة المحجربة

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٤٦٨	٢,٨٦٤	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٧,١٠	٥,٨٥٥	٢٠	٤٢٧+١٨٠	٤٢٧+١٦٠	القطاع الثاني
٥٦١٣,٨٩	٢,٨٦٤	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
١٠١٩٨,٨٣٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٠١٩٨,٨٣٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٤-٢) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا لائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٣م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٤٤٦٨	٢,٨٦٤	١٥٦٠	٤٢٧+١٦٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
١١٧,١٠	٥,٨٥٥	٢٠	٤٢٧+١٨٠	٤٢٧+١٦٠	القطاع الثاني
٥٦١٣,٨٩	٢,٨٦٤	٤٢٠	٤٢٧+٦٠٠	٤٢٧+١٨٠	القطاع الثالث
١٠١٩٨,٨٣٤	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
١٠١٩٨,٨٣٤	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م /هاشم مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٢٥+٦٠٠ الى الكم ٤٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (١-٥) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانته عاديه بسمك ١٥ سم

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠٠٠ م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	العرض	طول	الى	من	
٥٠٠	٢,٥٠	٢٠٠	٤٢٥+٨٠٠	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٥٠٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٠٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجبوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هشام مختار

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٣)

مشروع: استكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥+٦٠٠ الى الكم ٢٧+٦٠٠ بطول ٢ كم (الاتجاهين)

رقم البند و بيانه : (٢-٥) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية

تـنـفـيـذ : شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

مقدار العمل السابق : ٠,٠٠ ٢م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
٥٥,٨٠	٠,٣٠	١٨٦	٤٢٥+٧٨٦	٤٢٥+٦٠٠	القطاع الأول
٥٥,٨٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٥٥,٨٠	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / هشام مختار

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة لبنود الأعمال بتاريخ
١٨-١٢-٢٠٢٣ للقطاع الاتي :-

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
١	شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات	٤٢٥+٦٠٠	٤٢٧+٦٠٠	الاتجاهين

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لبنود الاصل تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات الاتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	اللفة	الإجمالي
١	أعمال الحفر				
١-١	بالمتر المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنيه لكلومتر زيادة	م ^٣	٧٦٤٥٤,٣١	٢٠	١٥٢٩٠,٨٦,٢٠
	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢				
	الكمية المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢		٣١٢٩,٢٣	٢١,٤٠	٦٦٩٦٥,٥٢
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢		٥٤١٦,٤٦	٢٢,٩	١٢٤٠,٣٦,٩٣
٢	أعمال الآلة و التطهير				
٢-٢	بالمتر المسطح اصال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقلب العمومية تسهيذا لاصال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٦٠,٠٠٠	٥	٣٠٠,٠٠٠
٣	أعمال الردم				
١-٣	بالمتر المكعب اصال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب ٢ متر وبسك لا يزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. على حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجورة	م ^٣	٥٢٨٢١,٤٠	٨٥	٤,٤٨٩,٨١٩
	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٢				
	الكمية المنفذة خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢		٢١٤٧٢,٢٠	٨٧,٦٠	١,٨٨٠,٩٦٥
	الكمية المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢		٧٥٨١٩,٦٢	٨٨,٦٠	٦,٧١٧,٦١٨
	الكمية المنفذة خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢		٦,٣٨٠,٩٥	٨٩,٨٠	٥,٤٢٢,٢٠٩
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢		٤٥٣٩٤,١٩	٩١,٧٠	٤,١٦٢,٦٤٧
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣		٩١١١,٦٤	٩٣,٤٠	٨٥١,٠٢٧
	علاوة مسافة النقل ١٥٤ كم		٢٦٥٠٠٠	٢٢٨	٦٠,٤٢٠,٠٠٠
	علاوة تحميل رسوم الكارثة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية		٢٦٥٠٠٠	١٣	٣,٤٤٥,٠٠٠

مدير مشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)


م / ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م / مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م / هاشم مختار



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (الطين - فوكة)
المقايضة المعدلة بعد المفاوضات بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لينود الاعمال تنفيذ شركة داربو للمقاولات العامة والإنشاءات الاتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ الى ٤٢٧+٦٠٠**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
٤	طبقات الأساس				
١-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفلاد بجهاز لوسنجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المصلية والفئة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	م ^٣	٩٢٧٦,٣٨	١٤٣,٣	١,٣٢٩,٣٠٥
	الكمية المنقذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣		٦٦٣٦,٨٨	١٤٤,٩	٩٦١,٦٨٤
	الكمية المنقذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣		١٦٠,٧٤	١٤٦,٤	٢٣,٥٣٢
	قيمة المادة المحجورة		١٦٠,٧٤	١٦١	٢,٥٨٧,٩١٤
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم		١٦٠,٧٤	١٩٥	٣,١٣٤,٤٣٠
	علاوة تصويل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية		١٦٠,٧٤	٢٥	٤٠١,٨٥٠
٢-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلاد بجهاز لوسنجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المصلية والفئة تشمل اجراء التجارب المصلية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجورة	م ^٣	٥٩٢٢,١٨	١٤٩,٧	٨٨٦,٥٥٠
	الكمية المنقذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣		٤٢٧٦,٦٥٤	١٥١,٣	٦٤٧,٠٥٨
	الكمية المنقذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣		١٠١٩٨,٨٣٤	١٧٥,٠	١,٧٨٤,٧٩٦
	قيمة المادة المحجورة		١٠١٩٨,٨٣٤	١٩٥	١,٩٨٨,٧٧٣
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم		١٠١٩٨,٨٣٤	٢٥	٢٥٤,٩٧١
	علاوة تصويل رسوم الكارثة والموازن طبقا للاتحة الشركة الوطنية				

مدير مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)


م/ ابراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ هاشم مختار



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقايضة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣ لبنود الاعمال تنفيذ شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات الاتجاهين
القطاع من المحطة ٤٢٥+٦٠٠ إلى ٤٢٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٥	البلاطات الخرسانية				
١٠٥	بالمتر المسطح أصل توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت مكدج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنظيف المسطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتدلة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم إضافة علاوة قدره ٥ جنيه بعد اود ١٠ متر رأسي على أن تتضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر رأسي)	٢م	٥٠٠	٤٥٧	٢٢٨,٥٠٠
٢٠٥	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣				
٢٠٥	بالمتر المكعب أصل توريد وصب خرسانة عادية لقضبان الحماية والميول الجانبية تتكون من ٣م ٠,٨ من دولوميت مكدج + ٣م ٠,٤ رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فبير + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أصل الحفر والشدات وكل مايلزم للحوال على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتدلة والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣م	٥٥,٨٠	٢٦٦٥,٢٠	١٤٨,٧١٨
	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣				
	الإجمالي				١٠٣,٧٨٧,٤٥٦

(مائة وثلاثة مليون وسبع مائة وسبع وثمانون ألف وأربع مائة وستة وخمسون جنيه فقط لا غير)

مدير مشروع (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع (الهيئة)

م/ إبراهيم الحناوي

مدير المشروع الاستشاري


م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ هاشم مختار

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"





محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين مطروح)
(قطاع العلمين فوكة) في المسافة من كم ٦٠٠ + ٢٥٥ إلى الكم ٦٠٠ + ٢٧٤ بطول ٢ كم (الاتجاهين) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٧/١٨ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / ايمن احمد حسن الحلواني مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٢- السيد المهندس / ابراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٣- السيد المهندس / شريف الهوارى مدير مشروع - شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات
٣-
٢-
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية

مهندس //

هاني محمد

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات من المحطة ٦٠٠+٢٥٠ الى المحطة ٦٠٠+٢٧٠

محضر تحديد مسافة نقل سن

(نقل سن)

انه في يوم الاثنين الموافق :- ٢٠٢٣/٢/٢٧

- بناءً على طلب شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات لتحديد مسافة نقل سن من كمارة الراغب

على طريق وادي النظرون للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب (XYZ) |
| ٤- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل مكتب الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي |
| ٥- السيد المهندس / شريف الهواري | ممثل شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات |

احداثي الكسارة : $30^{\circ}39'58.4''N$ $29^{\circ}49'12.7''E$

احداثي منتصف القطاع : $30^{\circ}58'15.05''N$ $28^{\circ}42'22.61''E$

وتبين ان الكسارة على مسافة ١٧٠ كم من منتصف قطاع الشركة

وعلي ذلك تم توقيع،،،

٥- السيد شريف الهواري
٤- السيد كمال نجيب
٣- السيد محمد خليل
٢- السيد مصطفى نجم
١- السيد ابراهيم الحناوي

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات - من المحطة 425+600 الى المحطة 427+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

- بناء على طلب المقاول شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / مصطفى نجم | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| 3- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة |
| 4- السيد المهندس / شريف الهواري | مندوب شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات |

وتبين ان المحجر علي مسافة 154 كم من منتصف قطاع شركة داريو للمقاولات العامة والإنشاءات

احد اثني المحجر $N 30^{\circ} 33' 19.7''$ $E 29^{\circ} 45' 06.7''$

احد اثني منتصف القطاع $N 30^{\circ} 58' 15.05''$ $E 28^{\circ} 42' 22.61''$



وعلي ذلك تم توقيع،،

4-

3-

2-

1-

مركز استشارات الهندسية
SGAC للمقاولات العامة والإنشاءات
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع

مهلة اضافيه واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إسم العملية: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية
ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة
الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٥.٦٠٠ الى
الكم ٢٧.٦٠٠ بطول ٢ كم فى الاتجاهين

إسم الشركة المنفذة: شركة داريو للمقاولات العامة والانشاءات

عقد العملية رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٧)

قيمة التعاقدية: ١٠٣.٧٨٧٤٥٦ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية: ٢٠٢٢/٧/١٨

تاريخ النھو طبقا للتعاقد: ٢٠٢٣/٣/١٧

المطلوب: مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٣/٩/١٧

المبررات:- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مدة العملية للاسباب الاتية:-
- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات
الجارى تنفيذها لمدة (٦ أشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات
العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة
المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المدة وهى كالتالى:

- عدم توافر المواد الخام
- عدم توافر قطع غيار المعدات

- إعداد مهندس:

مدير عام (صيانة/التنفيذ)

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية:

رأى الإدارة القانونية:

المختصة فى هذا الشأن مستأنفة وفقاً لمبدأاتهم المستندة الى موافق الصنوا ببط. المفترضة من مدير

المرز برأى بجلسية برقم (٢٠٢٣/٩/١٧) فى مواصلة المشروع دوماً بمساعدة ذلك من

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد ...

مع العملية المدة المفترضة من مجلس الوزراء -

مع عدم تحصيل مقابل تأخير من الشركة -

لعدم توافر مناظ ذلك ١٠٠ / ١٠٠ / ١٠٠
١٥ / ١٥ / ١٥

التوقيع)
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

1386040

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

جدول الوثيقة

رقم الوثيقة	2689/2024	تحديد	لوثيقة رقم	2193/2023
اسم المشترك او المشتركين	شركة داريو للمعاملات العامة و الابتعاث			
الموضوع	الاسماعيلية - مركز التل الكبير - مشية السلام			
اسم المستفيد	الهيئة العامة للطرق والكبارى			
اسم المقاول	تأميناً على عقد رقم (37 / 2022 / 2023) استكمال تنفيذ اعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 600+425 الى الكم 600+427 بطول 2كم (الاتجاهين)			
تاريخ	شروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)			
تاريخ	بشأن المناقص فى .	2024/09 21		
تاريخ	ويشهى فى	2025/09 20		
تاريخ	بدأ من			
تاريخ	و انتهى فى			
تاريخ	103 787 456 00	مخط سنة و ثلاثة ملايين و سبعمائة و سبعة و ثمانون ألفاً و اربعمائة و ستة و خمسون حنيه مصري		
تاريخ	الإصدار المائيه			
تاريخ	المسؤولية المائيه قبل الغير			



تحريراً في	16/09/2024	
اسم المتقدم	هاني عاطف	
نوع المنتج	23697	مصطفى محمد مصطفى

تأريخ جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم : 2689/2024 تجديـد لوثيقة رقم 2193/2023

النفس من كل حادث

مسألة: كذا

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 1$$

20. "س۔ کل حادث بعد ادنیٰ حد

حد 103,787,456.00

[illegible]

103,787,456.00

معالى منظر الفاضل للفسح الاول

الحمد لله

خود اللغو (۱)

1402 J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):1400–1407

١- الأمانة العامة

١- العواصف / الزلازل / الفيضانات / حرائق الغابات / انهيارات التربة / انزلاق الصخور / انهيار السدود - غير معطى

الاضواء النعوظة اىء صاءة او عور او سلسلة من الضائفر او الاضرار الناشئة عن حادث واحد

القسم الثاني : المسئلة المدنية قبل الغر

التحليلات

حدود التعويض (2)

النوم - العجز عنها

2

١- الإسهال الحبيبي -

•

100,000.00

١- التحصيل الواحد -

1

200,000.00

1-2 عهدا كان عدد الأشخاص -

20th من کل حادثہ متحدہ ادنیٰ
40,000 حد

200.000,00

2- الأصناف العامة للمنتج -

ح 4(1) (100)

400,000.00

أحضرني البراد الشريفة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل خلية أو سلسلة من الخلايا الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة شناق القيامين النكافلي - مصر

7-2

18/19 2024

تحریر افری

اسم الممنوح
هالي عاصف



1386042

تابع جدول وثيقة تأمين جميع أخطار العقولين رقم : 2689/2024 تجديد لوثيقة رقم 2193/2023

حساب الأقساط

حد	10,746.00	نصف عام
حد	591.03	شهر
حد	26.10	يوم
حد	100.16	سنة
حد	64.48	شهر
حد	21.49	يوم
حد	10.75	سنة
حد	11,560.00	شهر

يحتوي هذا الجدول على الأقساط المطلوبة لتأمين الموقع عليه من المشترك
في حدود الملاحق التالية والتذكورة فيما يلي والموقعة جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة



7 من 7

التاريخ: 16/09/2024
الاسم: هاني عاطف



Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sodegi Street - East Section- Alkafa Tower above Abu Dhari Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - النقى - الجيزة
فرع الهندسة : ٢٠ شارع وادى النيل - الهندسة - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع خالد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى معاد - سموحة - قسم مبنى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ فى الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قلعة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود سيدنى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طابى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شريف برج الأندلس - أمام المديرية الحالية
فرع الزقازيق : شى حال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورنيش النيل - دمياط

1386043

تأريخ جدول وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين رقم : 2689/2024 تجديد لوثيقة رقم 2193/2023

الشروط والتغطيات

يجب تحرير الألواح الخشبية بما في ذلك الدعائم وحلقة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى أو المباني بمسافات كافية
في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية
في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية
في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية

في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة في المبنى أو المباني بمسافات كافية



4 من 7

16/09/2024

تحريرا في

هاني عاطف

اسم المستخدم



Head Office	25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch	6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch	88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch	90 Fawzy Mosa Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch	Awad Alla Building 2, El Galish st., El Mansoura
Port said Branch	Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alskafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch	Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	Garnal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزى مازا - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش على البنك المصرى الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطنة ٢/٣ شارع المأمون ومحمود صندقى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم ١ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كويتىش النيل - دمياط

المرقعات

المحبه القاعه للقاءه العالميه له فقه حصه لخصا السبيل الى الملاحق التائه المرفقه جزء لا يتجزء من هذه الوثيقه

— *Journal of the American Medical Association*, 1967, 201: 1001-1002.

بعضی از مطالبات بالتعویض بابتی حال عن ای ضرر و فسخ نسبت او بلیغ عن

$$(\text{COV}[D-19]) = 0.22 \quad \text{and} \quad \text{COV}[D-20] = 0.19$$

١٠ - المرض المتلازمة التنفسية الحادة الشديدة (SARS-COV-2)

تعتبر الفيروسات من كوروننا المرتبطة بالتهالمة النفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

وَأَمَّا الْفُلُ فَأَنزَلْنَاهُ ذِكْرًا لِّعِبَادِنَا إِنَّهُ كَانَ كَلَمًا وَفُتًى

الشيء الذي يحد الخط على أرض الشريعة، الاستثناءات، والإحكام، التي استقرت المنصوص عليها في عدد

فقد الأضرار و الإضرار ، فقد الأضرار و الطارئ و التكاليف المتعلقة و

المعنى: عدم مباشرة بعض الأشخاص في الأعمال الملوثة أو أعمال التطهير أو

١٠٤٢ - صمدية من سلطنة قانونه فيما يتعلق بالأغلق : أ، النفقة ، ب، منع الوصول عند التعامل مع نفسي هذه

طُحِرَ وَفُحِرَ (الاستقاء الحسنة) والضرر أو المصيبة الناتجة عن الزلازل.

من السقوط السبق عليه، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة بها، أن الشركة ليست مسئولة

على عموم الضرر غير الحساسة أو الضرر أو المصنوفية المباشرة أو غير المباشرة المنسوبة من أو الناجمة عن الزلازل.

المادة 110: استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفصل أو عمز بالمادة

بالتشريط، ط، الاستثناءات، والاحكام، والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحقة

١٠ - لا يجوز التمسك بمسئولية عن تعويض المبتلى عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتحصية من

أم القاصدة عن القاصدة أم عمر المنياء

أما في ١٥ من الشهر الجاري، أي الضرب، أو التآلف، أو الصفة، أو البتة، أو العواصف، أو الرياح المحملة بالمياه.

[illegible]

من المعلوم في حق من الممنوع من السفر أو الكف أو الحجر أو غير ذلك من القيود

من أجل تحقيق هذا الغرض، فإننا نحتاج إلى أن نكون قادرين على فهم طبيعة المشكلة التي نواجهها، وأن نتمكن من تحديد الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها، وأن نتمكن من تطوير حلول فعالة لمعالجتها.

ملحق ١١٧١: الفحص الخاص بأطوال الأقسام المنفذة

من الصلوات والمناسبات الدينية، ومع عدم الإخلال بالشروط والإستثناءات والأحكام والإشترائط المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها، فإن الشركة سوف تقوم

يُعرض السهم في أي تلف أو خسارة أو مسئولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للحسمور و القواصم و الشدات والمصارف و القنوات واعمال الضرق قد

التيبت على الرغم من بعض في مجموعها الأبطال المحددة إن شاء ، وذلك بعض النظر عن حالة إتمام الأعمال المؤس عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محدد

عصافير علاج تلك الأمراض

الحظ الأقصى لصاحب القسم 20 متر ، وبالحظ أقصى 3 المقسم وبلد العسل فيها في نفس الوقت

شركة وشاق للتأمين النكافلي - مصر

75

16/09/2024 تحرير امني

اسم المستند : تاريخ طرابلس



١- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
٢- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
٣- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
٤- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
٥- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
٦- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
٧- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
٨- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
٩- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس
١٠- اصدار بيان من قبل الادارة العامة للمواصفات والمقاييس



16/09/2024 تحرير: اففي
هاتم عاطف اسم المستحضر



1386046

تجديد اول

نوع الاصدار : اخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين

وثيقة رقم : 2689/2024

ملحق رقم : 2689/2024

الفرع : المركز الرئيسي

اسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العامه والانشاءات

العنوان : الاسماعيليه - مركز النل الكبير - منشية السلام

المنتجات : لهندسة العامه للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/09/2024

الى : 20/09/2025


العميل : حم

القيمة : 103,787,456.00

بمبلغ سبعة وثلاثين مليون و سبعة و ثمانون الفا و اربع مائة و ستة و خمسون جنيه مصر

م	10,746.00	:	الطريق
م	591.03	:	صندوق التعمير
م	100.16	:	مصرف
م	26.10	:	البنك
م	64.48	:	م. التأمين و ارفعة سنه في الالف
م	21.49	:	م. التأمين و حملته لوثائق - ائتمن في الالف
م	10.75	:	م. التأمين و حملته لوثائق - واحد في الالف
م	11,560.00	:	احتمالي الاشتراك

(فقط أحد عشر ألفا و خمسمائة و ستون جنيه مصري)



تاريخ اصدار : 16/09/2024

اسم المستخدم : هاني عاطف

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

5 % 537.30

قيمة العمولات الاساسية قبل الاستقطاعات



شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

Head Office	: 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch	: 25 Wadi el Nil st., Mohandessen - Guza
Nasr City Branch	: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch	: 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch	: 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch	: Awad Alla Building 2, El Garish st., El Mansoura
Port said Branch	: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch	: Sheblin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	: Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

المركز الرئيسي : 25 شارع مصديق - الدقي - الجيزة
 فرع الهندسين : 25 وادي النيل - الهندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : 6 شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : 88 شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : 90 شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم 2 ش الجيش على النيل أقصى الخليج - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة 3 / أ شارع المأمون ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم 2 الدور الرابع عمارة الرفاع على بن تلة كورنيش النيل - دمياط

السيد / السيد العامه لطريق والكبرى

مدير عام

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم شركه داريو للمقاولات العامه والانساء والقسط
مبلغ 11.560.00 جنيه مصري فقط احد عشر الفا وخمسة وستون جنيه مصري. والمعقود بها التأمين لصالحكم عن
مبلغ 20/09/2025 الى 21/09/2025 سارية المفعول عن الفترة المشار إليها أعلاه وتم السداد بإيداع بالنك وتم التحصيل بحساب

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،،،

23697

التوقيع

2024/09/17

تاريخ في

اعداد

محمد حسن محمد

طبع بواسطة

1

عدد مرات الطباعة



٢٦٨٩
٢٠٢٤



وثاق
wethaq
وثاق للتأمين التكافلى - مصر
Wethaq Takaful Insurance-Egypt

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيب بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة

السيد/السادة/ شركة ناريو للمعادلات والاعمال

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى وثيقة جميع احصار المقولين رقم 2689 باسمكم ولصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى عن المدة من 2024/09/21 إلى 20/09/2025 بإجمالي مبلغ تأمين 103787456 جنيه مصري يرجى مراجعة والتأكد من أن مبلغ التأمين المنصوص عليه بالوثيقة يتناسب مع قيمة

الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين حيث أن وثائق التأمين تتضمن شرط النسبية. كما نفيدكم علماً بأنه نظراً للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية واثارها على التغير في قيمة الأصول المؤمن عليها نوجه عنايتكم لبيان حالة حدوث تغير في القيمة السوقية للممتلكات المؤمن عليها بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة قد أصبح أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية / السوقية موضوع التأمين فيتعين عليكم ضرورة إعادتنا برغبكم في زيادة مبلغ التأمين ليتناسب مع القيمة الحقيقية / السوقية للممتلكات.

تعريف شرط النسبية:

هو شرط يقتضى بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المشترك / المستفيد بمثابة مؤمن لدى نفسه بالتفرق بين القيمتين وتحمل تبعاً لذلك نصيبه من الخسارة أما في حالة الخسارة الكلية (الهلاك الكلى) فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير





وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين

حيث أن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) طلباً كتابياً يعتبر مع كافة الإقرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساساً للتعاقد وجزءاً متمماً للوثيقة.

فانه بموجب هذه الوثيقة تتعهد الشركة مقابل سداد المشترك الاشتراك المبين بالجدول وطبقاً للشروط والاستثناءات والأحكام والأشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو في الملاحق المكملة لها بتعويض المشترك بالطريقة وفي الحدود المنصوص عليها فيما بعد.

الاستثناءات العامة:

لا يغطي هذا التأمين بأي حال من الأحوال الخسائر أو التلغيات أو المسئوليات التي قد تحدث أو تنشأ أو تتفاقم بطريق مباشر أو غير مباشر بسبب:

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصبية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون نيابة عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء أو التلغ أو التدمير بأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثلية.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.

في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسئوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسئوليات مغطاة يقع على عاتق المشترك.

مدة التغطية

تبدأ مسئولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع العمل وتنتهي مسئولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد المقولة المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

- ١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بطلب التأمين صحيحة.
 - ٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متكاملاً لهذه الوثيقة وعبرة (هذه الوثيقة) أينما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو في الجدول أو الأقسام يكون لها ذات المعنى في أي مكان وردت فيه.
 - ٣ - يجب على المشترك وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.
 - ٤ - (أ) لممثلي الشركة الحق في التفتيش ومعاينة الأخطار المؤمنة في أي وقت مناسب وعلى المشترك تقديم كافة التفاصيل والبيانات الضرورية لهم واللازمة لتقييم الخطر.
 - (ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برقياً فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشترار التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهرياً يترتب عليها زيادة الخطر ما لم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.
 - ٥ - وفي حالة وقوع حادث قد ينشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يجب على المشترك أو من ينوب عنه أن يقوم بما يلي: -
(أ) إخطار الشركة فوراً تليفونياً أو برقياً وتعزيز ذلك كتابة متضمناً المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.
(ب) اتخاذ كل الخطوات التي في إمكاته للعمل على تقليل حجم الخسائر أو الأضرار.
(ج) المحافظة على الأجزاء التي أصابها الضرر وتمكين ممثلي الشركة أو خبراءها من معاينتها وفحصها.
(د) تقديم كافة المعلومات والمستندات المؤيدة للمطالبة والتي تحتاج إليها الشركة.
(هـ) إخطار الشرطة فوراً في حالة وقوع خسائر أو تلفيات بسبب حادث سرقة أو سطو.
- ولا تكون الشركة مسؤولة بأي حال عن أي خسائر أو تلفيات أو مسئوليات مالم تتسلم الشركة إخطار عنها خلال ١٤ يوماً من تاريخ وقوعها، وفور إخطار الشركة بموجب هذا الشرط يمكن للمشارك القيام بالإصلاحات أو الاستبدالات لأي تلفيات بسيطة.
- وفي جميع الحالات يجب إعطاء الفرصة لممثلي الشركة لكي يقوموا بمعاينة وفحص الخسائر أو الأضرار قبل إجراء الإصلاح أو الاستبدال وفي حالة عدم قيام ممثلي الشركة بإجراء المعاينة أو الفحص خلال فترة تعتبر كافية وفقاً للظروف

يصبح من حق المشترك القيام بإجراء الإصلاح أو الاستبدال، ولا تكون الشركة مسئولة بموجب هذه الوثيقة عن أي وحدة أصابها الضرر ولم يتم إصلاحها بالطريقة الصحيحة وبدون تأخير.

٦ - يجب على المشترك قبل أو بعد حصوله على التعويض من الشركة أن يقوم أو يسمح أو يساهم في القيام على نفقة الشركة بكل ما قد يكون ضرورياً أو تطالب به الشركة لاستعمال الحقوق ومباشرة الدعاوى التي تحل فيها محل المشترك في الحصول من الغير (بخلاف المشتركين بموجب هذه الوثيقة) على إبراء الذمة أو التعويض التي يكون لها الحق فيها بعد دفع التعويض للمشارك بمقتضى هذه الوثيقة.

٧ - شرط سقوط الحق:

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية: -

أ) إذا أدلى المشترك أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين.

ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جنائية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلاً.

٨ - إذا وُجد سارياً وقت وقوع الحادث الذي نشأت عنه الخسائر أو الأضرار للأشياء المؤمن عليها بموجب هذه الوثيقة تأمين أو جملة تأمينات أخرى تغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤوليات المؤمن عليها فإن الشركة لا تكون مسئولة عن تعويض هذه الخسائر أو التالفات أو المسؤوليات إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها إلى مجموع المبالغ المؤمن بها على نفس الأشياء.

٩ - تُخصص التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقدم إعمالاً لنص المادة (٧٥٢) من القانون المدني المصري

١٠ - كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

١١ - يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

١٢ - للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك والمستفيد بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ

القسم الأول : الأضرار المادية:

تم الاتفاق بموجب هذه الوثيقة بين الشركة والمشارك على أنه إذا لحق في أي وقت خلال فترة التغطية بالبنود الواردة بالجدول أو أي جزء منها أية خسارة أو تلف مادي ناتج عن حادث عرضي وفجائي تنشأ عن أي سبب بخلاف تلك الأسباب المستثناة على وجه التحديد وبطريقة تستدعي الإصلاح أو الاستبدال.

تقوم الشركة بتعويض المشارك عن هذه الخسارة أو التلف وفقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

يدفع مبلغ نقدي أو استبدال أو إصلاح (كما يترأى لها) وعلى ألا يتعدى مبلغ التعويض بالنسبة لأي بند من البنود الواردة بالجدول المبلغ الموضح أمام هذا البند. ولا يتعدى الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد أو مجموع التعويضات عن عدة حوادث جملة مبالغ التأمينات الموضحة بالجدول.

وتقوم الشركة أيضاً بتعويض المشارك عن تكلفة إزالة الانقاض الناتجة عن أي حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة بشرط أن يكون الجدول قد تضمن مبلغاً منفصلاً لهذا البند.

استثناءات خاصة بالقسم الأول:

لا تكون الشركة مسؤولة في جميع الأحوال عما يلي:

أ) المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشارك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

ب) الخسائر التبعية من أي نوع أو صفة أيا كانت بما في ذلك الجزاءات والغرامات والخسائر الناجمة عن التأخير أو بسبب عدم إتمام العمل أو فسخ العقد.

ج) الخسائر أو الأضرار الناتجة عن خطأ في التصميم.

(د) تكاليف استبدال أو إصلاح أو تصحيح المواد المعيبة أو المصنعية المعيبة على أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على البنود التي تأثرت بصفة مباشرة ولا يمتد إلى الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالبنود التي تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة والناجئة عن حادث يرجع إلى هذه المواد أو المصنعية المعيبة.

(هـ) الاستهلاك العادي والتآكل، الصدأ أو التآكسد، والتلف نتيجة عدم الاستعمال أو نتيجة العوامل الجوية العادية.

(و) الخسائر أو الأضرار التي تلحق بماكينات وآلات ومعدات التشييد وتكون ناشئة عن العطل الكهربائي و/أو الميكانيكي ، قصور أو كسر أو خلل تجميد سائل التبريد أو أى سائل آخر، التشحيم المعيب، نقص الزيت أو سائل التبريد ولكن فى حالة ما إذا تسبب هذا العطل أو الخلل فى حادث ونتج عنه تلفيات خارجية فإن هذه الخسائر اللاحقة تعتبر مغطاة.

(ز) الخسائر والتلفيات للمركبات المرخص لها بالسير فى الطريق العام أو المركبات المائية أو الطائرات.

(ح) الخسائر والتلفيات للملفات، الرسومات، الحسابات، الفواتير والعملات والطوابع والحجج والعقود، مستندات الديون والأوراق المالية والتجارية، خطابات الضمان، الشيكات.

(ط) الخسائر والتلفيات التي تكتشف فقط أثناء عملية الجرد.

الأحكام التي تطبق على القسم الأول:

أولاً: مبالغ التأمين:

يجب الأتقل مبالغ التأمين الواردة بالجدول عن:

بالنسبة للبند (١):

إجمالي قيمة عقد المقولة عند انتهاء عمليات التشييد متضمنة جميع المواد والأجور ومصاريف النقل والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والمواد أو الأشياء الأخرى التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع.

بالنسبة للبندين (٢ ، ٣) :

القيمة الاستبدالية للمعدات ومهمات والآلات التشييد والبناء بمعنى أنها تمثل تكاليف استبدال البنود المؤمنة ببنود جديدة من ذات النوع وسنة الصنع ونفس الكفاءة.

ويتعهد المشترك بزيادة أو تخفيض مبالغ التأمين إذا طرأت تقلبات جوهرية في الأجور والأسعار بشرط أن تكون هذه الزيادة أو النقص سارية المفعول فقط بعد إثباتها بالوثيقة بمعرفة الشركة .

وإذا ظهر أن مبالغ التأمين وقت وقوع الحادث تقل عن المبالغ الواجب التأمين بها فإن المشترك يتحمل حصة نسبية من قيمة التعويض وإذا تضمنت الوثيقة جملة بنود فإن كل بند منها يخضع على حدة لهذا الشرط.

ثانياً: أسس تسوية الخسائر:

في حالة حدوث خسائر أو تلفيات تسوى المطالبات بموجب هذه الوثيقة على أساس:

(أ) في حالة التلفيات الممكن إصلاحها:

تكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة الأشياء المؤمن عليها لحالتها السابقة مباشرة لحدوث التلفيات ناقصا قيمة المخلفات.

(ب) في حالة الخسارة الكلية:

القيمة الفعلية للأشياء المؤمن عليها قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة المخلفات وفي جميع الأحوال لا بد أن يكون المشترك قد أنفق المبالغ المطالب بها وأن تكون هذه المبالغ متضمنة في مبلغ التأمين وعلى أن يشترط دائماً الالتزام بتنفيذ أحكام وشروط الوثيقة.

ولا تقوم الشركة بالسداد إلا بعد تقديم الفواتير والمستندات الضرورية التي تقبلها والتي تثبت أن الاصطلاحات قد نفذت وأن الاستبدال قد تم حسب ظروف كل حالة هذا ويلزم إصلاح جميع التلفيات التي يمكن إصلاحها ولكن إذا كانت تكاليف الإصلاح لأي تلفيات تساوى أو تزيد على قيمة الأشياء قبل حدوث التلفيات مباشرة فإن التسوية تتم على الأساس أعلاه في (ب)

وتتحمل الشركة تكاليف الإصلاحات المبدئية إذا كانت هذه الإصلاحات تمثل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تؤدي إلى زيادة مصاريف الإصلاحات الإجمالية، ولا تغطي هذه الوثيقة تكاليف أية تعديلات أو إضافات أو تحسينات.

ثالثاً: التغطيات الإضافية:

يجوز أن تغطي الوثيقة المصاريف الإضافية لأوقات العمل الإضافي والعمل الليلي والعمل أثناء العطلات الرسمية ومصاريف النقل السريع بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

القسم الثاني: المسئولية المدنية قبل الغير:

تلتزم الشركة بتعويض المشترك وبعد أقصى المبالغ المحددة بجدول الوثيقة عن أي مبالغ يصبح المشترك مسئولاً عن دفعها قانوناً تعويضاً عن الأضرار التي تلحق بالغير بصفة عرضية كنتيجة مباشرة لتسييد أو تركيب البنود المؤمن عليها بموجب القسم الأول وتقع في موقع العمل أو مكان مجاور له مباشرة أثناء فترة التغطية وينتج عنها:-

(أ) الإصابات الجسدية أو الأمراض (سواء أدت إلى الوفاة أم لا).

(ب) الخسائر والتلفيات التي تلحق بممتلكات الغير.

وفي حالة المطالبة بتعويض يدخل في نطاق هذه الوثيقة تقوم الشركة أيضاً بتعويض المشترك عن:-

(أ) كافة النفقات ومصاريف التقاضي التي يستردها طالب التعويض من المشترك.

ب) كافة النفقات والمصاريف التي توافق الشركة على تحملها كتابة.
ويشترط دائما ألا تزيد مسئولية الشركة عن حدود التعويض القصوى المحددة بالجدول.

استثناءات خاصة بالقسم الثاني

لا تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن:

١ - المبلغ أو المبالغ التي يتحملها المشترك عن أي حادث والمذكورة بجدول الوثيقة.

٢ - المصاريف التي تتفق في إنشاء أو إعادة إنشاء أو تحسين أو إصلاح أو استبدال أي بند مغطى أو يمكن تغطيته بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة.

٣ - التلغيات التي تلحق بأية ممتلكات أو أراضي أو مبانى بسبب الذبذبات أو إزالة أو إضعاف الدعامات وكذلك الإصابات أو التلغيات التي تلحق بأي شخص أو بأية ممتلكات وتنشأ من أو تنتج عن مثل هذه التلغيات (مالم يتفق عليها بصفة خاصة بموجب ملحق).

٤ - المسئوليات الناتجة عن:

(أ) الإصابات الجسمية أو الأمراض التي تحدث لموظفي أو عمال المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة وكذلك أفراد أسرهم.

(ب) الخسارة أو التلغيات للممتلكات التي تخص أو تكون في عهدة أو حيازة أو حراسة أو إشراف المقاول أو المقاولين أو صاحب أو أصحاب المشروع أو أي منشأة مرتبطة بالمشروع المؤمن عليه أو على جزء منه بموجب القسم الأول من الوثيقة أو تخص أي موظف أو عامل يعمل لدى أي من المذكورين سابقا.

(ج) أي حادث تسبب عن أي مركبات مرخص لها بالسير على الطريق العام أو تسبب عن أي مركبات مانية أو طائرات.

(د) أي اتفاق يبرمه المشترك ويلتزم بمقتضاه بدفع أي مبلغ على سبيل التعويض أو غير ذلك. مالم يكن هذا الالتزام قائما أيضا في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

شروط خاصة تنطبق على القسم الثاني:

١ - يجب على المشترك أو من يمثله عدم الإقرار بأي مسئولية أو تقديم أو عرض أو إعطاء أي وعد بالدفع أو بالتعويض دون الحصول على موافقة كتابية من الشركة التي يحق لها إذا ما رغبت في ذلك أن تتولى وتدير باسم المشترك نيابة عنه الدفاع أو تسوية أي مطالبة أو أن تقيم دعوى باسم المشترك ولصالحها عن أي مطالبة بتعويض عن أضرار أو غير ذلك ولها مطلق الحرية في القيام بمباشرة أي قضايا أو تسوية أي مطالبة ويجب على المشترك في سبيل ذلك أن يقدم للشركة كافة المعلومات والمساعدات التي قد تطلبها.

٢- يجوز للشركة فيما يختص بأي حادث أن تدفع قيمة التعويض عن الحادث الواحد (بعد استبعاد أي مبلغ أو مبالغ سبق دفعها كتعويض متعلق به) أو أي مبلغ أقل يمكن به تسوية المطالبة أو المطالبات الناشئة عن الحادث وتبرأ ذمة الشركة من أي مسئولية أخرى بالنسبة لهذا الحادث تحت هذا القسم.

الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمؤه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً لآتي:

- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك بطريق حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشاركين بشأن استحقاقات هذا الأخير لنصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق .
- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .
- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك بنهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.
- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.
- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
- مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً .
- امس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشارك : يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع

غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقا للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق طبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١. (٢٠%) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.
 ٢. (١٥%) على الأكثر في سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 ٣. (٢٥%) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠%) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠%) من إصدارات ووثائق صناديق الاستثمار أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 ٤. ألا يزيد مجموعة قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
 ٥. (٣٠%) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهورة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠%) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠%) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 ٦. (٥٠%) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الادخار الصائفة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
 ٧. (٢٠%) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.
- صندوق حملة الوثائق: هو مجموعه من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه

- الاشتراكات وعوائدها حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تغطيته على النحو التالي: -
- تغطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
- الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويؤوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠% من رأس المال المنفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥% للعام الأول، ٥٠% للعام الثاني، ١٠٠% للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.
- توزيع الفائض التأميني: يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لنيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
- أجر المصاريف: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠% من الفائض التأميني
- هيئة الرقابة الشرعية: تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر كل من: -

رئيس اللجنة

١- الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى

عضو اللجنة

٢- فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي

عضو اللجنة

٣- الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب

وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠

- موافقة هيئة الرقابة الشرعية: تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠

شروط الموافقة على قبول التأمين التكافلي

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

1386047

جدول و ثبقة تامين الحوادث الشخصية

فرع الاصل: المركز الرئيسي

4002/2024 اصل

المسألة الأولى

شركة دارق للمقاولات العامة والإنشاءات
الإسماعيلية - مركز الشئ الكبير - مدينة السلام
الرياض - ١١٥٦١٠٠

مديرية
البحر

[illegible]

حسان بن النضر الكندي

رد	مبلغ	وصف	تاريخ
ح	479.00	تأمينات صحي	21/04/2017
ح	4.79	صنف لخدمة السيد	20/04/2017
ح	11.60	خمرية طو لفة	
ح	100.30	صنف لخدمة	
ح	2.87	سم الانترفا (رقادة) حة في راحة	
ح	0.96	صنف لخدمة	
ح	0.48	صنف لخدمة	
ح	600.00	تأمينات صحي	

الحمد لله

عنا نحن - معصية المودة - بالتغطية التأمينية لكل فرد.

طنداء - تعطيه البركة والتعزية التامنية لكل فرد

طبعاً في هذا الحيز أيضاً في السور وخط العامة للوثيقة

محرر

م. عظمیٰ

130,000.00	جم	فقط مائة و ثلاثون ألفا جنيه مصري
130,000.00	جم	فقط مائة و ثلاثون ألفا جنيه مصري

أخذ الإقصى الذي يلتزم به الشركة من الحالات الواحدة (سهما مع عدد الأشخاص) -

أخذ لإقصر الذي تلتزم به الممكة خلال مدة الفاسر -

مرفقات هذه الوثيقة :
أ - الشروط العامة للوثيقة
ب - تايه تحول الوثيقة

شركة وفاة التأمين التكافلي - مصر

1 على A

16/09/2024

17/09/2024 تاريخ الطباعة

عدد	احمد ضياء الدين احمد اساعير
رقم المجلد	23697 مصطفى محمد مصطفى



Head Office	25 Asadad St., Dokki - Giza	www.welnetq-egypt.com	E-mail: welnetq@welnet-qg.eg
Mohandessen Branch	20 Wadi El Nil st., Mohandessen - Giza		
Nasr City Branch	6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo		
Alexandria Branch	85 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria		
Smouha Branch	90 Fakry Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Area		
El Mansoura Branch	Awad Alla Building 2, El Gailah st., El Mansoura		
Port said Branch	Block 31A, Al Maamoun and Mahmoud Sedge Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said		
Ismaillia Branch	Sharia Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate		
Port said Branch	Garnat Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate		
Damietta Branch	Cornish El Nile Fourth Section, Qumatt El Bial Building, above R-Teck and Wafa Bank.		

الخط انساكن
19685

www.facebook.com/wehaq

المركز الدولي للموسيقى	٢٥ شارع مصدق - البقي - الجيزة
قصر الحسينة	١٠ شارع وادي النيل - الجدي - الجيزة
قصر المهندس نصر	١٦ شارع عباسي - القادش - نصر القاهرة
قصر الدكتور أحمد	٨١ شارع فؤاد (شارع الحرية) - (الاستاذية)
قصر الموسيقي	١٠ شارع شارع وادي النيل - سموحة - قسم سيدى جابر - الجيزة
قصر المهندس محمد	٣٤ شارع رقم ٢٤ - برج الجيش على النيل - الجدي - الجيزة
قصر بورسعيد	٣٤ شارع المأمون ومحمود محمد - قسم الشرق - برج الصفا على مصروف أبو ظبي - بورسعيد
قصر الصامعيلية	شارع عين شمس - التلستدي - أمام المديرية المالية
قصر الزاوية	في جملد على التأسار - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الجيزة
قصر مرميات	شقة رقم ٢ - الدور رقم ٤ شارع الراعي على النيل - قسم كبرى كبرى النيل - شبراخيت

1386048

إصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 4002/2024

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

1- يهدف هذا الوثيقة إلى تأمين المؤمن عليه من الأضرار الناتجة عن الحوادث الشخصية، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا الوثيقة.

2- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

3- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

4- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

5- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

6- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

7- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

8- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

9- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

10- لا يغطي هذا الوثيقة المؤمن عليه في حالة ارتكابه جريمة أو تورطه في حادث مروري أو حادث جوي أو حادث بحري أو حادث مائي أو حادث كهربائي أو حادث حريق أو حادث انفجار أو حادث تسرب غاز أو حادث تلوث بيئي أو حادث إرهابي أو حادث تخريب أو حادث حروب أو أحداث سياسية أو أحداث اقتصادية أو أحداث طبيعية أو أحداث أخرى غير مدرجة في هذا الوثيقة.

تأمين

مصلحة الإحصاء السكانية

الأمين - مبرور - (م.م.م.)

استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

16/09/2024

تحرير في

17/09/2024

تاريخ الطباعة

محمد صبيح الشيب أحمد الشعاير

إعداد

23697 مصطفى محمد مصطفى

كود المنتج



2 من 4



Head Office	: 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessan Branch	: 20 Wadi el Nil st., Mohandessan - Giza
Nasr City Branch	: 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch	: 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch	: 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch	: Awad Alia Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch	: Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedqi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch	: Sheblin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch	: Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch	: Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
 فرع المنهدسين : ٢٠ ش وادي النيل - المنهدسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
 فرع بورسعيد : ٢ / ٣ شارع المأمون ومحمود سديقي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شبن برج الأندلس - أمام المديرية الخالية
 فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شنة رقم ٢ البور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بي تك كورنيش النيل - دمياط

1386049

شروط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه أنه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والإحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار و/أو فقد الأرباح و/أو فقد الأرباح الطارئ و التكاليف المتعلقة و
بشكل مباشر أو غير مباشر من نفسي عدوي و/أو أمراض المعدية من في تلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير
و/أو السبل المعتمد أي في قرارات صناديق من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاف و/أو النفيد و/أو منع الوصول عند التعامل مع
بعض هذه الأمراض المعدية

بما في ذلك فيروس كورونا

بما في ذلك بعض هذه الأمراض المعدية بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن

وبما في ذلك فيروس كورونا (COVID-19)

بما في ذلك فيروس كورونا و/أو المرض المتلازمه التفهسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

بما في ذلك فيروسات أي بحريات أو سلالة نشأ عن فيروس من كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

بما في ذلك فيروسات أي بحريات أو سلالة نشأ عن فيروس من كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

16/09/2024

تاريخ في

17/09/2024

تاريخ تساقط

أحمد صياء الدين أحمد الساعيل

أحمد

مصطفى محمد مصطفى 23697

رقم السج



3 من 4



1386050

مطالبة سداد

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 4002/2024

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

اسم المشترك : شركه داريو للمقاولات العلميه والانشاءات

العنوان : الاسماعيليه - مركز النيل الكبير - منشية السلام

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 21/09/2024

الى : 20/09/2025

العملة : جنيه مصري

479.00 جم

الإشتراك الصافي

4.79 جم

حصة الدفعة التنصية

11.60 جم

الضريبة النوعية

100.30 جم

مصاريف الاصدار

2.87 جم

رسم الإشراف والرقابة / سنة في الألف

0.96 جم

إشتراك صندوق حصة الوثائق / أثنان في الألف


0.48 جم

إجمالي خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف

600.00 جم

إجمالي الأشتراك

فقط سمانة جنيه مصري



تحرير في : 16/09/2024

تاريخ الطباعة : 17/09/2024

اعداد : احمد صياء الدين احمد اسمعيل

كود الملحق : 23697 مصطفى محمد مصطفى

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

4 من 4

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات 47.90 10 %



Head Office : 25 Mesadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Alsafa Tower above Abu Dhabi Bank - port said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

الخط الساخن
19685

www.wethaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مسند - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - العقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فوزي ماز - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليجى - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / أ شارع المأمون ومحمود سديجى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طبل - بورسعيد
فرع الاسماعيليه : شارع شوبن برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٧ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بن تلة كورنيش النيل - دمياط



وثاق للتأمين التكافلي - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

إلى : السيد / محمد سعيد طه والكباري

السيد / محمد سعيد طه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحادث الشخصي رقم 2024/4002 الحوادث الشخصية. باسم شركه داريو للمعاولات العامه و الانشاءات والقسط الاجمالي
600 000 جنيه مصري فقط ستماده جنيه مصري. والمعقود بها التأمين لصالحكم عن الفترة من : 21/09/2024 إلى
2025/09/20 - معقول عن الفترة المشار إليها أعلاه و تم السداد بإيداع بالبنك وتم التحصيل بحساب الشركه
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام .

23697

2024/09/17

محمد حسن محمد

1





وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلى - مصر
Wethaq Takaful Insurance - Egypt

Confidentiality Data Protecting / حماية سرية البيانات

" Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches .Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through :

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address:
wethaq@wethaq-egypt.com

. Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.

. Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

" عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهيى بكم عدم الإفصاح عن أي من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

- الخط الساخن للشركة: 19685
- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أي من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفي حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أي رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

- الخط الساخن: 19685
- البريد الإلكتروني للشركة:
wethaq@wethaq-egypt.com

- يرجى توخي الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة



وثاق
wethaq

وثاق للتأمين التكافلى - مصر
Wethaq Takaful Insurance-Egypt

٢٠١٩
٢٠٢٢

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

بناءً على البيانات والقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحق بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلى - مصر على الممتلكات والمسئوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشارك خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة أو أية مدد لاحقة يتفق عليها، أية إصابة جسمانية نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر، ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة.

الشروط العامة

البند الأول: الحالات التي يشملها التأمين

أولاً: في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد ببيانهم بالجدول أو على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستحقين، على أنه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الاداء الي باقي المستفيدين أو المستحقين.

ثانياً: في حالة العجز الكلى المستديم :

تؤدي الشركة للمشارك أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية:

- فقد البصر العيني نهائياً
- فقد الساقين أو القدمين
- فقد ذراع و قدم
- فقد يد و قدم
- فقد اذن أو اللسان
- فقد اذن أو ساق
- فقد - - - - -

كما يحظر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة.

ولا يجوز للمشارك أي مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً.

ثالثا : في حالة العجز الجزئي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتترك مبلغا يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	٢ - الأطراف السفلي	نسبة العجز الجزئي		١ - الأطراف العليا
		الايمن	الايسر	
%٥٠	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	%٥٠	%٦٠	الفقد الكامل للذراع او اليد
%٤٠	الفقد الكامل لطرف سفلي الي ما تحت الركبة	%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل لحركة الكتف
%٣٠	البتر الجزئي للقدم والشامل لجميع الأصابع	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل لحركة المرفق
%٣٠	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل لحركة المعصم
%٣٠	الفقد الكامل لحركة الركبة	%٢٥	%٣٠	الفقد الكامل للإبهام و السبابة
%١٥	الفقد الكامل لحركة مفصل القدم	%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل للإبهام والاصبع غير السبابة
%٨	الفقد الكامل لحركة ابهام القدم	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل للسبابة والاصبع غير الايهام
٣ - الكسور		%٢٠	%٢٥	الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة
%٣٠	كسر لم يلتحم بالساق	%١٥	%٢٠	الفقد الكامل للإبهام فقط
%٢٠	كسر لم يلتحم بالقدم	%١٠	%١٥	الفقد الكامل للسبابة فقط
%٢٠	كسر لم يلتحم بالرصغة	%٨	%١٠	الفقد الكامل للوسطى فقط
%٢٥	كسر لم يلتحم بالفك الأسفل	%٧	%٨	الفقد الكامل للأنف فقط
%١٠	كسر ضلعي يصحبه تشوه دائم في الصدر واضرابات وظيفته	%٦	%٧	الفقد الكامل للحنجر فقط

وإذا كان المشترك اعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعالیه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
الصمم وانكماش الأطراف وفقد الإبصار .

صمم تام	٤٠ %	صمم احدي الاذنين	١٥ %
انكماش طرف سفلي خمسة (٥) سنتيمترات على الأقل ...	١٥ %	الفقد الكامل لعين واحدة	٣٥ %

ويعتبر عجز البصر كله او بعضه عجزا مطلقا نهائيا عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد احد الأطراف كله او بعضه فقد جزئيا بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج ويشترط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول اطراف مختلفة او اية أجزاء من احد الأطراف يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على اساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المومن به لحالة العجز الكلي المستديم .
لا يستحق للمشارك أي مبلغ عن فقد اطراف او أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة اطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئيا الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

رابعاً : في حالة العجز الكلي المؤقت :

إذا أصيب المشترك بعجز كلي مؤقت تؤدي له الشركة المبلغ الأسبوعي المتفق عليه بالوثيقة لحالة العجز الكلي المؤقت طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ، ويتبع اثناءها علاجاً طبياً ويمثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ، ويستمر سداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاوله عمله .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المشترك الفراش للعلاج على الا تتعدى ٥٢ أسبوعاً تبدأ من يوم وقوع الإصابة، ويجوز ان يصرف هذا المبلغ على فترات الإصابة طالما ان المشترك قدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج عن الإصابة ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبة عدد تلك الأيام الي سبعة .

البند الثاني: الاستثناءات

ويمكن تقسيم هذه الاخطار الى نوعين:

أولاً : اخطار لا تغطيها الوثيقة :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية:

- الوفاة الطبيعية
- بسبب تادية الخدمة العسكرية وقت السلم او الحرب او العصيان او الثورة او التآمر ضد نظام الحكم
- الاخطار الذرية او التفاعلات النووية أيا كان سببها او مصدرها وقت السلم او الحرب .
- السفر على الطائرات الحربية
- الانتحار او الشروع فيه سواء كان عن وعي وادراك او عن غير وعي وادراك .
- تعمد المشترك إصابة نفسه او تعريضها لخطر غير مادي او بسبب ارتكابه جريمة او الشروع فيها
- فقد الإرادة بسبب الجنون او الوقوع تحت تأثير المخدرات او مسكر

ثانياً : اخطار لا تغطيها الوثيقة الا بنص صريح (مقابل اشتراك إضافي) :

لا تغطي هذه الوثيقة حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم او العجز المؤقت التي تنشأ عن او تتصل بطريق مباشر او غير مباشر عن أي من الحالات الآتية :

" ما لم يتفق على غير ذلك بين الشركة والمشارك مقابل اشتراك إضافي "

- ١- الحرب او الغزو او أي عمل من عدو اجنبي او العدوان او العمليات الحربية (سواء أعلنت الحرب ام لم تعلن)
والشغب والاضطرابات والثورات الاهلية والاضرابات العمالية .
- ٢- الإرهاب والتخريب
- ٣- الهزات الأرضية والبراكين والعواصف والفيضانات والسيول
- ٤- السفر على الطائرات الخاصة
- ٥- الاشتراك في مباريات الفرق الرياضية التي تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهوكي والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس او القيام بإجراء اختبارات السرعة.

البند الثالث : الجمع بين مزايا التأمين

تؤدي الشركة للمشارك المبلغ الأسبوعي المنصوص عليه في حالة العجز الكلي المؤقت بالوثيقة بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق له في حالات الوفاة او العجز الكلي او الجزئي المستديم.
ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها في حالات الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم، فإذا كان المشترك قد انتفع بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه في أي من حالتَي العجز المستديم وتوفي بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة

الستة أشهر التالية لوقوع الحادث المؤدي الي الإصابة فتؤدي الشركة للمستفيدين المبلغ المنصوص عليه في حالة الوفاة مخصصا من المبلغ الذي سبق صرفه لحالة العجز المستديم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث او أكثر يقع خلال مدة التأمين على الحد الأقصى لمبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة او العجز المستديم ايهما أكبر بالإضافة الي المبالغ التي قد تستحق في حالات العجز الكلي المؤقت.

البند الرابع : التعديلات

إذا التحق المشترك خلال مدة التأمين بأي عمل يختلف عن وظيفته او مهنته الوارد ذكرها في جدول الوثيقة وكان من شأن ذلك زيادة الخطر الذي يتعرض له المشترك، فيجب عليه الحصول على موافقة كتابية من الشركة بذلك.
ويحق للشركة عندئذ ان توافق على هذا التعديل مقابل اشتراك إضافي وان تقوم بتخفيض مبلغ التأمين او ان تفسخ العقد، وفي الحالة الأخيرة ترد الي المشترك الجزء النسبي من الاشتراك عن المدة الباقية.

وإذا غفل المشترك بحسن نية عن اخطار الشركة بتعديل وظيفته او مهنته ولم يحصل على الموافقة الكتابية الواردة في هذا البند وكان من شأن التعديل زيادة في اشتراك التأمين فتخفف مبالغ التأمين الواردة في الجدول بنسبة الفرق بين الاشتراك الفعلي والاشتراك الذي كان يتعين سداذه.

البند الخامس : سقوط الحق

تسقط كافة حقوق المشترك الناشئة في هذه الوثيقة في الحالات الآتية:

(أ) إذا ادلى المشترك أو من ينوب عنه بيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين، أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جوهرية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدأ سريان وثيقة التأمين.

(ب) مخالفة المشترك أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح المنظمة لمزاولة نشاطه إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية.

ويسقط حق المشترك أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المشترك أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلا.

البند السادس : الالتزامات

يجب على المشترك ان يخطر الشركة في مركزها الرئيسي او في فرعها المذكور اسمه على الوثيقة وذلك فوراً وكتابة عن أي حادث يقع له ،ويجب عليه أيضا ان يضع نفسه في اقرب فرصة تحت اشراف طبيب مختص، وإذا لم تتسلم الشركة الاخطار المذكور خلال سبعة

أيام من وقوع الحادث فان المطالبة تكون غير مقبولة مالم يقدم المشترك عنرا مقبولا للتأخير ولا تسال الشركة عن أداء أي مبلغ للمشارك أو المستفيدين الا إذا سمح لطبيب الشركة او مندوبها المكلف بذلك بفحص المشترك متى رأت الشركة ضرورة ذلك للتحقق من مدي الإصابة او العجز او السبب الحقيقي للوفاة .

البند السابع : مدة العقد

لا تلتزم الشركة بتجديد هذه الوثيقة أو إخطار المتعاقد بتاريخ انتهائها، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد الوثيقة لمدة أخرى يتفق عليها ويشتراط سداد اشتراك التامين المقابل.

البند الثامن: التقادم

تحصص التغطية بموجب هذه الوثيقة لشروط التقادم إعمالاً بنص المادة ٧٥٢ من القانون المدني المصري

البند التاسع: المحاكم المختصة

كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في أراضيها الجهة التي أصدرت هذه الوثيقة.

البند العاشر: الشرط الفاسخ

للشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المشترك بسداد اشتراك التأمين في موعد استحقاقه أو تعذر تحصيل الشيك المحرر بقيمة الاشتراك لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المشترك و المستفيد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد الاشتراك خلال عشرة أيام ، و إلا اعتبر العقد مفسوخاً فإذا لم يقم المشترك أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المشترك و المستفيد بفسخ العقد ، و ذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقوقها في جزء نسبي من اشتراك التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ.

البند الحادي عشر: شرط الإلغاء

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المشترك والمستفيد (إن وجد) بخطاب موصى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من الاشتراك يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين.

كما يجوز للمشارك طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من الاشتراك عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة، ويشترط في هذه الحالة ألا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء.

جدول المدد القصيرة:

حتى ٣ شهور	٥٠% من الاشتراك السنوي
حتى ٦ شهور	٧٥% من الاشتراك السنوي
حتى ٩ شهور	٩٠% من الاشتراك السنوي
لمدة تزيد عن ٩ شهور	الاشتراك السنوي بالكامل

البند الثاني عشر: الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي

- طبقاً لهذه الوثيقة يعتبر المشترك مشتركاً مع غيره من المشتركين على أساس تكافلي لدى شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمنوه عنها فيما بعد بالشركة وتعتبر الشركة مديراً لنظام التأمين بصيغة المضاربة وفقاً للآتي:
- تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً وتحدد بوجه خاص علاقة الشركة بالمشاركين بشأن استحقاقات هذا الأخير لتخصيبه من صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع الذي يتحقق في حساب عمليات التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية بموجب النظام الأساسي للشركة وبما لا يقل عن ٤٠% من صافي الفائض التأميني المحقق بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وسائر المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق .
- تخضع كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بالشركة لرقابة وإشراف هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة للتحقق من توافق معاملاتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إن وجد وذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة أشر اكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها.
- في حالة وجود عجز في صندوق حملة الوثائق يتم منح الصندوق قرضاً حسناً من أموال المساهمين يسد من فوائض الصندوق في السنوات اللاحقة.
- في حالة عدم استلام أحد المشتركين لحصته من الفائض التأميني المخصص للتوزيع، تقوم الشركة بالاحتفاظ بالفائض غير الموزع لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية ثم يتم التصرف فيه طبقاً للقواعد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
- مفهوم نظام المضاربة: تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وذلك نظير حصة شائعة للشركة من الفائض التأميني المحقق بصفتها مضارباً .
- أسس علاقة التأمين التكافلي بين شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر والمشاركين : يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشارك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية بعد تكوين ما يلزم من المخصصات الفنية والاحتياطيات وكافة المصروفات الخاصة بصندوق حملة الوثائق وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها علماً بأن ما يدفعه المؤمن له (المشارك) في نظام التأمين هو اشتراك وفي حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزام المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

- السياسة الاستثمارية التي تتبعها شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر: يتم استثمار أموال صندوق حملة الوثائق وأموال أصحاب حقوق الملكية وفقاً لما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على شركات التأمين بأوعية استثمارية يتوافر فيها عناصر الضمان والسيولة والربحية ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة وطبقاً لإحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- ويتعين أن يتم توظيف أموال حملة الوثائق طبقاً لما ورد بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر حسب النسب الآتية:

١. (٥٠٪) على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها.
 ٢. (١٥٪) على الأكثر في سندات وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 ٣. (٢٥٪) على الأكثر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشروط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على (٥٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (٢٠٪) من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو (٢٠٪) من إصدارات وثائق صناديق الاستثمار أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 ٤. ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار في السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار عن جهة واحدة على (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
 ٥. (٣٠٪) على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيود بمصلحة الشهر العقاري بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار على (١٠٪) من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو (١٠٪) من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
 ٦. (٥٠٪) على الأكثر في ودائع نقدية لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو شهادات الإيداع أو الإذخار الصادرة عن تلك البنوك ويدخل في هذه النسبة شهادات الإيداع وغيرها من الأدوات المالية النقدية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
 ٧. (٢٠٪) على الأكثر في استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة.
- صندوق حملة الوثائق: هو مجموعه من الحسابات التي تنشئها الشركة حسب النظام الأساسي للشركة وبما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين والتي تتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة الوثائق وتودع فيه الأكثر أماناً وعوائد حيث تكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات الشركة وفي حالة وجود عجز في حسابات المشتركين (حملة الوثائق) يتم تعويضه على النحو التالي:-
 - تعطية العجز من احتياطي حملة الوثائق إن وجد.
 - الاقتراض من المساهمين بمقدار العجز وسداده من فائض الفترات اللاحقة (القرض الحسن) ويؤوب ضمن الأصول على ألا يتجاوز نسبة ٥٠٪ من رأس المال المدفوع للشركة ويكون مخصص اضمحلال لرصيد القرض بنسبة ٢٥٪ للعام الأول، ٥٠٪ للعام الثاني، ١٠٠٪ للعام الثالث على أن يراعى استبعاد قيمة القرض الحسن من الأصول عند حساب هامش الملاءة المالية للشركة.

- **توزيع الفائض التأميني:** يتم توزيع الفائض التأميني والخاص بحملة الوثائق بعد خصم الضرائب المستحقة وتغطية القرض الحسن إلى وحد ذلك نهاية السنة المالية ويتم التوزيع على جميع حملة الوثائق بنسبة اشتراكاتهم دون التفرقة بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل خلال الفترة المالية وذلك وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة هيئة الرقابة الشرعية عليها وفقاً لدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين.
- **أجر المضاربة:** تدير الشركة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضارباً وذلك لصالح المشتركين في نظام التكافل وتتقاضى الشركة مقابل إدارة خدماتها نسبة ٦٠ % من الفائض التأميني
- **هيئة الرقابة الشرعية:** تتكون لجنة الرقابة الشرعية بشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر كل من: -
١. الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد أحمد هلالى رئيس اللجنة
٢. فضيلة الشيخ / خالد عبد المحسن الجندي عضو اللجنة
٣. الأستاذ / الدكتور / السيد على السيد محمد عبد المطلب عضو اللجنة
وقد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على النحو السالف بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠
- **موافقة هيئة الرقابة الشرعية:** تم الموافقة على وثيقة التأمين من هيئة الرقابة الشرعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠

البند الثالث عشر: شرط الموافقة على قبول التأمين التكافلي

يعتبر قبول وثيقة التأمين الصادرة من شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر (المدير لنظام التأمين بصيغة المضاربة) موافقة صريحة من المشترك بالمشاركة مع غيره من المشتركين بنظام التأمين والتي ينظم تكوينها عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وعلى أن يتم توزيع صافي الفائض من حساب المشتركين في نهاية السنة المالية وفقاً للوائح التي تضعها الشركة وموافقة الهيئة الشرعية عليها.

شروط التحكيم

كل نزاع ينشأ بين أطراف هذه الوثيقة سواء فيما يتعلق بتفسير أحكامها أو بتطبيق شروطها يمكن اللجوء في شأنه - بناء على اتفاقهم - إلى نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة
المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة

لاستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

يناير ٢٠٢٣

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة داريو ، إلى المركز الهندسي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخصوص تحديد مدى صلاحية عينة تربة ممثلة للقطاع من الكم (٦٠٠+٤٢٥) : (٦٠٠+٤٢٧) لإستخدامها في مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين - فوكة) . تم توريد العينة الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالبى التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهرى .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الإختبارات :

العينة:

Brownish yellow , med/coarse silty sand ,pieces of cemented sand, trace pebbles.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبارات التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

نسبة المار من منخل $\frac{3}{4}$ (%)	93.0%
نسبة المار من منخل رقم 200 (%)	15.0%

جدول رقم (١)



بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح بالشكل رقم (2) حيث كانت النتائج كما يلي:

2.10	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
8.0	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

٤. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للحلال:

التصنيف	USCS	SC
	AASHTO	A-1-b
الصلاحية وفقاً لمواصفات المشروع	صالحة	
ملاحظات	العينة صالحة وفقاً لمواصفات المشروع طبقاً لإفادة الإستشاري (سيسترا).	

العينة (صالحة) للإستخدام فى المشروع السابق ذكره

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل
13/4/23



مهندس المعمل


م. سمير محمد أبو الحسن



Project	مشروع القطار الكهربائي (العلمين)
Client	شركة داربو
Classification	

426+300

Sieve Analysis (ASTM D-1140)

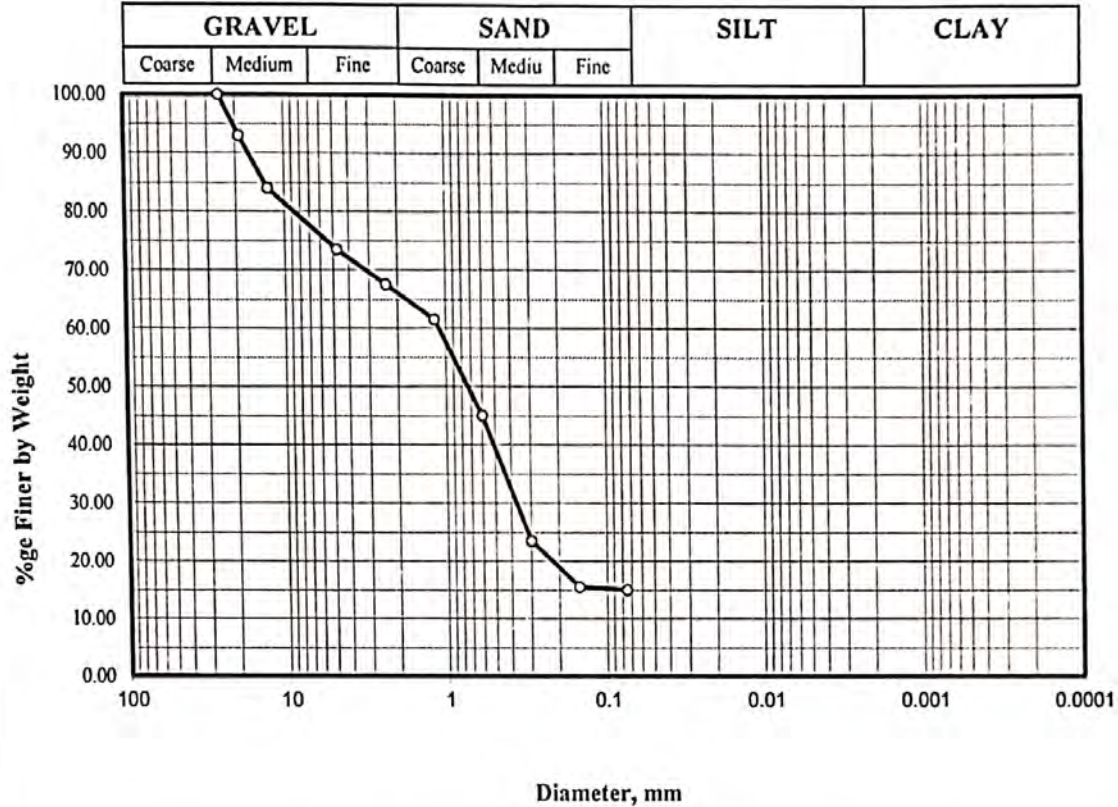

Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
%ge Finer by weight		100.0	100.0	93.0	84.0	73.5	67.5	61.5	45.0
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063				
%ge Finer by weight		23.5	15.5	15.0	15.0				
Effective Diameter		N/A mm							
Uniformity Coefficient		N/A							
Passing sieve no. 200		15.0 %							

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor it's suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة إنشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية علي ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

Figure 1

مختبر ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية




Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (03) 592-5550 Fax (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الإسكندرية
هاتف ٥٩٢.٥٥٥٠ (٠٣) فاكس ٥٩٢.١٨٥٣ (٠٣)

Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داربو
Description	

425+900

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

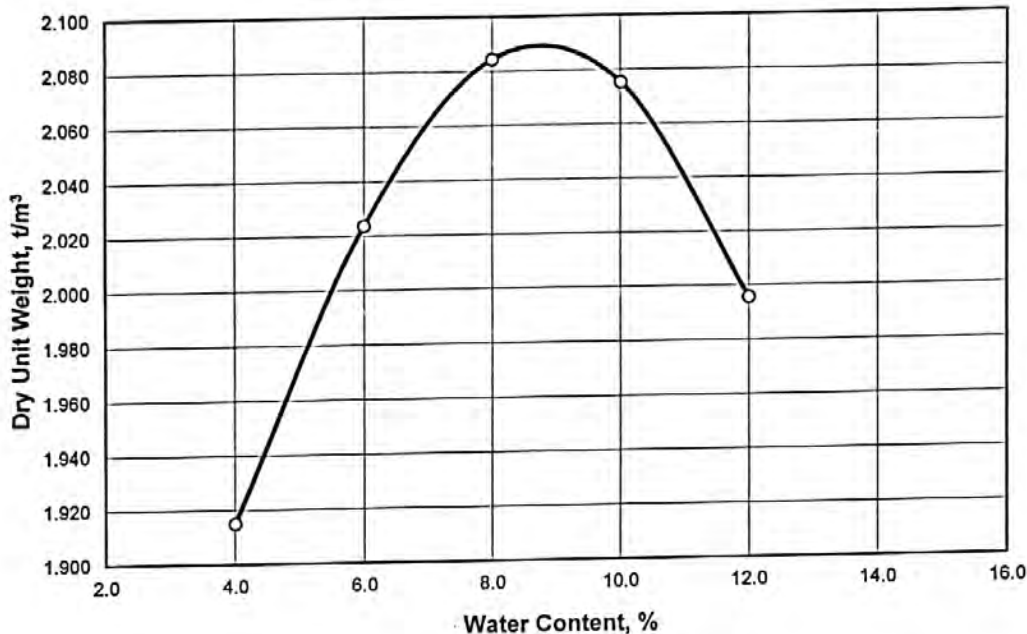

Sample	1	2	3	4	5	6		
Water Content	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	0.0		
Moist Unit Weight, t/m³	1.99	2.15	2.25	2.28	2.24	0.00		
Dry Unit Weight, t/m³	1.91	2.02	2.08	2.08	2.00	0.00		
Percentage of aggregate > 19mm						7.0%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.08	t/m³	
Max Modified Unit weight						2.10	t/m³	
Optimum moisture content						8.00	%	

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة
المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة

لإستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

يناير ٢٠٢٣

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة داريو ، إلى المركز الهندسى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخصوص تحديد مدى صلاحية عينة تربة ممثلة للقطاع من الكم (٦٠٠+٤٢٥) : (٦٠٠+٤٢٧) لإستخدامها في مشروع القطار الكهربائى السريع (العلمين - فوكة) . تم توريد العينة الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالبى التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهرى .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الاختبارات :

العينة:

Brownish yellow , pieces of cemented, sand med/coarse silty sand, trace pebbles.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبارات التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

نسبة المار من منخل ٣" (%)	81.7%
نسبة المار من منخل رقم 200 (%)	14.0%

جدول رقم (١)



بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح بالشكل رقم (2) حيث كانت النتائج كما يلي:

2.15	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
10.0	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

٤. الخلاصة والتوصيات :

بناء على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للتحليل:

GC	USCS	التصنيف
A-1-b	AASHTO	
صالحة	الصلاحية وفقاً لمواصفات المشروع	
العينة صالحة وفقاً لمواصفات المشروع طبقاً لإفادة الإستشارى (سيسترا).		ملاحظات

العينة (صالحة) للإستخدام فى المشروع السابق ذكره

مدير المعمل

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مهندس المعمل

م. سمير محمد أبو الحسن






Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داريو
Classification	

426+400

Sieve Analysis (ASTM D-1140)

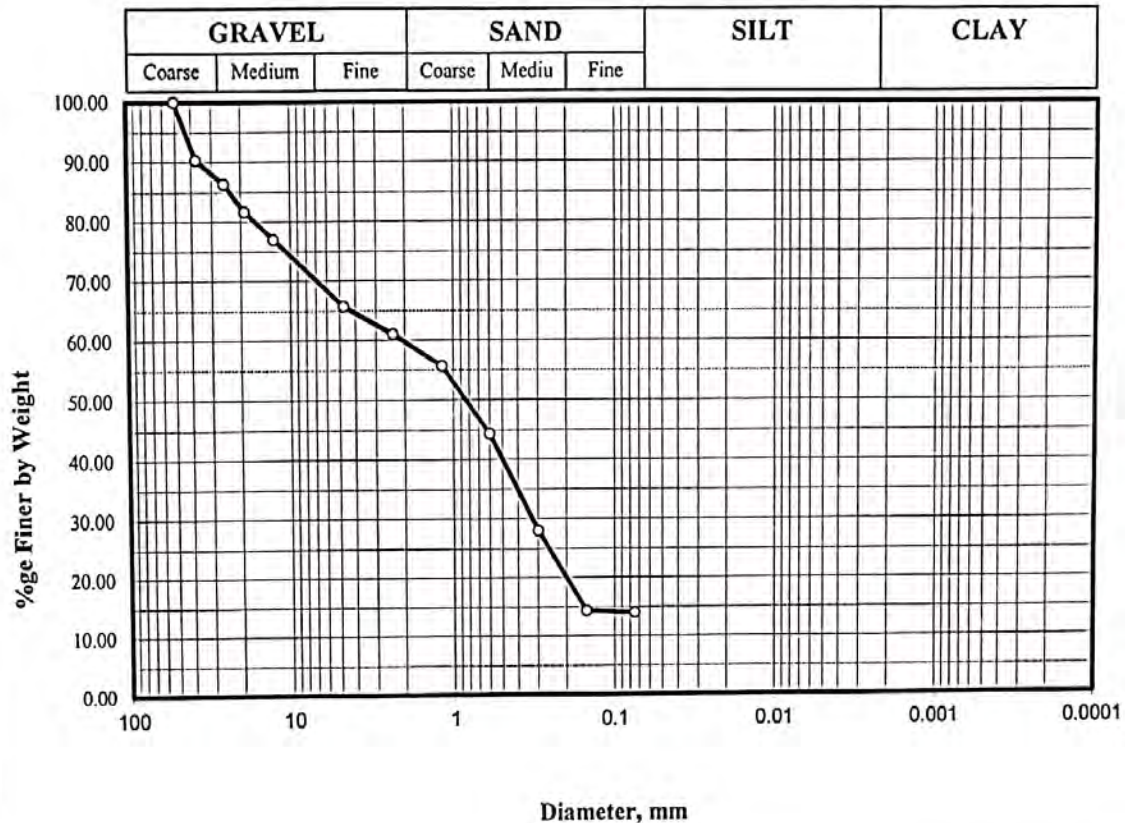

Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
%ge Finer by weight		90.3	86.3	81.7	77.0	65.7	61.0	55.7	44.3
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063				
%ge Finer by weight		28.0	14.3	14.0	14.0				
Effective Diameter		N/A	mm						
Uniformity Coefficient		N/A							
Passing sieve no. 200		14.0	%						

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor it's suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات و صحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية علي ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

Figure 1




Soil Mechanics and Foundations Laboratory
Faculty of Engineering
Alexandria University
Tel (03) 592-5550 Fax: (03) 592-1853

معمل ميكانيكا التربة و الأساسات
كلية الهندسة
جامعة الاسكندرية
شئون ٥٩٢٠٥٥٠ (٠٣) ٥٩٢-١٨٥٣ فاكس (٠٣) ٥٩٢-١٨٥٣

Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داريو
Description	

426+400

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

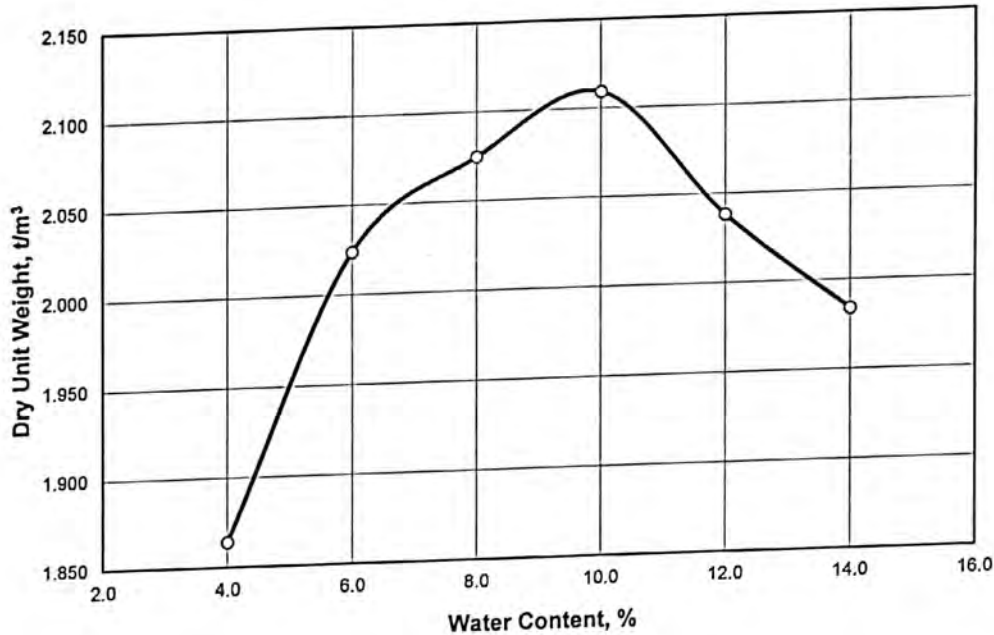

Sample	1	2	3	4	5			
Water Content	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0			
Moist Unit Weight, t/m³	1.94	2.15	2.24	2.32	2.28			
Dry Unit Weight, t/m³	1.86	2.02	2.07	2.11	2.04			
Percentage of aggregate > 19mm						18.3%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.11	t/m³	
Max Modified Unit weight						2.15	t/m³	
Optimum moisture content						10.00	%	

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن

م. سمير محمد أبو الحسن
م. سمير محمد أبو الحسن
جامعة الاسكندرية

Figure 2



جامعة الإسكندرية

كلية الهندسة

المركز الهندسي للخدمة العامة
معمل ميكانيكا التربة والأساسات

تقرير فني عن

صلاحية عينة

لاستخدامها في مشروع
محور القطار السريع - (العلمين - فوكة الضبعة)

بناء على طلب

شركو داريو للمقاولات العامة

إعداد

أ.د. عمرو زكريا الوكيل

مدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات

رقم المشروع: MTR - 2058

يناير ٢٠٢٣

١. مقدمة :

بناء على طلب شركة داريو ، إلى المركز الهندسي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بخصوص تحديد مدى صلاحية عينة تربة ممثلة للقطاع من الكم (٦٠٠+٤٢٥) : (٦٠٠+٤٢٧) لإستخدامها في مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين - فوكة) . تم توريد العينة الى معمل ميكانيكا التربة والاساسات - كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بمعرفة السادة / طالى التقرير.

٢. التجارب المعملية:

تم إجراء التجارب الآتية على العينة الموردة:

- التوصيف الظاهري .
- التدرج الحبيبي.
- بروكتور القياسي.

٣. التوصيف ونتائج الاختبارات :

العينة:

Brownish yellow pieces cemented sand, med/coarse silty sand, and some pebbles.

التدرج الحبيبي :

يتضح من نتائج إختبارات التدرج الحبيبي بالشكل رقم (1) مايلي:

نسبة المار من منخل $\frac{3}{4}$ (%)	93.0%
نسبة المار من منخل رقم 200 (%)	7.0%

جدول رقم (١)



بروكتور القياسي :

* تم اجراء تجارب الدمك القياسي على العينة كما هو موضح بالشكل رقم (2) حيث كانت النتائج كما يلي:

2.17	الكثافة الجافة القصوى (طن / م ³)
8.0	المحتوى المائي الأمثل (%)

جدول رقم (٢)

٤. الخلاصة والتوصيات :

بناءً على ما سبق، يوضح الجدول التالي مدى صلاحية العينة الموردة للحلال:

SC	USCS	التصنيف
A-1-b	AASHTO	
صالحة	الصلاحية وفقاً لمواصفات المشروع	
العينة صالحة وفقاً لمواصفات المشروع طبقاً لإفادة الإستشارى (سيسترا).	ملاحظات	

العينة (صالحة) للإستخدام فى المشروع السابق ذكره .


مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن



Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داريو
Classification	
426+100	Sieve Analysis (ASTM D-1140)

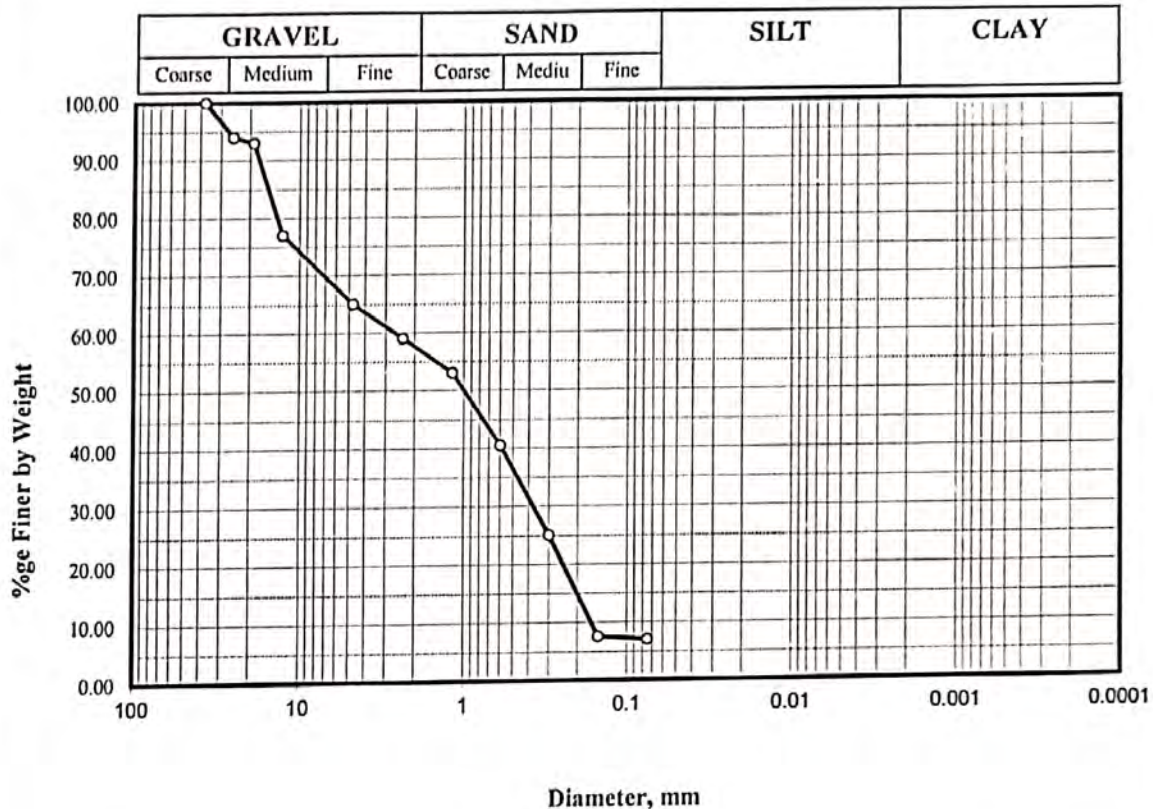

Sieve size (mm.)		37.50	25.40	19.05	12.70	4.75	2.36	1.18	0.60
% Finer by weight		100.0	94.0	93.0	77.0	65.0	59.0	53.0	40.5
Sieve size (mm.)		0.30	0.15	0.075	0.063				
% Finer by weight		25.0	7.5	7.0	7.0				
Effective Diameter		0.17 mm							
Uniformity Coefficient		16.01							
Passing sieve no. 200		7.0 %							

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor its suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن


Figure 1



Project	مشروع القطار الكهربائي قطاع ٦ (العلمين)
Client	شركة داريو
Description	

426+100

Standard Proctor Test (ASTM D-1557)

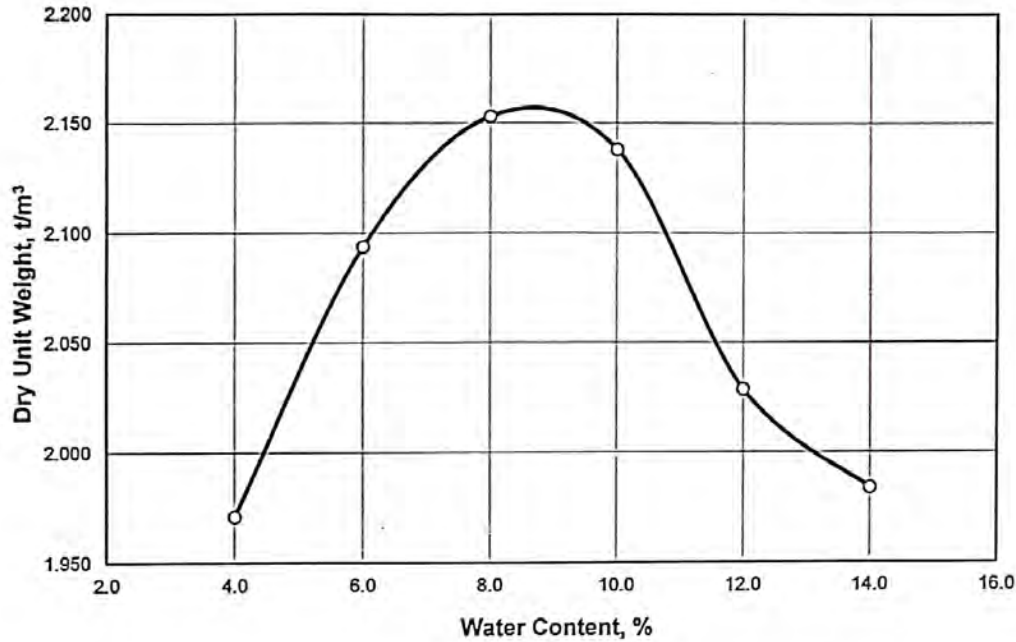

Sample	1	2	3	4	5			
Water Content	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0			
Moist Unit Weight, t/m³	2.05	2.22	2.33	2.35	2.27			
Dry Unit Weight, t/m³	1.97	2.09	2.15	2.14	2.03			
Percentage of aggregate > 19mm						7.0%		
Maximum dry unit weight (γ_{max})						2.15	t/m³	
Max Modified Unit weight						2.17	t/m³	
Optimum moisture content						8.00	%	

Warning:

The Lab is responsible ONLY for the test results and its correctness. The Lab is NOT responsible for the quality of the tested material nor it's suitability as a construction material. The lab is NOT responsible for the interpretation of test results.

المعمل مسؤول فقط عن نتائج الاختبارات وصحتها. المعمل غير مسؤول عن جودة المواد المختبرة أو صلاحيتها للاستخدام كمادة انشاء. المعمل غير مسؤول عن كيفية استخدام نتائج الاختبارات أو أي نتائج مبنية على ذلك.

تحذير:

مدير المعمل
أ.د. عمرو زكريا الوكيل



مهندس المعمل
م. سمير محمد أبو الحسن
