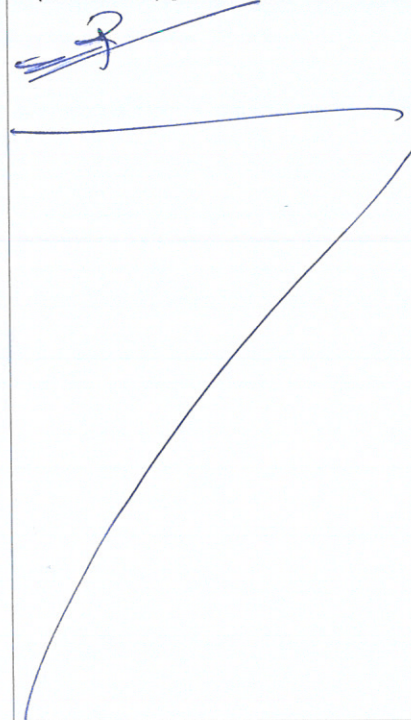


تنفيذ اعمال عدد (3) برايخ خرسانية اسفل مسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
عند المحطات (301+775 / 301+765 / 301+515) بالأمر المباشر
تنفيذ : "شركة الاخوه العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات "

المنطقة الخامسة - المنطقة غرب الدلتا (الاسكندرية -مرسي مطروح)
المقاول: "شركة الاخوه العرب لتقسيم الأراضي والمقاولات " رقم العقد (2025/2024/529)
مستخلص (1) جاري
في المدة من بدء العمل حتى 29 / 01 / 2025

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنية	الوحده	الكمية طبقا للمقايمة	مقدار العمل السابق إجرانه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	القيمة المستحقة بعد الإستقطاع	ملاحظات
1	أعمال جسات بالبر في التربة العادية والمتاسكة اجهار اقل من 250 كجم / سم2 و البند يشمل تقديم تقرير للاستشاري	450	م.ط	45.00	0.00	43.00	43.00	19,350	0.00	19,350	المهندسون متواجدون التقارير متواجدة الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعى تطبيق نصوص العقد مكتب جهاز الاشراف متواجد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2026-01-08) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2026-01-08) 
9	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم2	2,100	م3	45.70	0.00	35.00	35.00	73,500	0.00	73,500	
10	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٠٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واطافه السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن ٠٠٤ كجم/سم ٢) على أن يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى (واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	3,325	م3	615.50	0.00	352.00	352.00	1,170,400	0.00	1,170,400	
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (1.00 م) (رتية ١2) وسمك 6سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتية 5/36 بمعدل 5 10φ مم للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل 6 16φ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرون ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتكلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	1,590	م.ط	528.50	0.00	178.00	178.00	283,020	0.00	283,020	
12	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الاتشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	44,000	طن	110.00	0.00	67.00	67.00	2,948,000	0.00	2,948,000	
13	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لغانف البولى إيثيلين سمك 400ميكرون والسعر يشمل الركوب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	25	م2	3027.00	0.00	359.00	359.00	8,975	0.00	8,975	
14	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الاتسومات المسلح سمك 4 مم والفئة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن 20 سم	105	م٢	4,800.00	0.00	1869.00	1869.00	196,245	0.00	196,245	
16	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الايقل محتوي الاسمنت البورتلاندى العادي عن 150 كجم /م3 لكل 1م3	800	م3	36.00	0.00	13.00	13.00	10,400	0.00	10,400	
	علوة زيادة محتوى الاسمنت و الاجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة 125 جنية / 50 كجم/ اسمنت سواء بالزيادة او النقصان	125	50 كجم	195.00	0.00	39.00	39.00	4,875	0.00	4,875	
17	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت فى الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	220	م ط	861.00	0.00	391.00	391.00	86,020	0.00	86,020	
18	بالمتر الطولى توريد وتنفيذ مادة ملئ فواصل من الداخل والخارج (sweling bar) من انتاج سيكا او مايمائلها سمك 2سم وعمق 1سم والسعر يشمل مادة اللصق وتنظيف الفاصل قبل التركيب و حمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك 2 سم عند الفاصل و كذلك تركيب جراب من PVC مملوء بالشحم لزوم اشاير الربط و الفئة لا تشمل سعر الاشاير وذلك طبقا لتعليمات واعتمادات جهة الاشراف	630	م ط	99.00	0.00	32.00	32.00	20,160	0.00	20,160	
إجمالي المستخلص											4,820,945
إجمالي ما سبق صرفه											0.00
إجمالي المستحق (أربع ملايين وثمانمائة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيها فقط لا غير)											4,820,945

يعتمد،،،،،

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ رنا فودة

الاستشاري العام (ميسر)
م/احمد ابو عافية
م/جابر ابراهيم

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ وليد ابراهيم عبد القوي

شركة الاخوة العرب
لتقسيم الاراضى والمقاولات
ب.ض: 433 - 466 - 677
س.ت: 5514
مطروح القطار الكهربائي
