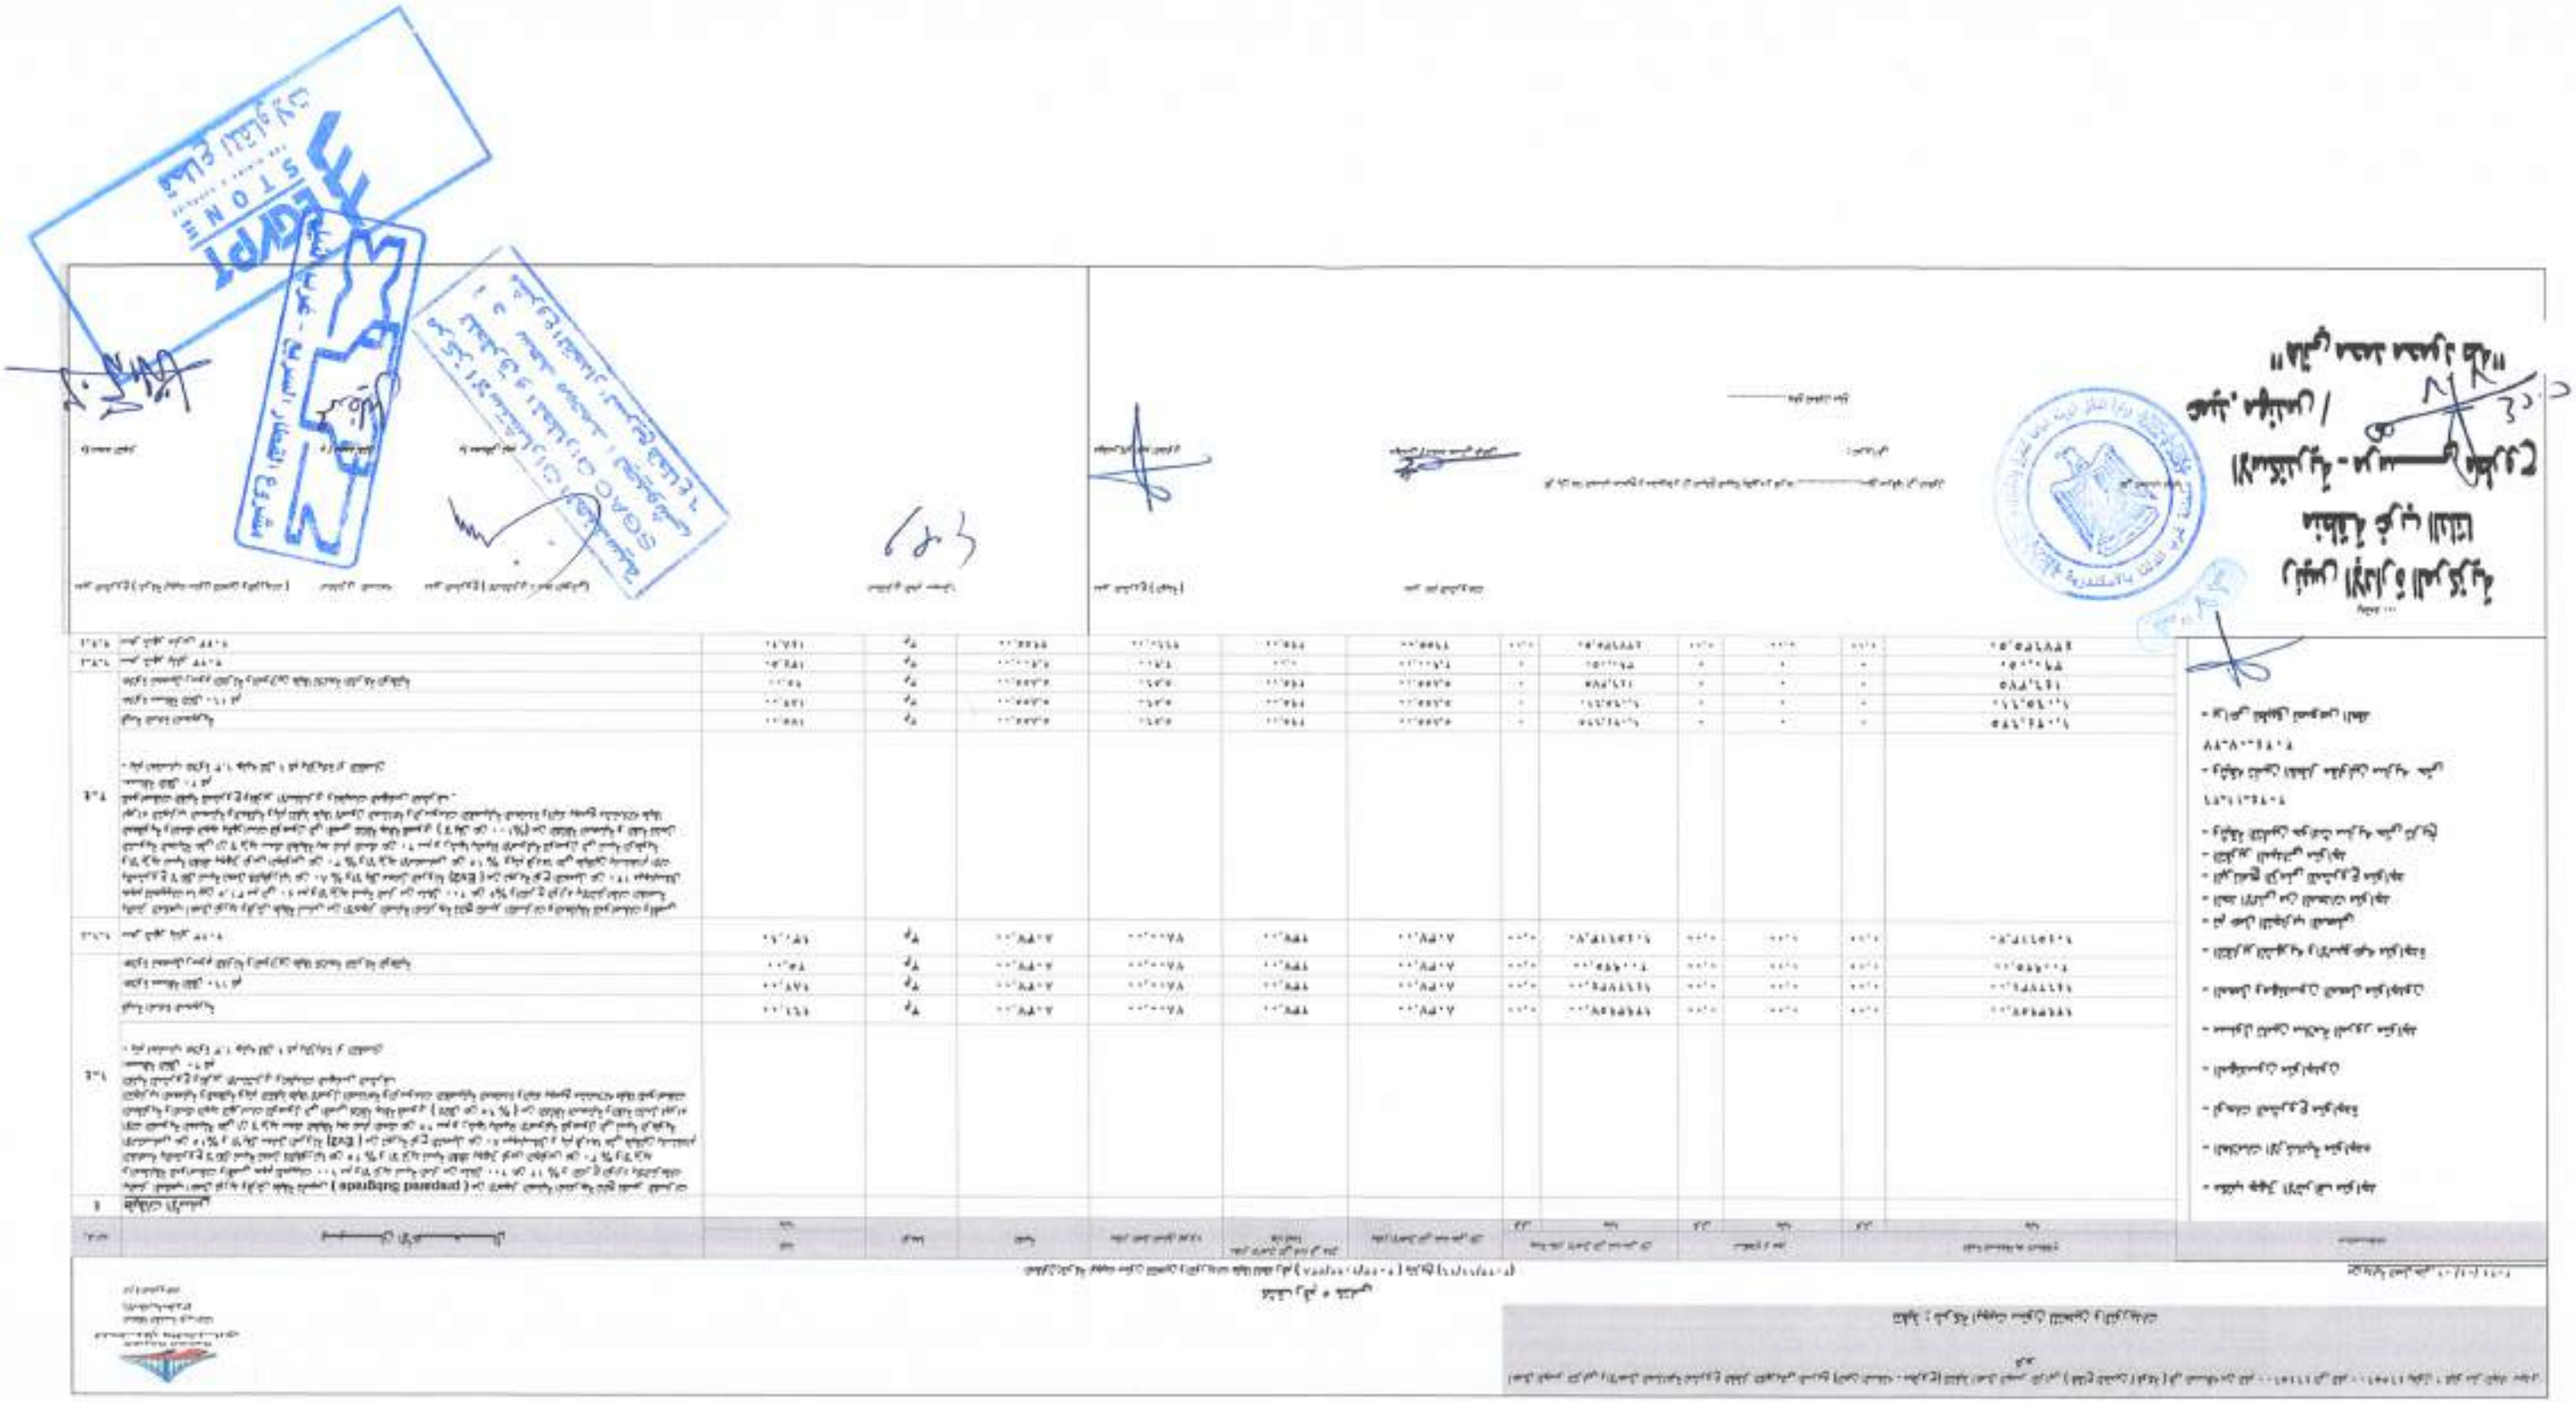

أعمال الجسر القرابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر القرابي (قطاع الخمسين (فرعية) في المسافة من الكم ٠٠٠ ٥٦٤٠٩٠ إلى الكم ٠٠٠ ٥٦٥٥٩٠ يكون ١ كيلو متر اتجاه سيدي كرير

تنفيذ : شركة أبيهت ستون للتعدين والتوريدات

كشف رقم « ختامي

المقاول:شركة أبيهت ستون للتعدين والتوريدات طبقا للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٢٨) بتاريخ (٢٠٢٢/١٢/١٦)

من وإلى العمل حتى ٢٠٢٥/٠٤/٠١

م	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الكمية	الوحدة	سعر العمل البنود بورد	الكمية	سعر الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع و دمغ				القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه		جنيه		جنيه		قرش	جنيه	قرش		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٥	الباطات الخرسانية																
١٠٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ من بولوميت متدرج + ٠,١ م٣ رمل حرش و الاضافات طبقا للتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بلاتفاصل) بسمك ٢سم (طبقا للتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعدال منسوب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتتطلب السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها + جنية بعد اول ١٠متر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥متر راسي).															
١٠١٠٥	سعر شهر مايو ٢٠٢٣	٥٥٢,٠٠	م٢	٧٦٠٠,٠٠	٨٨٥٦,٠٠	١٢٨٩,٠٠	٨٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٩٠٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٤,٠٩٠٩٠٢,٠٠		
٢٠٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقصات العمليات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ من بولوميت متدرج + ٠,١ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا للتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بلاتفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتمام العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنظيف طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها + جنية بعد اول ١٠متر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن ٥متر راسي).															
١٠٢٠٥	سعر شهر مايو ٢٠٢٣	٢٦٦٥,٢٠	م٣	١٩٥,٠٠	٢١٦,٢٥	٢١,٢٥	٥٥٤٣١٥,١٠	٠,٠٠	٥٨٤٣٤٥,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠			٥٨٤٣٤٥,٩٠		
	إجمالي قيمة المستخلص								٩١٧١٢٧٧٢,٣٠								
	اخدر عشرة مليون و سبعمائة و اثنا عشرة الف و سبعمائة واثنان وسبعون جنيها و ثلاثون قرش فقط لاغير																

مدير المشروع (شركة أبيهت ستون للتعدين والتوريدات) — مستشاري المستند — مدير المشروع (الاستشاري : سعد الجوابي) — استشاري العام سيكا — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات — على الحساب نهائيا — يعتمد ..

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
