الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
ملف رقم: / /

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحلة السابعة)).

- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص ختامي رقم (٣) للعملية بعاليه.
- تنفيذ: شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم.
- العقد رقم: (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٧).
- بقيمة: ٣٥٢,٨٨٩,٨٦ جنيهاً (فقط ثلاثمائة واثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون جنيهاً وستة وثمانون قرشاً لا غير).
- بإجمالي: ٦,٨٥٧,٠٥٣,٥٦ جنيهاً (فقط ستة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثة وخمسون جنيهاً وستة وخمسون قرشاً لا غير) وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١١.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/٣٠
عدد المرفقات: ( )
مستخلص أصل + ٣ صورة
استمارة ٥٠ ع.ح
بيان أعمال
حصر أعمال

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

استمارة رقم ٥٠ « ع ح ٥٠ »

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة لاعتمادات الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : المنطقة الحادية عشر - صنوبر سيناء

المبلغ المستحق إلى : شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم

بموجب { الطلبات طيه ، أو : مستخلص رقم (٣) ختامي عن عملية تنفيذ أعمال إنشاء الجسر العلوي للوحدات العسكرية المتعامدة مع طريق المحاور ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٤) شرطة عسكرية - الرحلة السابعة))

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٧	٣٥٢٨١٩٨٦٥٧		
		الجملة	

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كاتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم ———

الختم ذو التاريخ

روجع ———

رئيس المصلحة ———

الاعتماد الإداري ونوع الخصم						عند المراجعة
بيانات	نوع الخصم					
	جنيه	قرش	قسم	فرع	نسل	بند
مستخلص رقم (٣) ختامي عن عملية تنفيذ أعمال إنشاء الجسر العلوي للوحدات العسكرية المتعامدة مع طريق المحاور ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٤) شرطة عسكرية - الرحلة السابعة)) حسب عقد رقم (٧٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)	٣٥٢٨١٩٨٦	٥٧				
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش				
رسم الدمغة			عادي: قرش ——— جنيه ———	إضافي: قرش ——— جنيه ———	دمغة توقيع: قرش ———	
صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

في ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : { جاري / الإيرادات } ——— بتاريخ ——— الإمضاء ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « غ ح » برقم ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ———

روجع في ——— سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب { شيك / إذن صرف }

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٩ س ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط ———

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ——— إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب { شيك / إذن صرف } رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد في سجل { الشيكات / الحوالات } تحت رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج في كشف { الشيكات / الحوالات } رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت { شيك / إذن صرف } ——— إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ——— سنة ٢٠

وزارة النقل
الشبكة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

محضر الاستلام الابتدائى

الخاص بعملية أعمال انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (تنفيذ انشاء السور وابراج الحراسة ومبنى الامن و البوابة) السرية 23 شرطه عسكرية – المرحلة السابعة

تنفيذ شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم

إنه فى يوم الاربعاء الموافق 20 / 12 / 2023 و بناء علي موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق علي تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عاليه اجتمع كل من السادة الاتي أسمائهم :

اللجنـــــــــة :

1	السيد المهندس / أيمن محمد متولي	رئيسا
2	السيد المهندس / محمد محمود اباظة	عضوا
3	السيد المهندس / محمد كمال حسن	عضوا
4	السيد المهندس / أحمد ماهر الغمري	عضوا
5	السيد المهندس / هبة تاج الدين	عضوا

جهاز الاشراف :

1	السيد المهندس / شريف مصطفي صدقي	جهاز الإشراف من قبل المنطقة

الشركة المنفذة :

1	السيد المهندس / خالد كمال ابراهيم	الشركة المنفذة

و بالمعاينة الظاهرية قد تبين أنه قد تم تلافى الملاحظات و لا مانع من استلام الأعمال استلاما ابتدائيا
كما أنه قد أفاد جهاز الاشراف علي المشروع بان جميع الأعمال تم الانتهاء منها بتاريخ 2023/2/20
و قد تحرر محضرا بذلك و استلم كل طرف صورة للعمل بها

الشركة المنفذة	جهاز الاشراف	اللجنة
شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم س.ت : ١٤١٢٣		

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحلة السابعة)).

تنفيذ: شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم.

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٧).

نتشرف أن نرفق لسيادتكم مقايسة ختامية ومذكرة إيضاحية للعملية بعاليه.

نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

مرفقات: عدد: ( )

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحـمـد الطحـــان

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

مذكرة إيضاحية

بخصوص عملية: تنفيذ أعمال إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية – المرحلة السابعة)).

تنفيذ: شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم.

- محضر استلام الموقع بتاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢١.
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدة معتمد: ٢٠٢٣/١٢/٢٠.
- تم إسناد العملية عاليه على شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم بموجب العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٧) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦ بمبلغ ٨٧٥٩١٢٥,٠٠ جنيهاً.
- تم الاستلام الابتدائي للعملية عاليه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٠.
- تم إعداد مقايسة ختامية للعملية عاليه بنسبة نقص عن قيمة إجمالي العقد الأصلي بمبلغ ٦٨٥٧٠٥٣,٥٦ جنيهاً بنسبة نقص (٢١,٧٢ %) عن قيمة العقد الأصلي وذلك طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.

لذا نأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم نحو الموافقة على المقايسة الختامية للعملية عاليه بمبلغ ٦٨٥٧٠٥٣,٥٦ جنيهاً (فقط ستة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثة وخمسون جنيهاً وستة وخمسون قرشاً لا غير).

<u>والأمر مفوض لسيادتكم.</u>

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: /٢٠٢٤/٠٥

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أحمد الطحان

مقايسة ختاميه

اسم العملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطه عسكرية - المرحلة السابعة)	
اسم الشركة المنفذة	شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم
قيمة العملية طبقاً للتعاقد	٨٧٥٩١٢٥ جنية
عقد رقم	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٧ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٦
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٤ أشهر.
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٢/١١/٢١.
تاريخ النهو الفعلي طبقاً لأخر مد مدة معتمد	٢٠٢٣/١٢/٢٠.
المقايسة الواردة من	المنطقة الحاديه عشر _ جنوب سيناء.
قيمة المقايسة الختامية	٦٨٥٧٠٥٣.٥٦ جنيه.
قيمة النقص وكذا نسبة النقص عن العقد الأصلي	١,٩٠٢,٠٧١.٤٤ جنيه بنسبة نقص ٢١.٧٢ %
"مبررات المقايسة الختامية " تعديل كميات الاعمال طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة.	
مدير المشروع	مهندس / شريف مصطفي صدقي
مدير عام المشروعات	مهندس/ احمد عراقي
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أباظة.
مدير عام صيانة الكباري	مهندس / محمد كمال حسن غنيم
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / ابو بكر احمد عساف
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحاديه عشر	مهندس/ احمد الطحان
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس/ ايمن متولي
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الأستاذ/ تامر بدرت محمود

التوقيع ( )
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ( )
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفي
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق و الكباري (المنطقة الحادية عشر)

عملية اعمال انشاء سرية ٢٣ شرطة عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهدة (انشاء سريه ٢٣ شرطه عسكريه)

(السور + البوابة و مبنى الامن + أبراج الحراسة)

تنفيذ: شركة اولاد ابراهيم سليمان قاسم للمقاولات و التوريدات العمومية

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله			المقايسه الختامية			ملاحظات
			الكميه المعدلة	الفئة (جنيه)	اجمالى	الكميه الختامية	الفئة (جنيه)	اجمالى	
	الاعمال الاعتيادية								
١	بالمتر المكعب حفر اتربه لزوم الاساسات فى اى نوع من انواع التربه ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعة الاف و ستمائة متر مكعب)	م٣	٤٦٠٠	٩٠	٤١٤٠٠٠	٣٨٨٨,١٤	٩٠	٣٤٩٩٣٢,٦	
٢	بالمتر المكعب حفر اتربه لزوم الاساسات فى التربه الصخريه ونزح المياه ان وجدت والفئة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ألف و ثلثمائة متر مكعب)	م٣	١٣٠٠	١٣٠	١٦٩٠٠٠	١٢٩٦,٠٥	١٣٠	١٦٨٤٨٦,٥	
٣	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة إحلال من التربه الزلطيه (زلط الى رمل ١:٢) اسفل الاساسات موردة من خارج الموقع و خالية من المواد العضوية و الضارة حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم بطبقات لا يزيد أي منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول لاقصى كثافة جافة (ثلاثة الاف متر مكعب)	م٣	١٦٠٠	٢٧٥	٤٤٠٠٠٠	٠,٠٠	٢٧٥	٠	
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ألفان و ستمائة متر مكعب)	م٣	٢٦٠٠	١٤٥	٣٧٧٠٠٠	٢١٤٢,٣٥	١٤٥	٣١٠٦٤٠,٧٥	
٥	بالمتر المكعب خرسانه عاديه لزوم الاساسات واسفل السملات على الا تقل كميه الاسمنت عن٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان و أربعون متر مكعب)	م٣	٢٤٠	١٦٥٠	٣٩٦٠٠٠	٢١٨,٢٠	١٦٥٠	٣٦٠٠٣٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه للاساسات (القواعد والسملات ورقابى الاعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح (مائتان و أربعون متر مكعب)	م٣	٢٤٠	٢٢٧٥	٥٤٦٠٠٠	٢١٥,٩٥	٢٢٧٥	٤٩١٢٨٦,٢٥	
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبالات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح (مائة و ستون متر مكعب)	م٣	١٦٠	٢٩٠٠	٤٦٤٠٠٠	١٣٨,٩٧	٢٩٠٠	٤٠٣٠١٣	
٨	بالمتر المسطح خرسانه عاديه للارضيات و الارصفه سمك ١٠ سم بنسبه خلط ٨ و ٠ م٣ زلط نظيف متدرج + ٤ و ٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و خمسون متر مربع)	م٢	٩٠	١٦٥	١٤٨٥٠	٨٢,٣٧	١٦٥	١٣٥٩١,٠٥	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 ؛ 52) بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات،واللوحات الانشائيه وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و أربعون طن)	طن	٤٥	٢٧٦٠٠	١٢٤٢٠٠٠	٤١,٣٠	٢٧٦٠٠	١١٣٩٩٤٢,٩٢٨	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفئة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ألف و سبعمائة متر مربع)	م٢	١٧٠٠	٥٥	٩٣٥٠٠	١٤٥١,١٦	٥٥	٧٩٨١٣,٨	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفئة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرانح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدايز بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثلاثون متر مربع)	م٢	٣٥	١٣٥	٤٧٢٥	٣٤,٤٥	١٣٥	٤٦٥٠,٧٥	

مهندس الشركة

خالد كمال

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم

س.ت : ١٤١٢٣

مهندس الهيئة

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق و الكباري (المنطقة الحادية عشر)

عملية اعمال انشاء سرية ٢٣ شرطة عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهدة (انشاء سريه ٢٣ شرطه عسكريه)

(السور + البوابة و مبنى الامن + أبراج الحراسة)

تنفيذ: شركة اولاد ابراهيم سليمان قاسم للمقاولات و التوريدات العمومية

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله			المقايسه الختامية			ملاحظات
			الكميه المعدلة	الفئة (جنيه)	اجمالي	الكميه الختامية	الفئة (جنيه)	اجمالي	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٥	١٥٠	٥٢٥٠	٣٤,٤٥	١٥٠	٥١٦٧,٥	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثلاثون متر مربع)	م٢	٣٥	١٢٠	٤٢٠٠	٣٤,٤٥	١٢٠	٤١٣٤	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ربعمائة و أربعون متر مكعب)	م٣	٤٤٠	١٧٣٠	٧٦١٢٠٠	٤٠١,٣٣	١٧٣٠	٦٩٤٣٠٠,٩	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفئة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعون متر مكعب)	م٣	٤٠	١٨٠٠	٧٢٠٠٠	٣٥,١١	١٨٠٠	٦٣١٩٨	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطاقة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف (مائتان و خمسون متر مربع)	م٢	٢٥٠	١٠٥	٢٦٢٥٠	٢١١,٠٢	١٠٥	٢٢١٥٧,١	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من:٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطاقة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعة الاف و ثمنمائة متر مربع)	م٢	٤٨٠٠	١٣٥	٦٤٨٠٠٠	٤٢٠٢,٢٨	١٣٥	٥٦٧٣٠٧,٨	
١٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعة الاف و ثمنمائة متر مربع)	م٢	٤٨٠٠	١٤٠	٦٧٢٠٠٠	٤٢٠٢,٢٨	١٤٠	٥٨٨٣١٩,٢	
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان و خمسون متر مربع)	م٢	٢٥٠	١٣٥	٣٣٧٥٠	٢١١,٠٢	١٣٥	٢٨٤٨٧,٧	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثمانون متر مربع)	م٢	٨٠	١٩٠	١٥٢٠٠	٧٤,٦٠	١٩٠	١٤١٧٤	
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة سيراميك والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعون متر طولى)	م.ط	٦٠	٥٠	٣٠٠٠	٤٨,٦٠	٥٠	٢٤٣٠	

مهندس الشركة

خالد كمال

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم

س.ت : ١٤١٢٣

مهندس الهيئة

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله			المقايسه الختامية			ملاحظات
			الكميه المعدلة	الفئة (جنيه)	اجمالى	الكميه الختامية	الفئة (جنيه)	اجمالى	
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفئة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ١ : ٣م٠,٨٠ زلط + ٣م٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادى والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه احداهما باللون الأبيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثون متر طولى)	م.ط	٦٠	١٩٠	١١٤٠٠	٤٦,٦٠	١٩٠	٨٨٥٤	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفئة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثون متر مربع)	م٢	٧٠	١٩٠	١٣٣٠٠	٥٦,١٠	١٩٠	١٠٦٥٩	
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد MDF وقوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الراس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الحديد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب (ستة متر مربع)	م٢	٦	٣٠٠٠	١٨٠٠٠	٤,٤٠	٣٠٠٠	١٣٢٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات (ps الثقيلة) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفئة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب (خمسة و أربعون متر مربع)	م٢	٤٥	٣١٠٠	١٣٩٥٠٠	٢١,٤٤	٣١٠٠	٦٦٤٦٤	
٢٦	بالكجم توريد وتشغيل و تركيب حديد مشغول للبوابات والهندريل والقطاعات المعدنيه و الفئة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و التثبيت و الدهان بوجهين بريمر و وجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب و كذلك الكوالين و المفصلات مخرطة و الخردوات و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة الاف و سبعمائة كيلوجرام)	كجم	٣٧٠٠	٥٢	١٩٢٤٠٠	١٨٥٩,٠٩	٥٢	٩٦٦٧٢,٦٨	
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفئة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثلاثون متر طولى)	م.ط	٤٠	١٢٥	٥٠٠٠	٢٩,٠٠	١٢٥	٣٦٢٥	
٢٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفئة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جاليتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (عدد أثنين)	عدد	٢	٩٠٠	١٨٠٠	١,٠٠	٩٠٠	٩٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب ردم تربة احلال بالتربة الزلطية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على كثافة و عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول .الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٠٠٠	١٤٥	٤٣٥٠٠٠	٢٦٠٧,٦٩	١٤٥	٣٧٨١١٥,٠٥	

مهندس الشركة

خالد كمال

م/ ابراهيم سليمان قاسم
ت : ١٤١٢٣

مهندس الهيئة

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق و الكباري (المنطقة الحادية عشر)
عملية اعمال انشاء سرية ٢٣ شرطة عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهدة (انشاء سريه ٢٣ شرطه عسكريه)
(السور + البوابة و مبنى الامن + أبراج الحراسة)
تنفيذ: شركة اولاد ابراهيم سليمان قاسم للمقاولات و التوريدات العمومية

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله			المقايسه الختامية			ملاحظات
			الكميه المعدلة	الفئة (جنيه)	اجمالى	الكميه الختامية	الفئة (جنيه)	اجمالى	

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله			المقايسه الختامية			ملاحظات
			الكميه	الفئة (جنيه)	اجمالى	الكميه الختامية	الفئة (جنيه)	اجمالى	
	الاعمال الكهربائية								
١	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره احادي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٥٠٠	٢٠٠٠	٤	٥٠٠	٢٠٠٠	
٢	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد عشرة)	عدد	١٠	٦٠٠	٦٠٠٠	٢	٦٠٠	١٢٠٠	
٣	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بريزة ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و اللقمة و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد أثنا عشر)	عدد	١٢	٧٠٠	٨٤٠٠	١٠	٧٠٠	٧٠٠٠	
٤	بالعدد توريد و تركيب مخرج تليفون ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٧٠٠	٢٨٠٠	٢	٧٠٠	١٤٠٠	
٥	بالعدد توريد و تركيب مخرج داتا ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العملو اللقمة و مقطع سلك التوصيل داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٧٠٠	٢٨٠٠	٢	٧٠٠	١٤٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢×١٢٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة Led و مقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف (عدد عشرة)	عدد	١٠	١٢٥٠	١٢٥٠٠	٤	١٢٥٠	٥٠٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة (طراز جلوب كروي) كامل باللمبة الليد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٧٥٠	٣٠٠٠	٧	٧٥٠	٥٢٥٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف اناره طراز سله كامل باللمبه الليد ٣٠ سم ١٥واط يتم تركيبه علي الحائط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف (عدد مائتان)	عدد	٢٠٠	١٧٠٠	٣٤٠٠٠٠	١٩٢	١٧٠٠	٣٢٦٤٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية ip65 كامل بالمكونات و اللمبة ١٠٠ واط ليد و البند محمل عليه ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر و المواسير قطر ٢ بوصة و كذا مقطع السلك ٢×٣ مم٢ نحاس و كذا كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (عدد أربعون)	عدد	٥٤	٦٥٠٠	٣٥١٠٠٠	١٦	٦٥٠٠	١٠٤٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 2 بوصه و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (سبعمائة متر طولى)	م/ط	٧٠٠	٣٥٥	٢٤٨٥٠٠	٦٧٠	٣٥٥	٢٣٧٨٥٠	
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (سبعمائة متر طولي)	م/ط	٣٣٨	٣٥٠	١١٨٣٠٠	٠	٣٥٠	٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠ + ٩٠) مم٢ الومنيوم مسلح و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (مائة و خمسون متر طولي)	م/ط	١٥٠	٦٥٠	٩٧٥٠٠	١٤٠	٦٥٠	٩١٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 400 أمبير و عدد ١٢ مفتاح ١٠٠ أمبير و عدد ٨ مفتاح ٨٠ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و مزودة باجهزة قياس و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (عدد أثنين)	عدد	١	١٦٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠	٠	١٦٠٠٠٠	٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 40 أمبير و عدد ١٢ مفتاح أحادي ١٠ - ٢٠ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (عدد واحد)	عدد	١	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	

مهندس الشركة

خالد كمال

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣

مهندس الهيئة

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق و الكباري (المنطقة الحادية عشر)

عملية اعمال انشاء سرية ٢٣ شرطة عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهدة (انشاء سريه ٢٣ شرطه عسكريه)

(السور + البوابة و مبنى الامن + أبراج الحراسة)

تنفيذ: شركة اولاد ابراهيم سليمان قاسم للمقاولات و التوريدات العمومية

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله			المقايسه الختامية			ملاحظات
			الكميه المعدلة	الفئة (جنيه)	اجمالى	الكميه الختامية	الفئة (جنيه)	اجمالى	
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة انارة شوارع و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 امبير وعدد ١ كونتكتور ٦٠ امبير و عدد٣ مفتاح ثلاثي MCCB 40 امبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (عدد واحد)	عدد	١	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	١	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح ٢٠ امبير و عدد ٤ مفتاح أحادي ١٠ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٢٠٠٠	٨٠٠٠	٤	٢٠٠٠	٨٠٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب مروحة سقف/ حائط ٥٦ بوصة من اجود الأنواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (عدد أثنين)	عدد	٢	١٥٠٠	٣٠٠٠	٠	١٥٠٠	٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب و اختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط و بها المكونات الاتية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 امبيرو عدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 امبير و عدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	١	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	
	الإجمـــــالـــــي الكلي				٨٧٥٩١٢٥,٠٠			٦٨٥٧٠٥٣,٥٦	

مهندس الشركة

خالد كمال

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم

س.ت : ١٤١٢٣

مهندس الهيئة

م/ شريف صدقي

مدير المشروعات

م/ أحمد عراقي

رئيس الادارة المركزية

م/ احمد الطحان

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله	المقايسه الختامية	الفرق بالزيادة او بالنقصان (%)	ملاحظات
			الكميه المعدلة	الكميه الختامية		
	الاعمال الاعتيادية					
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات فى اى نوع من انواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفه تشمل سند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اربعة الاف و ستمائة متر مكعب)	م٣	٤٦٠٠	٣٨٨٨,١٤	-١٥,٤٨٪	
٢	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات فى التربة الصخرية ونزح المياه ان وجدت والفه تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لتنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف و ثلثمائة متر مكعب)	م٣	١٣٠٠	١٢٩٦,٠٥	-٠,٣٠٪	
٣	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة إحلال من التربة الزلطية (زلط الى رمل ١:٢) اسفل الاساسات موردة من خارج الموقع و خالية من المواد العضوية و الضارة حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم بطبقات لا يزيد أي منها عن ٢٥سم مع الرش بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول لاقصى كثافة جافة (ثلاثة الاف متر مكعب)	م٣	١٦٠٠	٠,٠٠	-١٠٠,٠٠٪	
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الفمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسلب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الفان و ستمائة متر مكعب)	م٣	٢٦٠٠	٢١٤٢,٣٥	-١٧,٦٠٪	
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان و اربعون متر مكعب)	م٣	٢٤٠	٢١٨,٢٠	-٩,٠٨٪	
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه للاساسات (القواعد والسملات وزقابى الاعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح (مائتان و أربعون متر مكعب)	م٣	٢٤٠	٢١٥,٩٥	-١٠,٠٢٪	
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانه مسلحه لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات و الطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ اسمنت بورتلاندى عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفة تشمل أعمال الفرم الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح (مئة و ستون متر مكعب)	م٣	١٦٠	١٣٨,٩٧	-١٣,١٤٪	
٨	بالمتر المسطح خرسانه عاديه للارضيات و الأرصفه سمك ١٠ سم بنسبه خلط ٨ و٠ م٣ زلط نظيف مندرج + ٤ و٠ م٣ رمل نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكي والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و خمسون متر مربع)	م٢	٩٠	٨٢,٣٧	-٨,٤٨٪	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 ؛ 52) بجميع الاقطار والفة تشمل التوريد والتشغيل والتركيب و التربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات،واللوحات الاتشائيه وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و أربعون طن)	طن	٤٥	٤١,٣٠	-٨,٢٢٪	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين والفة تشمل عمل وجهين متعامدين علي البارد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ألف و سبعمائة متر مربع)	م٢	١٧٠٠	١٤٥١,١٦	-١٤,٦٤٪	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات و المطابخ الدور العلوى من الأسومات سمك ٤ مم والفة تشمل الدهان اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزرة على الدايز بارتفاع ٢٠سم و اللحام بالباشبورى وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثلاثون متر مربع)	م٢	٣٥	٣٤,٤٥	-١,٥٧٪	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم كثافه لاتقل عن ٣٠ سمك٥ سم ويحمل علي البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢سم وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٣٥	٣٤,٤٥	-١,٥٧٪	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند ثم الجرجورى عن ٣سم وتتكون الخرسانة من اجزاء زلط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثلاثون متر مربع)	م٢	٣٥	٣٤,٤٥	-١,٥٧٪	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ربعمائة و أربعون متر مكعب)	م٣	٤٤٠	٢٨١,٤٥	-٣٦,٠٣٪	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت / م٣ رمل والفة تشمل توريد المون وعمل السقايل اللازمة مع رش المبانى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعون متر مكعب)	م٣	٤٠	٣٥,١١	-١٢,٢٣٪	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٠,٥٠ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المهندس المشرف (مائتان و خمسون متر مربع)	م٢	٢٥٠	٢١١,٠٢	-١٥,٥٩٪	

خالد كمال

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق و الكباري (المنطقة الحادية عشر)
عملية اعمال انشاء سرية ٢٣ شرطة عسكرية ضمن اعمال تطوير طريق المعاهدة (انشاء سريه ٢٣
(السور + البوابة و مبنى الامن + أبراج الحراسة)
تنفيذ: شركة اولاد ابراهيم سليمان قاسم للمقاولات و التوريدات العمومية

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله	المقايسه الختامية	الفرق بالزيادة او بالنقصان (%)	ملاحظات
			الكميه المعدلة	الكميه الختامية		
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من: ٣٥٠ كجم اسمنت / م٣ رمل البطانة بسمك ٥و١ سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والضهارة بسمك ٥و سم بمونة مكونة من ٥و٠ م٣ رمل + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعة الاف و ثمنمائة متر مربع)	م٢	٤٨٠٠	٤٢٠٢,٢٨	-١٢,٤٥%	
١٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافياتو - سافيتو - او ما يماثله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعة الاف و ثمنمائة متر مربع)	م٢	٤٨٠٠	٤٢٠٢,٢٨	-١٢,٤٥%	
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مائتان و خمسون متر مربع)	م٢	٢٥٠	٢١١,٠٢	-١٥,٥٩%	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم فرز أول من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية النحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثمانون متر مربع)	م٢	٨٠	٧٤,٦٠	-٦,٧٥%	
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة سيراميك والفنة تشمل التوريد والتركيب وسقية النحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (أربعون متر طولى)	م.ط	٦٠	٤٨,٦٠	-١٩,٠٠%	
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم والفنة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م٠,٨٠ زلط + ٣م٠,٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين بيوية اللاكيه إحداهما باللون الأبيض والأخرى باللون الأسود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثون متر طولي)	م.ط	٦٠	٤٦,٦٠	-٢٢,٣٣%	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفنة تشمل التوريد والتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (ثلاثون متر مربع)	م٢	٧٠	٥٦,١٠	-١٩,٨٦%	
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد MDF وقوائم الضلف و الرأس العليا قطاع ٢×٥ بوصه و الرأس السفلى قطاع ٢×٦ بوصه و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق والبرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه ببوية اللاكيه سايبس او سينيتال او مايماثلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب (ستة متر مربع)	م٢	٦	٤,٤٠	-٢٦,٦٧%	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات (ps الثقيلة) او ما يماثلها والمطابقة للكود المصرى و الفنة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣مم و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من أجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٢×٦ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب (خمسة و أربعون متر مربع)	م٢	٤٥	٢١,٤٤	-٥٢,٣٦%	
٢٦	بالكجم توريد وتشغيل و تركيب حديد مشغول للبوابات والهندريل والقطاعات المعدنيه و الفنة تشمل التوريد و التشغيل و التركيب و التثبيت و الدهان بوجهين بريمر و وجهين ببوية اللاكية باللون المطلوب و كذلك الكوالين و المفصلات مخرطة و الخردوات و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف (ثلاثة الاف و سبعمائة كيلوجرام)	كجم	٣٧٠٠	١٨٥٩,٠٩	-٤٩,٧٥%	
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك والفنة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (خمسة و ثلاثون متر طولي)	م.ط	٤٠	٢٩,٠٠	-٢٧,٥٠%	
٢٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ " و الفنة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالبتراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (عدد أثنين)	عدد	٢	١,٠٠	-٥٠,٠٠%	
٢٩	بالمتر المكعب ردم تربة احلال بالتربة الزلطية على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن مع الغمر بالمياه والدمك الجيد للحصول على كثافة و عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك على حساب المقاول والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م٣	٣٠٠٠	٢٦٠٧,٦٩	-١٣,٠٨%	

خالد كمال

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣

رقم	بند	الوحدة	المقايسه المعدله	المقايسه الختامية	الفرق بالزيادة او بالنقصان (%)	ملاحظات
			الكميه المعدلة	الكميه الختامية		
	الاعمال الكهربائية					
١	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره احادي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٤	%٠,٠٠	
٢	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد عشرة)	عدد	١٠	٢	%٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بريزة ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و اللقمة و مقطع سلك التوصيل ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد أثنا عشر)	عدد	١٢	١٠	%٠,٠٠	
٤	بالعدد توريد و تركيب مخرج تليفون ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٢	%٠,٠٠	
٥	بالعدد توريد و تركيب مخرج داتا ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العملو اللقمة و مقطع سلك التوصيل داخل مواسير مرنة ١٦ مم٢ و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٢	%٠,٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢×١٢٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمبة Led و مقطع السلك ٢×٢ مم٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم٢و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف (عدد عشرة)	عدد	١٠	٤	%٠,٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة (طراز جلوب كروي) كامل باللمبة الليد وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٧	%٠,٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف اناره طراز سله كامل باللمبه الليد ٣٠ سم ١٥واط يتم تركيبه علي الحائط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف (عدد ماتتان)	عدد	٢٠٠	١٩٢	%٠,٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية ip65 كامل بالمكونات و اللمبة ١٠٠ واط ليد و البند محمل عليه ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر و المواسير قطر ٢ بوصة و كذا مقطع السلك ٢×٣ مم٢ نحاس و كذا كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (عدد أربعون)	عدد	٥٤	١٦	%٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير pvc 2 بوصه و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (سبعمائة متر طولى)	م/ط	٧٠٠	٦٧٠	%٠,٠٠	
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (سبعمائة متر طولي)	م/ط	٣٣٨	٠	%٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠ + ٩٠) مم٢ الومنيوم مسلح و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف (مائة و خمسون متر طولي)	م/ط	١٥٠	١٤٠	%٠,٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 400 أمبير و عدد ١٢ مفتاح ١٠٠ أمبير و عدد ٨ مفتاح ٨٠ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و مزودة باجهزة قياس و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (عدد أثنين)	عدد	١	٠	%٠,٠٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 40 أمبير و عدد ١٢ مفتاح أحادي ١٠ - ٢٠ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (عدد واحد)	عدد	١	١	%٠,٠٠	
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة انارة شوارع و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 امبير وعدد ١ كونتكتور ٦٠ امبير و عدد٣ مفتاح ثلاثي MCCB 40 أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (عدد واحد)	عدد	١	١	%٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح ٢٠ أمبير و عدد ٤ مفتاح أحادي ١٠ أمبير و البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف (عدد أربعة)	عدد	٤	٤	%٠,٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب مروحة سقف/ حائط ٥٦ بوصة من اجود الأنواع و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف (عدد أثنين)	عدد	٢	٠	%٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب و اختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط و بها المكونات الاتية : عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 امبيرو عدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 امبير و عدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١	%٠,٠٠	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة
م/ شريف صدقي



بيان الاعمال بمستخلص رقم ختامي

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري



عملية : تنفيذ اعمال انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع اعمال تطوير طريق السويس الإسماعيلية - المعاهدة -
(انشاء مباني سرية ٢٣ شرطة عسكرية)
انشاء السور و مبنى الامن و ٤ أبراج حراسة

تنفيذ شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية الختامية	الكمية المنفذة فعليا	الكمية بالمستخلص	النسبة
	أولا الاعمال الاعتيادية					
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة	م٣	٣٨٨٨,١٤	٣٨٨٨,١٤	٣٨٨٨,١٤	%١٠٠
٢	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الأساسات فى التربة الصخرية	م٣	١٢٩٦,٠٥	١٢٩٦,٠٥	١٢٩٦,٠٥	%١٠٠
٣	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة إحلال من التربة الزلطية	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	م٣	٢١٤٢,٣٥	٢١٤٢,٣٥	٢١٤٢,٣٥	%١٠٠
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات	م٣	٢١٨,٢٠	٢١٨,٢٠	٢١٨,٢٠	%١٠٠
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات	م٣	٢١٥,٩٥	٢١٥,٩٥	٢١٥,٩٥	%١٠٠
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات	م٣	١٣٨,٩٧	١٣٨,٩٧	١٣٨,٩٧	%١٠٠
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم	م٢	٨٢,٣٧	٨٢,٣٧	٨٢,٣٧	%١٠٠
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (37 ؛ ٥٢) بجميع الاقطار	طن	٤١,٣٠	٤١,٣٠	٤١,٣٠	%١٠٠
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين	م٢	١٤٥١,١٦	١٤٥١,١٦	١٤٥١,١٦	%١٠٠
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح	م٢	٣٤,٤٥	٣٤,٤٥	٣٤,٤٥	%١٠٠
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الفوم	م٢	٣٤,٤٥	٣٤,٤٥	٣٤,٤٥	%١٠٠
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم	م٢	٣٤,٤٥	٣٤,٤٥	٣٤,٤٥	%١٠٠
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ	م٣	٢٨١,٤٥	٢٨١,٤٥	٢٨١,٤٥	%١٠٠
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي	م٣	٣٥,١١	٣٥,١١	٣٥,١١	%١٠٠
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف	م٢	٢١١,٠٢	٢١١,٠٢	٢١١,٠٢	%١٠٠
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	م٢	٤٢٠٢,٢٨	٤٢٠٢,٢٨	٤٢٠٢,٢٨	%١٠٠
١٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (سافيتو)	م٢	٤٢٠٢,٢٨	٤٢٠٢,٢٨	٤٢٠٢,٢٨	%١٠٠
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بنوية البلاستيك	م٢	٢١١,٠٢	٢١١,٠٢	٢١١,٠٢	%١٠٠
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس٣٠×٣٠×٣سم	م٢	٧٤,٦٠	٧٤,٦٠	٧٤,٦٠	%١٠٠
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة سيراميك	م.ط	٤٨,٦٠	٤٨,٦٠	٤٨,٦٠	%١٠٠
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم	م.ط	٤٦,٦٠	٤٦,٦٠	٤٦,٦٠	%١٠٠
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة	م٢	٥٦,١٠	٥٦,١٠	٥٦,١٠	%١٠٠
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد MDF	م٢	٤,٤٠	٤,٤٠	٤,٤٠	%١٠٠
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم	م٢	٢١,٤٤	٢١,٤٤	٢١,٤٤	%١٠٠
٢٦	بالكجم توريد وتشغيل و تركيب حديد مشغول للبوابات والهندريل	كجم	١٨٥٩,٠٩	١٨٥٩,٠٩	١٨٥٩,٠٩	%١٠٠
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك	م.ط	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	٢٩,٠٠	%١٠٠
٢٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ "	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
٢٩	بالمتر المكعب ردم تربة إحلال من التربة الزلطية	م٣	٢٦٠٧,٦٩	٢٦٠٧,٦٩	٢٦٠٧,٦٩	%١٠٠

مهندس الشركة

م/ خالد كمال

مهندس الهيئة

م/

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣



تابع بيان الاعمال بمستخلص رقم ختامى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى



عملية : تنفيذ اعمال انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع اعمال تطوير طريق السويس الإسماعيلية - المعاهدة -
(انشاء مباني سرية ٢٣ شرطة عسكرية)
انشاء السور و مبنى الامن و ٤ أبراج حراسة

تنفيذ شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية الختامية	الكمية المنفذة فعليا	الكمية بالمستخلص	النسبة
	ثانيا الاعمال الكهربائية					
١	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة احادي ماجيك او ما شابهه	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	%١٠٠
٢	بالعدد توريد و تركيب مفتاح انارة ثنائي	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٣	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بريزة ماجيك او ما شابهه	عدد	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	%١٠٠
٤	بالعدد توريد و تركيب مخرج تليفون ماجيك او ما شابهه	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٥	بالعدد توريد و تركيب مخرج داتا ماجيك او ما شابهه	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	%١٠٠
٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢×١٢٠ سم	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	%١٠٠
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة (طراز جلوب كروي)	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠	%١٠٠
٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة طراز سله باللمبه الليد	عدد	١٩٢,٠٠	١٩٢,٠٠	١٩٢,٠٠	%١٠٠
٩	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع	عدد	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	%١٠٠
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ الومنيوم مسلح	م/ط	٦٧٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	٦٧٠,٠٠	%١٠٠
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح	م/ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠ + ٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح	م/ط	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	%١٠٠
١٣	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB ٤٠٠ أمبير	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠
١٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB ٤٠ أمبير	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة انارة شوارع مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB ١٠٠ امبير	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	%١٠٠
١٦	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح ٢٠ أمبير	عدد	٤,٠٠	٤,٠٠	٤,٠٠	%١٠٠
١٧	بالعدد توريد و تركيب مروحة سقف/ حائط	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	%٠
١٨	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB ٢٥٠ أمبير	عدد	١,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	%٠

مهندس الشركة

م/ خالد كمال

مهندس الهيئة

م/

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣


البوابة العمومي

النوع	المكان و الوصف		العدد	الطول	اجمالى الطول	اجمالي الصنف ١ ضلفة	اجمالي الصنف ٢ ضلفة	وزن ال م	الإجمالى
علبة ٤*٨ ٣مم	قائم	يمين و شمال خارجي	1	2.75	2.75	16.83	33.66	5.652	190.25
			1	3.25	3.25				
	نائم	سفلي	1	2.75	2.75				
		مستطيل	2	1.92	3.84				
		مربعات سفلي	4	0.35	1.4				
		مربعات علوي	2	0.41	0.82				
		عارضة علوي	1	2.02	2.02				
علبة ٤*٦ ٢مم	قائم	يمين و شمال داخلي	1	2.6	2.6	11.19	22.38	3.14	70.27
			1	3.25	3.25				
	نائم	اسفل الشمعدانات	1	1.92	1.92				
		اسفل دوابر علوي	1	2.02	2.02				
		مستطيل جانبي	4	0.35	1.4				
علبة ٣*٣ ٢مم	فوق و تحت الدوابر السفلية		2	1.92	3.84	3.84	7.68	1.884	14.47
خوصة سم*٦مم	الشبيكة	سفلي	24	0.55	13.2	38.16	76.32	0.942	71.89
			4	0.35	1.4				
			4	0.15	0.6				
		يمين و شمال	18	0.5	18				
			4	0.41	3.28				
			4	0.21	1.68				
خوصة سم*٨مم	الدوابر	فوق و تحت	12.5	0.96	24	53.4	106.8	1.256	134.14
	مربع داخلي		10	0.51	10.2				
	شمعدان		12	0.51	12.24				
	شكل تحت المربع الداخلي		1	1.2	2.4				
	خوصة بالعرض على الحربة		4	0.57	4.56				
سيخ مربع ١٦*١٦	اطار	٢ مربع سفلي	4	0.39	1.56	45.97	91.94	2.0096	184.76
			4	0.35	1.4				
		مستطيل سفلي	2	1.92	3.84				
			2	0.39	0.78				
		مستطيل جانبي	4	0.35	1.4				
		مستطيل صغير	2	1.56	3.12				
		مستطيل كبير	2	2.22	4.44				
		برواز اساسى	1	2.02	2.02				
			1	1.92	1.92				
			1	1.55	1.55				
			1	2.22	2.22				
		٢ مربع علوي	8	0.35	2.8				
		مستطيل علوي	2	0.35	0.7				
			2	2.02	4.04				
	حربة	مقاس صغير	8	0.6	4.8				
		مقاس كبير	1	1.12	1.12				
			1	1.17	1.17				
			1	1.2	1.2				
			1	1.24	1.24				
			1	0.7	0.7				
			1	0.75	0.75				
			1	0.8	0.8				
			1	0.85	0.85				
		مقاس صغير فوق وسط	1	0.15	0.15				
			1	0.25	0.25				
			1	0.35	0.35				
			1	0.4	0.4				
		اسفل المربع الداخلي	2	0.2	0.4				
صاج	٣مم		3.075	2.9	8.9175	8.9175	17.835	23.55	420.01
كمرة U	١٠سم		2	3	6			10.6	63.60
مفصلة	كبيرة		6					0.5	3.00
اشكال و حلية		حربة	32				64		100
		وردة كبيرة	4				8		
		وردة صغيرة	23				46		
		نص كورة	95				190		
		شكل كبير	2				4		
									1252.40

خالد كمال


شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣

الأبراج

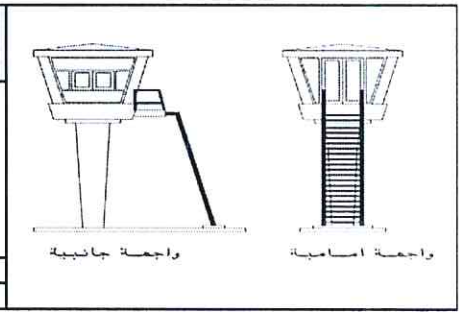


علبة ٨*٤ ٢ مم		قائم السلم	2	4.3	8.6	34.4			
		سندة علوية	2	0.15	0.3	1.2			
		الدرج	13	0.87	11.31	45.24			
		٢ هندربل	4	0.62	2.48	9.92			
			2	0.9	1.8	7.2			
					24.49	97.96	3.768	369.113	371.625
خوصة ٤ * ٢		٢ هندربل	2	0.5	1	4	0.628	2.512	

شبابيك الحماية



خوصة ٢.٥ سم * ٥ مم		الدائر	2	1.5	3	10.4	0.98125	10.205	58.435
			2	1.1	2.2				
سيخ مربع ١٦ مم		القائم	9	1.1	9.9	24	2.0096	48.2304	
		العرضي	15	0.14	2.1				

الباب الصغير

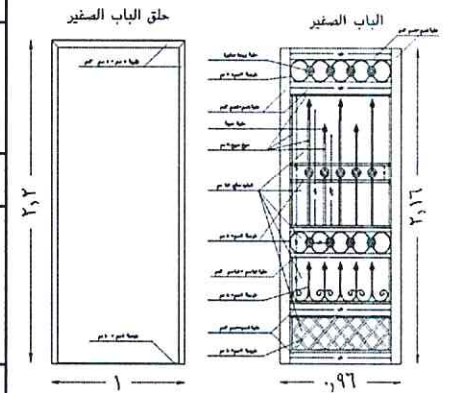

علبة ٨ سم * ٤ سم ٣ مم	٣مم	القائم	2	2.16	4.32	7.52	5.652	42.503	176.625
		العرضي	4	0.8	3.2				
علبة ٣ سم * ٣ سم ٢مم	٢مم	العرضي	2	0.8	1.6	1.6	1.884	3.014	
خوصة ٢سم * ٨ مم		الدوابر	10	0.47	4.7	13.58	1.256	17.056	
		العرضي	2	0.8	1.6				
		نص الرسمة السفلية	6	0.5	3				
		الشبكة السفلية	10	0.35	3.5				
			4	0.195	0.78				
خوصة ٥سم * ١٠ مم		الحلق سفلي	1	1	1	3.16	3.925	12.403	
		مرايا الضلفة	1	2.16	2.16				
سيخ مربع ١٦ مم		العرضي	5	0.8	4	10.51	2.0096	21.121	
		القائم علوي	2	0.9	1.8				
		القائم وسط	2	0.305	0.61				
		القائم سفلي	2	0.22	0.44				
		سيخ الحرية الطويل	3	0.8	2.4				
		سيخ الحرية القصير	2	0.63	1.26				
زاوية ٥ سم * ٥ سم ٣ مم	٣مم	الحلق قايم	2	2.2	4.4	5.4	2.355	12.717	
		الحلق عرضي	1	1	1				
صاج	٣مم		1	2.2	2.2	2.2	23.55	51.81	
اشكال		حربة			10			16	
		وردة صغيرة			13				
		نص كورة			36				

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣
خالد أكمال

	مقاس القطاع					وزن المتر
	طول	عرض	عرض	سمك	كثافة الحديد	
علبة ٨ سم * ٤ سم ٢ مم	1000	80	40	2	0.00000785	3.768
علبة ٨ سم * ٤ سم ٣ مم	1000	80	40	3	0.00000785	5.652
علبة ٤ سم * ٦ سم ٢مم	1000	40	60	2	0.00000785	3.14
علبة ٣ سم * ٣ سم ٢مم	1000	30	30	2	0.00000785	1.884
زاوية ٥سم * ٥ سم ٣ مم	1000	50	50	3	0.00000785	2.355
خوصة ٥سم * ١٠ مم	1000		50	10	0.00000785	3.925
خوصة ٤ سم * ٢ مم	1000		40	2	0.00000785	0.628
خوصة ٢سم * ٨مم	1000		20	8	0.00000785	1.256
خوصة ٢سم * ٦مم	1000		20	6	0.00000785	0.942
خوصة ٢.٥ سم * ٥ مم	1000		25	5	0.00000785	0.98125
سيخ مربع ١٦ مم	1000		16	16	0.00000785	2.0096
صاج ٣مم	1000		1000	3	0.00000785	23.55
كمرة ١٠سم U						10.6

اجمالي الحديد المشغول	
البوابة العمومي	1252.40
الأبراج	371.625
شبابيك الحماية	58.435
البوابة الصغيرة	176.625
	1859.09

مهندس الشركة

خالد كمال

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣

مهندس الهيئة

حصر الختامي

م	اسم البند	عدد
1	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ "	1

مهندس الشركة

خالد كمال

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية : إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ إنشاء مبني السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السابعه)

عقد رقم (٧٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المورخ في ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢

تنفيذ شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم

مستخلص ختامي

في المده من بداية الاعمال حتي تاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الكميه بالمقايسه الختامية	الوحدة	الفئة جنية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
أولا الاعمال الاعتيادية												
١	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة	٣٨٨٨,١٤	م٣	٩٠	٣٨٨٨	٠.١٤	٣٨٨٨,١٤		٣٤٩٩٣٢.٦٠	٠.٠٠	٣٤٩٩٣٢.٦٠	١- يراعي تطبيق بنود التعاقد .
٢	بالمتر المكعب حفر اترية لزوم الأساسات فى التربة الصخرية	١٢٩٦,٠٥	م٣	١٣٠	٠	١,٢٩٦.٠٥	١٢٩٦,٠٥		١٦٨٤٨٦.٥٠	٠.٠٠	١٦٨٤٨٦.٥٠	٢- المهندسون متواجدون .
٣	بالمتر المكعب توريد و تشغيل طبقة إحلال من التربة الزلطية	٠,٠٠	م٣	٢٧٥	٠	٠.٠٠٠	٠,٠٠		٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣- لافتات العملية متواجده .
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	٢١٤٢,٣٥	م٣	١٤٥	٢١٤٢	٠.٣٥	٢١٤٢,٣٥		٣١٠٦٤٠.٧٥	٠.٠٠	٣١٠٦٤٠.٧٥	٤- التقارير الشهرية و النصف شهرية و الأسبوعية متواجدة .
٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات	٢١٨,٢٠	م٣	١٦٥٠	٢١٩	٠.٨٠-	٢١٨,٢٠		٣٦٠٠٣٠.٠٠	٠.٠٠	٣٦٠٠٣٠.٠٠	٥- بوليصة التأمين متواجدة .
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات	٢١٥,٩٥	م٣	٢٢٧٥	٢١٦	٠.٠٥-	٢١٥,٩٥		٤٩١٢٨٦.٢٥	٠.٠٠	٤٩١٢٨٦.٢٥	
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات	١٣٨,٩٧	م٣	٢٩٠٠	١٣٩	٠.٠٣-	١٣٨,٩٧		٤٠٣٠١٣.٠٠	٠.٠٠	٤٠٣٠١٣.٠٠	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم	٨٢,٣٧	م٢	١٦٥	٨٣	٠.٦٣-	٨٢,٣٧		١٣٥٩١.٠٥	٠.٠٠	١٣٥٩١.٠٥	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ ؛ ٥٢) بجميع الاقطار	٤١,٣٠	طن	٢٧٦٠٠	٤٢	٠.٧٠-	٤١,٣٠		١١٣٩٩٤٢.٩٣	٠.٠٠	١١٣٩٩٤٢.٩٣	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبه لزوم الاساسات بالبتومين	١٤٥١,١٦	م٢	٥٥	١٤٥٢	٠.٨٤-	١٤٥١,١٦		٧٩٨١٣.٨٠	٠.٠٠	٧٩٨١٣.٨٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح	٣٤,٤٥	م٢	١٣٥	٣٥	٠.٥٥-	٣٤,٤٥		٤٦٥٠.٧٥	٠.٠٠	٤٦٥٠.٧٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من الغوم	٣٤,٤٥	م٢	١٥٠	٢٨	٦.٤٥	٣٤,٤٥		٥١٦٧.٥٠	٠.٠٠	٥١٦٧.٥٠	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم	٣٤,٤٥	م٢	١٢٠	٢٨	٦.٤٥	٣٤,٤٥		٤١٣٤.٠٠	٠.٠٠	٤١٣٤.٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ	٢٨١,٤٥	م٣	١٧٣٠	٤٠٢	٠.٦٧-	٤٠١,٣٣		٦٩٤٣٠٠.٩٠	٠.٠٠	٦٩٤٣٠٠.٩٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مبانى سمك طوبة من الطوب الاسمنتي	٣٥,١١	م٣	١٨٠٠	٣٦	٠.٨٩-	٣٥,١١		٦٣١٩٨.٠٠	٠.٠٠	٦٣١٩٨.٠٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف	٢١١,٠٢	م٢	١٠٥	٢١٢	٠.٩٨-	٢١١,٠٢		٢٢١٥٧.١٠	٠.٠٠	٢٢١٥٧.١٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	٤٢٠٢,٢٨	م٢	١٣٥	٣٩٩٠	٢١٢.٢٨	٤٢٠٢,٢٨		٥٦٧٣٠٧.٨٠	٠.٠٠	٥٦٧٣٠٧.٨٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (سافيتو)	٤٢٠٢,٢٨	م٢	١٤٠	٤٠٠٠	٢٠٢.٢٨	٤٢٠٢,٢٨		٥٨٨٣١٩.٢٠	٠.٠٠	٥٨٨٣١٩.٢٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية البلاستيك	٢١١,٠٢	م٢	١٣٥	١٩١	٢٠.٠٢	٢١١,٠٢		٢٨٤٨٧.٧٠	٠.٠٠	٢٨٤٨٧.٧٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرارة مقاس ٣٠×٣٠×٣سم	٧٤,٦٠	م٢	١٩٠	٧٥	٠.٤٠-	٧٤,٦٠		١٤١٧٤.٠٠	٠.٠٠	١٤١٧٤.٠٠	
٢١	بالمتر الطولى توريد وتركيب وزرة سيراميك	٤٨,٦٠	م.ط	٥٠	٤٩	٠.٤٠-	٤٨,٦٠		٢٤٣٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٣٠.٠٠	
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب بردورة أسمنتية بأبعاد ٥٠ × ٢٥ × ١٥ سم	٤٦,٦٠	م.ط	١٩٠	٤٢	٤.٦٠	٤٦,٦٠		٨٨٥٤.٠٠	٠.٠٠	٨٨٥٤.٠٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة	٥٦,١٠	م٢	١٩٠	٥٧	٠.٩٠-	٥٦,١٠		١٠٦٥٩.٠٠	٠.٠٠	١٠٦٥٩.٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد و تركيب ابواب خشب موسكى تجليد MDF	٤,٤٠	م٢	٣٠٠٠	٥	٠.٦٠-	٤,٤٠		١٣٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٢٠٠.٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك وابواب ألومنيوم	٢١,٤٤	م٢	٣١٠٠	٢٢	٠.٥٦-	٢١,٤٤		٦٦٤٦٤.٠٠	٠.٠٠	٦٦٤٦٤.٠٠	
٢٦	بالكجم توريد وتشغيل و تركيب حديد مشغول للبوابات والهندريل والقطاعات المعدنية	١,٨٥٩.٠٩	كجم	٥٢	٠	١,٨٥٩.٠٩	١,٨٥٩.٠٩		٩٦٦٧٢.٦٨	٠.٠٠	٩٦٦٧٢.٦٨	
٢٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك	٢٩,٠٠	م.ط	١٢٥	٢٩	٠.٠٠	٢٩,٠٠		٣٦٢٥.٠٠	٠.٠٠	٣٦٢٥.٠٠	
٢٨	بالعدد توريد و تركيب جرجوري صرف امطار قطر ٣ "	١,٠٠	عدد	٩٠٠	١	٠.٠٠	١,٠٠		٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩٠٠.٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب ردم تربة إحلال من التربة الزلطية	٢٦٠٧,٦٩	م٣	١٤٥	٢٦٠٨	٠.٣١-	٢٦٠٧,٦٩		٣٧٨١١٥.٠٥		٣٧٨١١٥.٠٥	
الإجمالـــــــ

الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية : إنشاء المباني البديله للوحدات العسكريه المتعارضه مع طريق المعاهده (لتنفيذ إنشاء مبني السريه (٢٣) شرطه عسكريه - المرحله السابعه)

عقد رقم (٧٥٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) المؤرخ في ١٦ / ١١ / ٢٠٢٢

تنفيذ شركة أولاد إبراهيم سليمان قاسم

مستخلص ختامي

في المده من بداية الاعمال حتي تاريخ ٩٨ / ٧٨ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الكميه بالمقايسه الختامية	الوحدة	الفئة جنية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
ثانيا الاعمال الكهربائية												
١	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره احادي ماجيك او ما شابهه	٤	عدد	٥٠٠	٤	٠,٠٠	٤	جاري ختامي	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠	
٢	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائي	١٠	عدد	٦٠٠	٢	٠,٠٠	٢		١٢٠٠	٠	١٢٠٠	
٣	بالعدد توريد و تركيب مفتاح بريزة ماجيك او ما شابهه	١٢	عدد	٧٠٠	١٠	٠,٠٠	١٠		٧٠٠٠	٠	٧٠٠٠	
٤	بالعدد توريد و تركيب مخرج تليفون ماجيك او ما شابهه	٤	عدد	٧٠٠	٢	٠,٠٠	٢		١٤٠٠	٠	١٤٠٠	
٥	بالعدد توريد و تركيب مخرج داتا ماجيك او ما شابهه	٤	عدد	٧٠٠	٢	٠,٠٠	٢		١٤٠٠	٠	١٤٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب وإختبار كشاف ٢×١٢٠ سم	١٠	عدد	١٢٥٠	٤	٠,٠٠	٤		٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	
٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة (طراز جلوب كروي)	٤	عدد	٧٥٠	٧	٠,٠٠	٧		٥٢٥٠	٠	٥٢٥٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب كشاف اناره طراز سله باللمبه الليد	٢٠٠	عدد	١٧٠٠	١٩٢	٠,٠٠	١٩٢		٣٢٦٤٠٠	٠	٣٢٦٤٠٠	
٩	بالعدد توريد و تركيب كشاف إنارة طراز شوارع	٥٤	عدد	٦٥٠٠	١٦	٠,٠٠	١٦		١٠٤٠٠٠	٠	١٠٤٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×١٦) مم٢ الومنيوم مسلح	٧٠٠	م/ط	٣٥٥	٦٧٠	٠,٠٠	٦٧٠		٢٣٧٨٥٠	٠	٢٣٧٨٥٠	
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤×٣٥) مم٢ الومنيوم مسلح	٣٣٨	م/ط	٣٥٠	٠	٠,٠٠	٠		٠	٠	٠	
١٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣×١٥٠ + ٧٠) مم٢ الومنيوم مسلح	١٥٠	م/ط	٦٥٠	١٤٠	٠,٠٠	١٤٠		٩١٠٠٠	٠	٩١٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 400 أمبير	١	عدد	١٦٠٠٠٠	٠	٠,٠٠	٠		٠	٠	٠	
١٤	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 40 أمبير	١	عدد	١٢٠٠٠	١	٠,٠٠	١		١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	
١٥	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة انارة شوارع مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 100 امبير	١	عدد	٤٠٠٠٠	١	٠,٠٠	١		٤٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	
١٦	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع و به المكونات التالية : عدد ١ مفتاح ٢٠ أمبير	٤	عدد	٢٠٠٠	٤	٠,٠٠	٤		٨٠٠٠	٠	٨٠٠٠	
١٧	بالعدد توريد و تركيب مروحة سقف/ حائط	٢	عدد	١٥٠٠	٠	٠,٠٠	٠		٠	٠	٠	
١٨	بالعدد توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 أمبير	١	عدد	١٢٥٠٠٠	١	٠,٠٠	١		١٢٥٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠	
	الإجمالـــــــــــــــــي للأعمـــال الكهربائيـــــة								٩٦٧٥٠٠,٠٠			
	الإجمالـــــــــــــــــي للأعمـــال الإعتياديـــــة								٥٨٨٩٥٥٣,٥٦			
	الإجمالـــــــــــــــــي	فقط ستة ملايين وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً وستة وخمسون قرشاً لا غير								٦,٨٥٧,٠٥٣.٥٦			

مهندس الشركة
م / خالد قاسم

مهندس الهيئة
م / شريف صدقي

مدير عام المشروعات
م / احمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية
م / احمد الطحان

شركة أولاد ابراهيم سليمان قاسم
س.ت : ١٤١٢٣

روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ٢٠٢٤/٥/٣٠
