وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة باسيوط و المنيا

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق ديروط / الفرافرة بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة أسيوط)

مستخلص رقم ١ جارى

العقد رقم ١١٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤ مع شركة بى اتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة شامل المدة من بدء العمل الى ٨ / ٨ / ٢٠٢٤

الكمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت الى الآن	جملة قيمة الاعمال السابق اجراءه	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	ملاحظات
١٥٤٠٠	١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفة باستخدام المكانس الميكانيكة والفنة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤٠	م٣	٠	١٢٧٠٠٠	١٢٧٠٠٠	٠	٥٠٨٠٠٠٠	٥٠٨٠٠٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد المهندسون متواجدون العلامات الارشادية والتحذرية متواجده لوحات المشروع متواجدة التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده يراجع الأدوات المكتبية عدد ١٥ كرتونة ورق A٤ مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
٤٠٠٠٠	٤	بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لايقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالمياة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل ٢٠كم -يتم زيادة علاوة تحجير فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مايثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر	٥٠	١٨	م٢	٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٠	٢٢٢٠٠٠,٠٠	٢٢٢٠٠٠	
		الاجمالى								٥٣٠٢٠٠٠		

٥٠٢٦٩٠٠ = ٠,٩٥ ×

فقط خمسة مليون وثلاثمائه واثنان الفجنيها مصرياً

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ محمود محمد عبد الغنى

مدير المشروع

م/ احمد خالد عيد

ندس شركة بى اتش

م/ شعبان جابر

يعتمد .....

رئيس الادارة المركزية

مهندس/
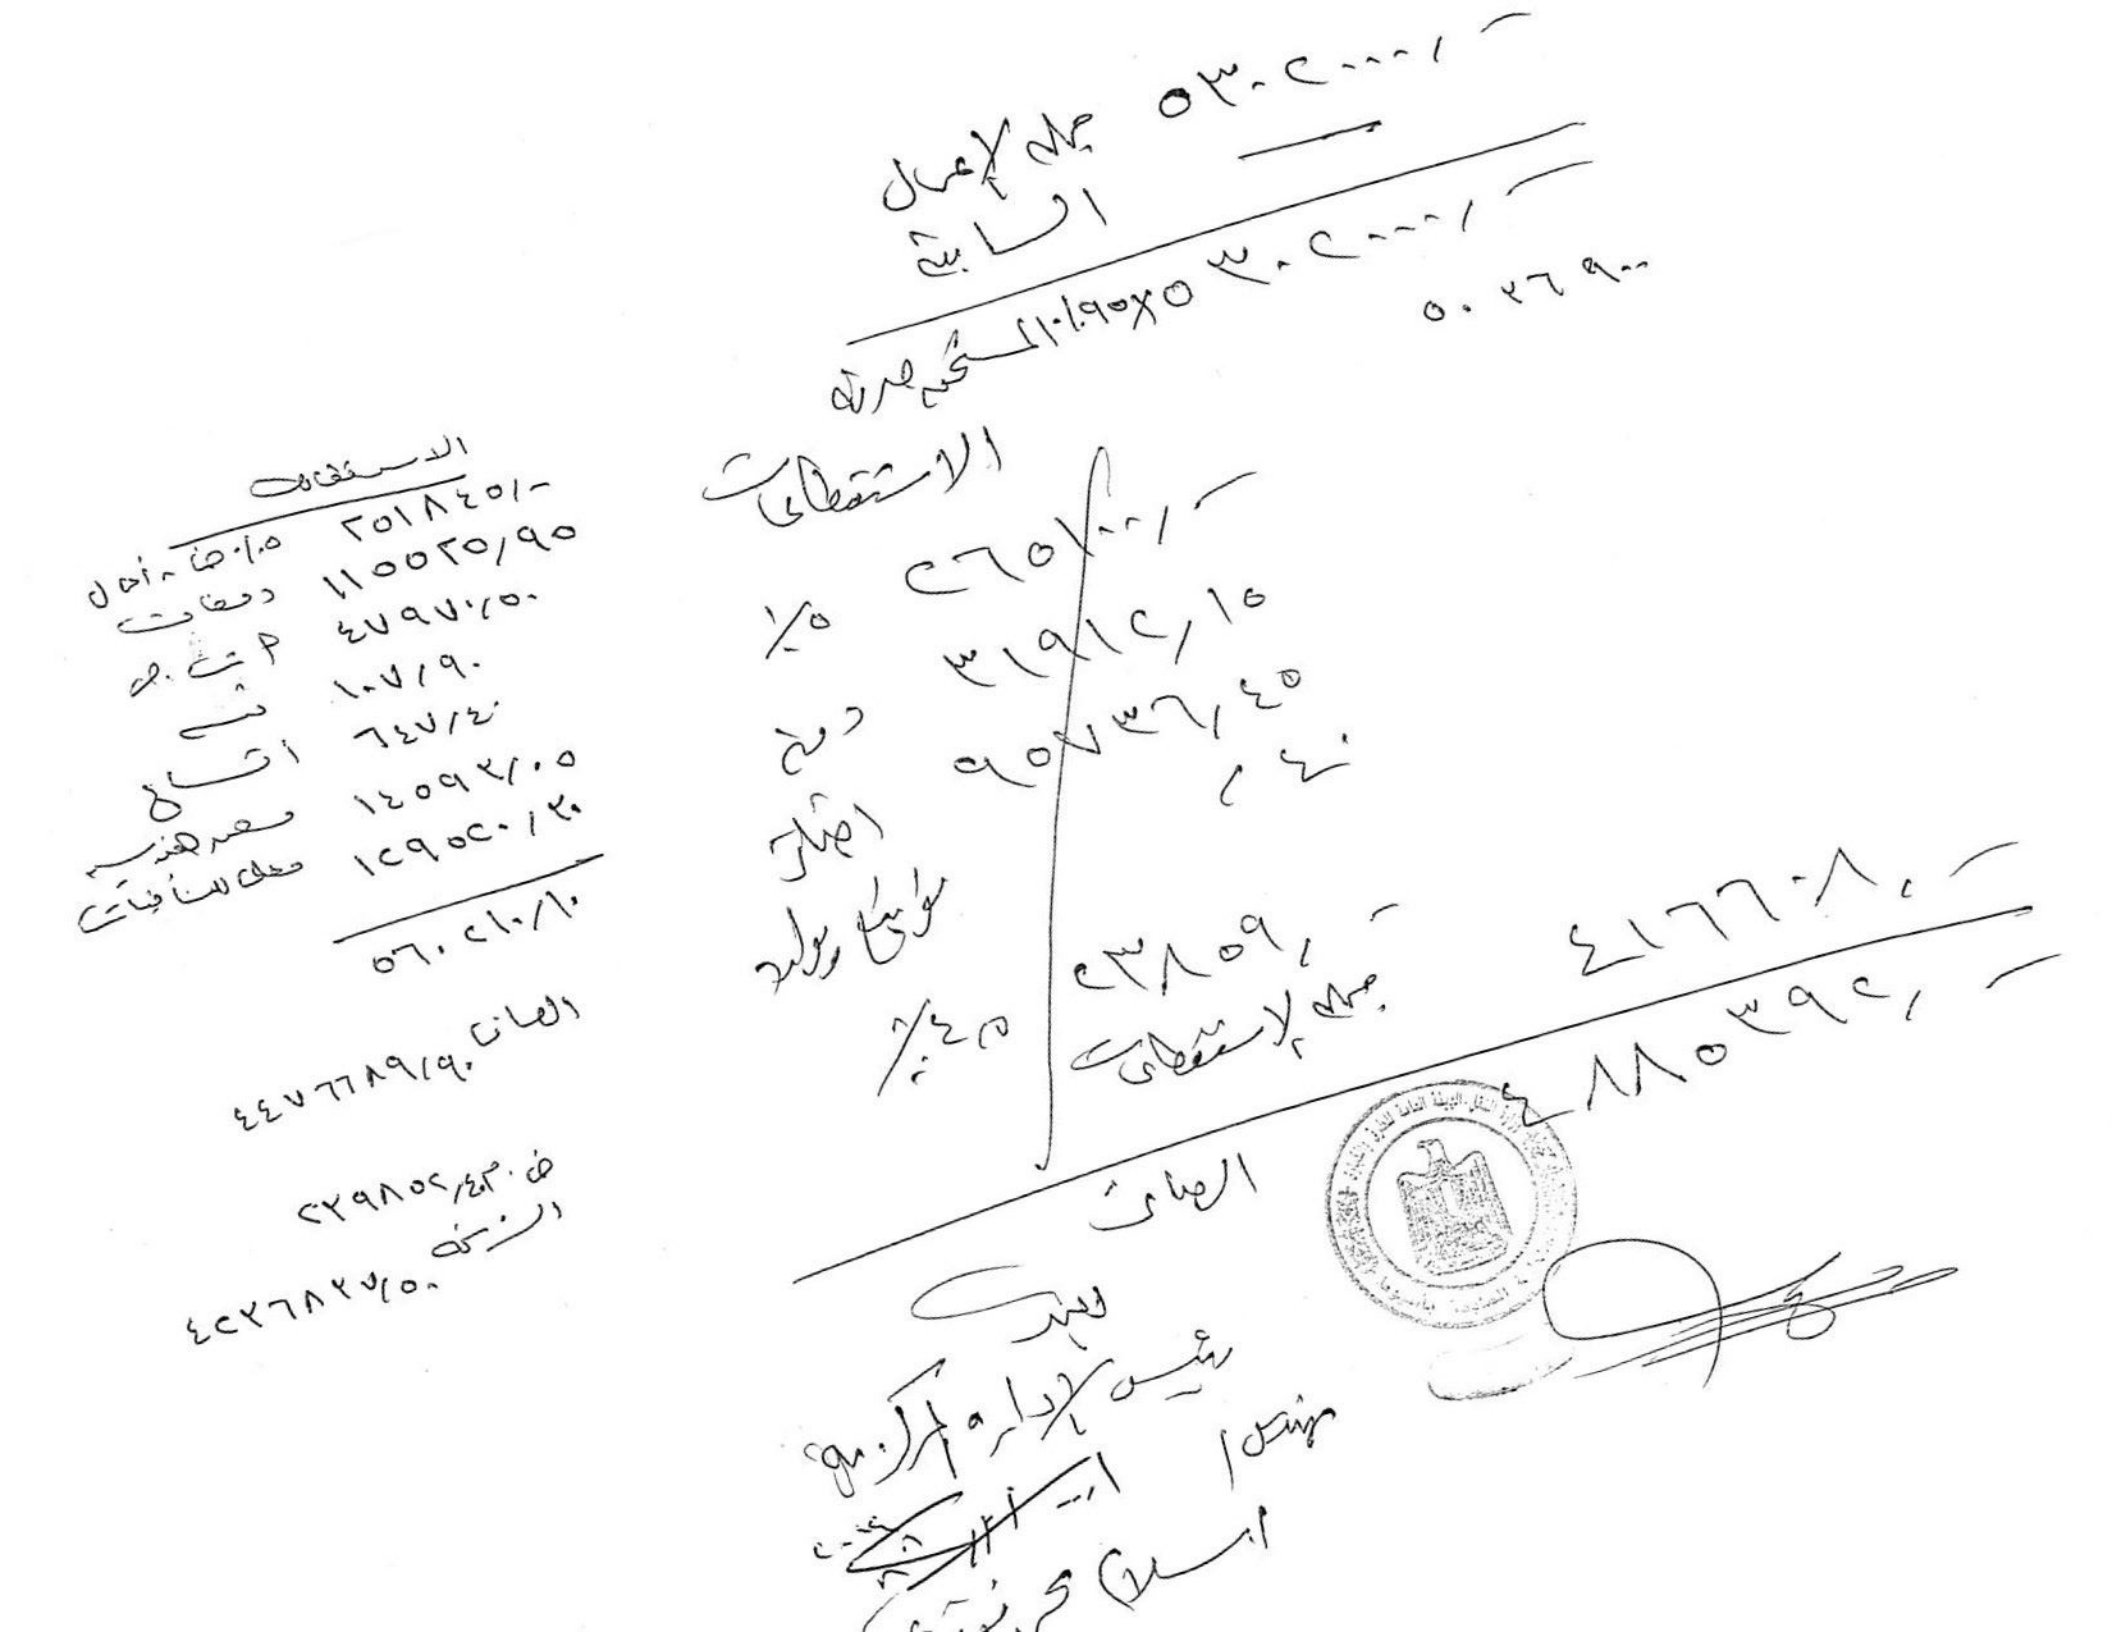
اسلام محمد فوزى
